




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 09 de enero de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	266
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	270
Central La Tablada	-77
Central P. del Tigre	314
APR A	0
APR B	-2
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.424
C. Baygorria	2.338
C. Palmar	7.895
C. Salto Grande	14.640
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.699
TOTAL Generación	34.496

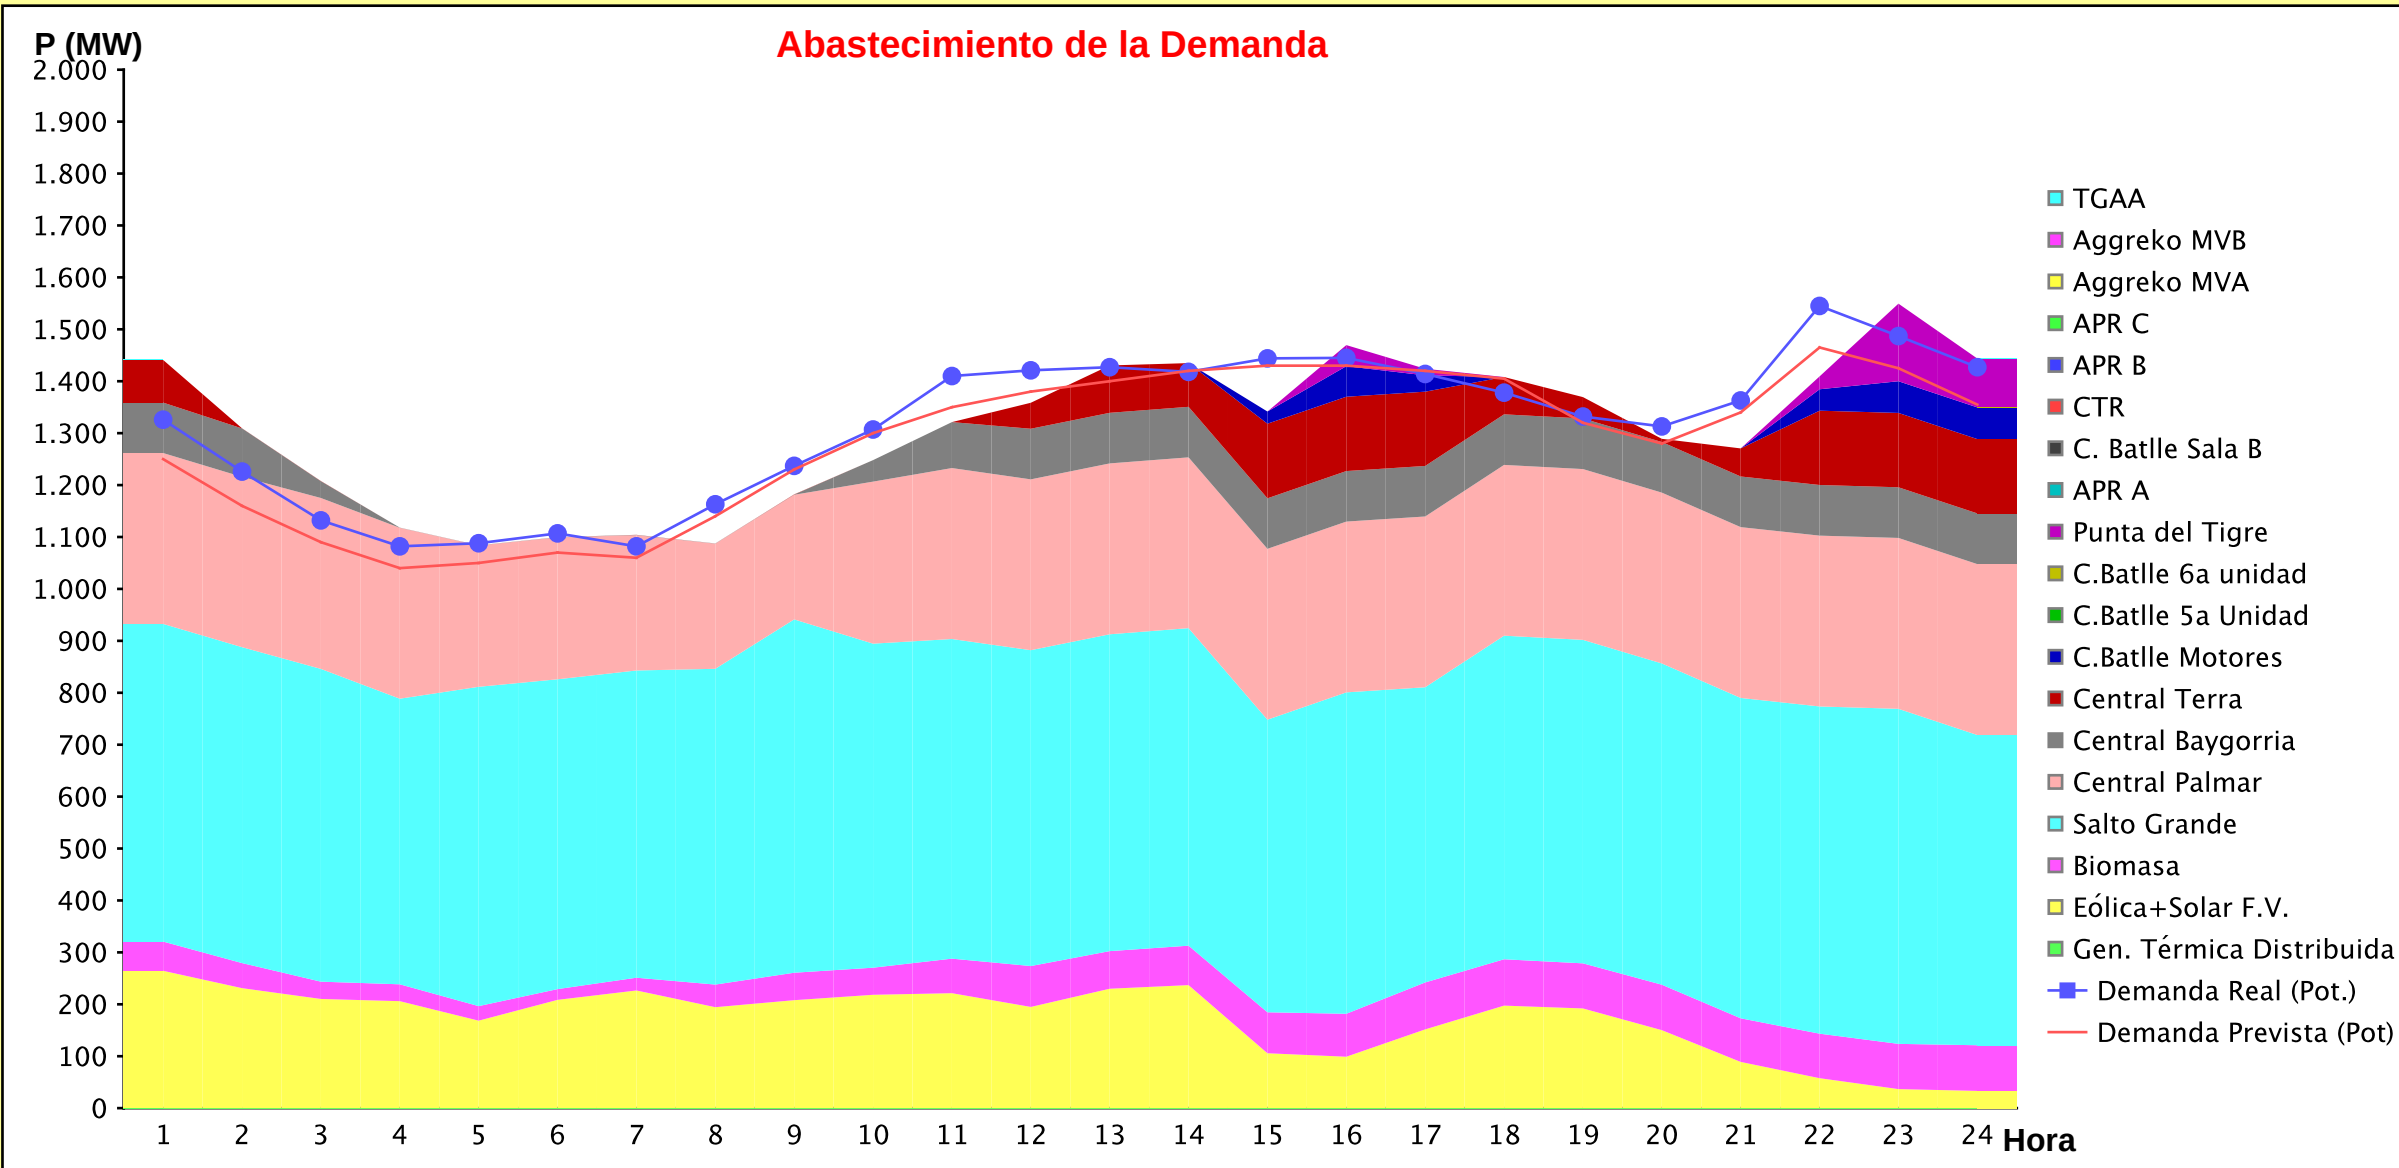

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.173
Hidráulica	3.173
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.173



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.323
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.810
Diferencia (MWh)	513
Ejecutada - Programada	1,66 %

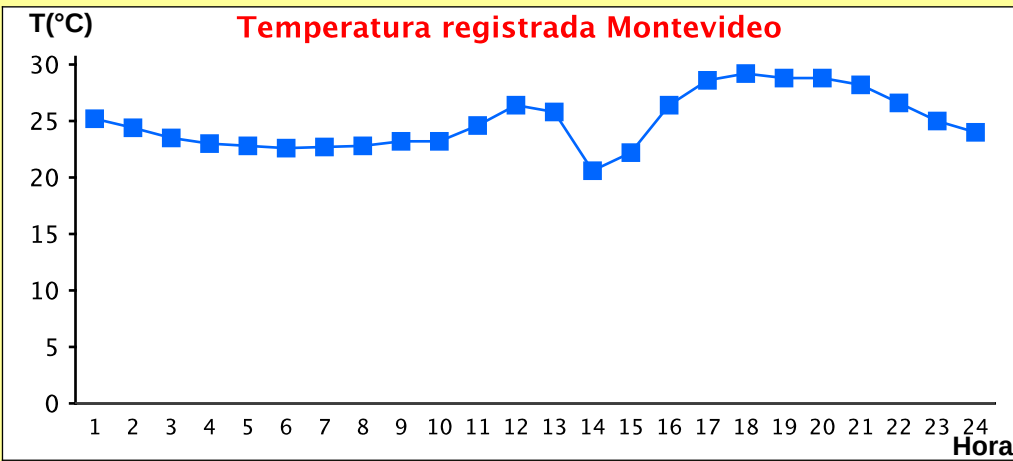


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1460,73 Hora 11:43
Potencia mínima:	1067,6 Hora 04:33
Pico noche:	1549,37 Hora 21:54

Generación Media (MW)	
Eólica	172,6
Biomasa	66,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

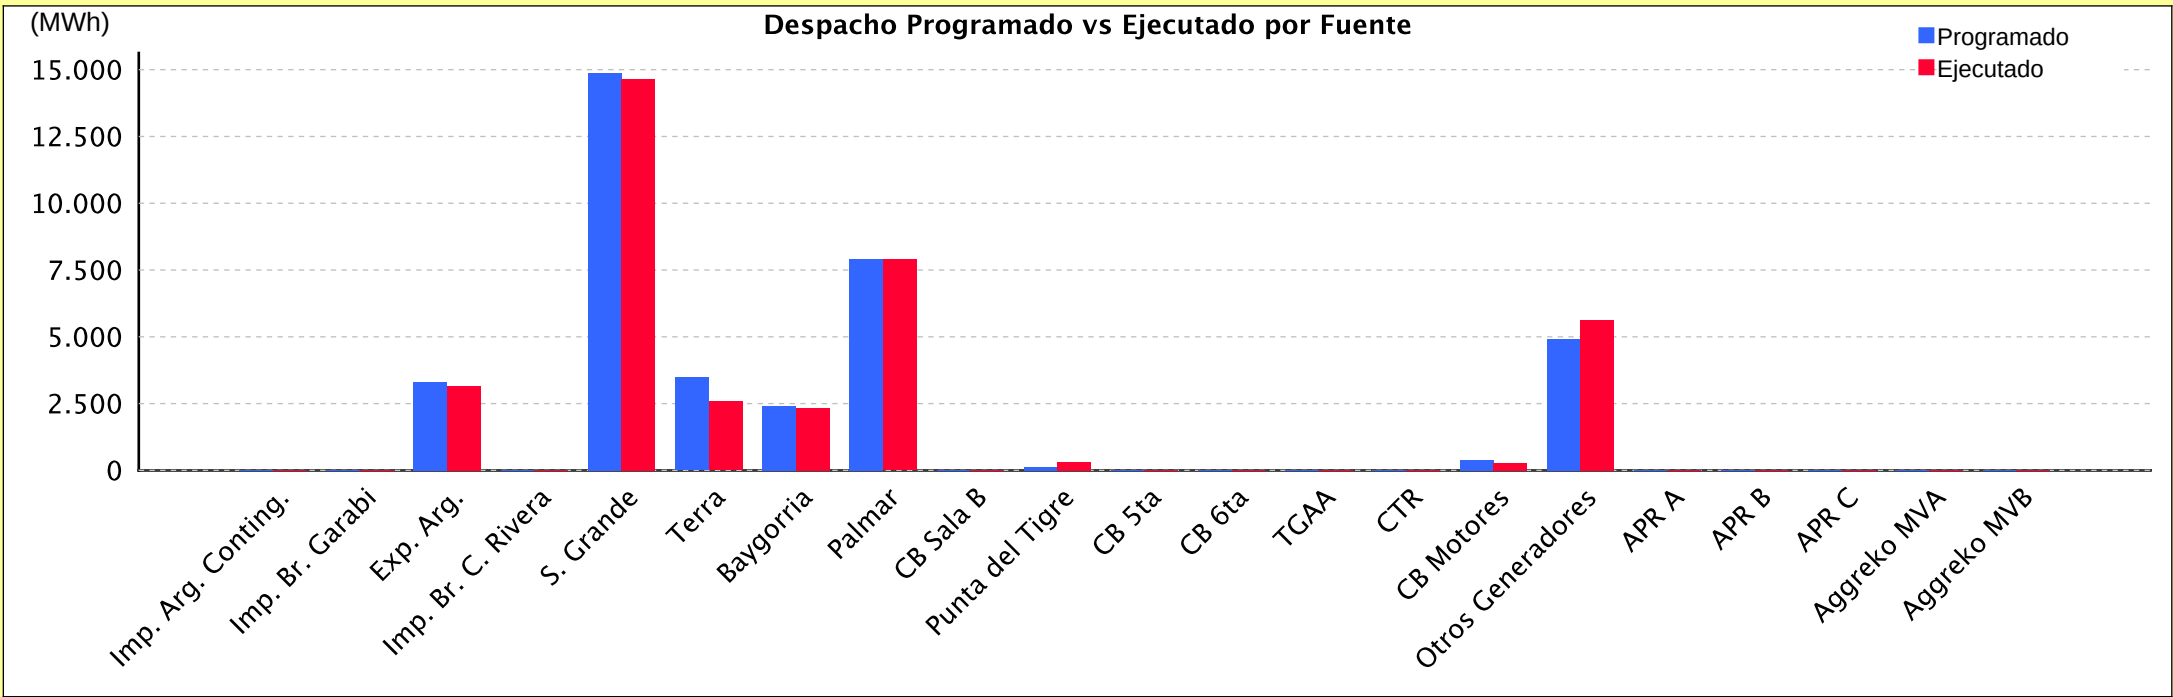
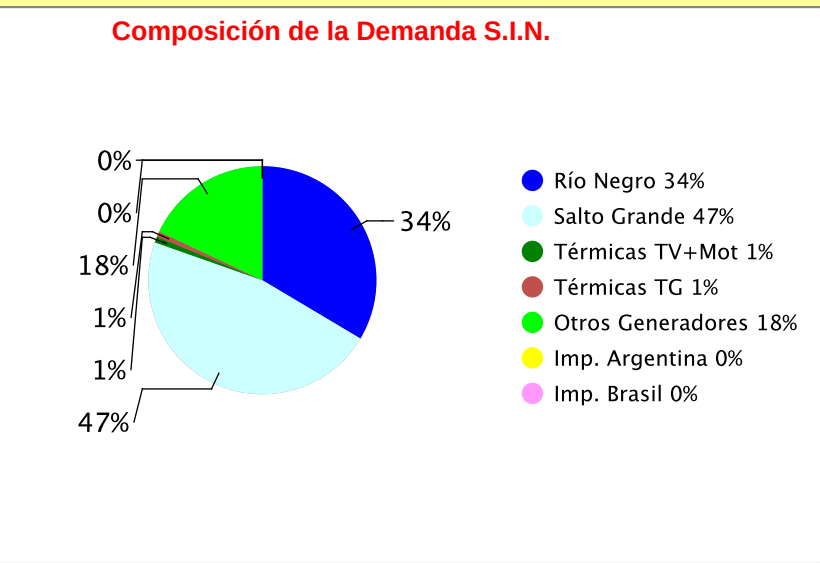


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

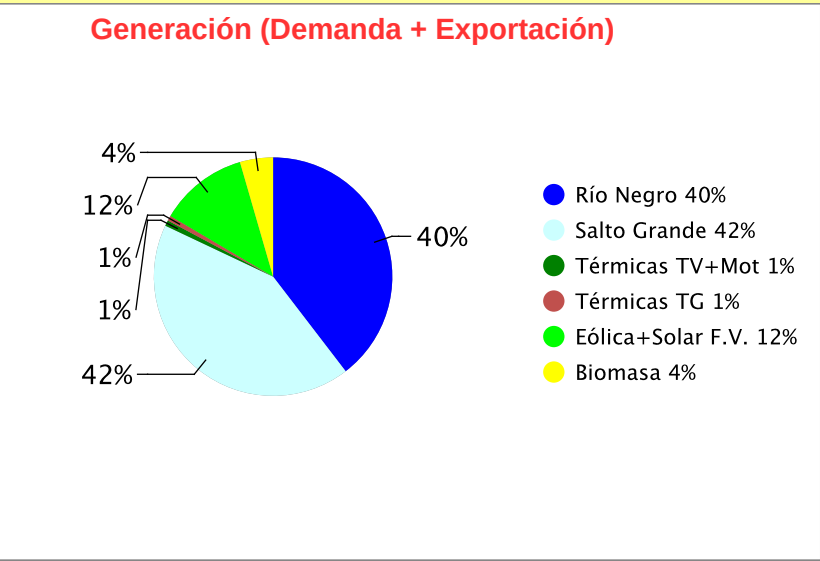



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

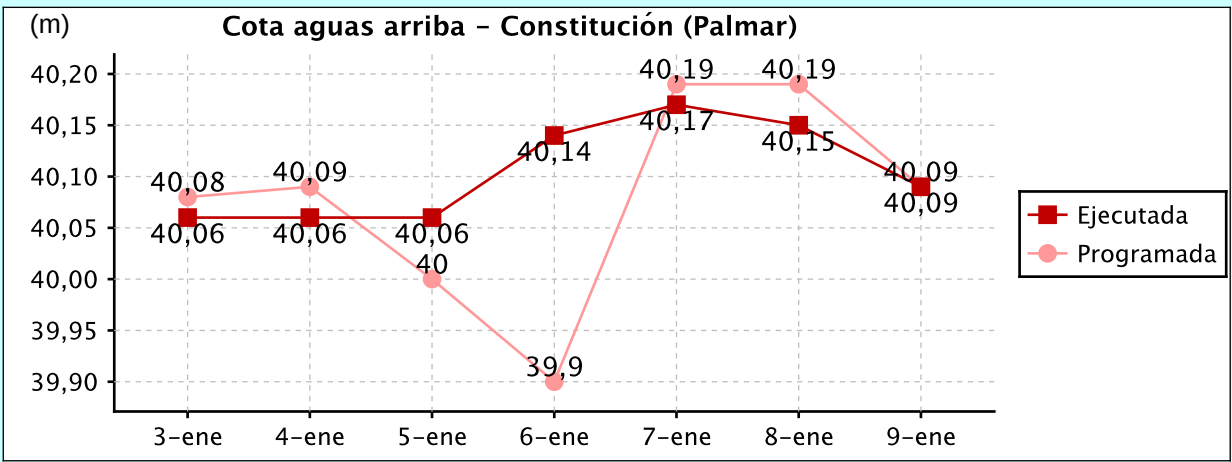
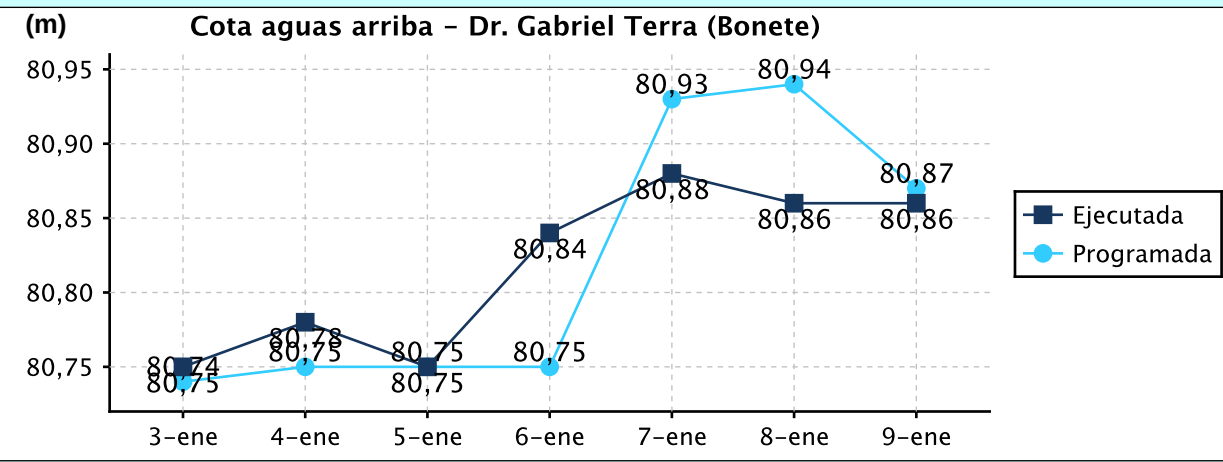


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,87	80,86
Baygorria	54,08	54,06
Palmar	40,09	40,09
SGU	33,99	34,07

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

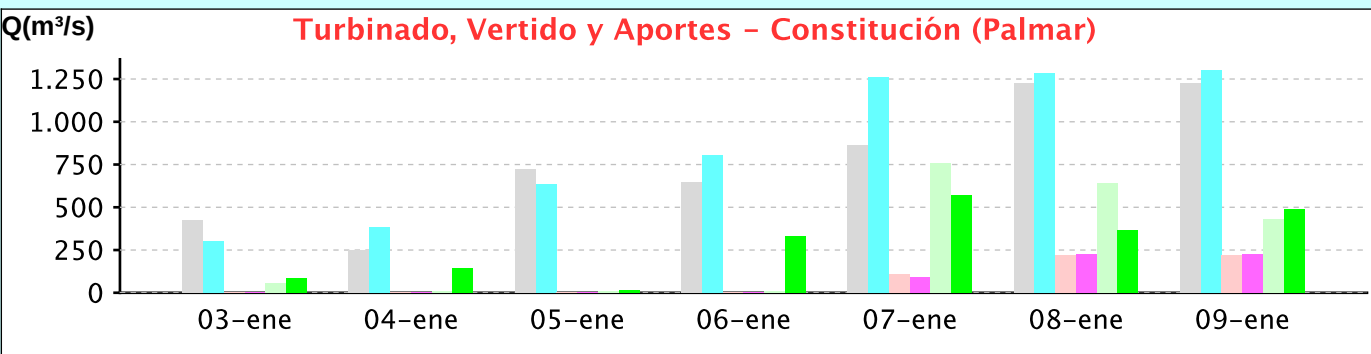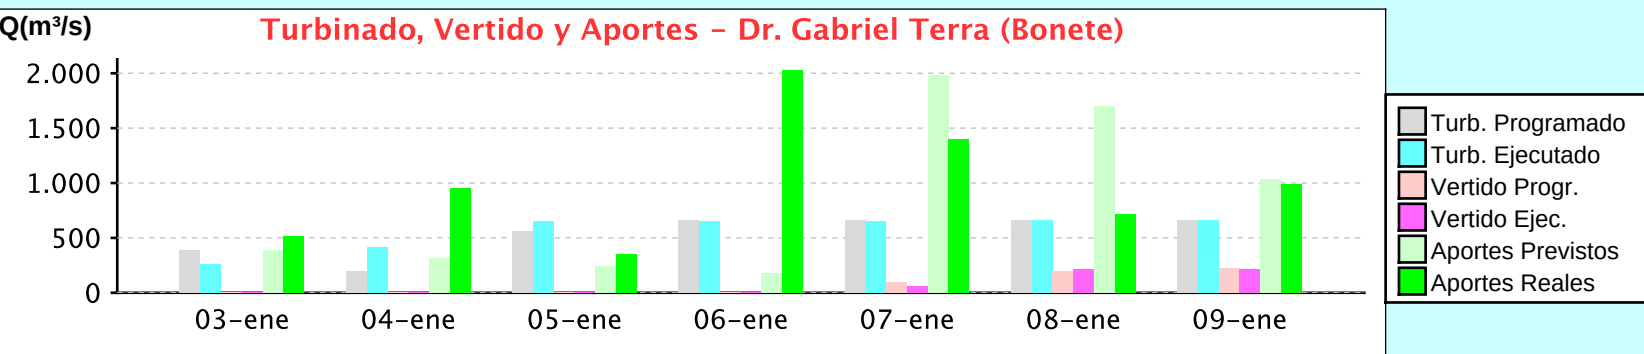

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

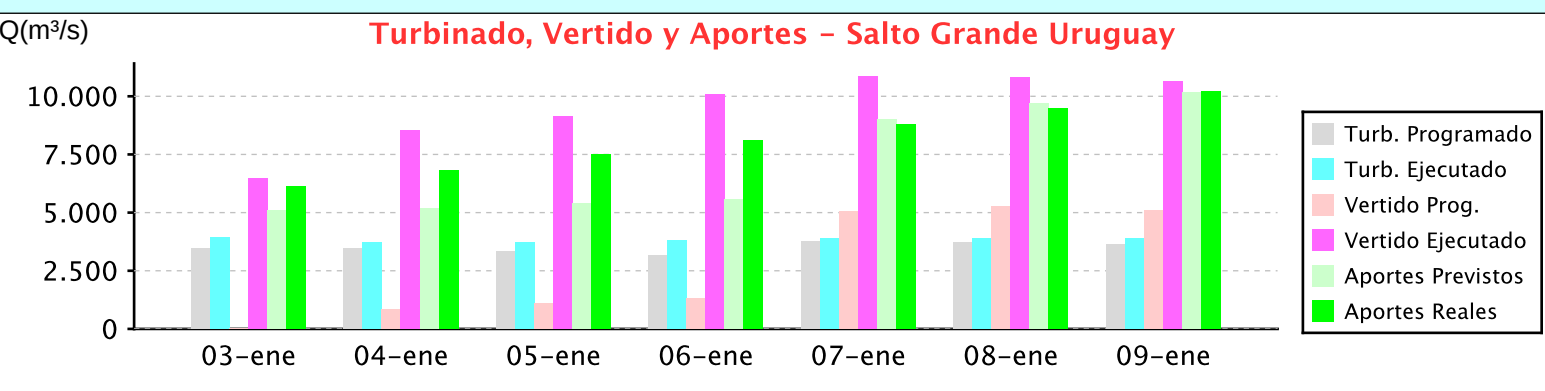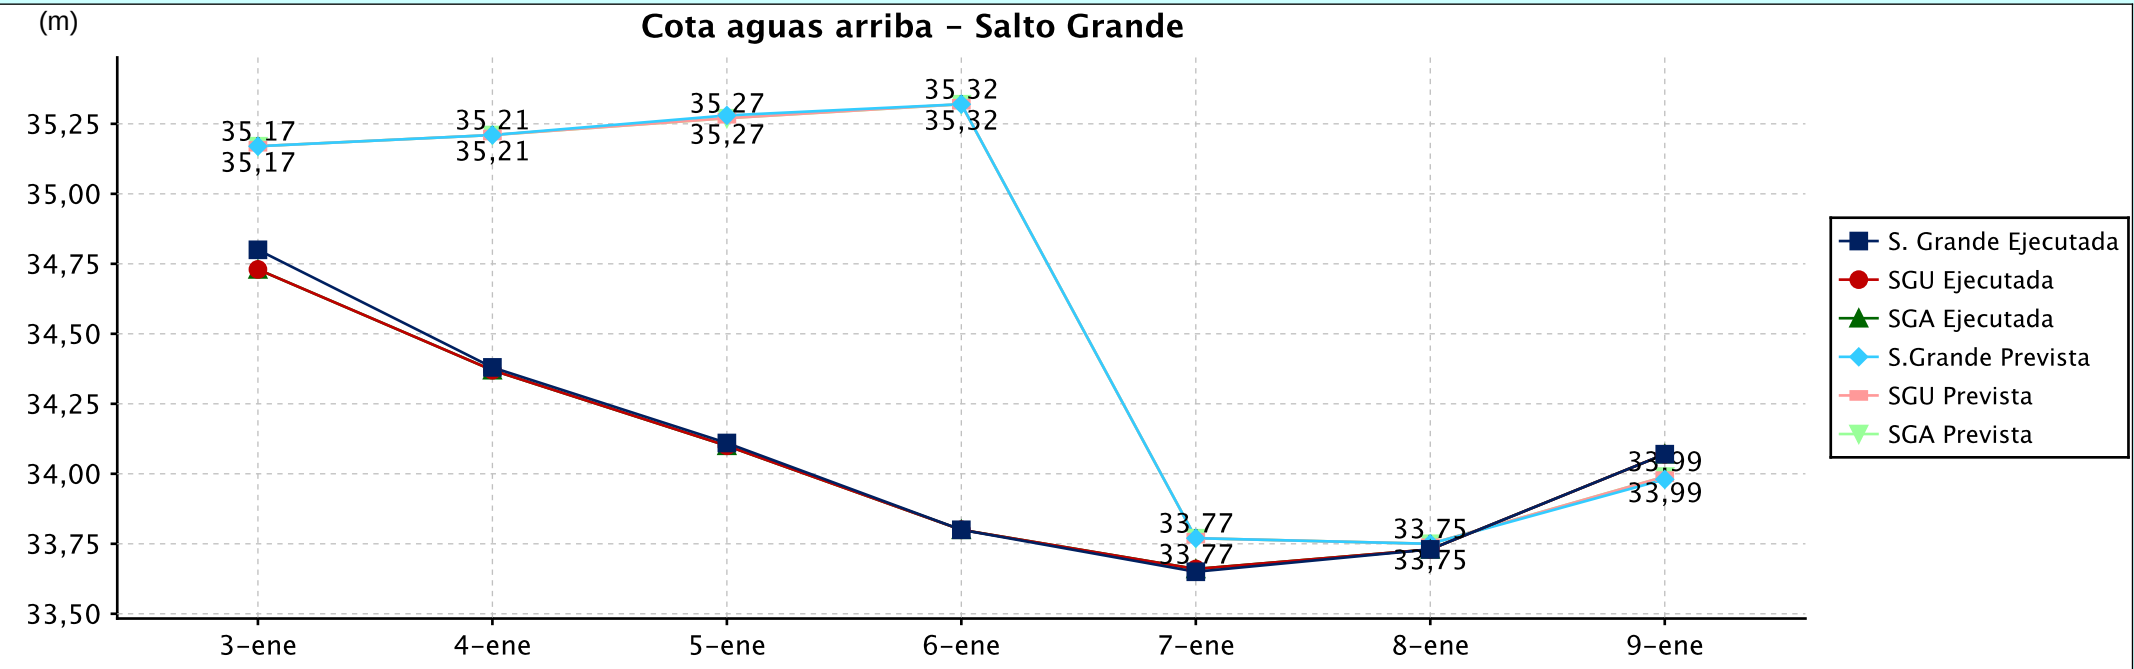

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,07
Cota Vista Arg	34,07
Cota real	34,07
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	660	656
Baygorria	859	879
Palmar	1.226	1.300
SGU	3.617	3.871

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.032	990
Baygorria	37	44
Palmar	432	489
SGU	10.175	10.218

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	216
Baygorria	100	0
Palmar	220	225
SGU	5.113	10.621

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 92 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

20/01/2015 14:03
