




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 19 de enero de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-11
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-8
Central La Tablada	-77
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.406
C. Baygorria	2.254
C. Palmar	7.856
C. Salto Grande	18.790
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.407
TOTAL Generación	37.616

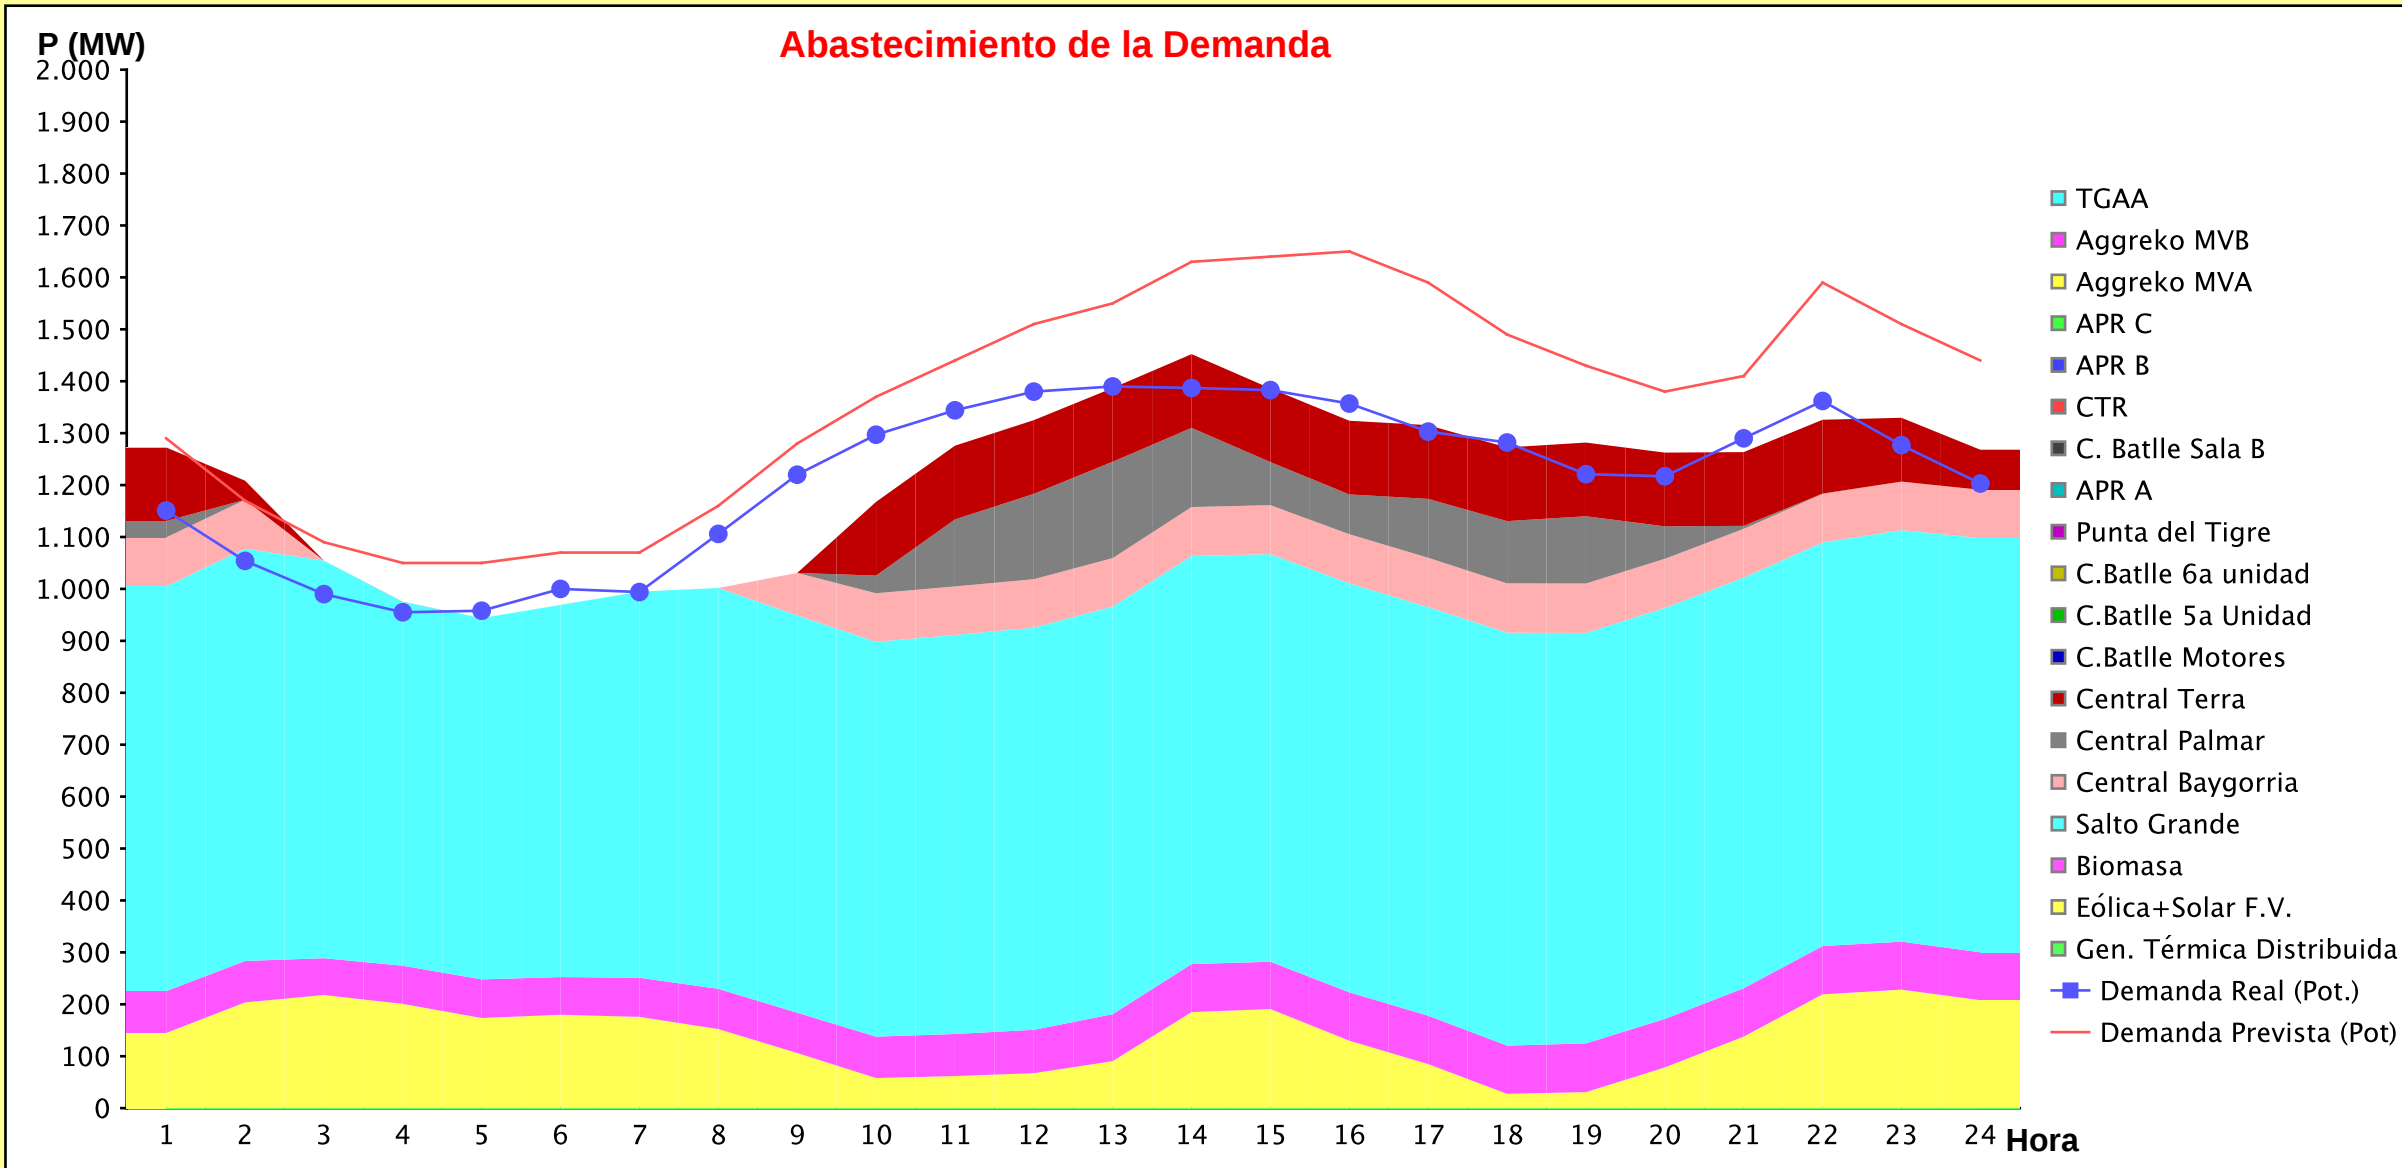

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	8.612
Hidráulica	8.612
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	8.612



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.004
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	32.860
Diferencia (MWh)	-3.856
Ejecutada - Programada	-11,73 %

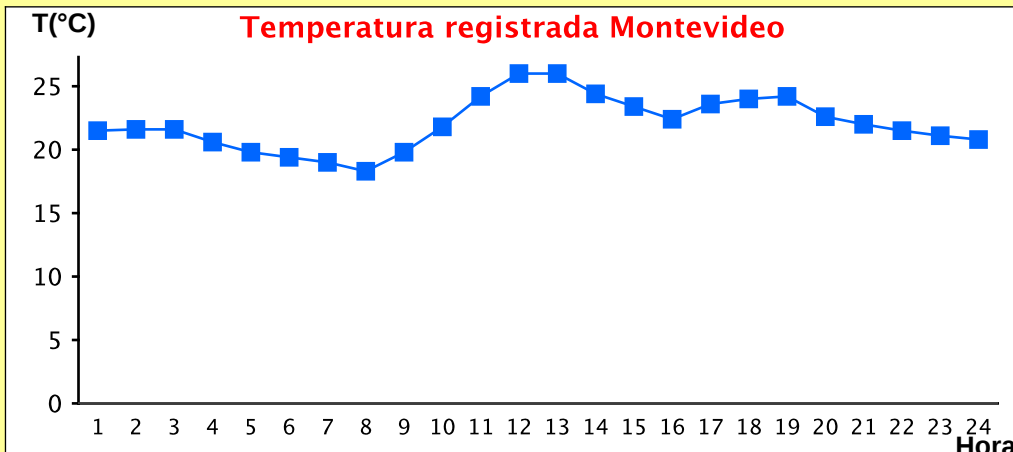


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1431,17 Hora 13:19
Potencia mínima:	943,9 Hora 03:59
Pico noche:	1361,77 Hora 21:58

Generación Media (MW)	
Eólica	140,5
Biomasa	85,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

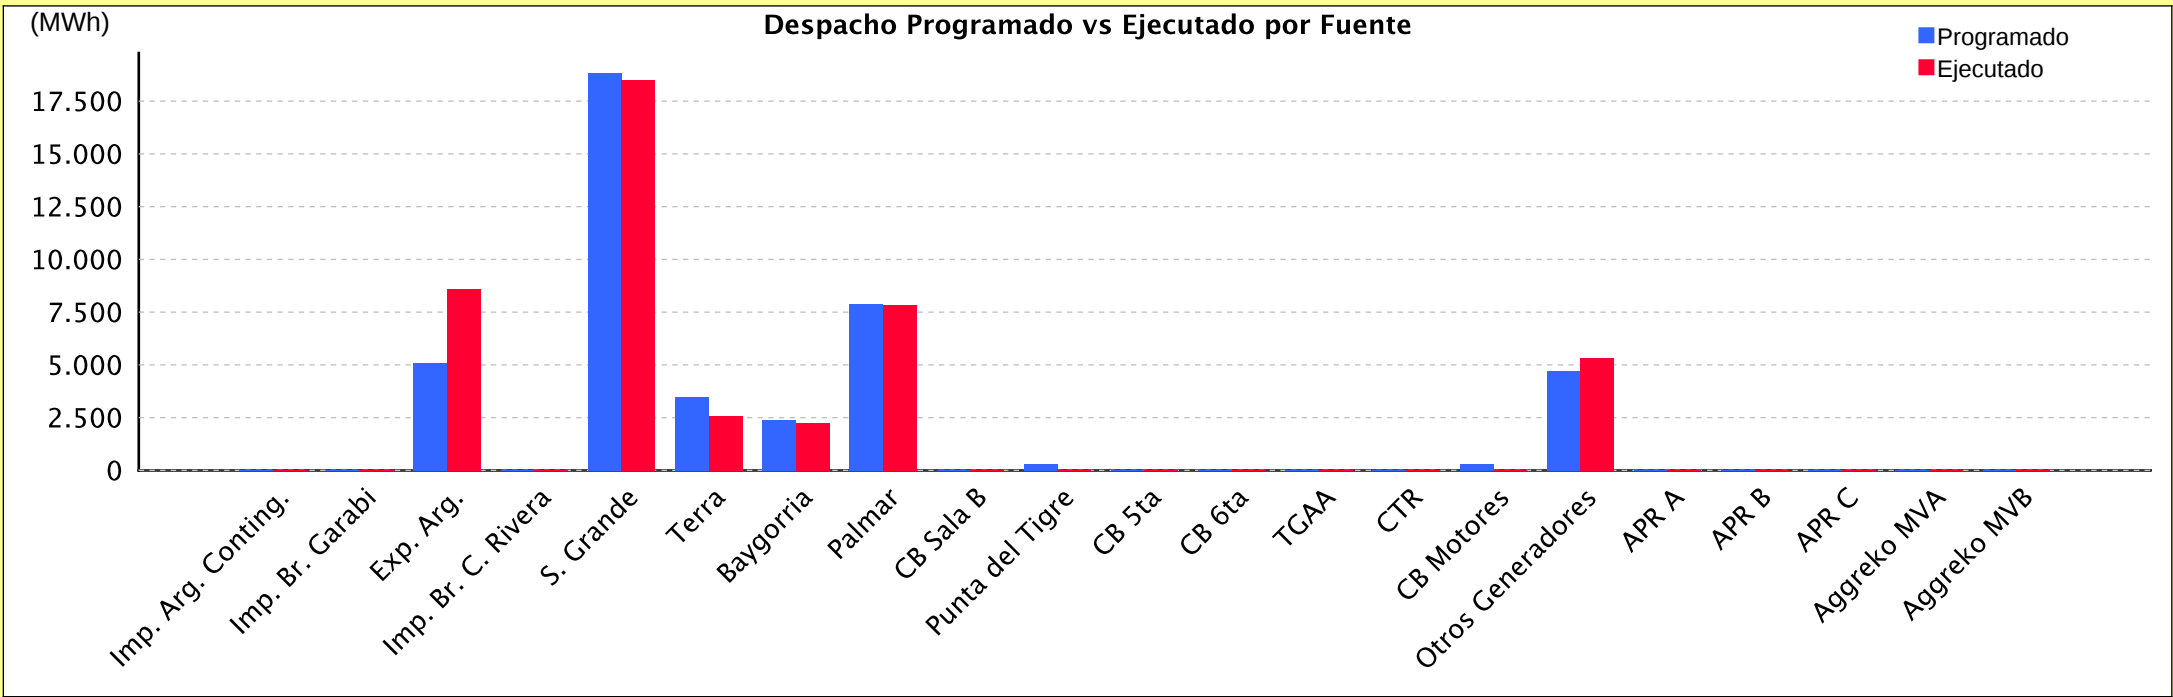
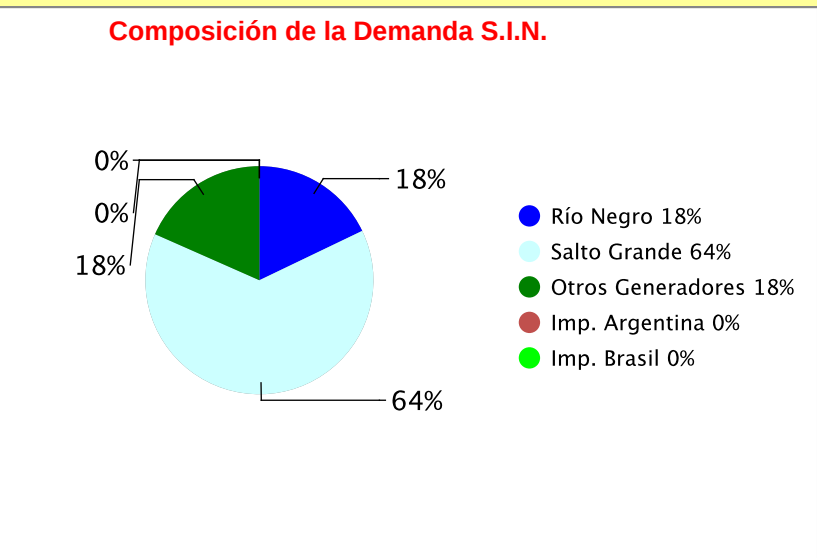


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

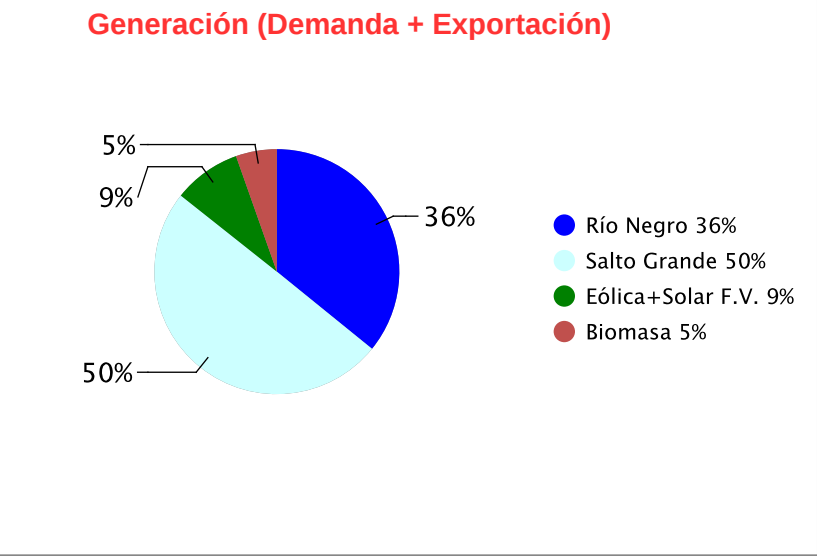



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

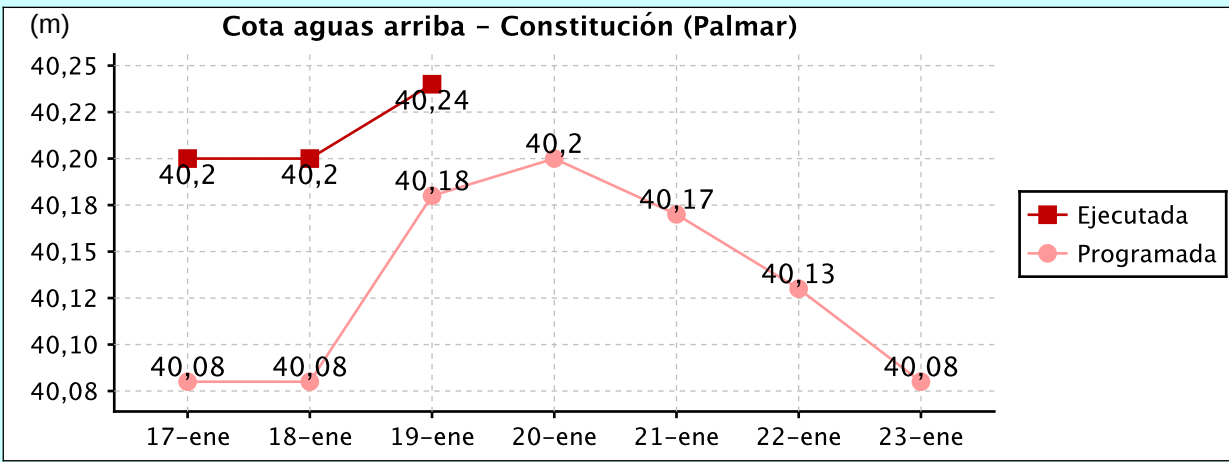
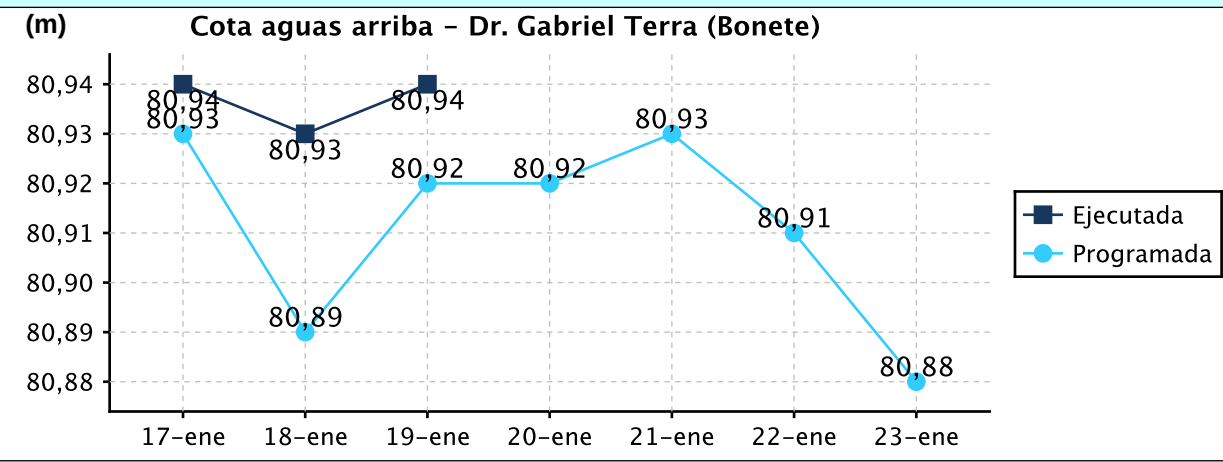


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,92	80,94
Baygorria	54,26	54,12
Palmar	40,18	40,24
SGU	35,02	35,07

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

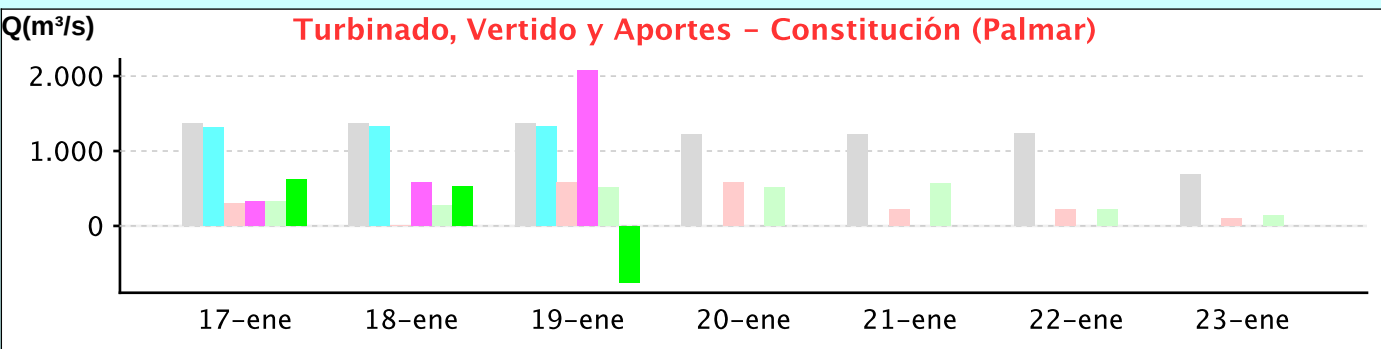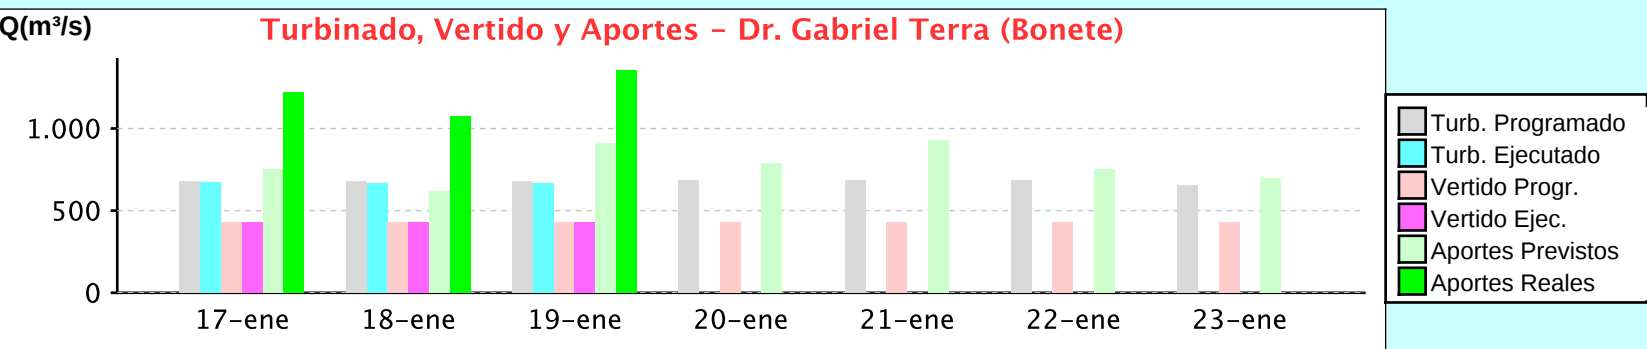

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

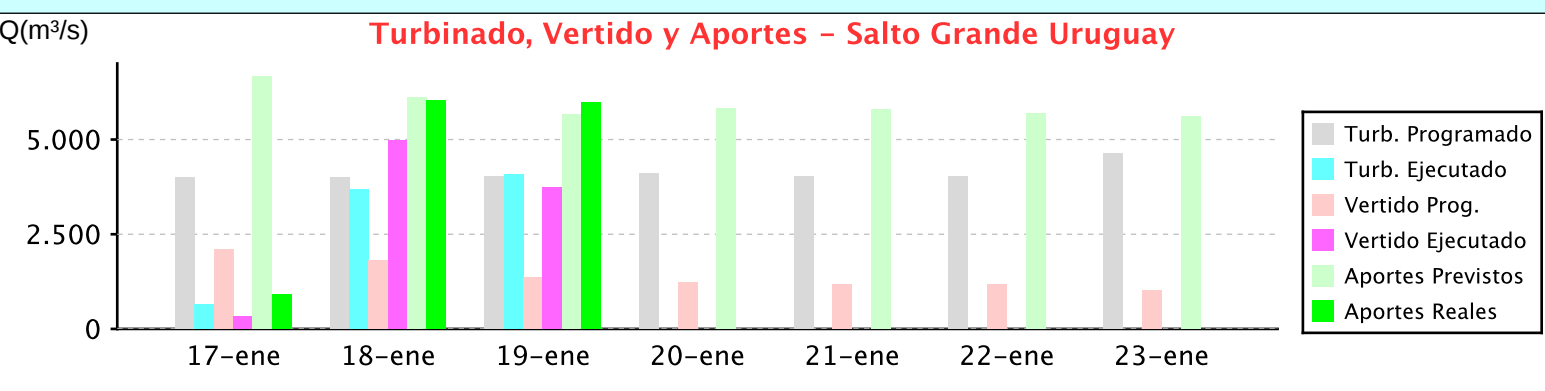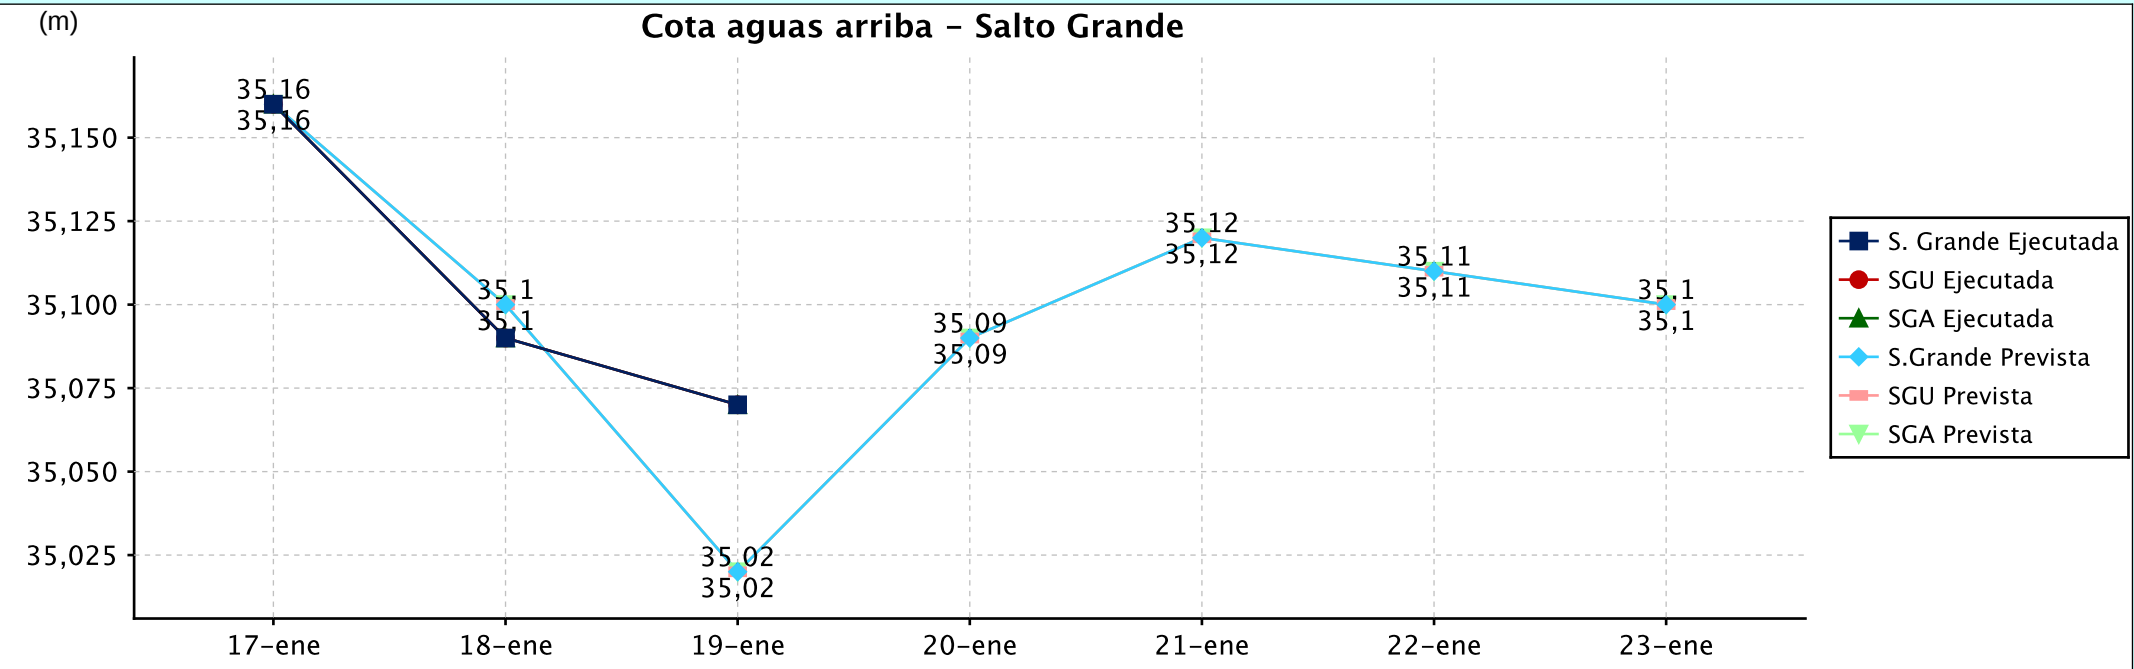

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,07
Cota Vista Arg	35,07
Cota real	35,07
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
0	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	679	668
Baygorria	902	856
Palmar	1.363	1.331
SGU	4.030	4.077

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	911	1.354
Baygorria	282	126
Palmar	520	-751
SGU	5.650	5.974

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	430	428
Baygorria	500	480
Palmar	580	2.082
SGU	1.351	3.736

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 359 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

21/01/2015 18:34
