




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


miércoles 21 de enero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-1
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	2
Central La Tablada	-84
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.403
C. Baygorria	2.377
C. Palmar	7.193
C. Salto Grande	15.746
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.488
TOTAL Generación	33.112

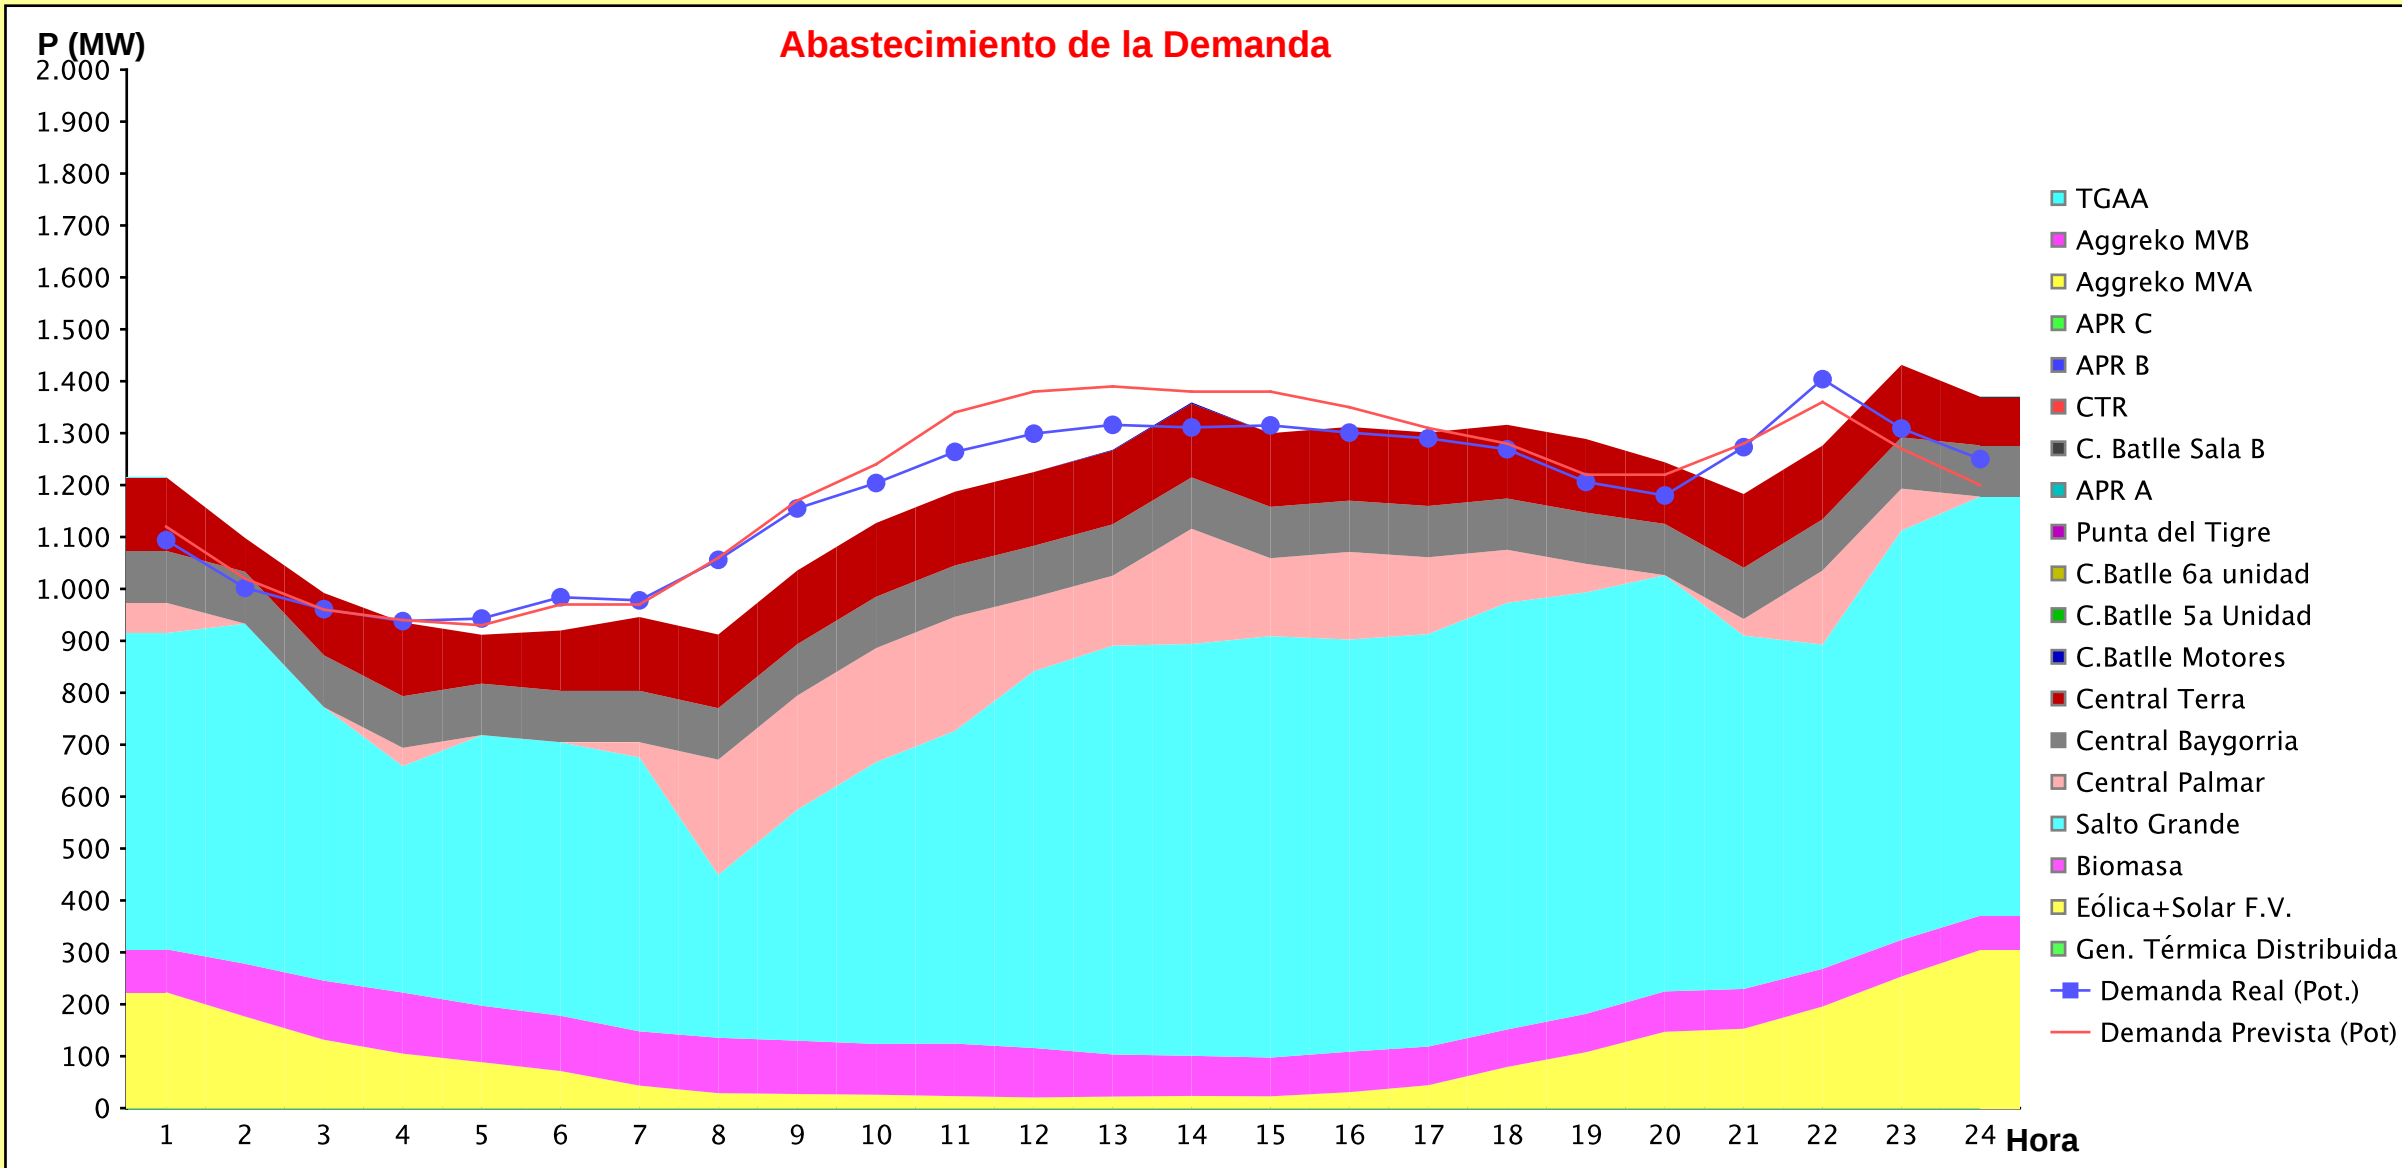



Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	5.052
Hidráulica	5.052
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	5.052

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.060
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.740
Diferencia (MWh)	-680
Ejecutada - Programada	-2,36 %

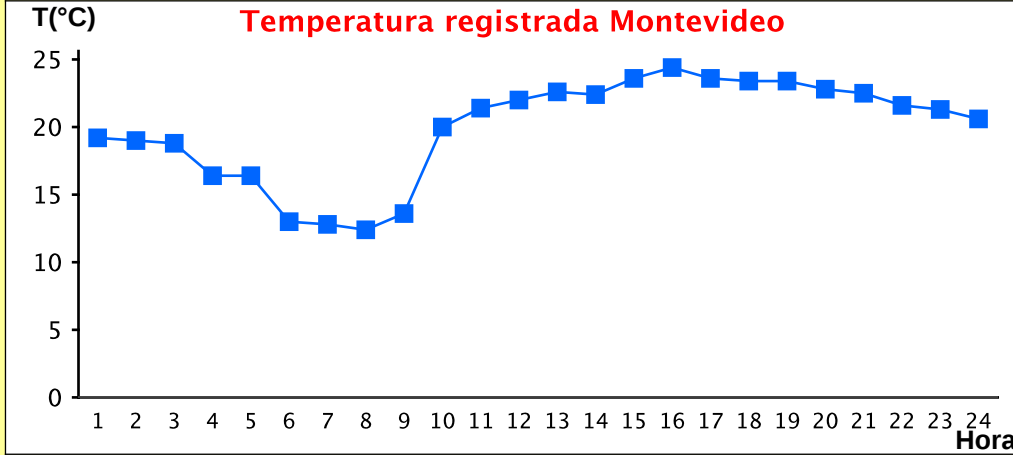


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1332,28 Hora 13:41
Potencia mínima:	915,31 Hora 04:06
Pico noche:	1426,89 Hora 21:44

Generación Media (MW)	
Eólica	98,8
Biomasa	89,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

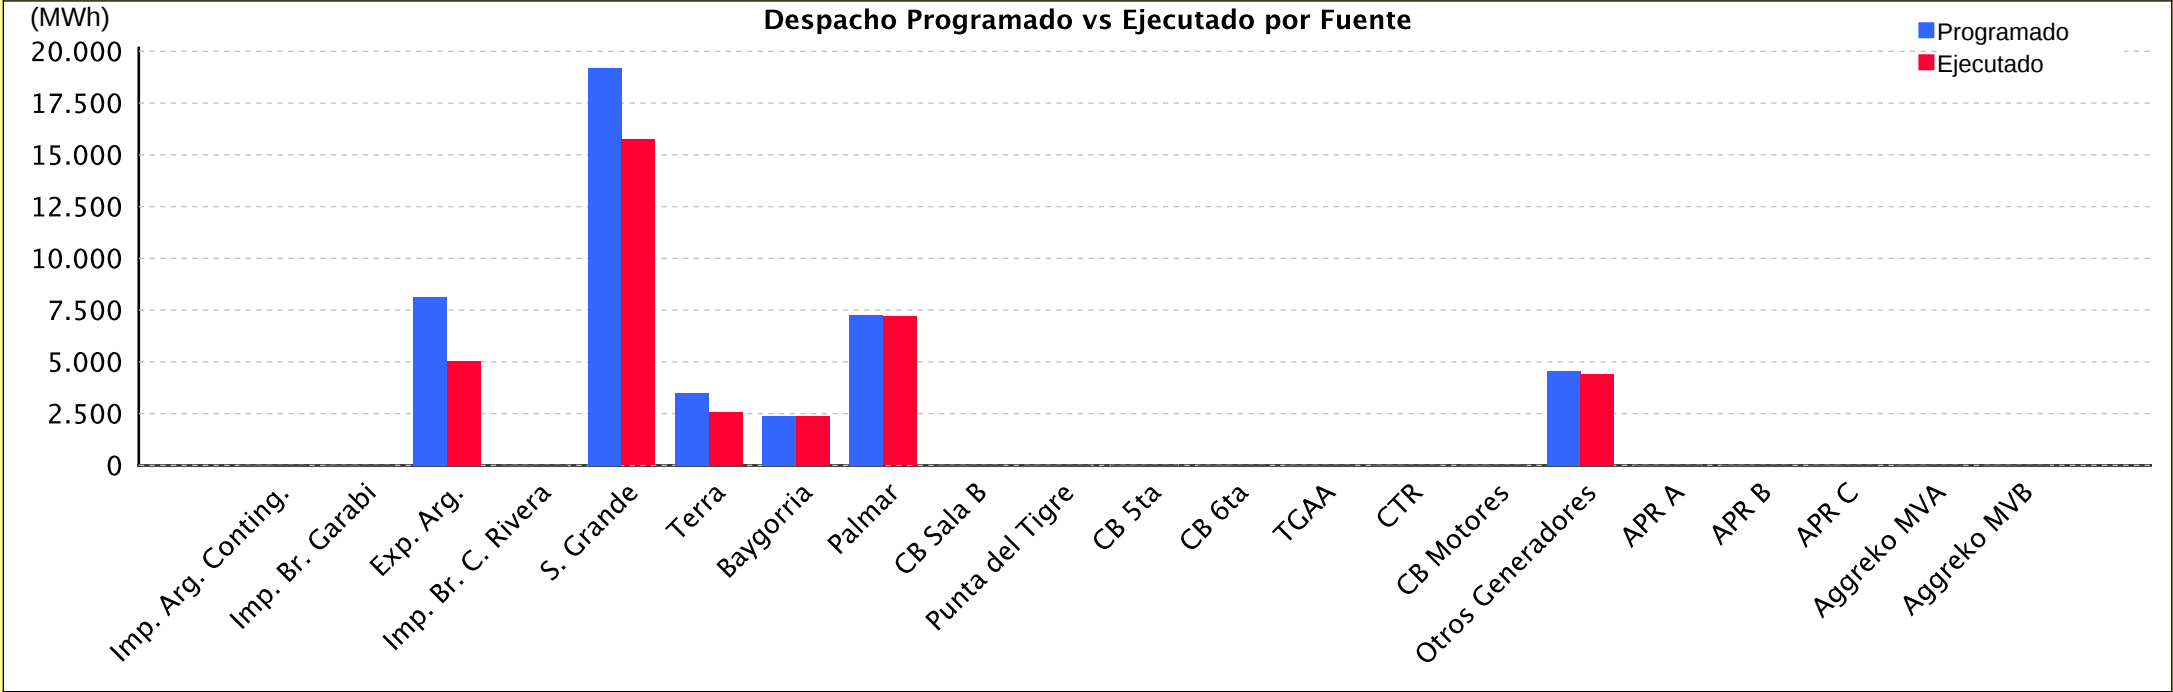
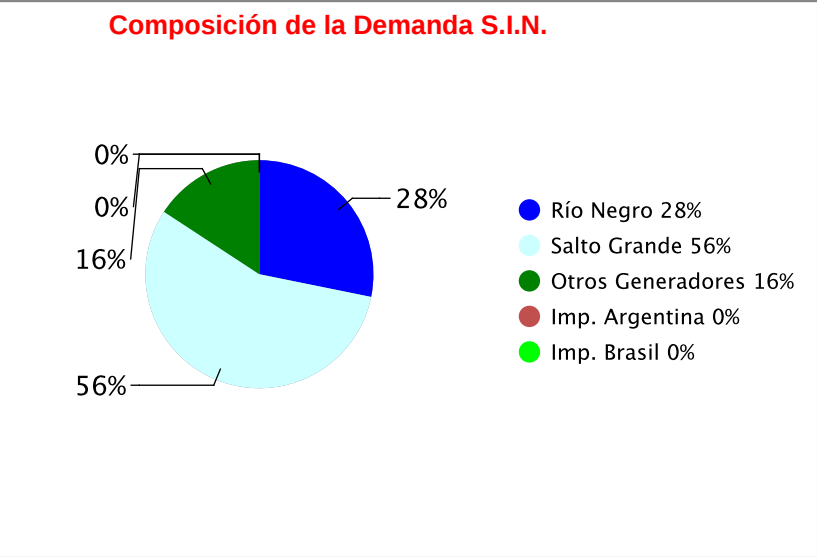


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

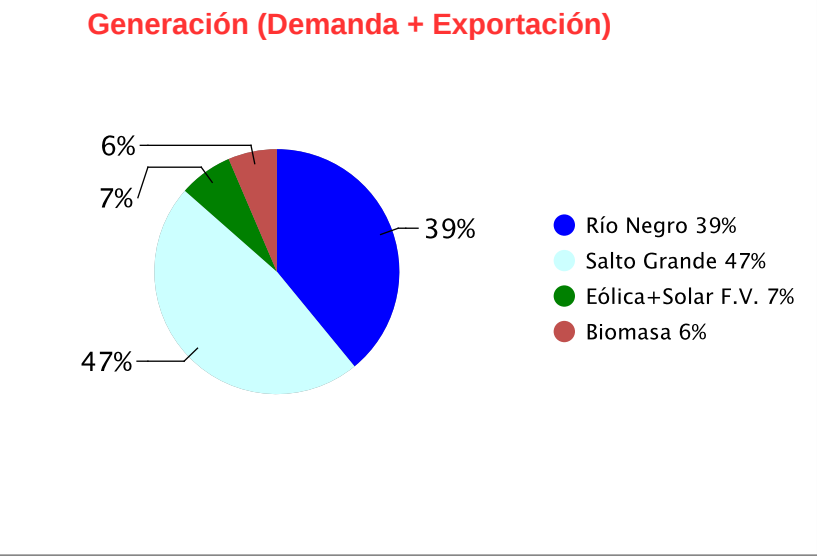



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

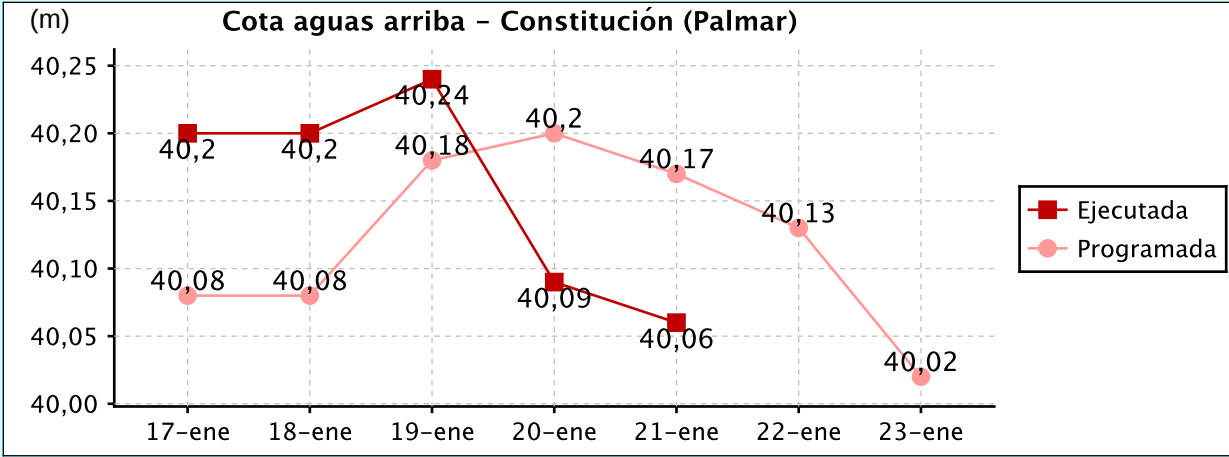
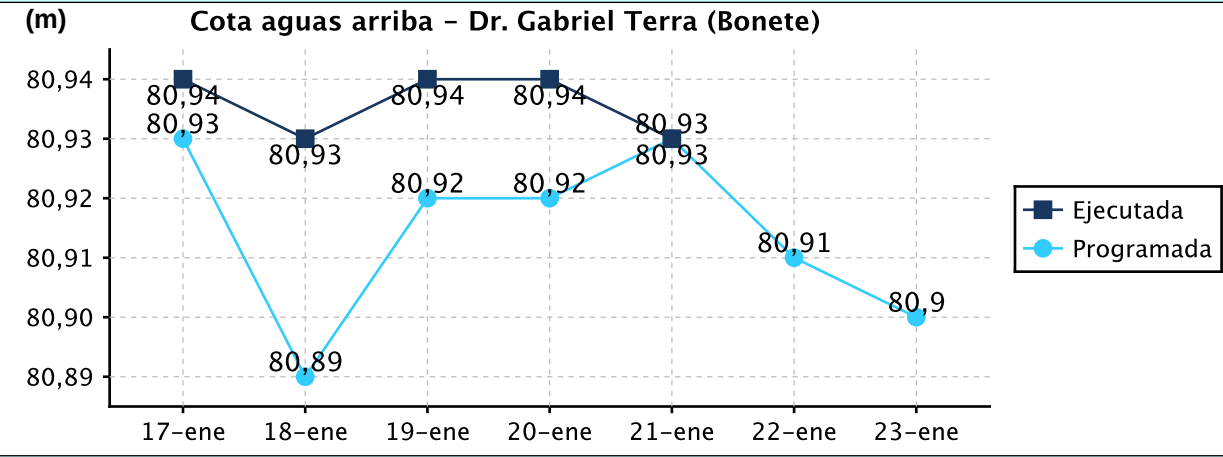


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,93	80,93
Baygorria	54,23	54,2
Palmar	40,17	40,06
SGU	35,12	35,13

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

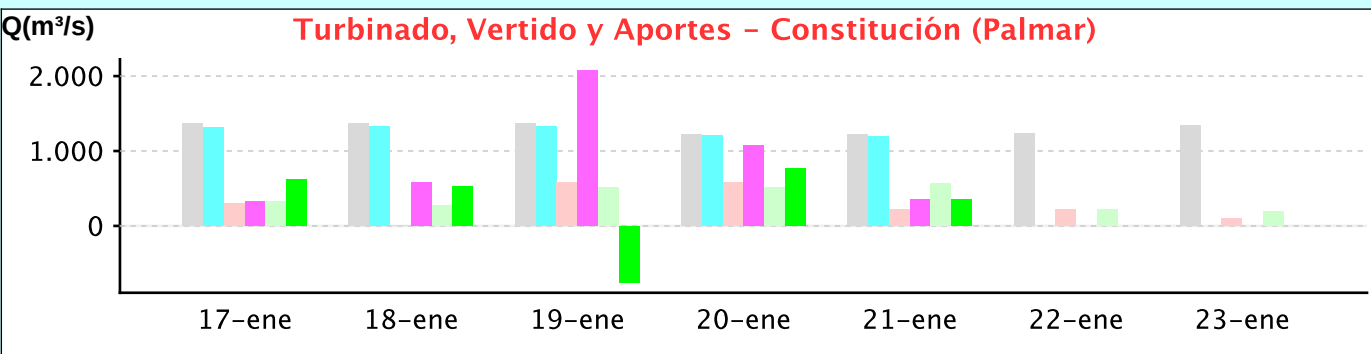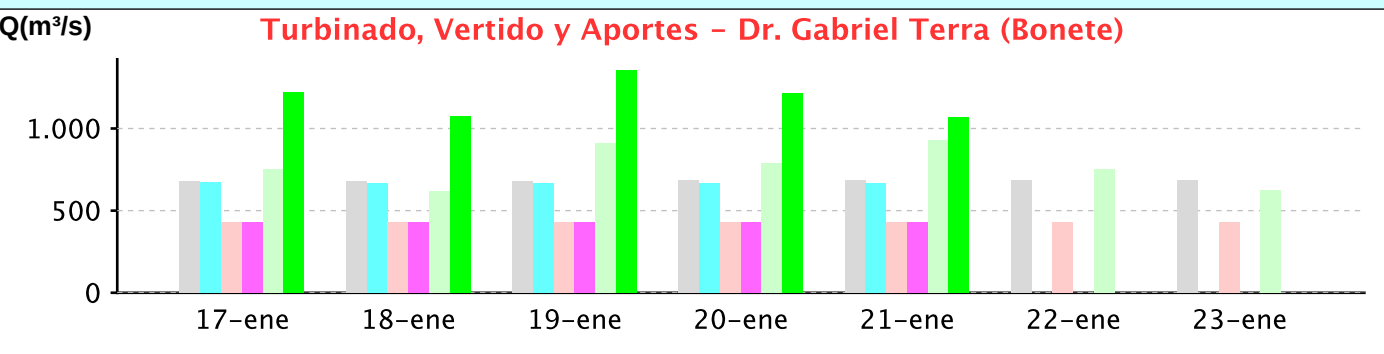

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

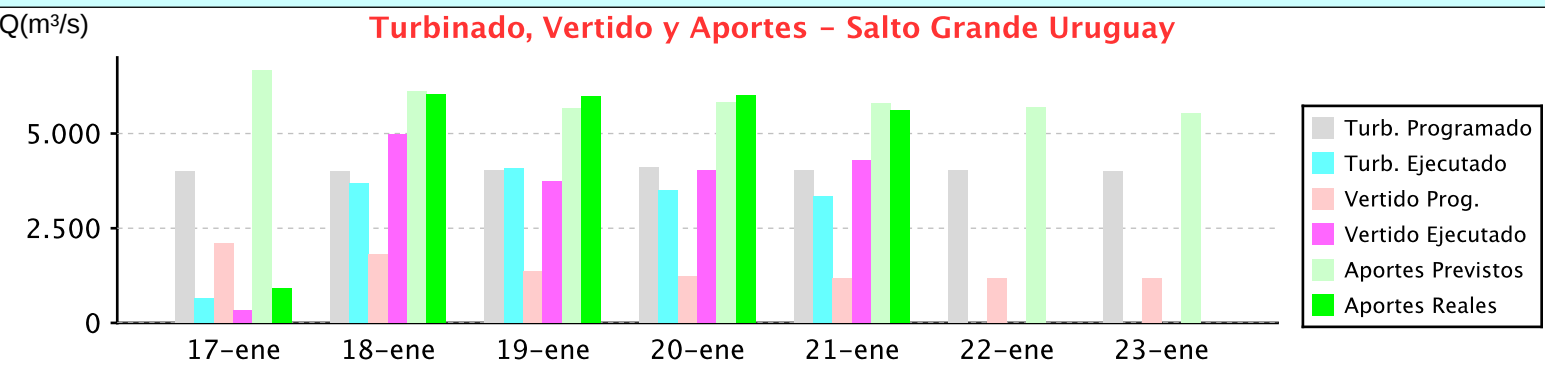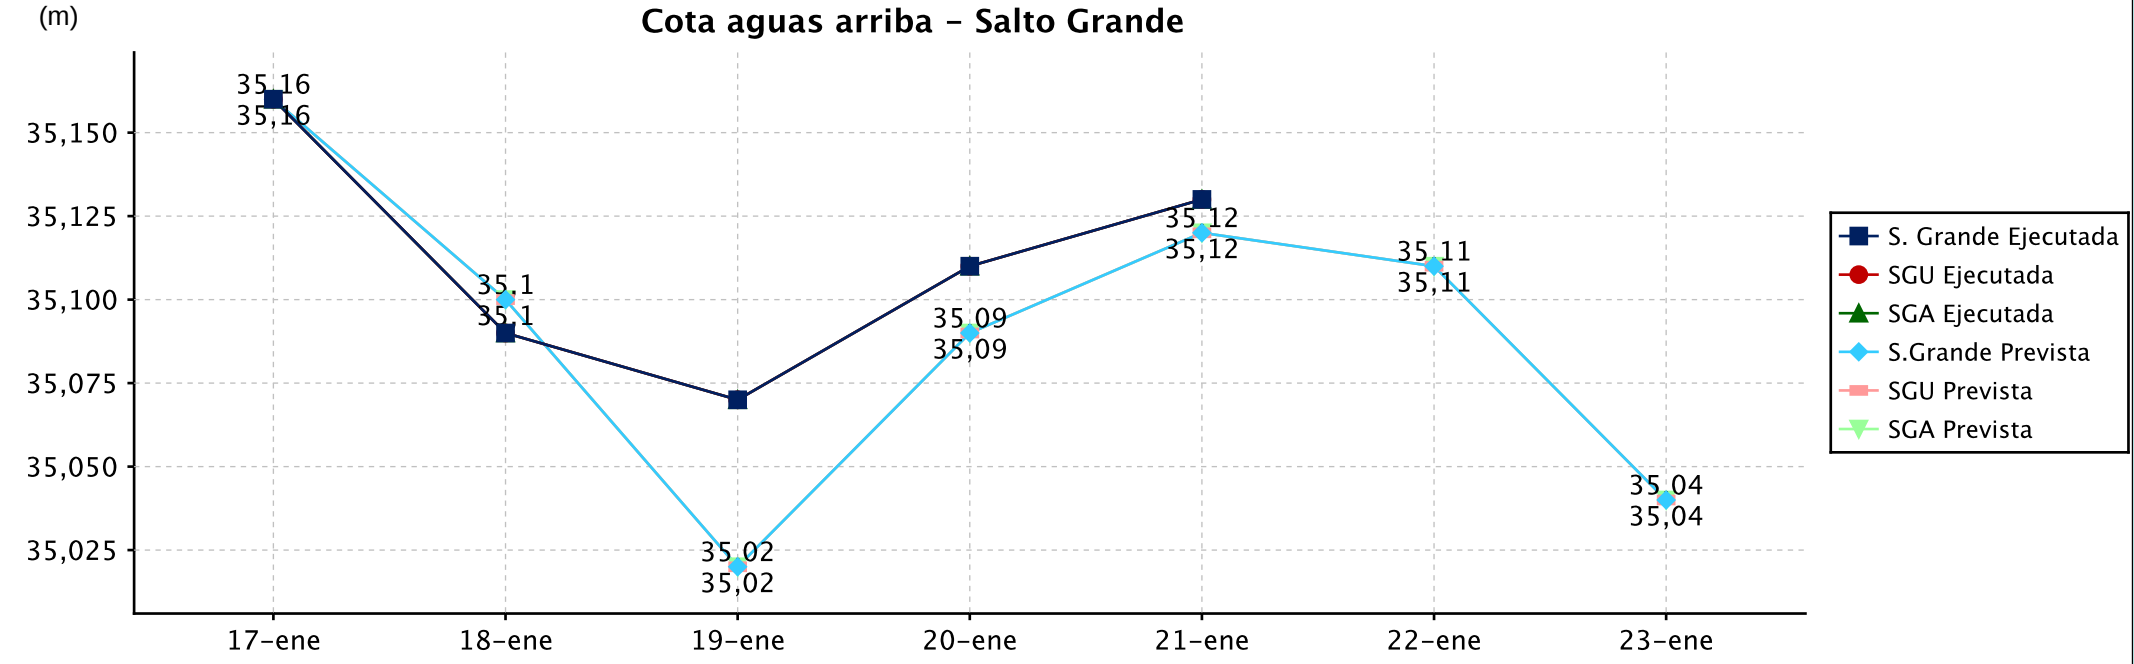

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,13
Cota Vista Arg	35,13
Cota real	35,13

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	686	664
Baygorria	906	891
Palmar	1.225	1.193
SGU	4.015	3.340

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	928	1.071
Baygorria	48	37
Palmar	574	352
SGU	5.800	5.621

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	430	427
Baygorria	300	246
Palmar	225	349
SGU	1.188	4.286

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 211 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

23/01/2015 17:15
