




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 22 de enero de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-6
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-81
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.408
C. Baygorria	2.366
C. Palmar	7.252
C. Salto Grande	17.049
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.568
TOTAL Generación	37.548

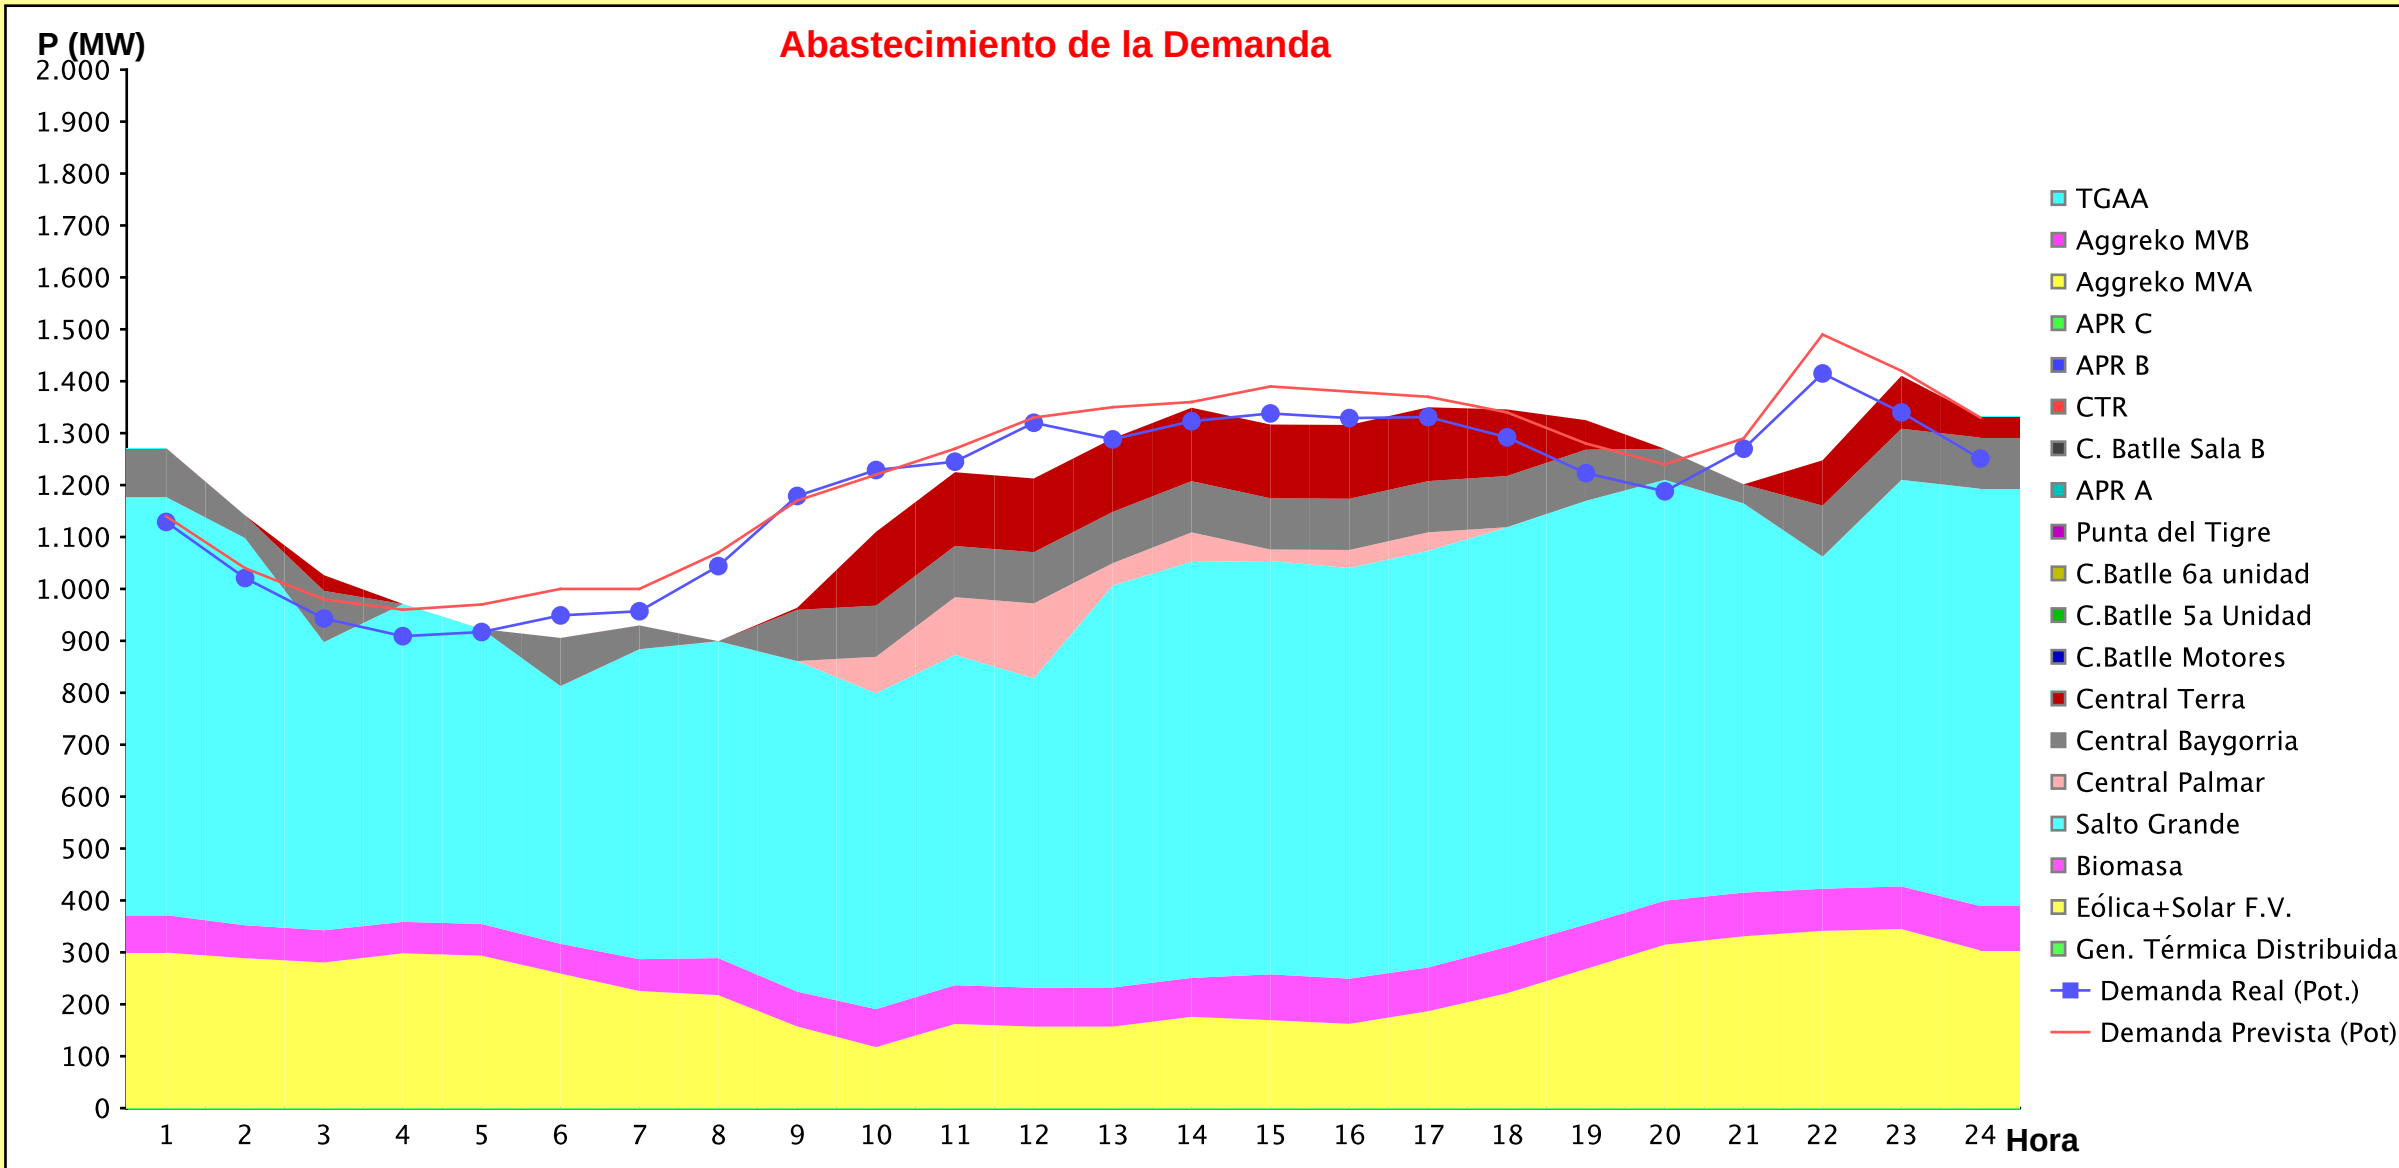

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	9.283
Hidráulica	9.283
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	9.283



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.265
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.390
Diferencia (MWh)	-1.125
Ejecutada - Programada	-3,83 %

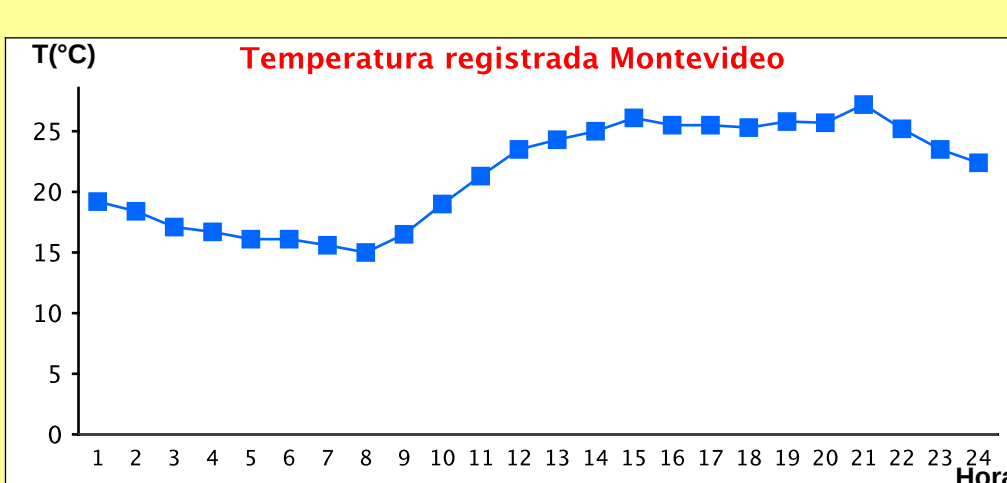


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1348,77 Hora 15:16
Potencia mínima:	908,93 Hora 03:55
Pico noche:	1434,3 Hora 21:43

Generación Media (MW)	
Eólica	239,5
Biomasa	75,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

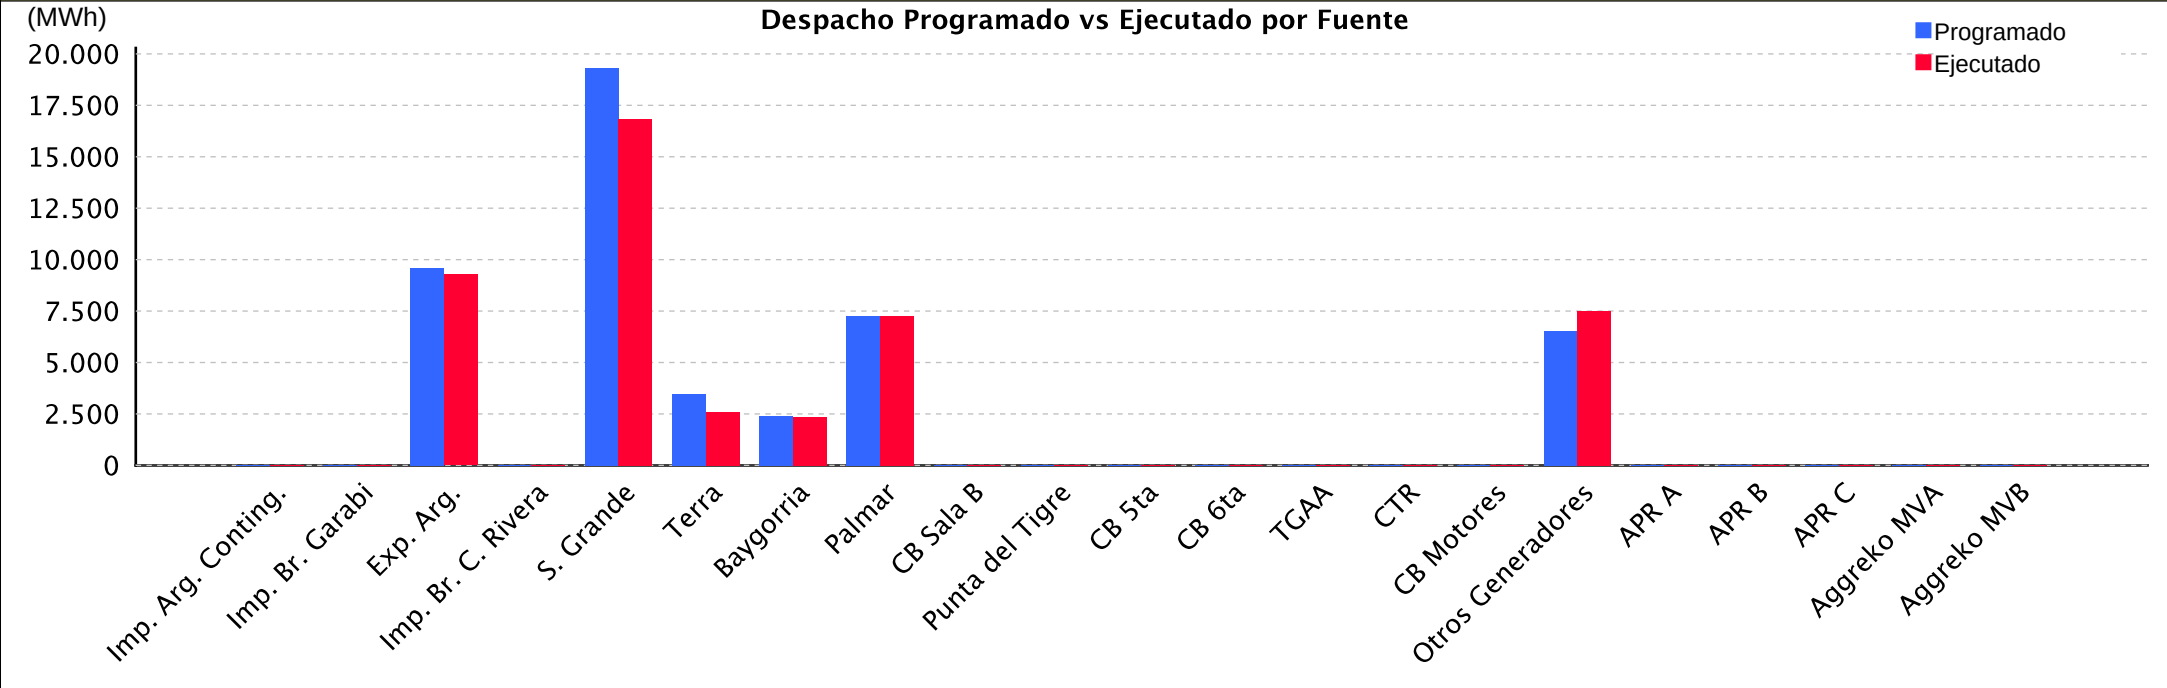
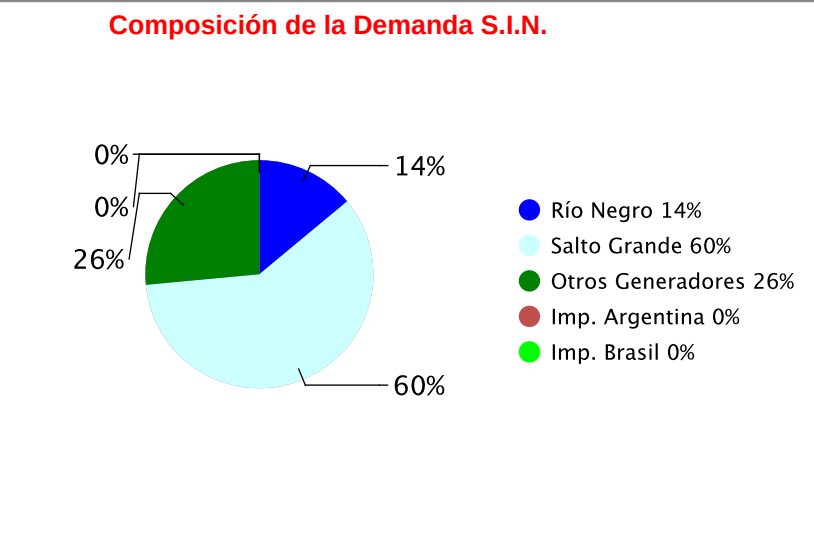


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

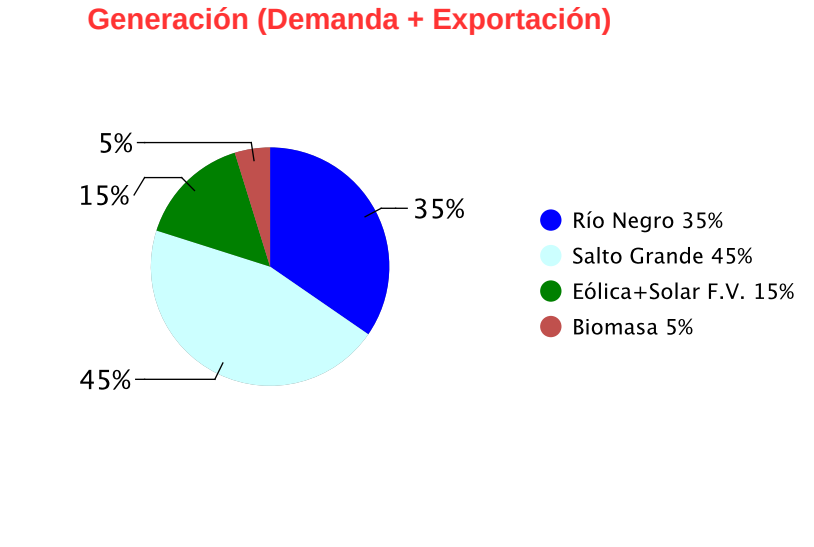



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

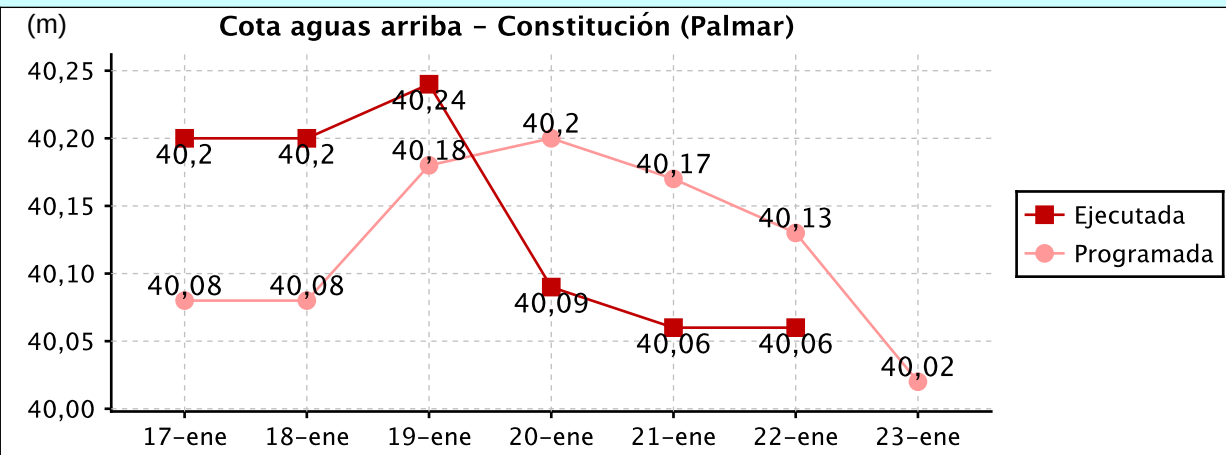
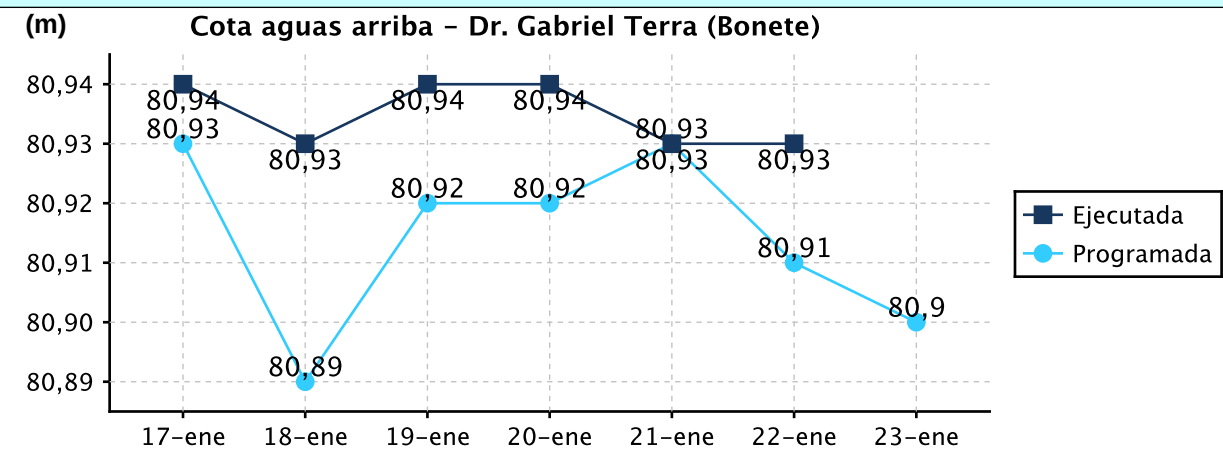


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,91	80,93
Baygorria	54,25	54,15
Palmar	40,13	40,06
SGU	35,11	35,08

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

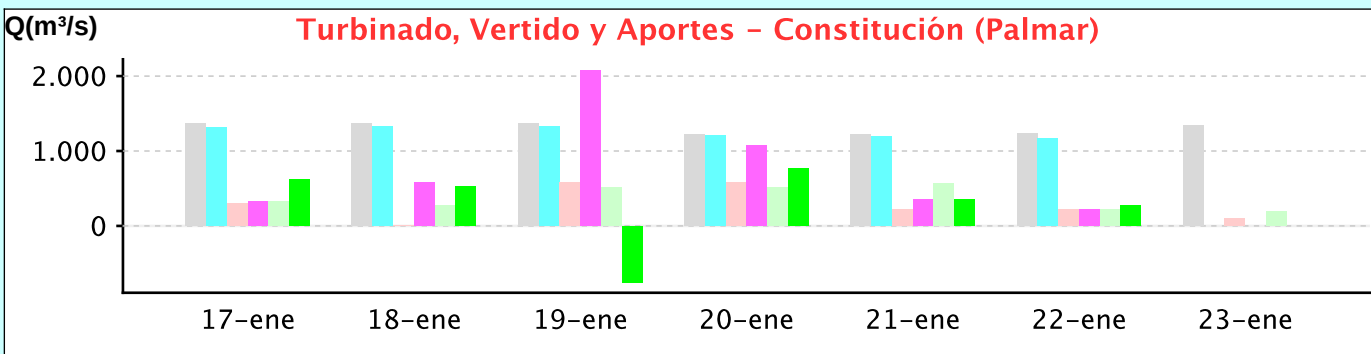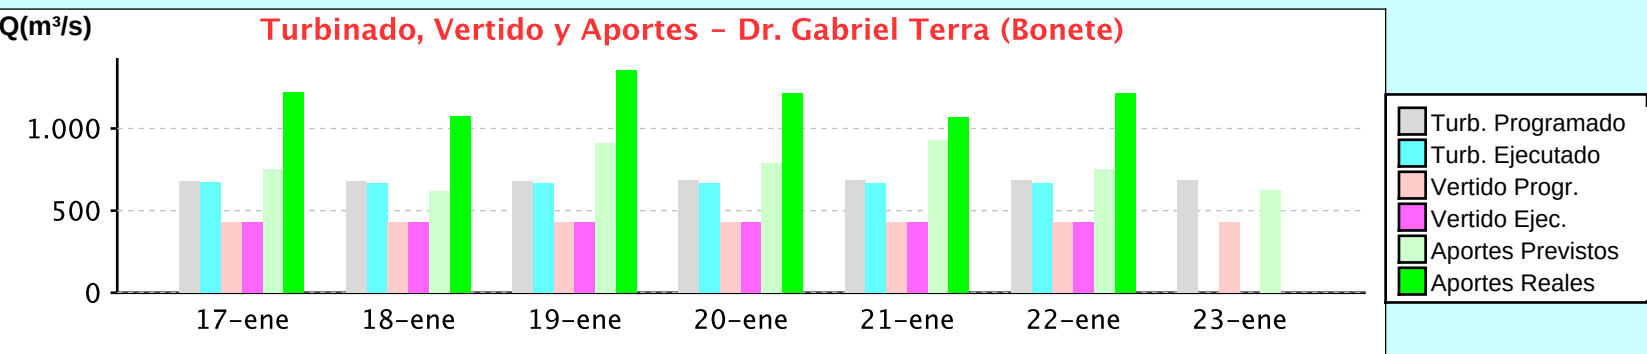

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

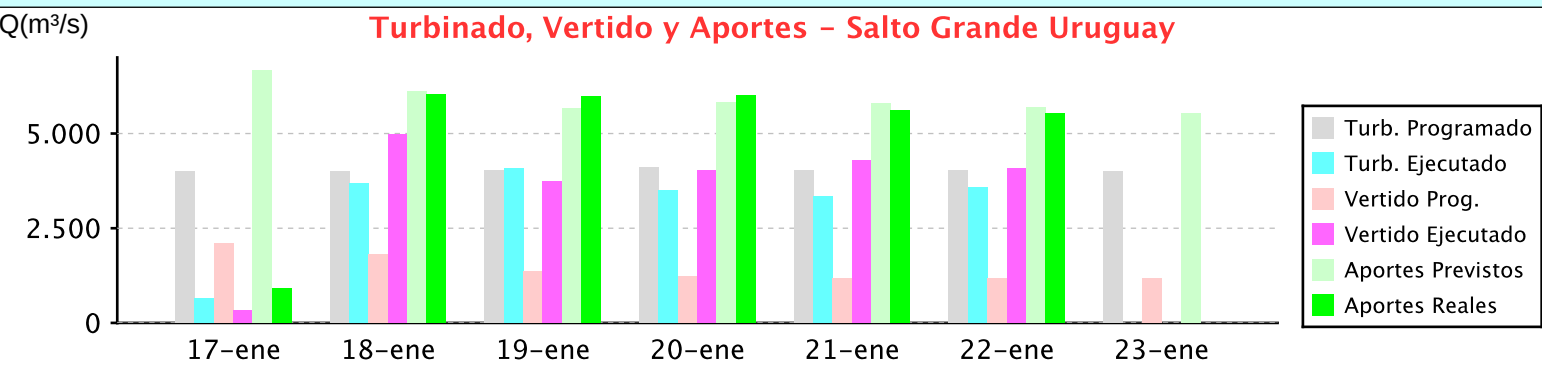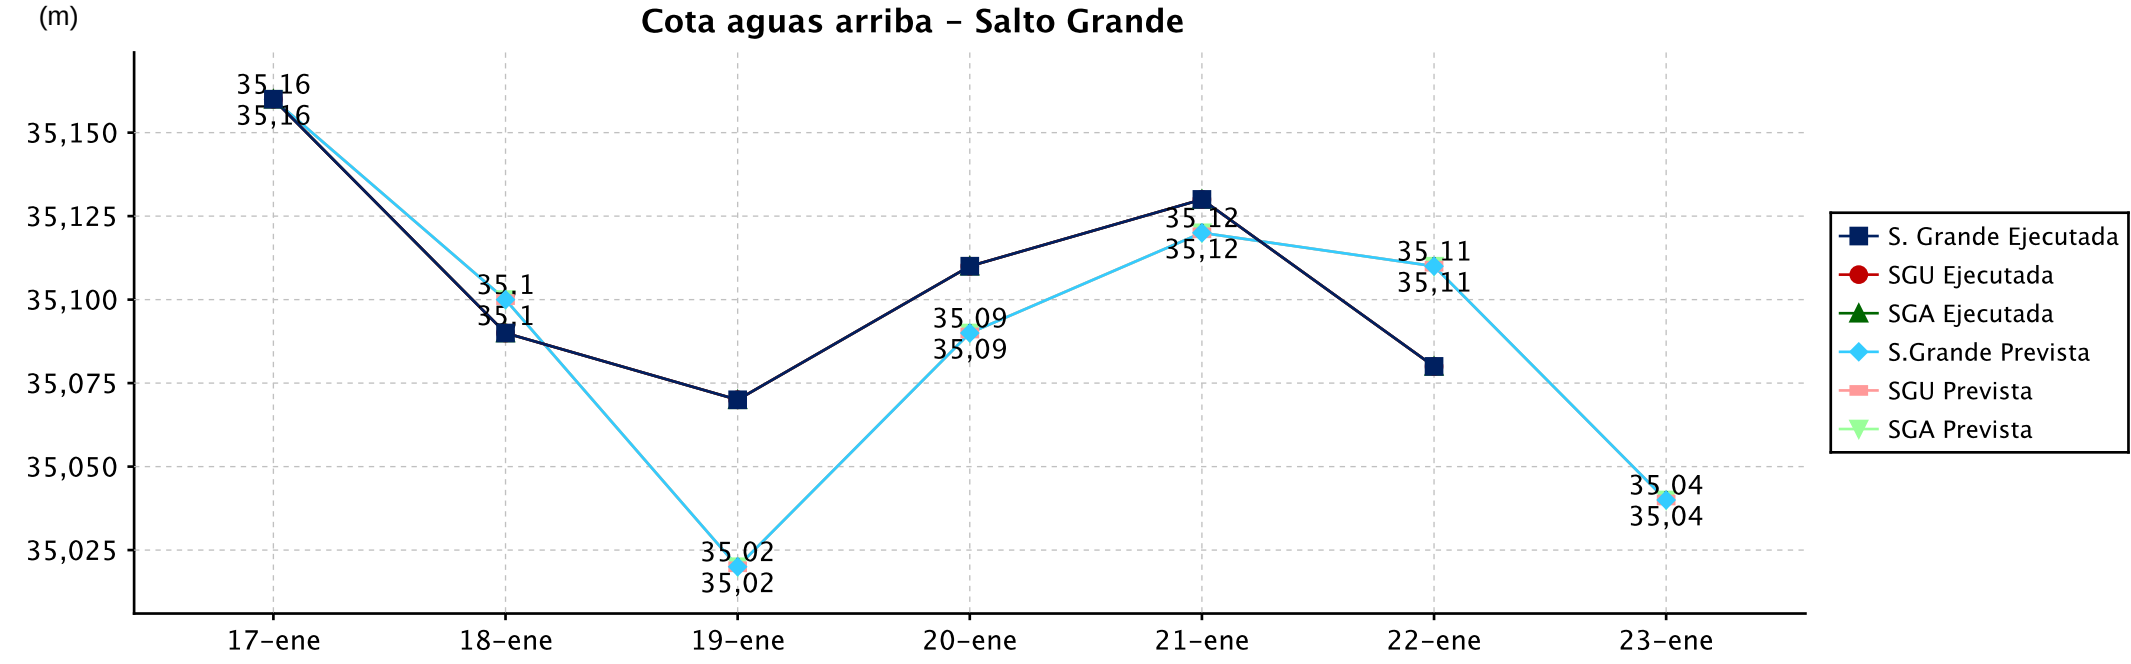

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,08
Cota Vista Arg	35,08
Cota real	35,08
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	685	669
Baygorria	904	882
Palmar	1.230	1.171
SGU	4.021	3.576

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	750	1.214
Baygorria	7	9
Palmar	217	276
SGU	5.700	5.538

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	430	427
Baygorria	250	278
Palmar	225	225
SGU	1.180	4.070

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 387 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

23/01/2015 17:18
