



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 31 de enero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-6
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-85
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.894
C. Baygorria	1.427
C. Palmar	5.238
C. Salto Grande	17.139
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.920
TOTAL Generación	31.518

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	5.124
Hidráulica	5.124
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	5.124


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.394
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.435
Diferencia (MWh)	-1.041
Ejecutada - Programada	-3,80 %

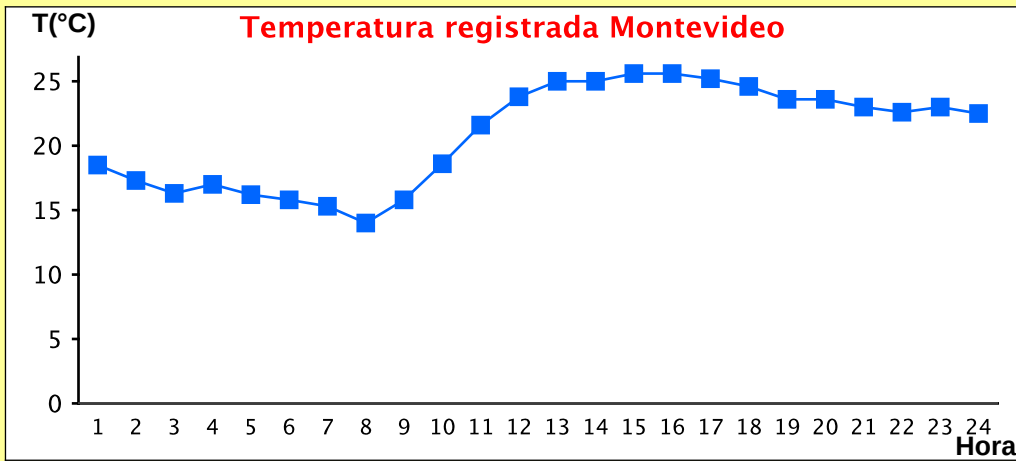
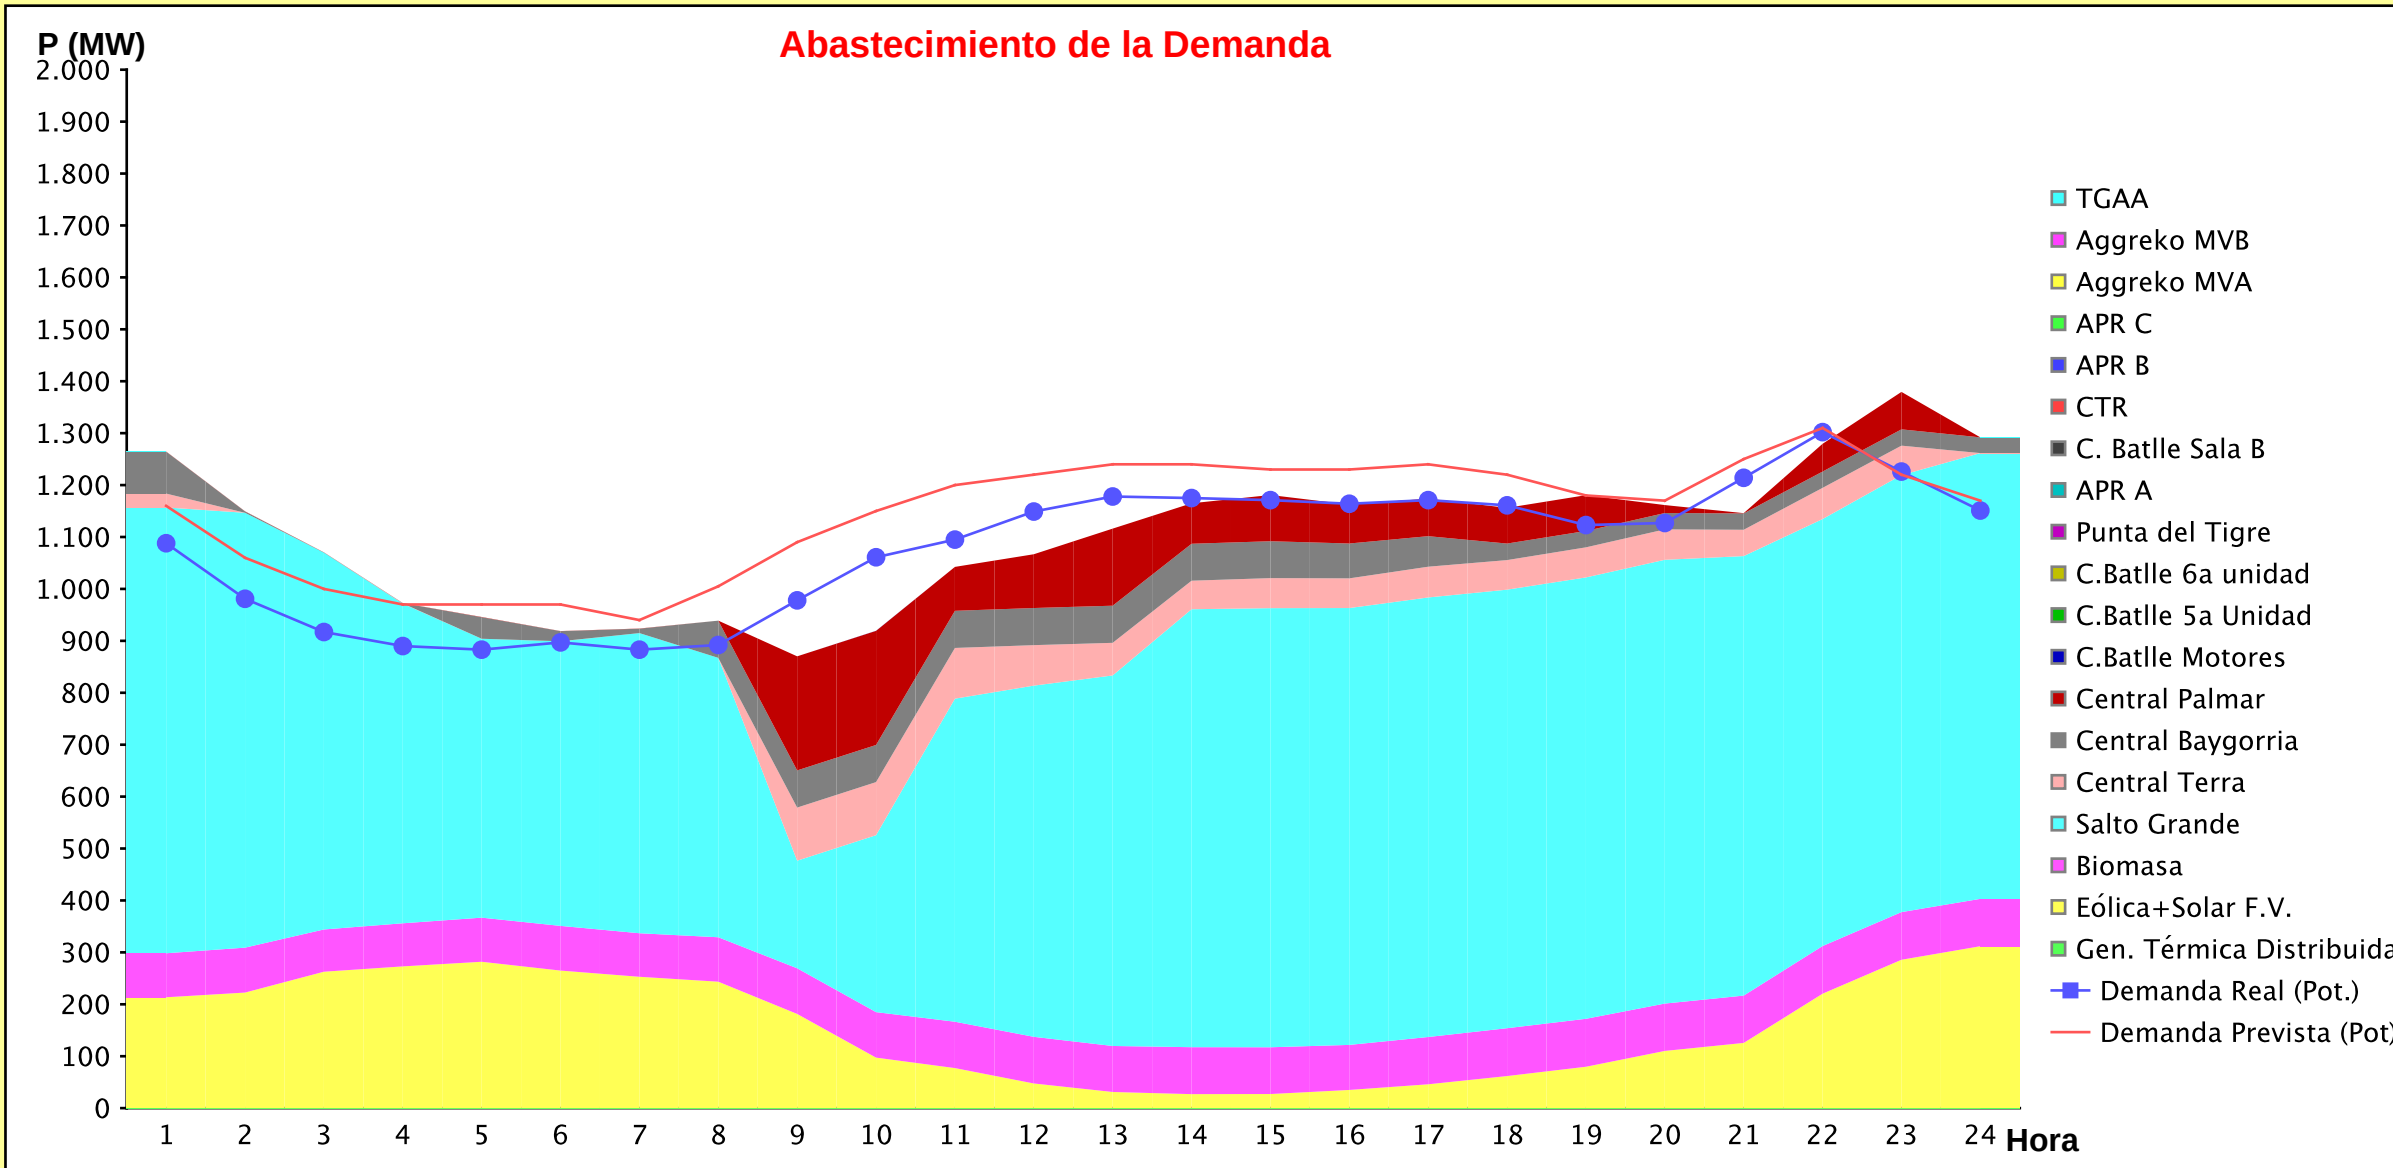


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	0 Hora 00:00
Potencia mínima:	0 Hora 00:00
Pico noche:	0 Hora 00:00

Generación Media (MW)	
Eólica	157,9
Biomasa	88,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


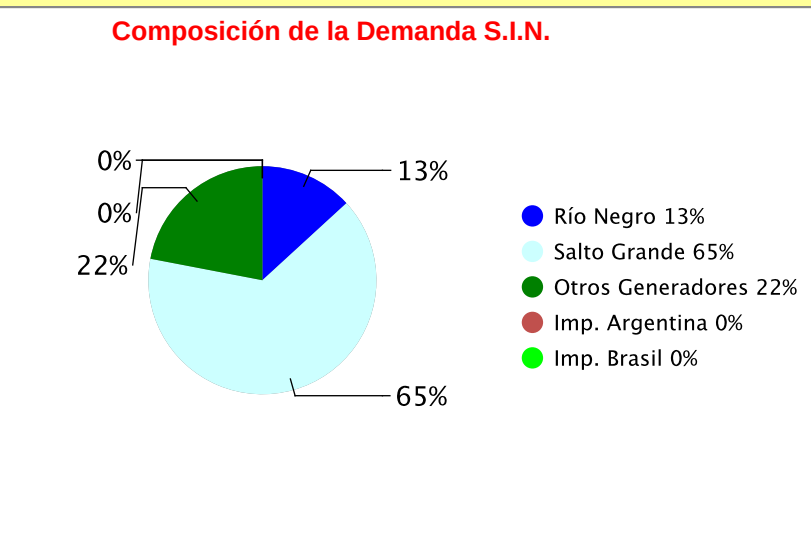


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

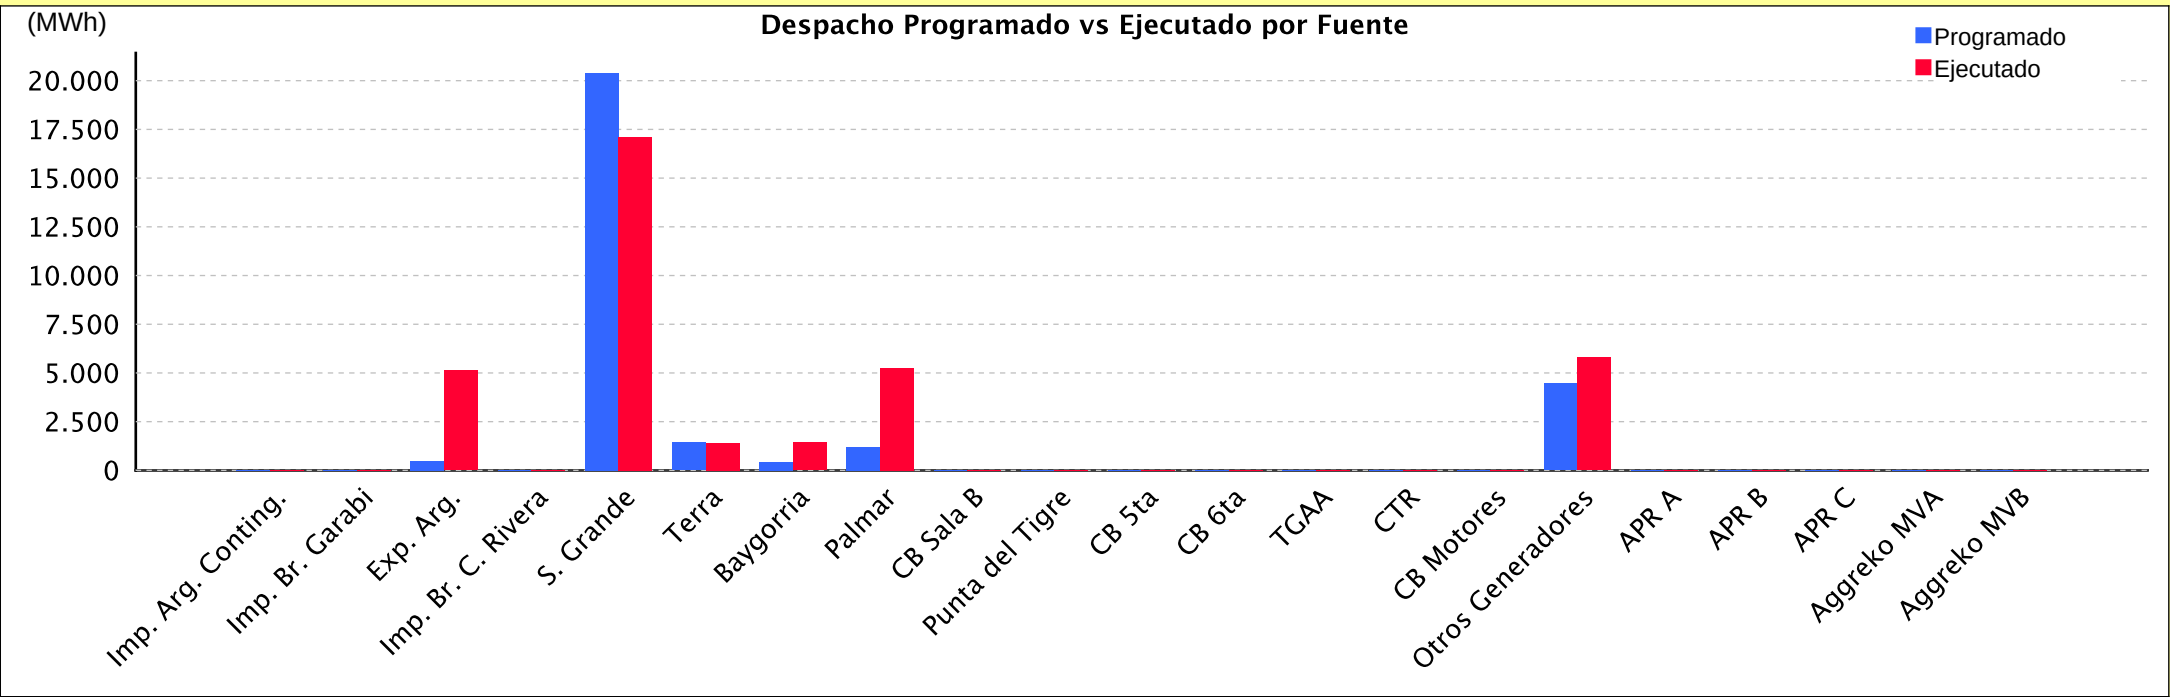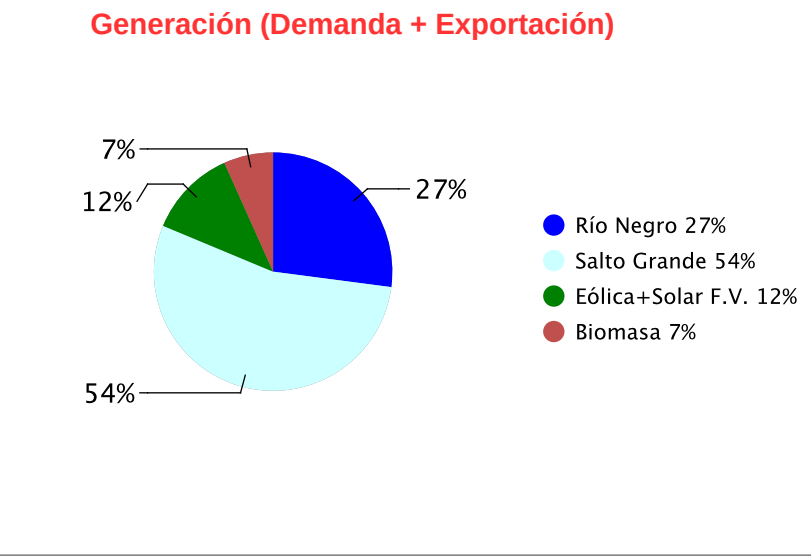



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

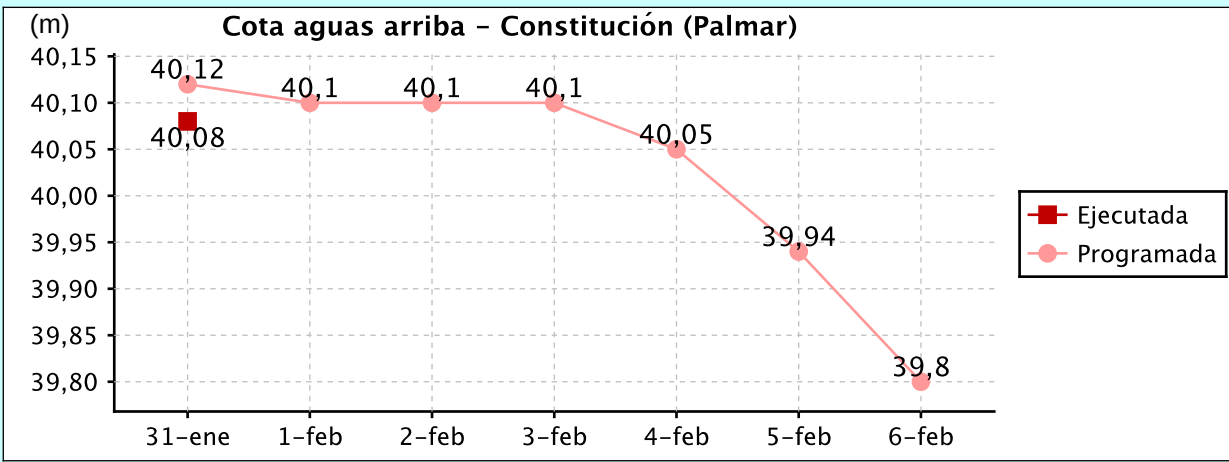
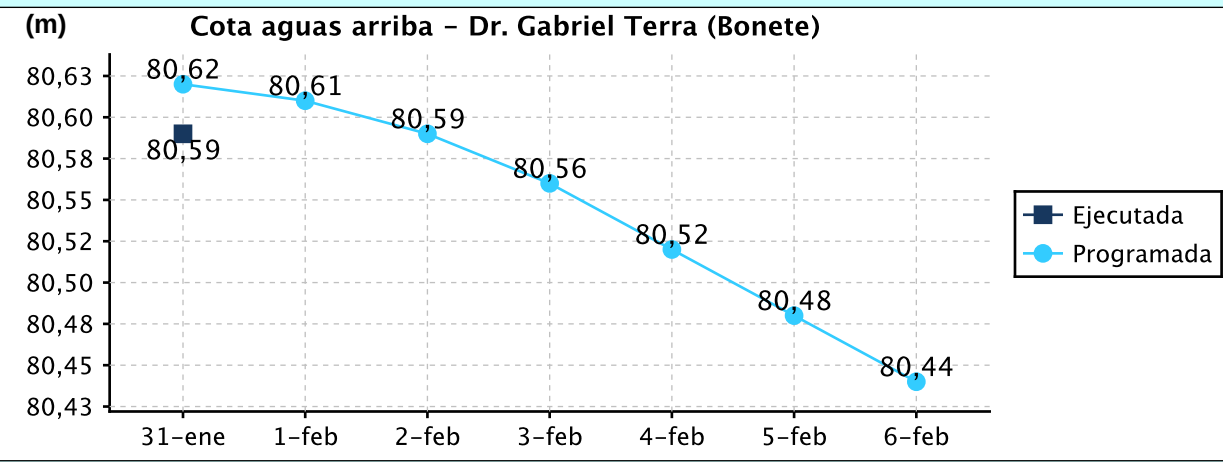


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,62	80,59
Baygorria	54,30	54,2
Palmar	40,12	40,08
SGU	35,21	35,49

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

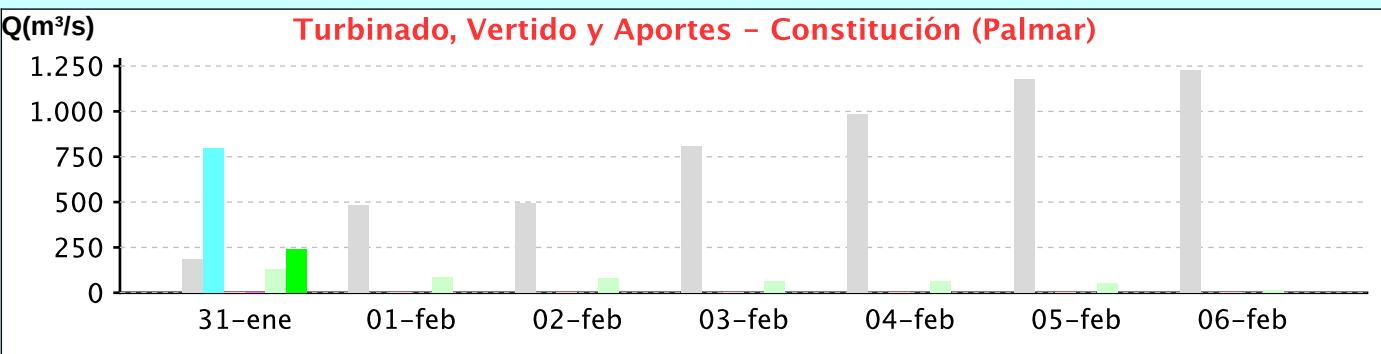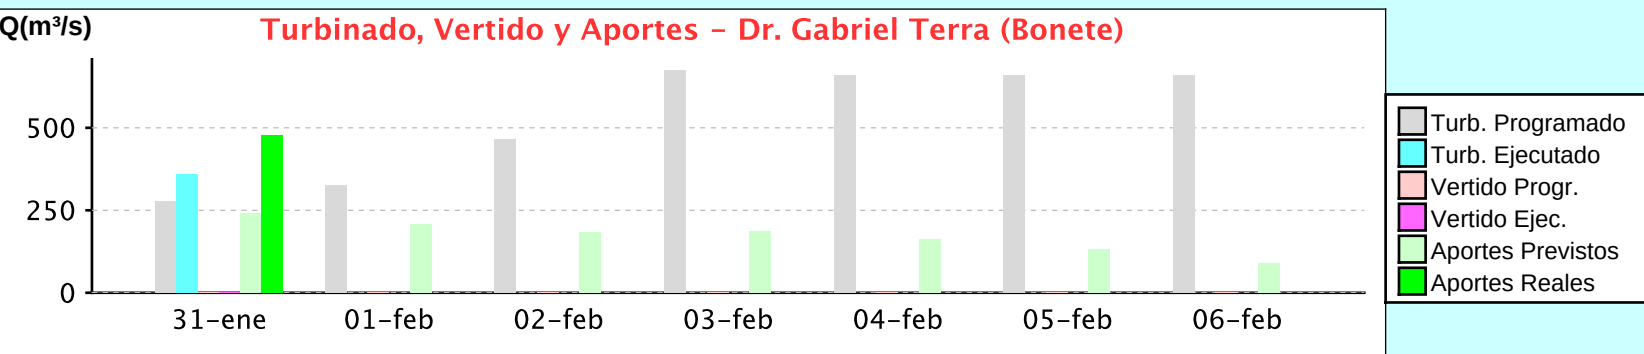

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

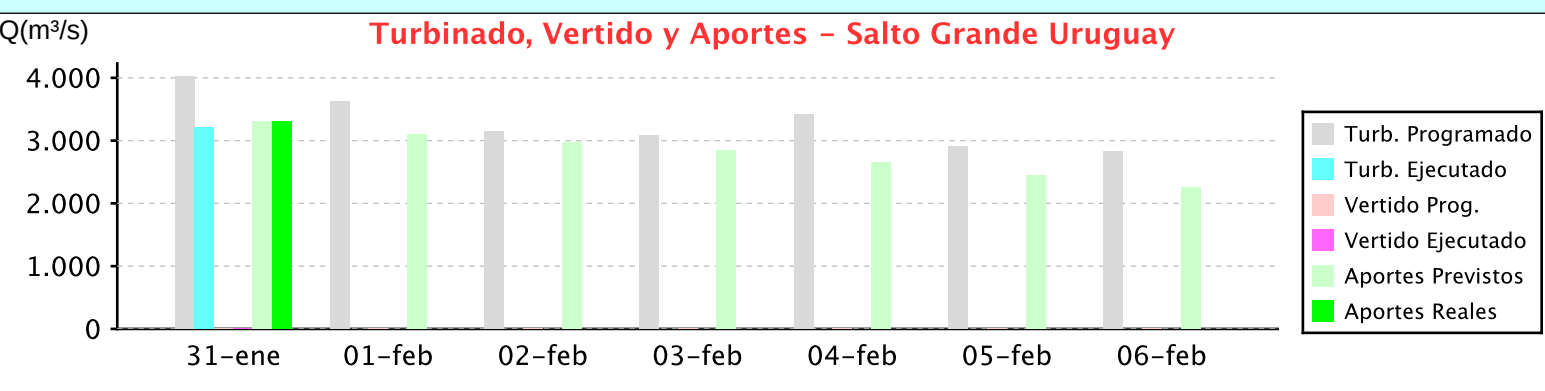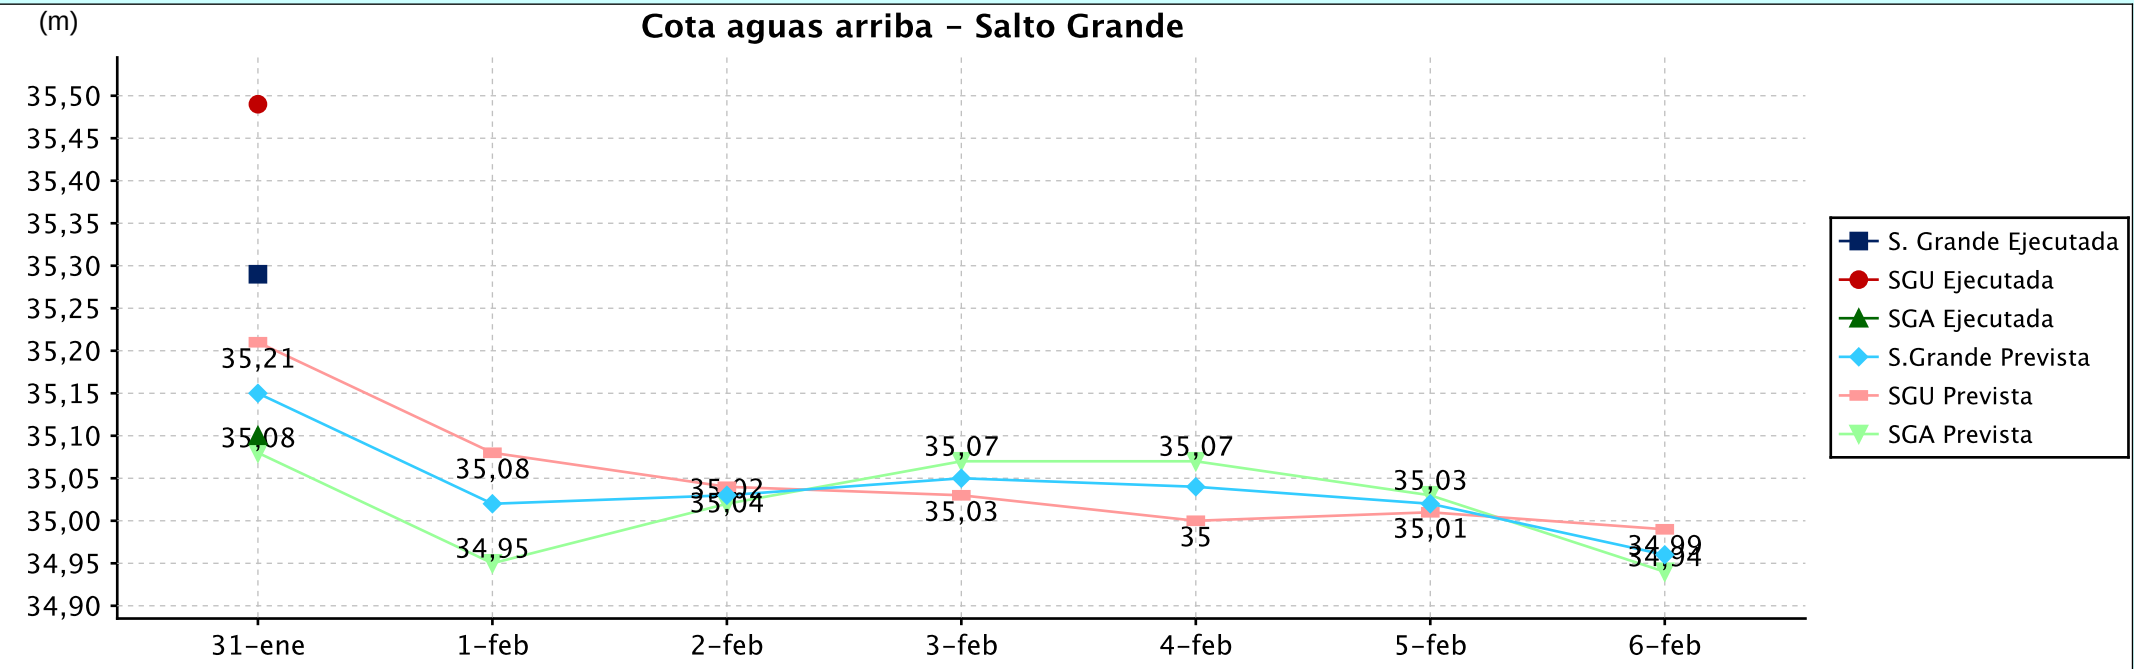

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,49
Cota Vista Arg	35,10
Cota real	35,29
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
9.530	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	278	360
Baygorria	156	493
Palmar	187	797
SGU	4.028	3.205

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	242	476
Baygorria	0	32
Palmar	132	238
SGU	3.300	3.304

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 213 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
Al momento no están disponibles los valores de los Picos de Potencia.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

02/02/2015 17:22
