



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 08 de febrero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	1.662
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.665
Central La Tablada	149
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	304
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.309
C. Baygorria	2.094
C. Palmar	4.806
C. Salto Grande	10.605
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.457
TOTAL Generación	27.379

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.379
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.160
Diferencia (MWh)	219
Ejecutada - Programada	0,81 %

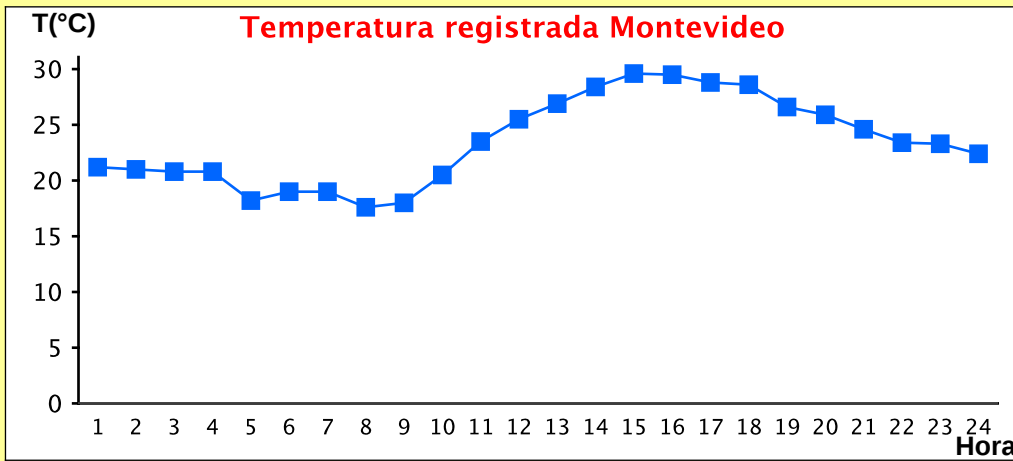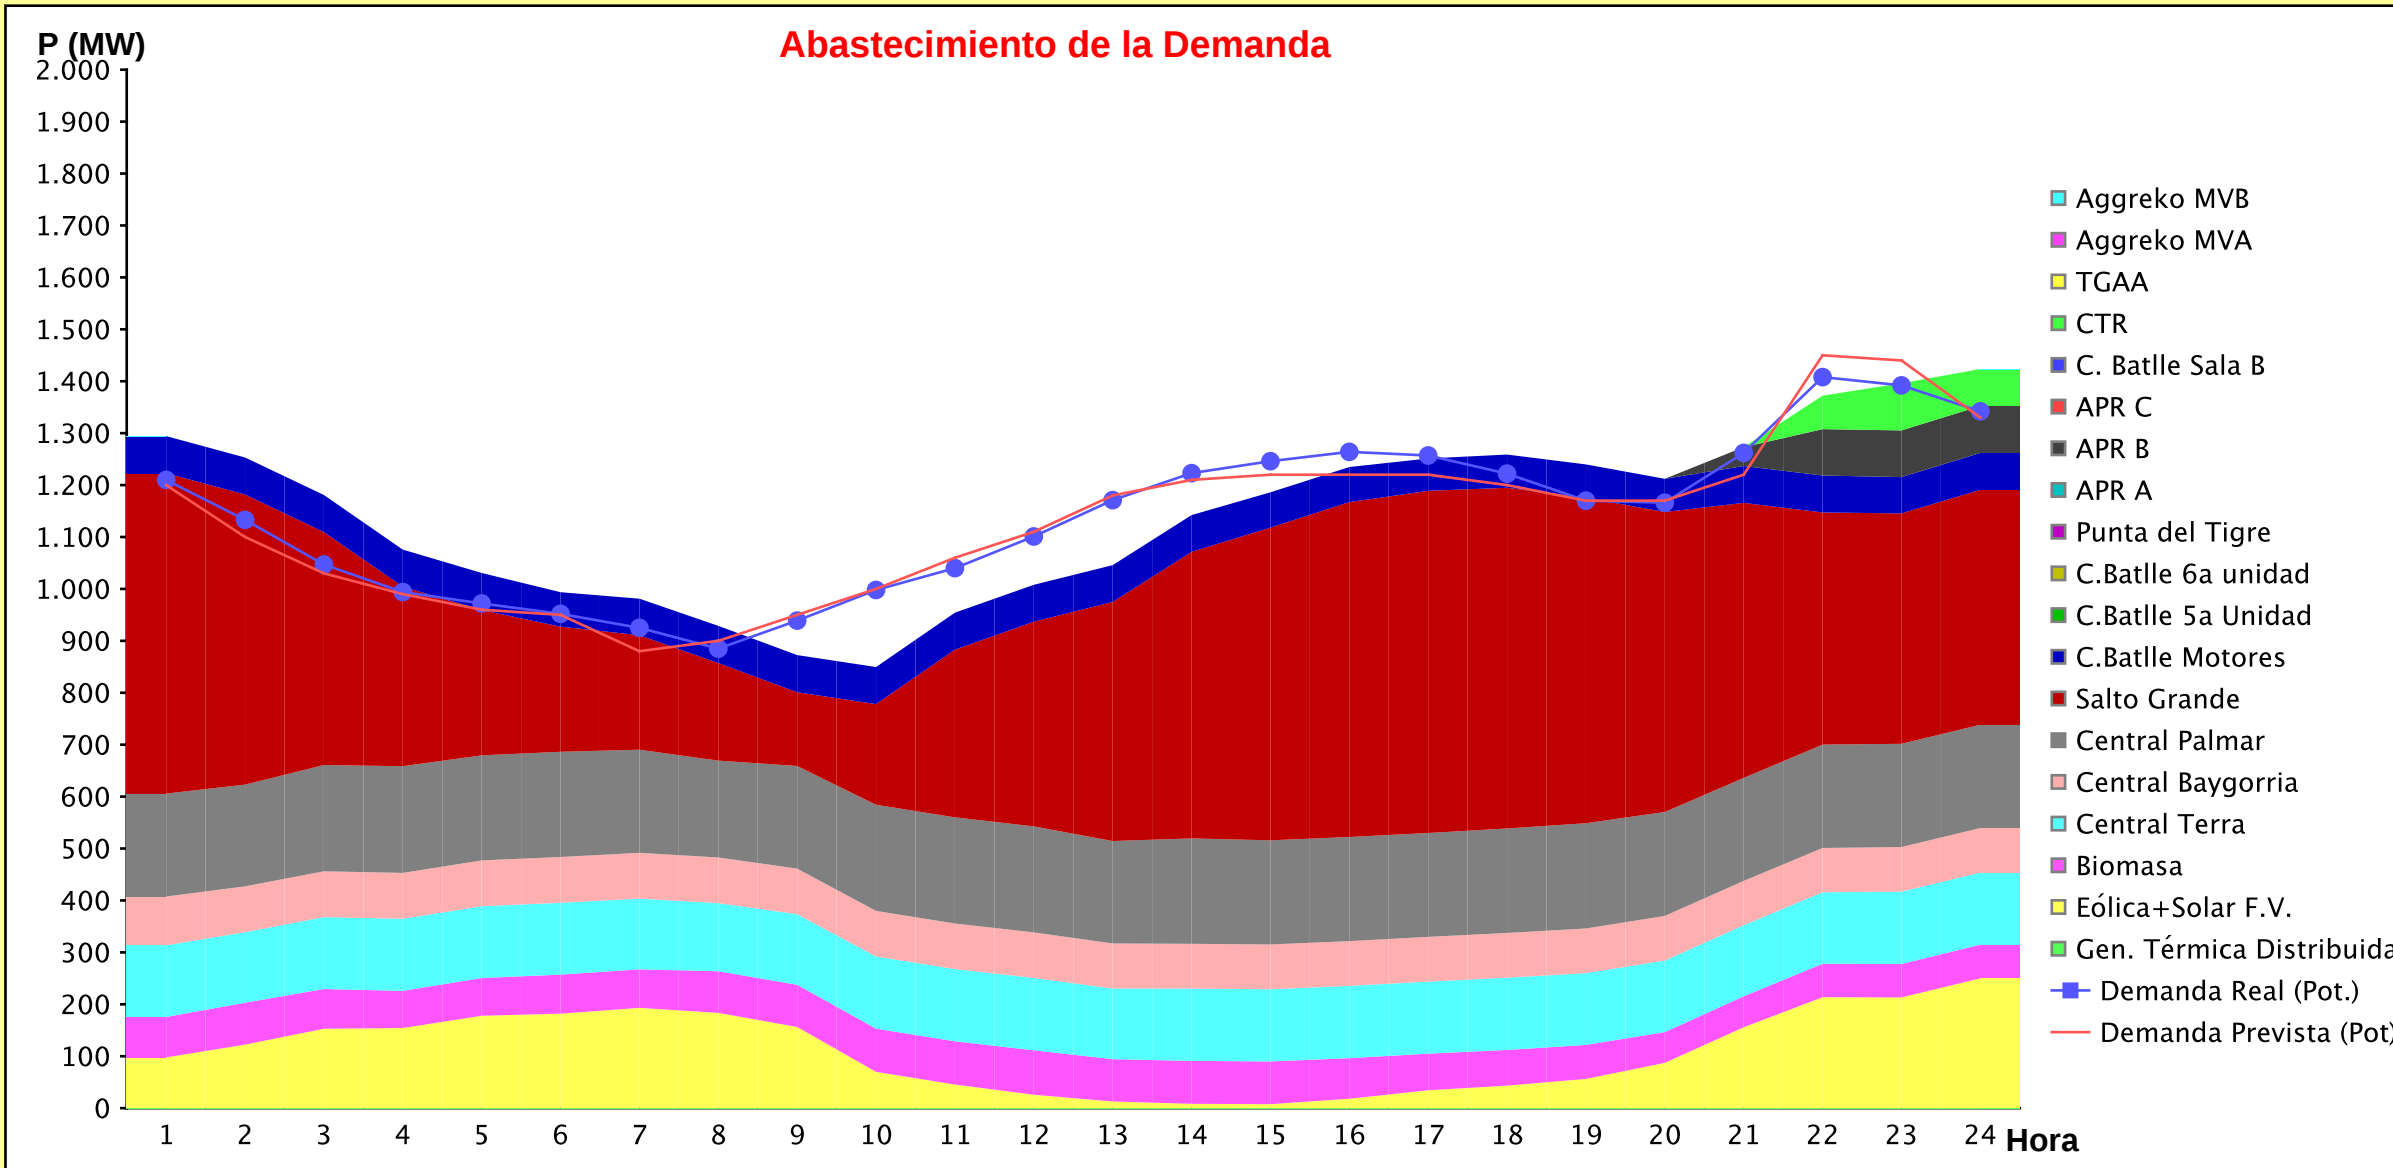



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1290,93 Hora 15:39
Potencia mínima:	863,41 Hora 07:50
Pico noche:	1431,06 Hora 22:18

Generación Media (MW)	
Eólica	111,4
Biomasa	74,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

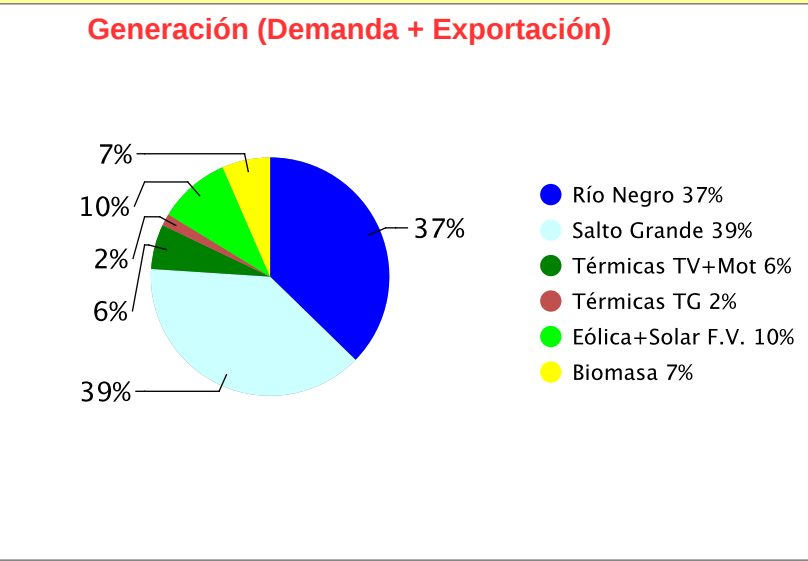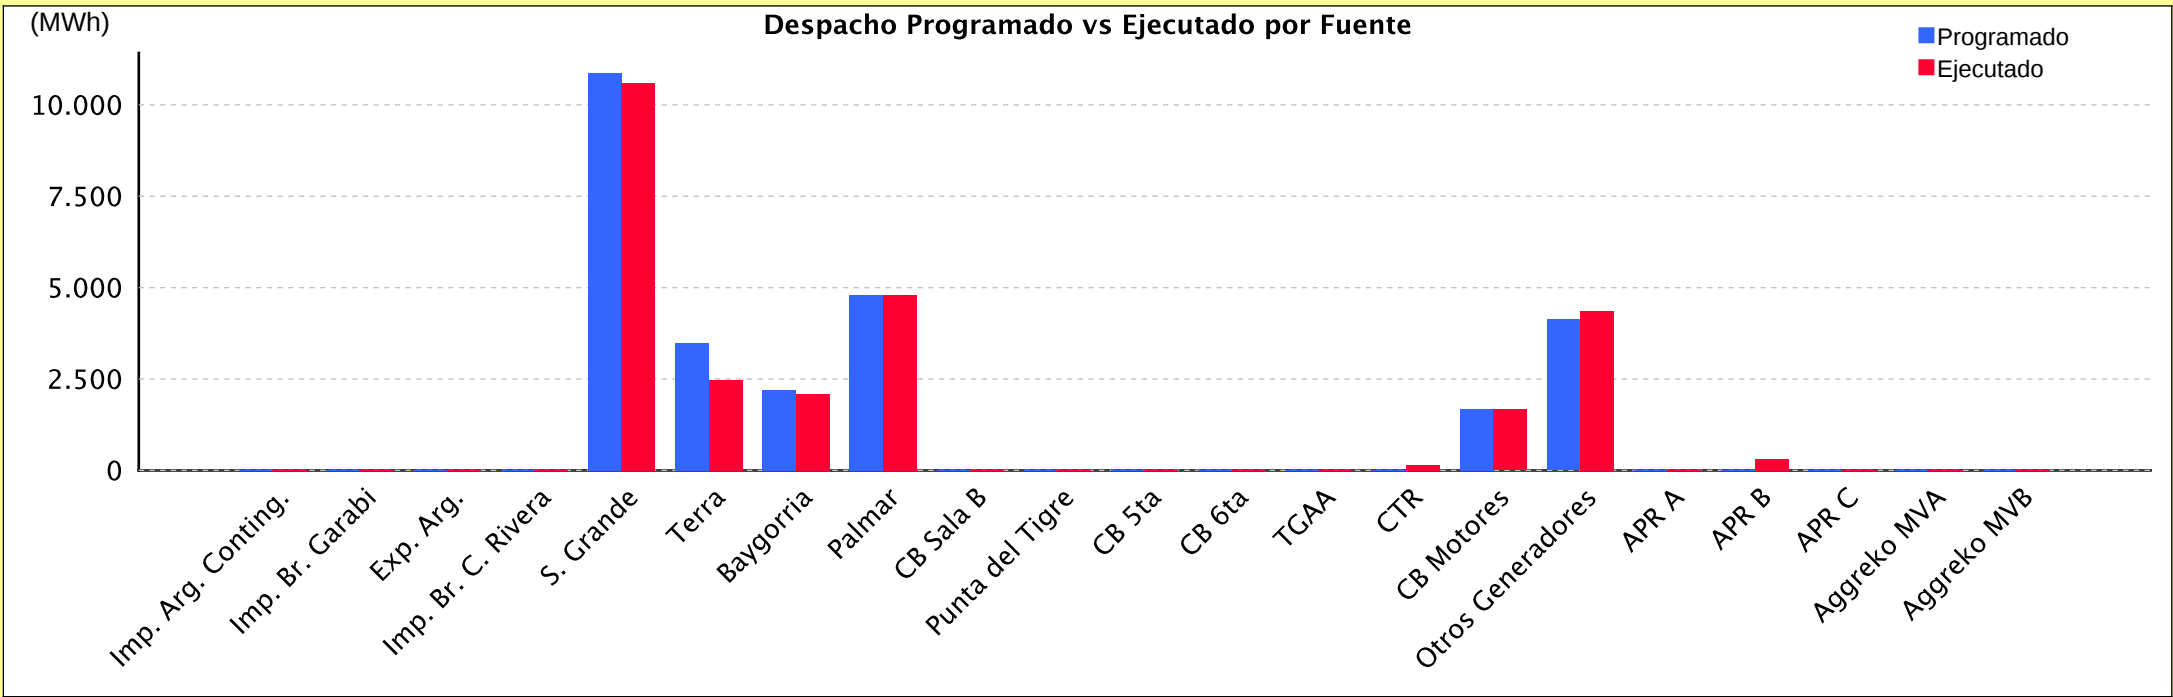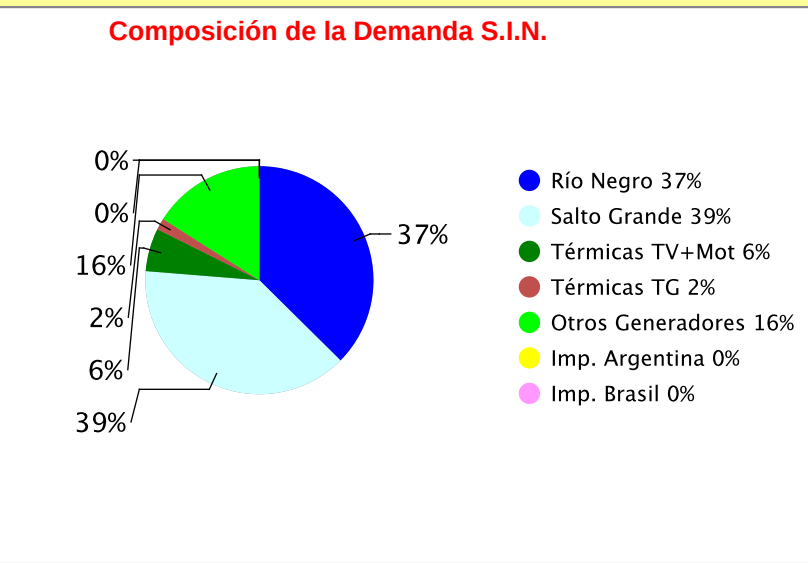



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

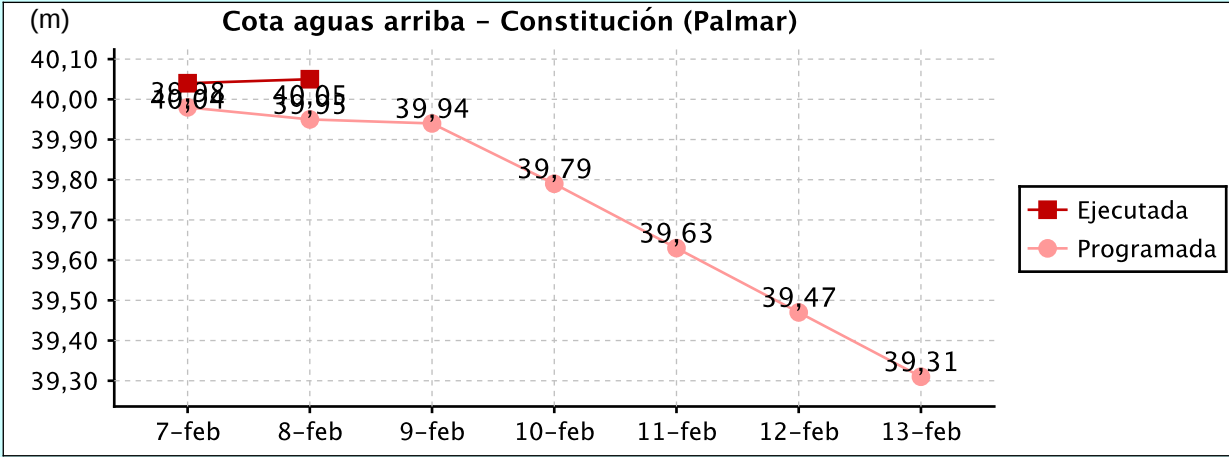
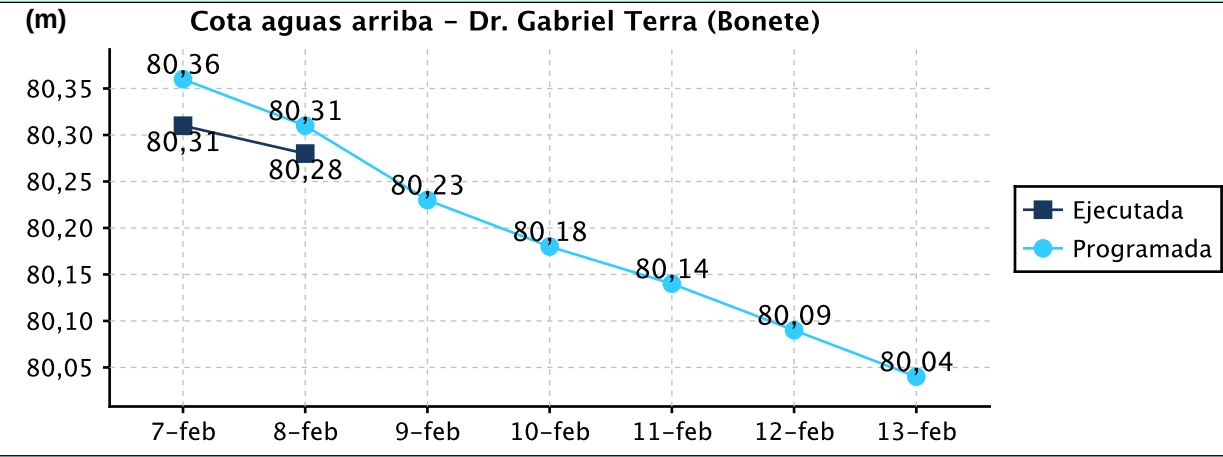


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,31	80,28
Baygorria	54,07	53,69
Palmar	39,95	40,05
SGU	35,46	35,66

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

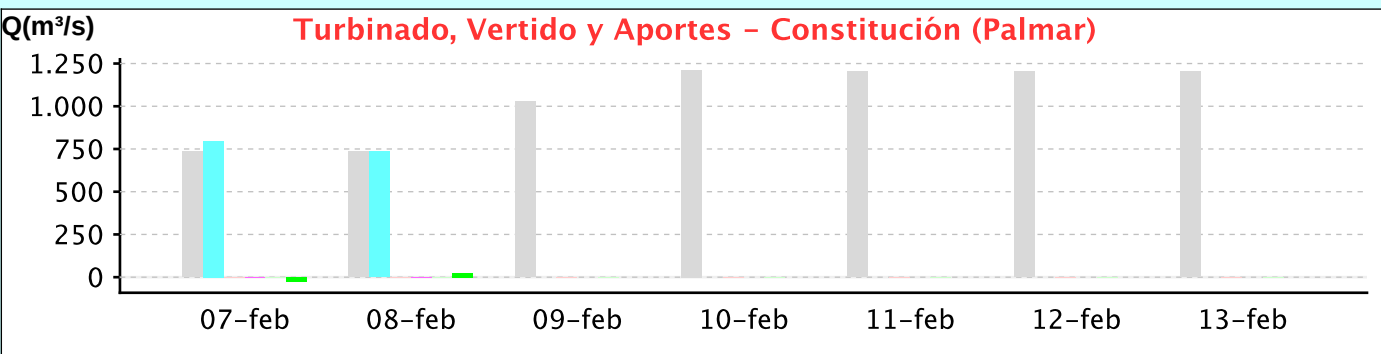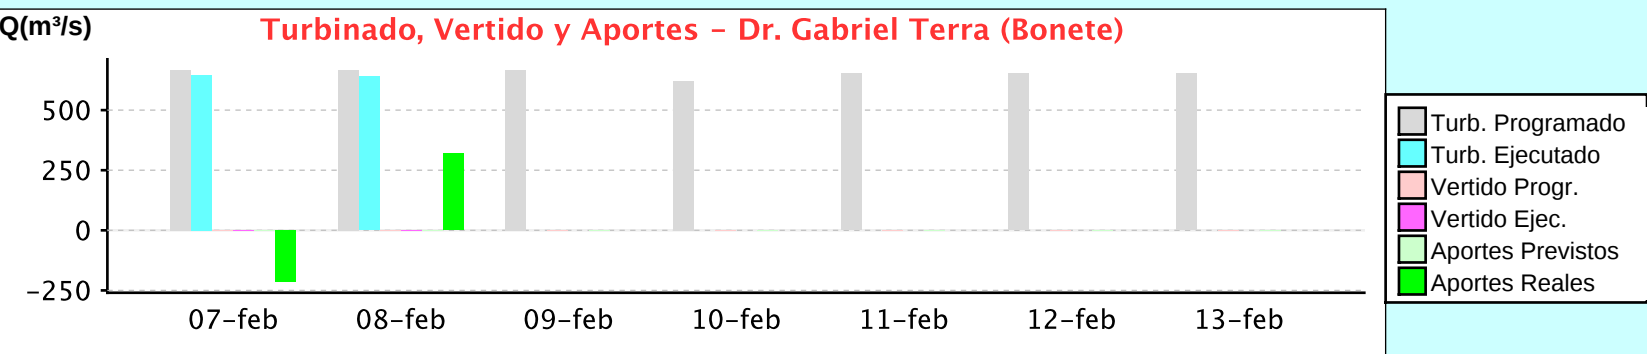

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

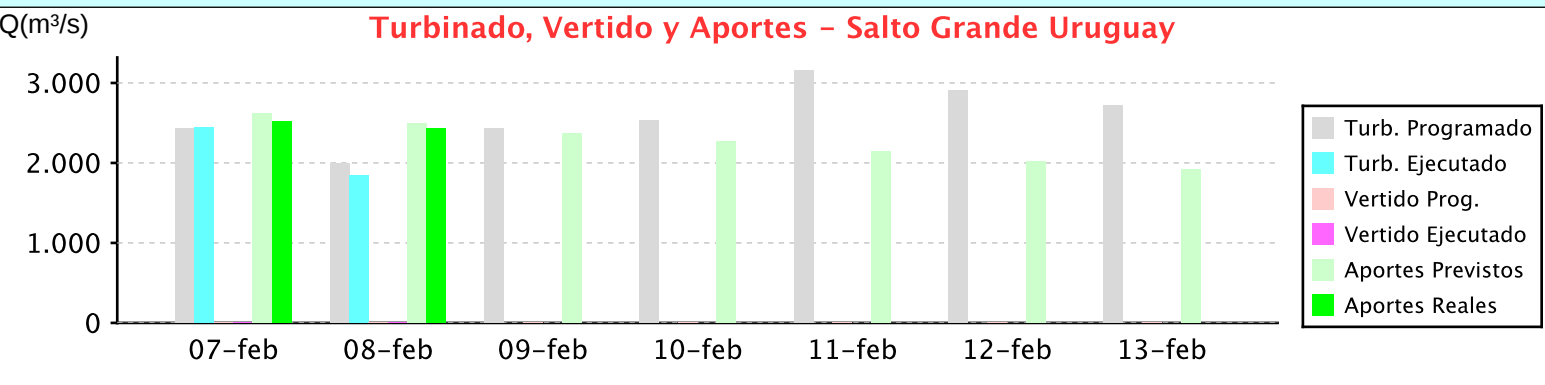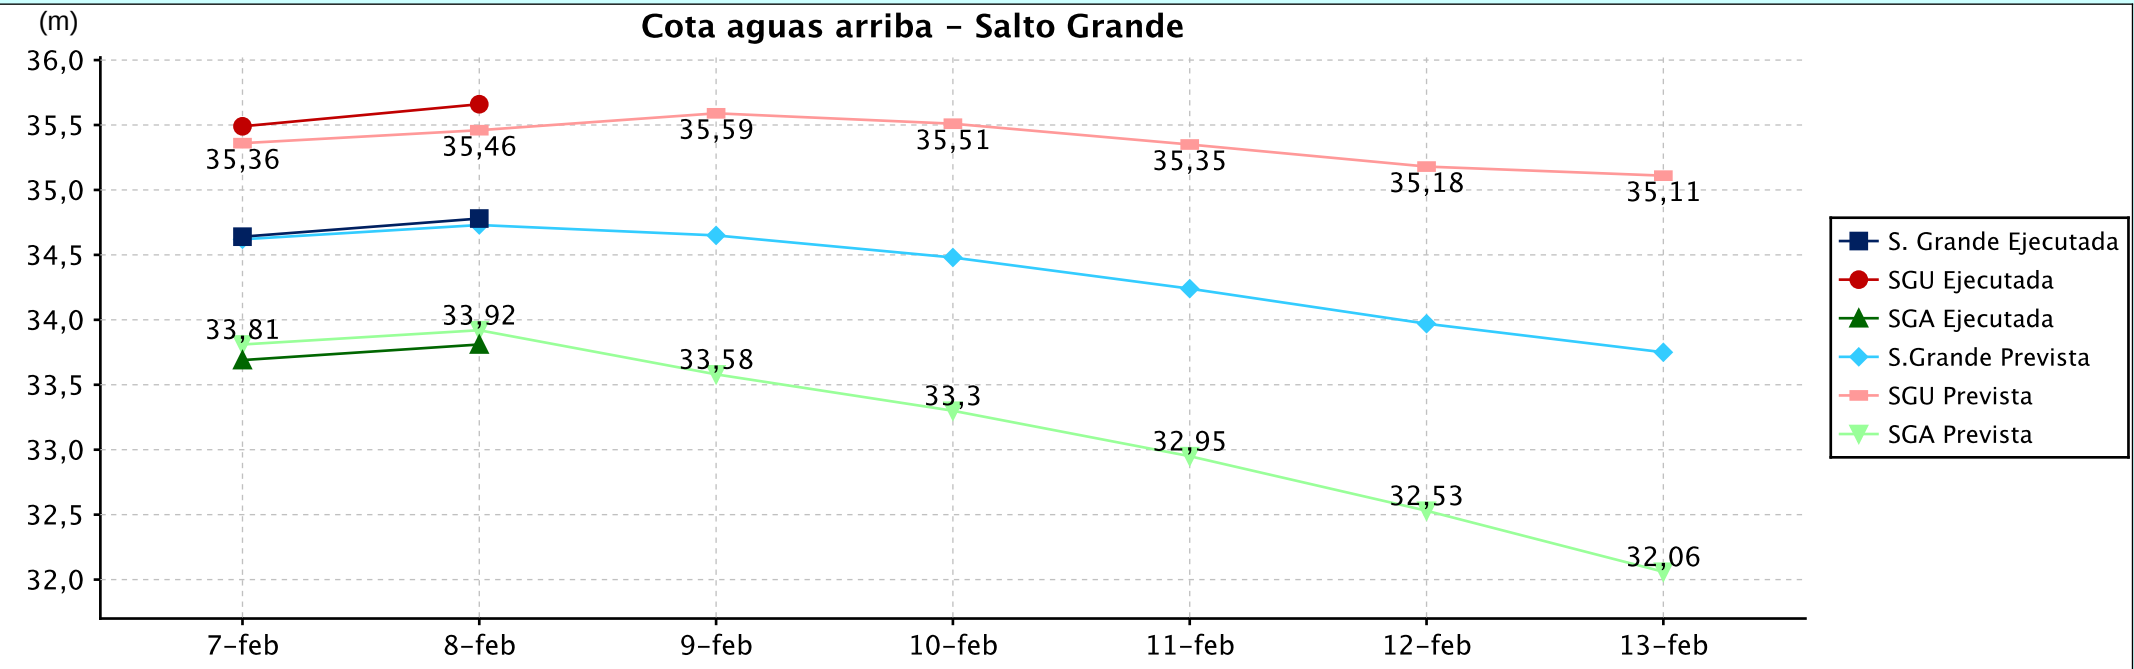

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,66
Cota Vista Arg	33,81
Cota real	34,78

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	42.048
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	667	639
Baygorria	782	777
Palmar	737	736
SGU	1.994	1.848

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	320
Baygorria	0	22
Palmar	0	24
SGU	2.500	2.430

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Debido a un desperfecto en un transformador de MVA, se debió despachar APR B y CTR para evitar sobrecargas en el resto de los transformadores de la estación.
