



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 09 de febrero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	1.661
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.665
Central La Tablada	1.499
Central P. del Tigre	-5
APR A	-2
APR B	1.033
APR C	0
Aggreko	327
Aggreko MVA	154
Aggreko MVB	172
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.319
C. Baygorria	1.499
C. Palmar	6.445
C. Salto Grande	12.835
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.104
TOTAL Generación	32.714

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.714
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.990
Diferencia (MWh)	1.724
Ejecutada - Programada	5,56 %

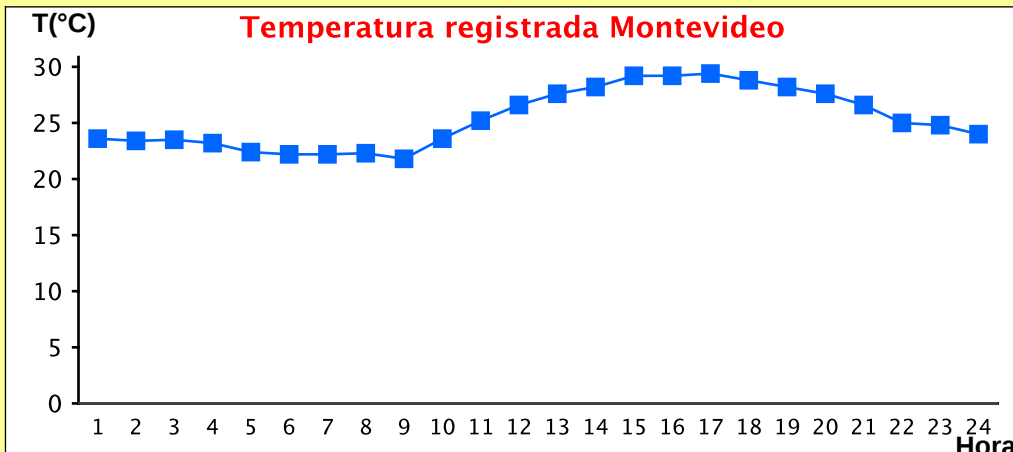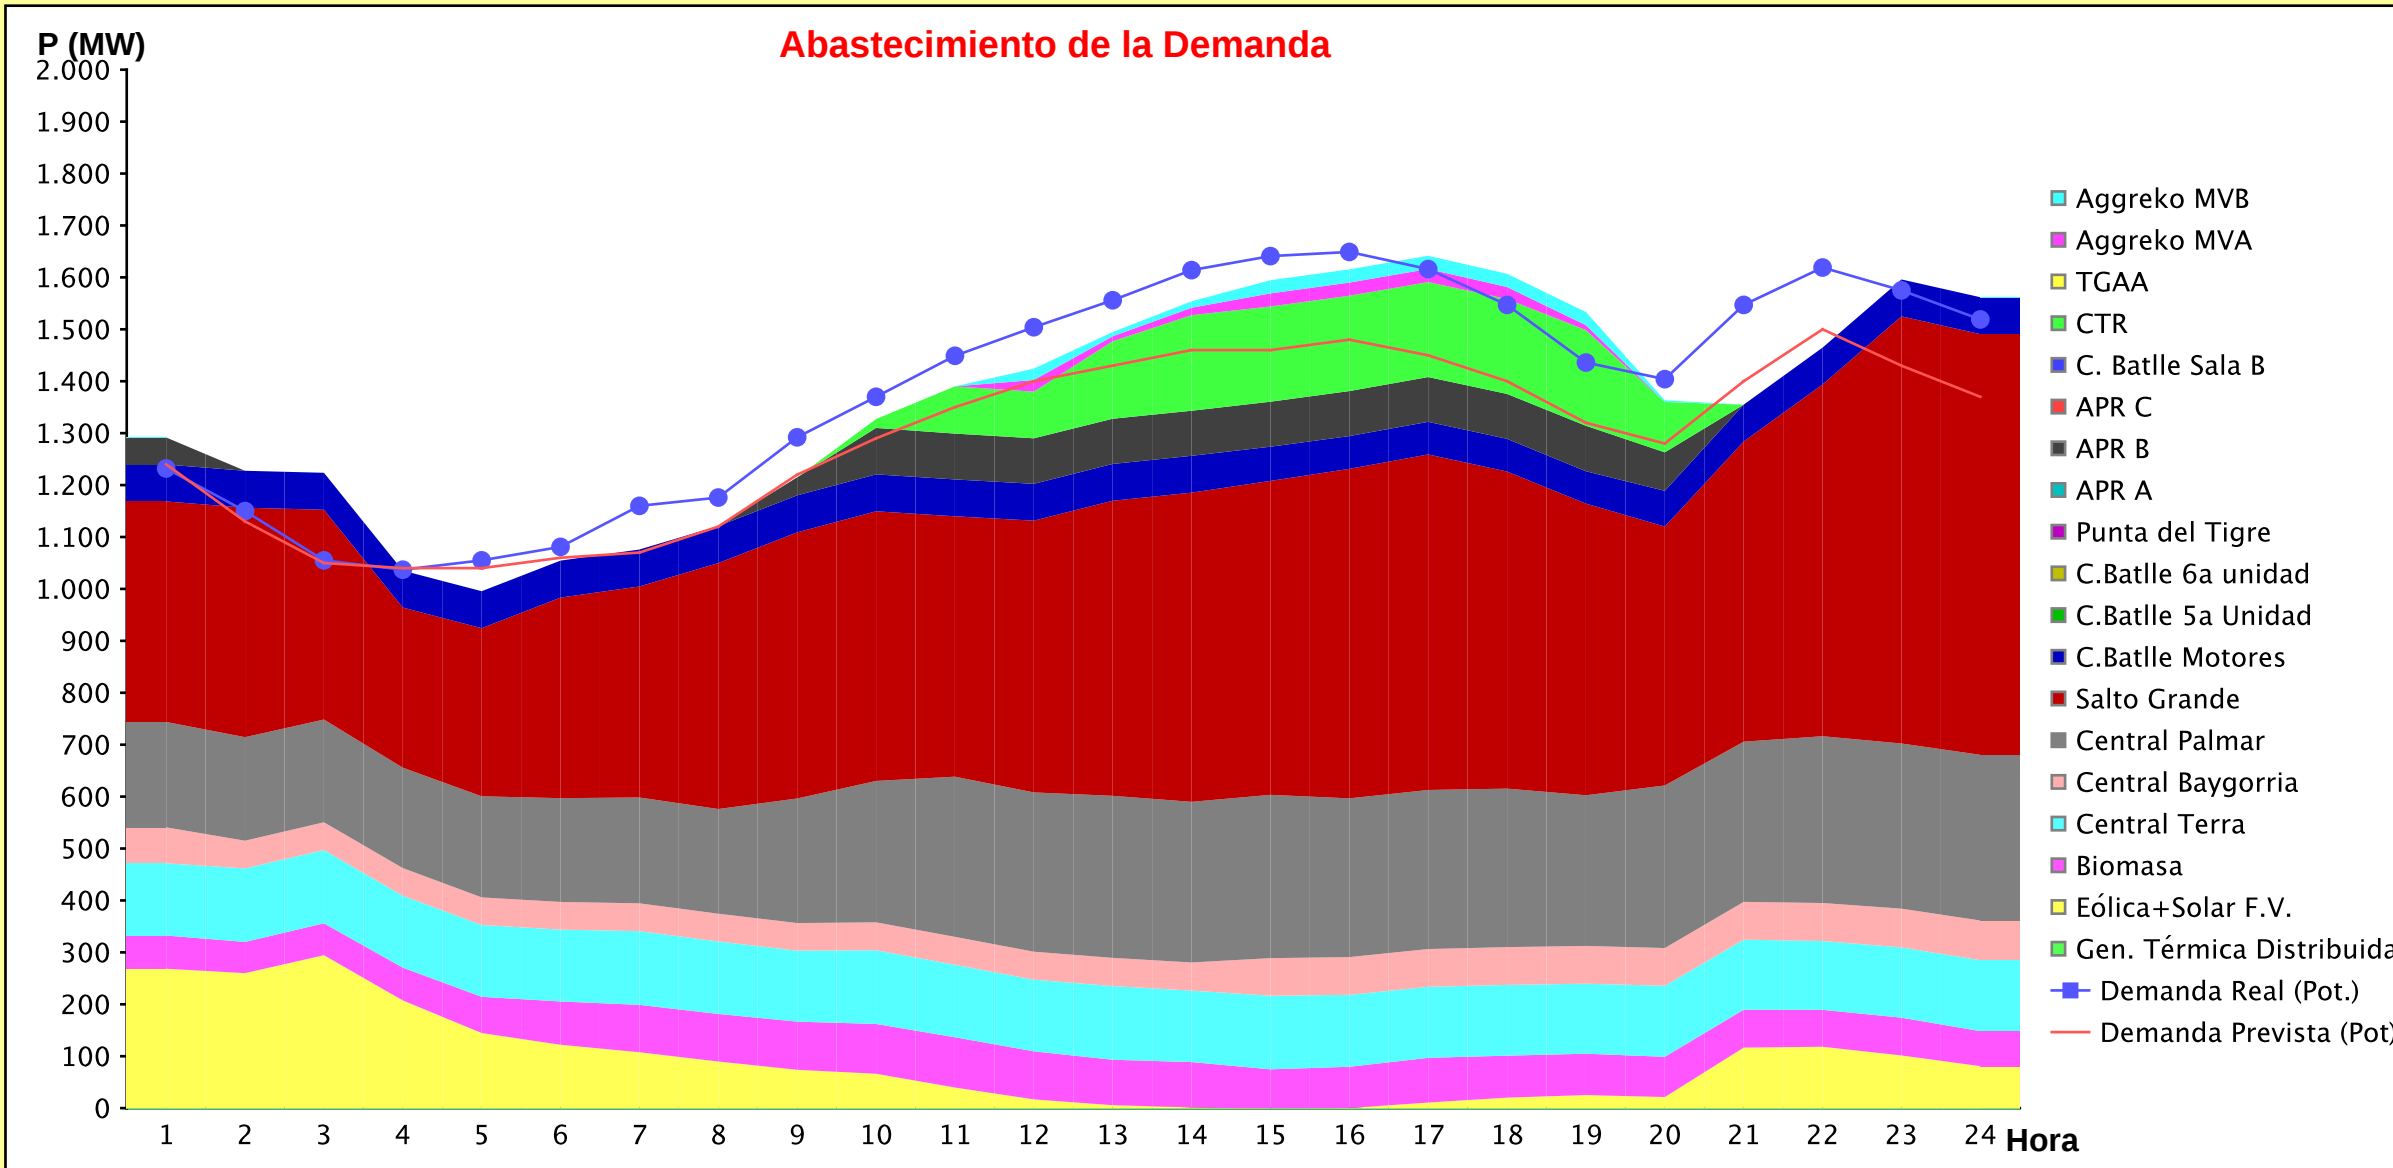



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1654,68 Hora 15:25
Potencia mínima:	1017,64 Hora 03:52
Pico noche:	1622,85 Hora 21:41

Generación Media (MW)	
Eólica	92,8
Biomasa	79,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

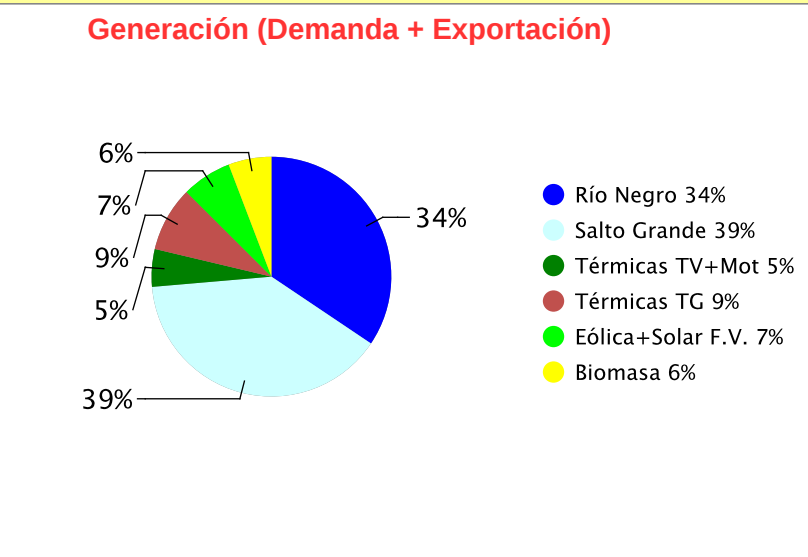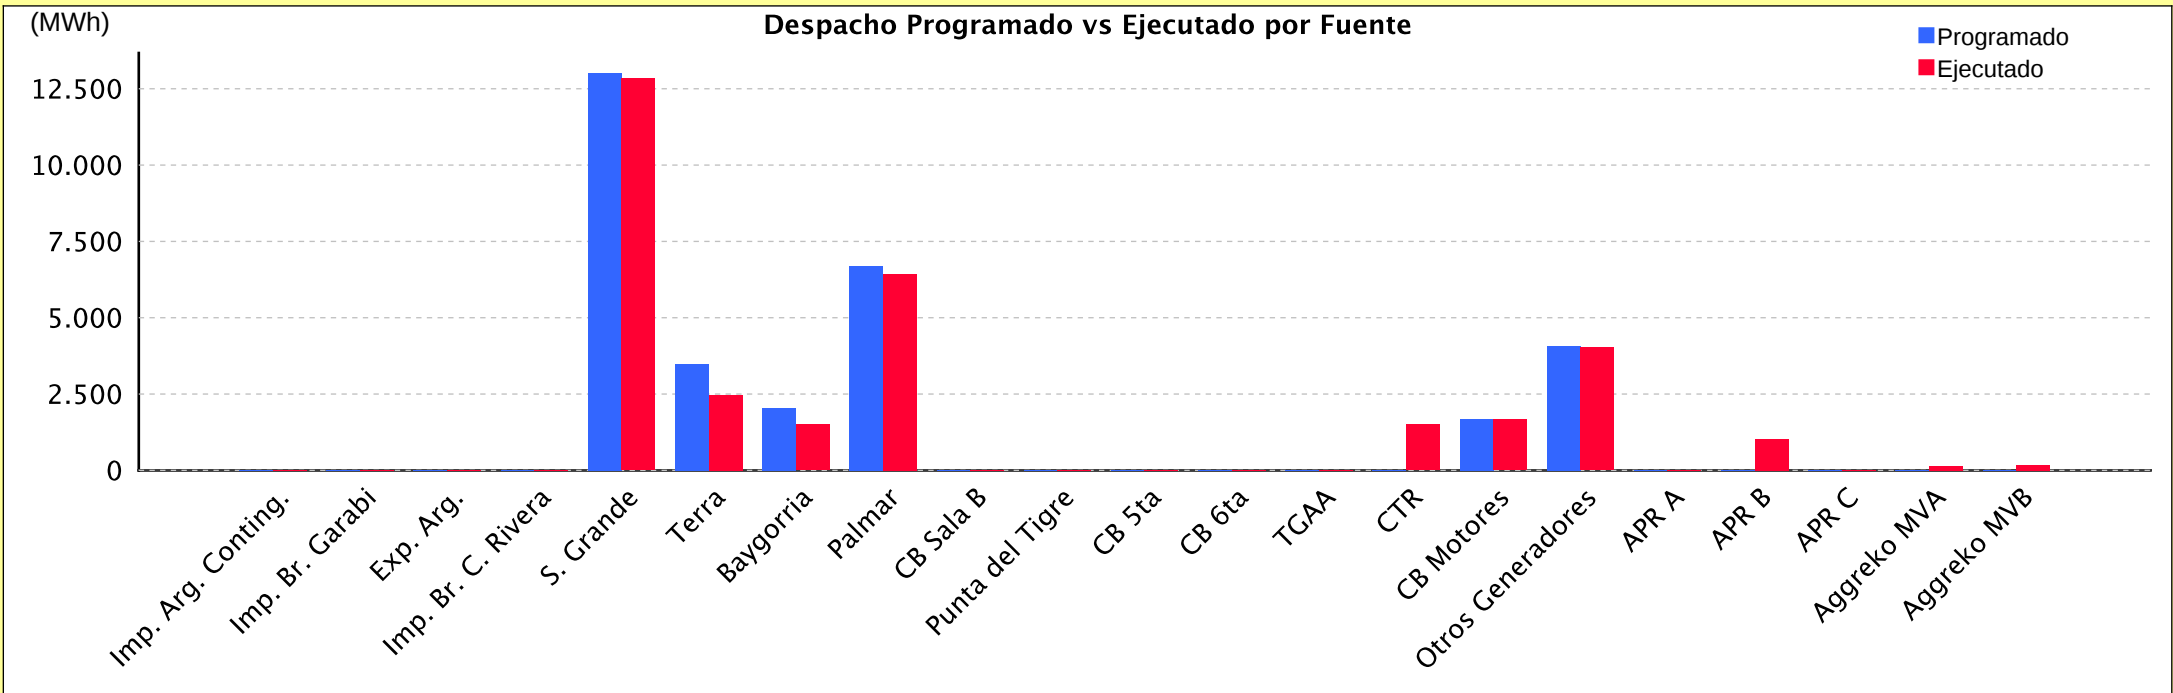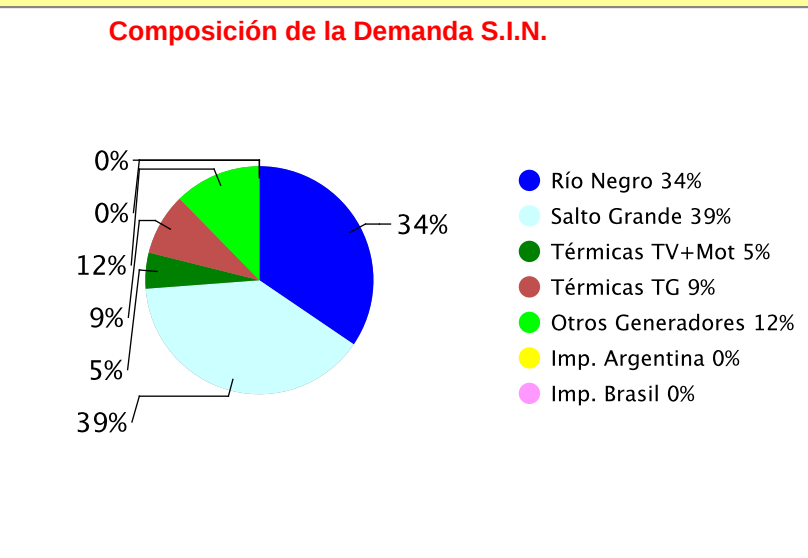



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

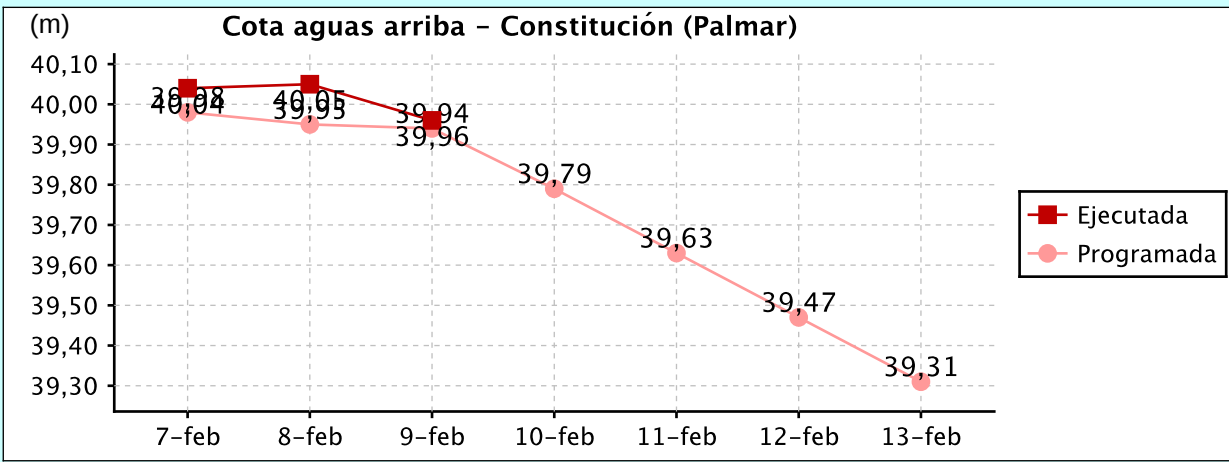
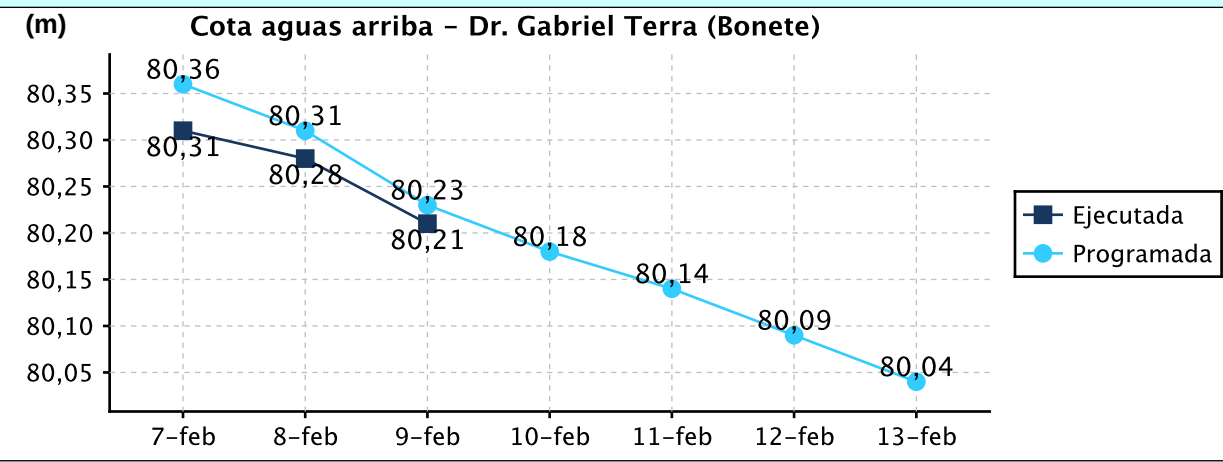


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,23	80,21
Baygorria	53,71	53,78
Palmar	39,94	39,96
SGU	35,59	35,62

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

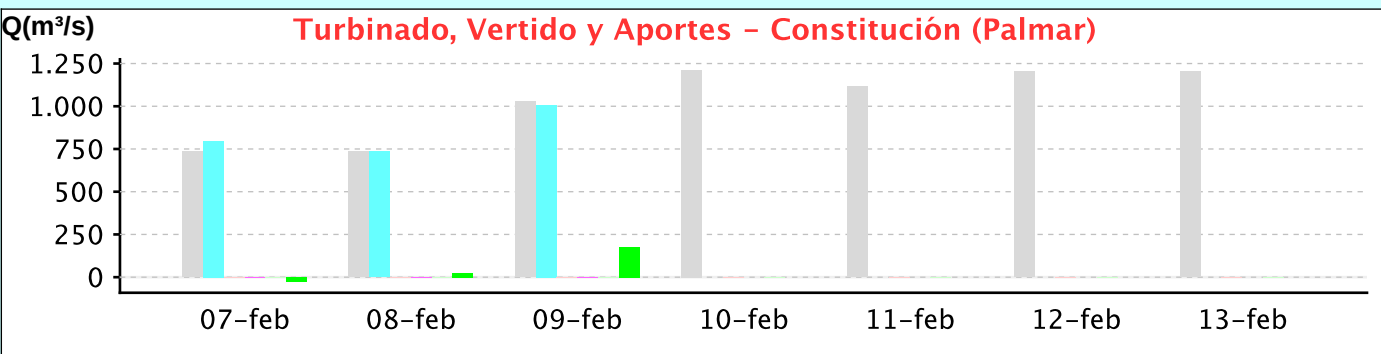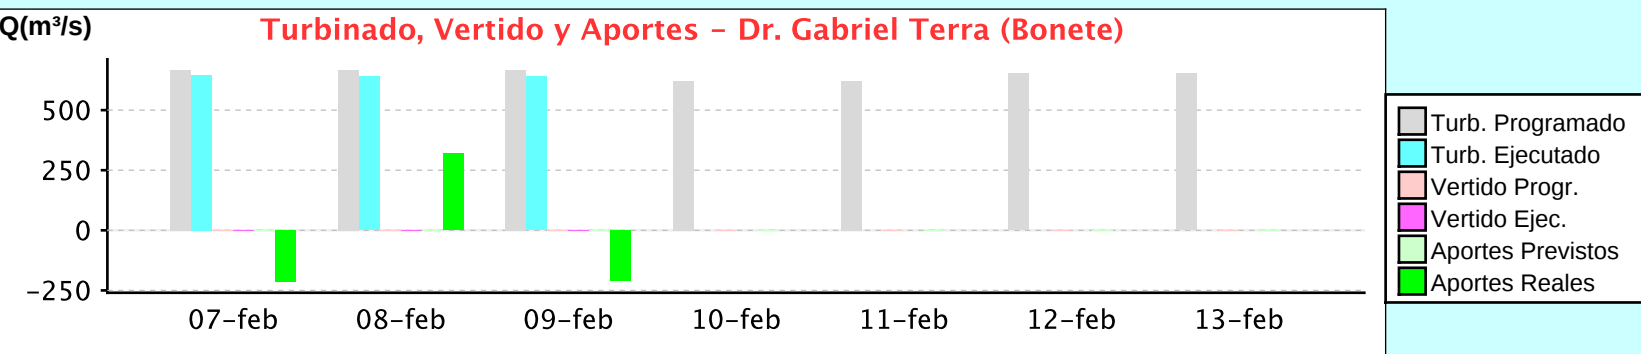

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

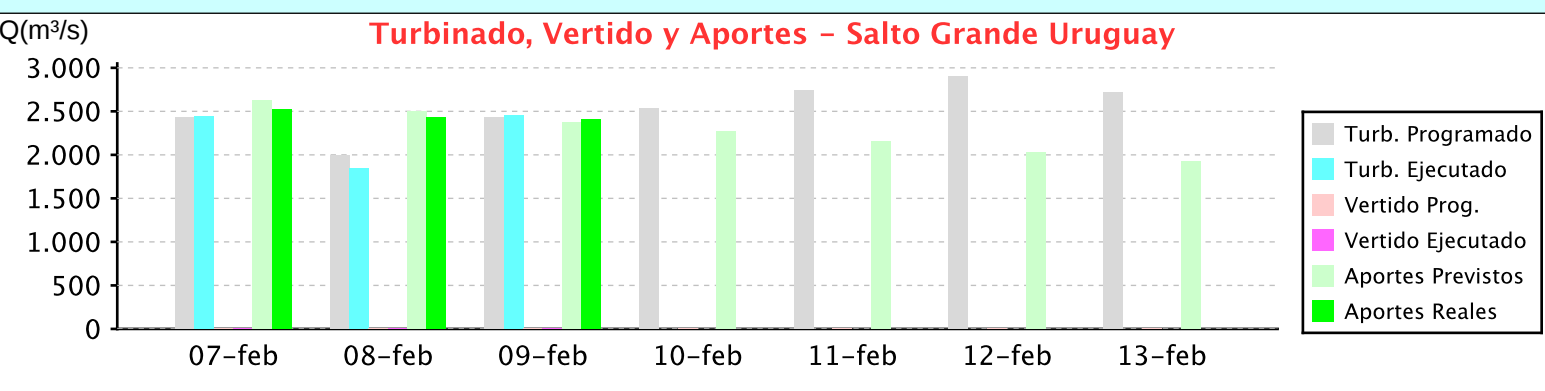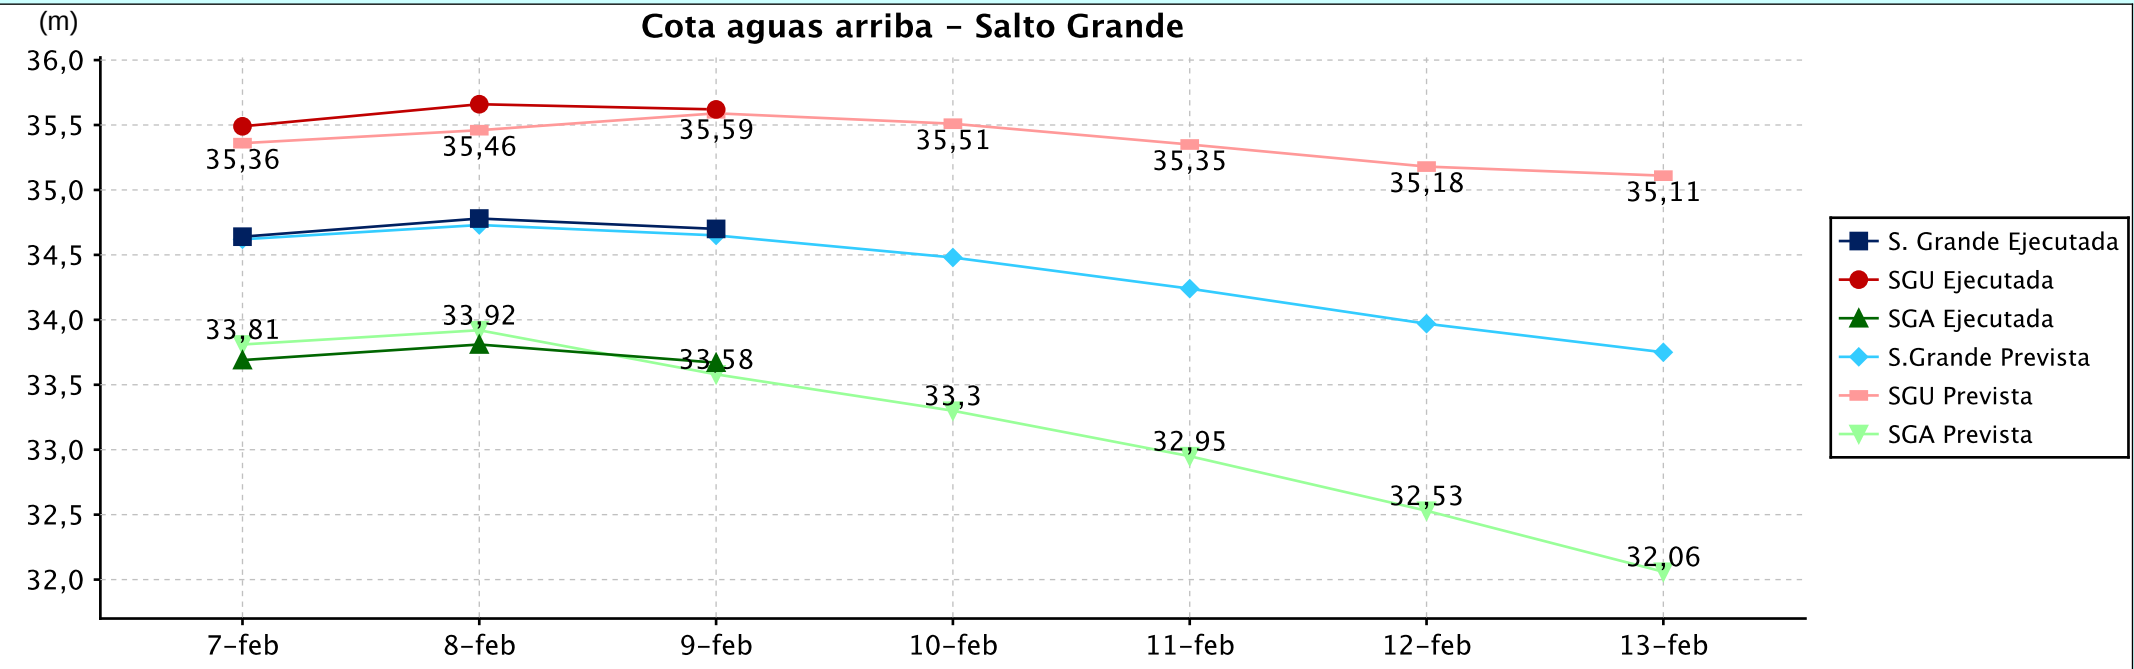

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,62
Cota Vista Arg	33,67
Cota real	34,70

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	44.110
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	667	640
Baygorria	727	550
Palmar	1.027	1.007
SGU	2.430	2.456

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-212
Baygorria	0	25
Palmar	0	175
SGU	2.375	2.404

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
