




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 10 de febrero de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.686
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.690
Central La Tablada	-49
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.042
C. Baygorria	1.612
C. Palmar	7.829
C. Salto Grande	13.485
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.255
TOTAL Generación	31.853

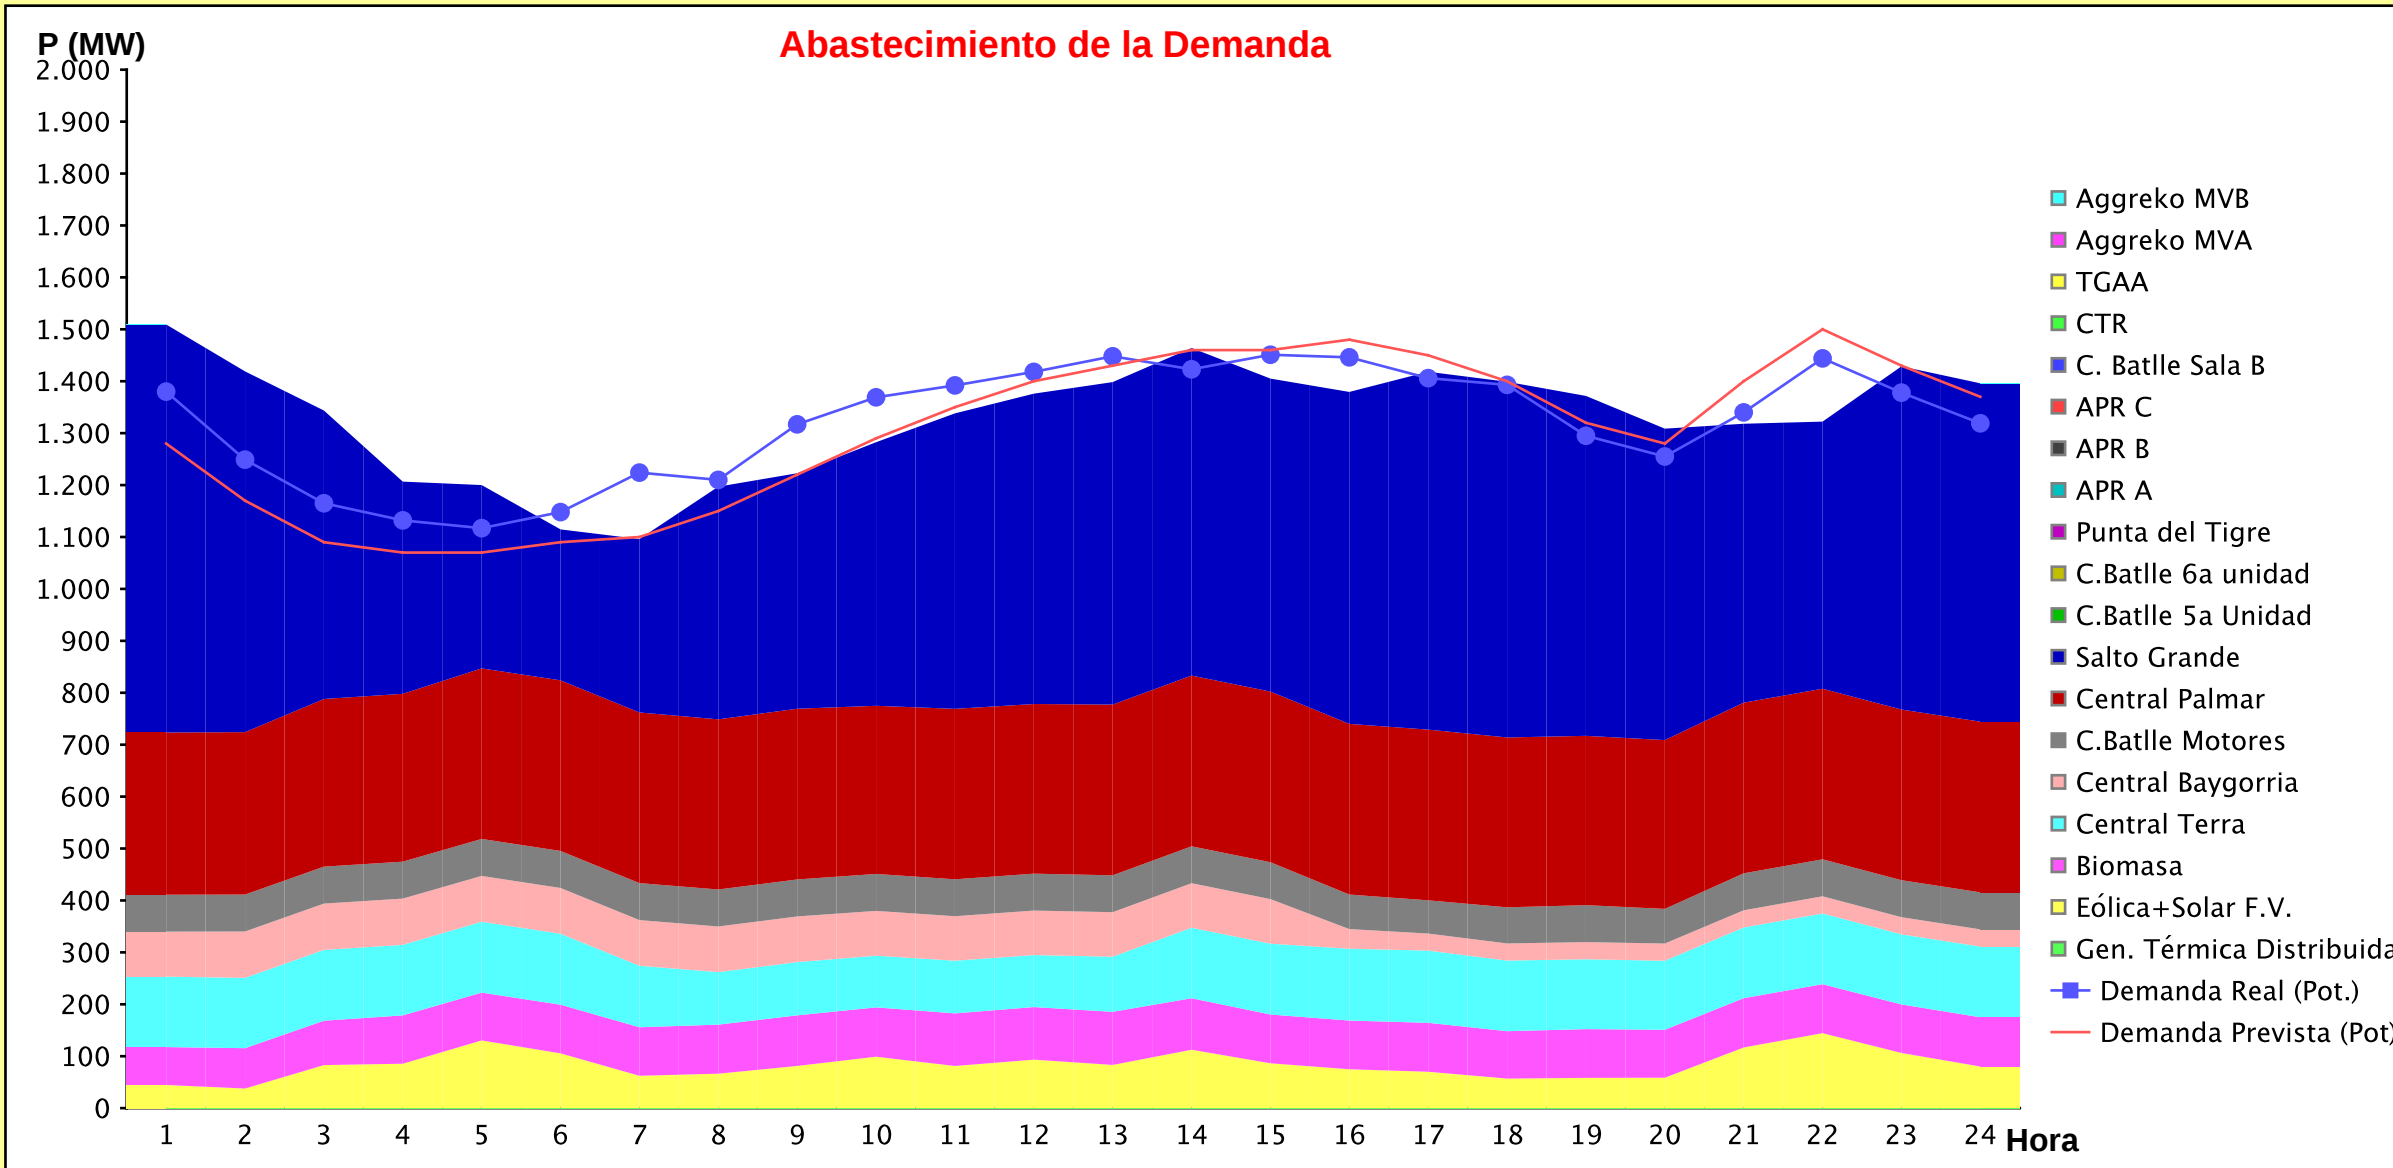

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.853
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.260
Diferencia (MWh)	593
Ejecutada - Programada	1,90 %

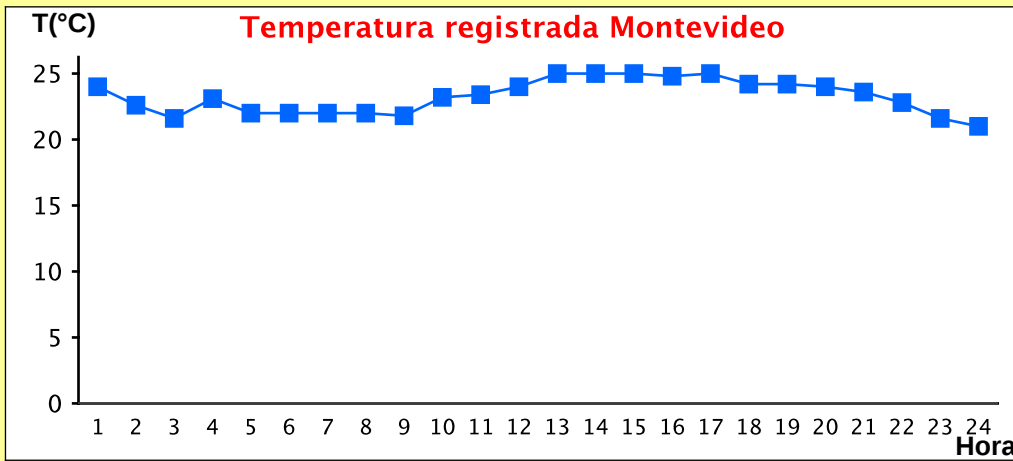



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1465,05 Hora 15:25
Potencia mínima:	1118,12 Hora 04:47
Pico noche:	1478,1 Hora 21:51

Generación Media (MW)	
Eólica	85,3
Biomasa	93,5
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

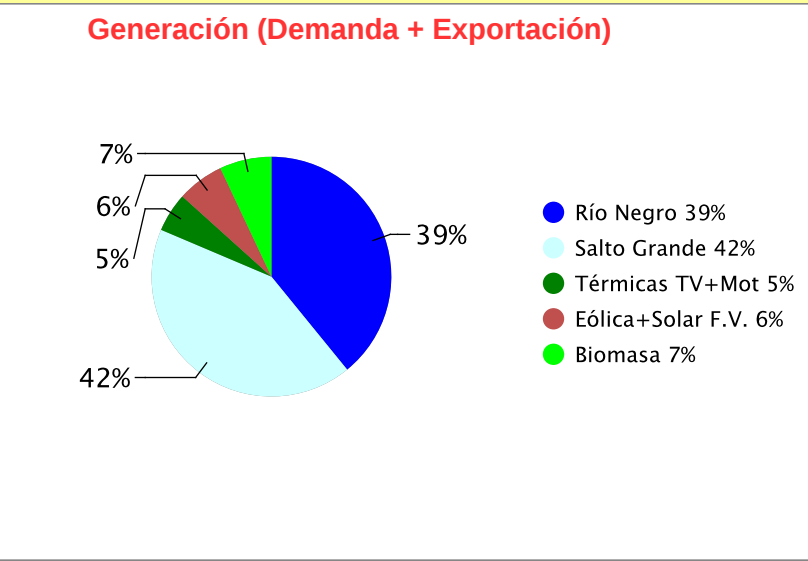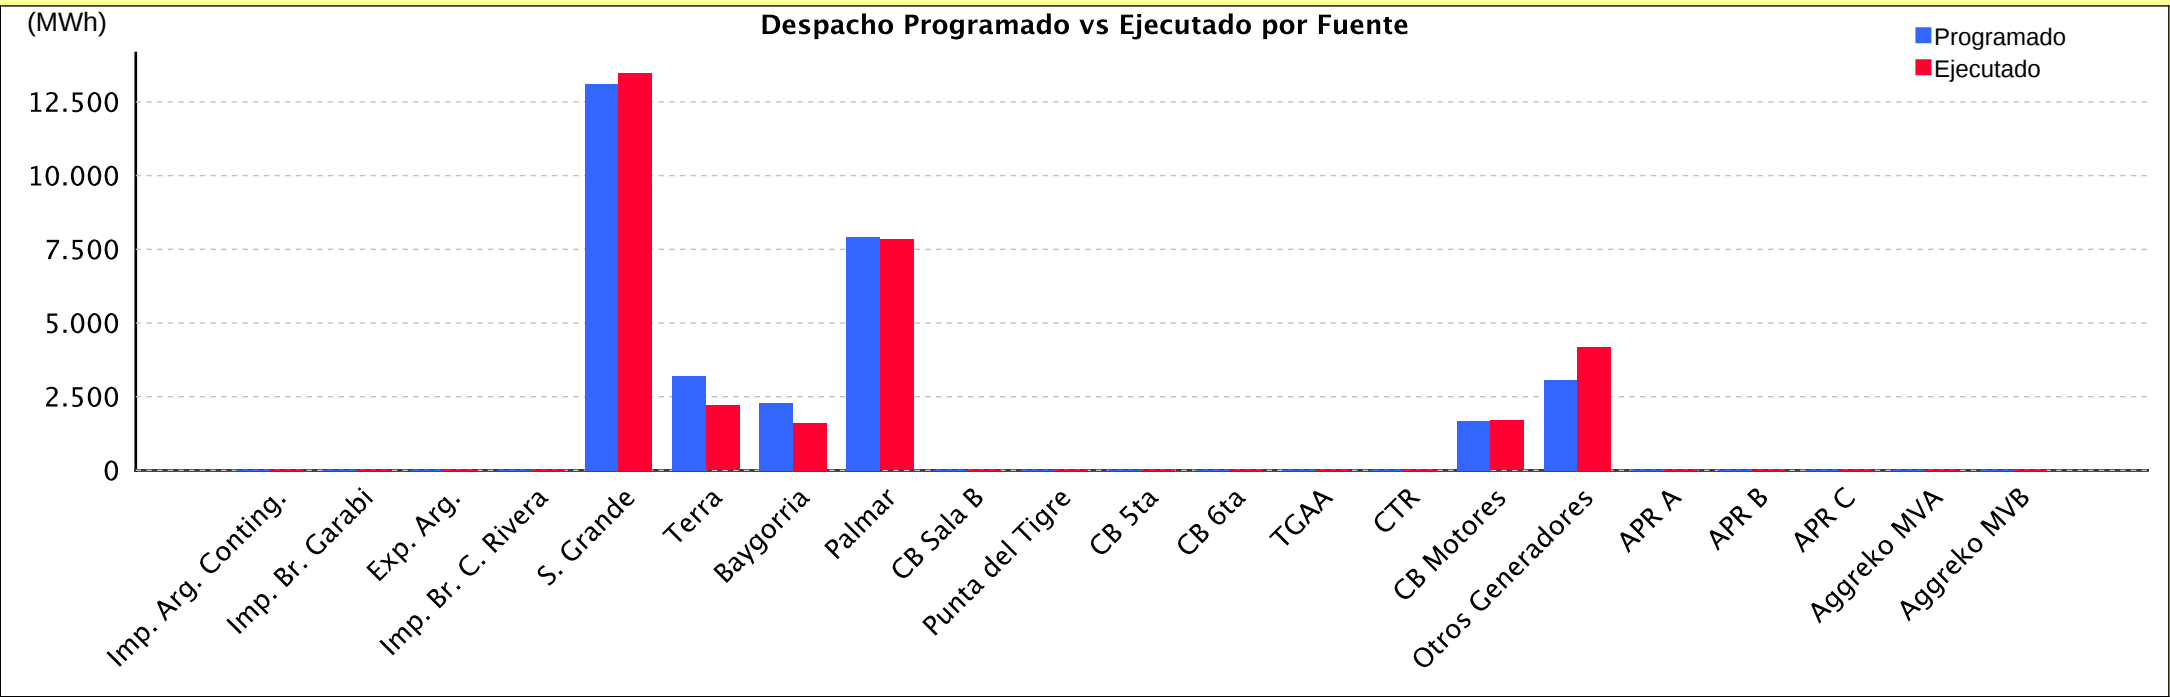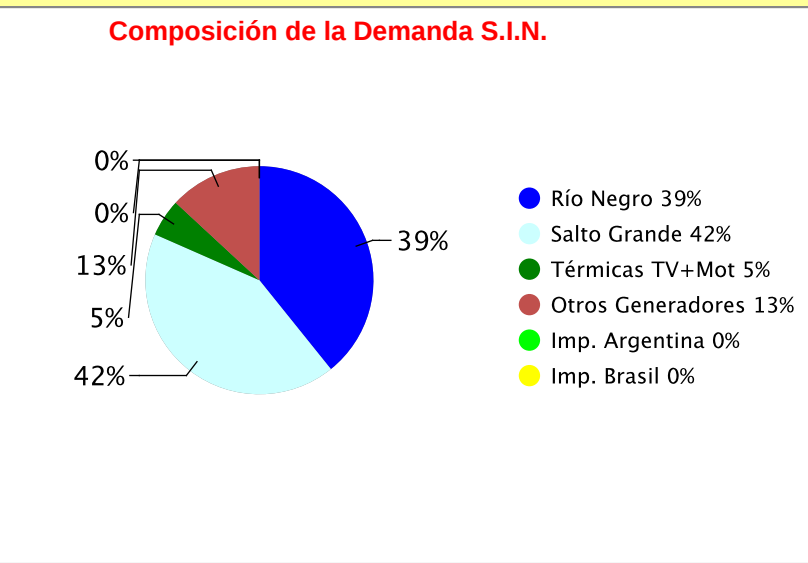



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

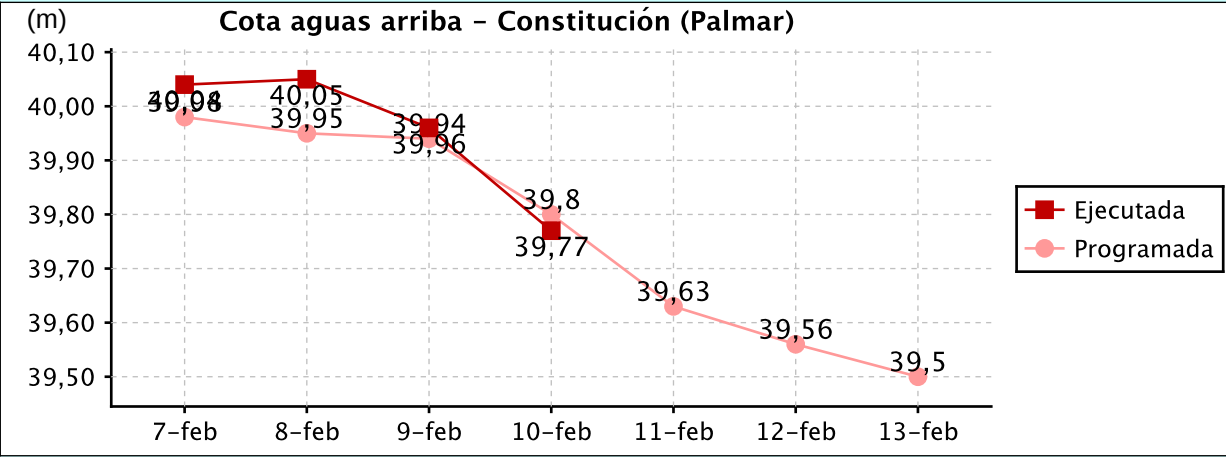
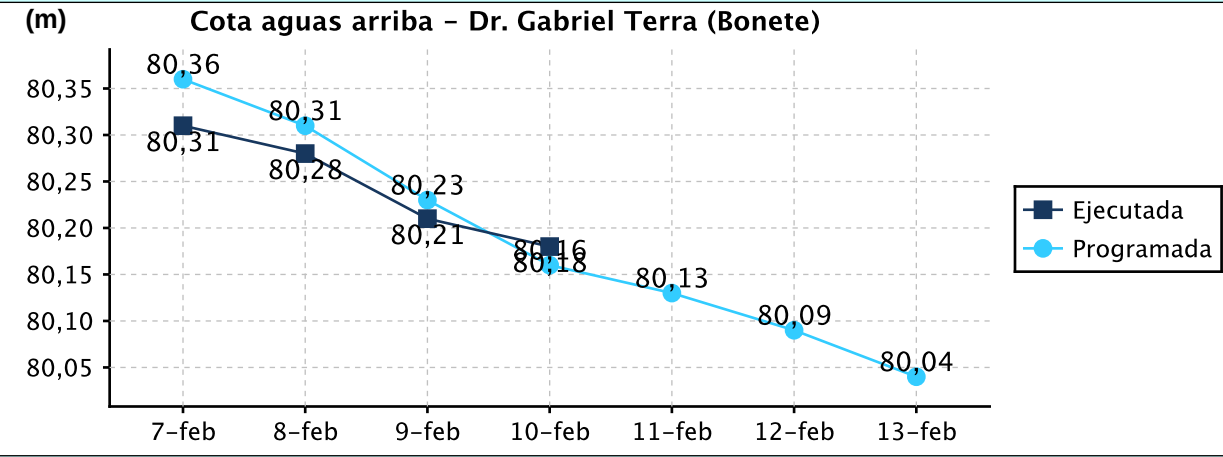


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,16	80,18
Baygorria	53,81	53,79
Palmar	39,80	39,77
SGU	35,54	35,63

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

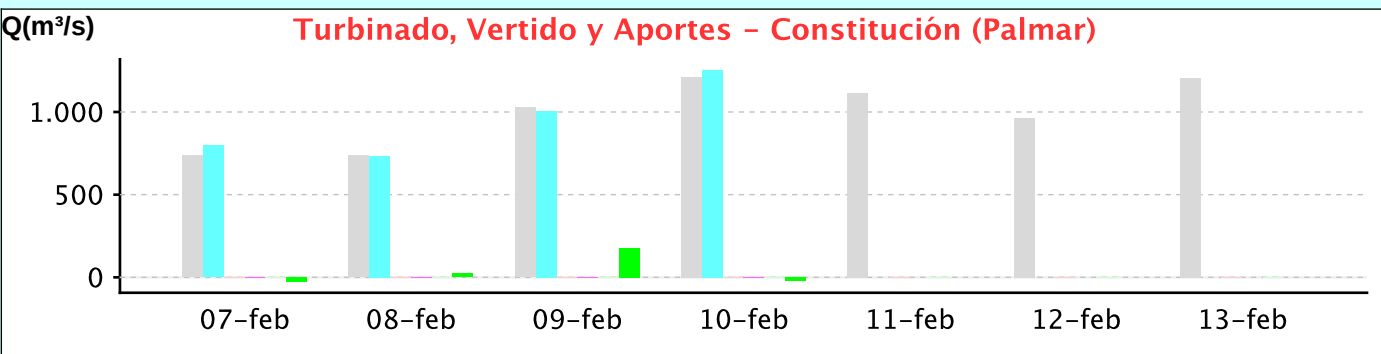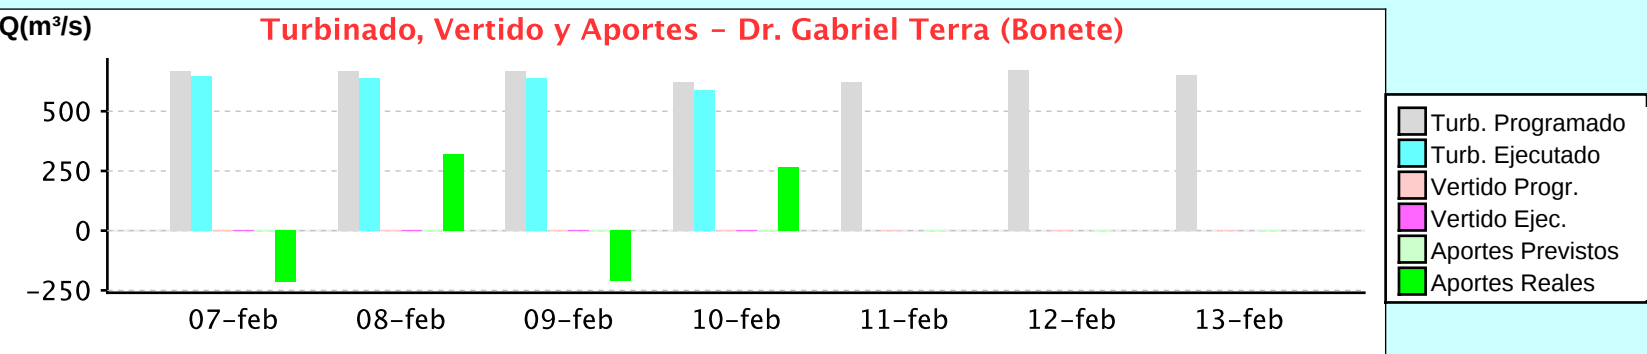

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

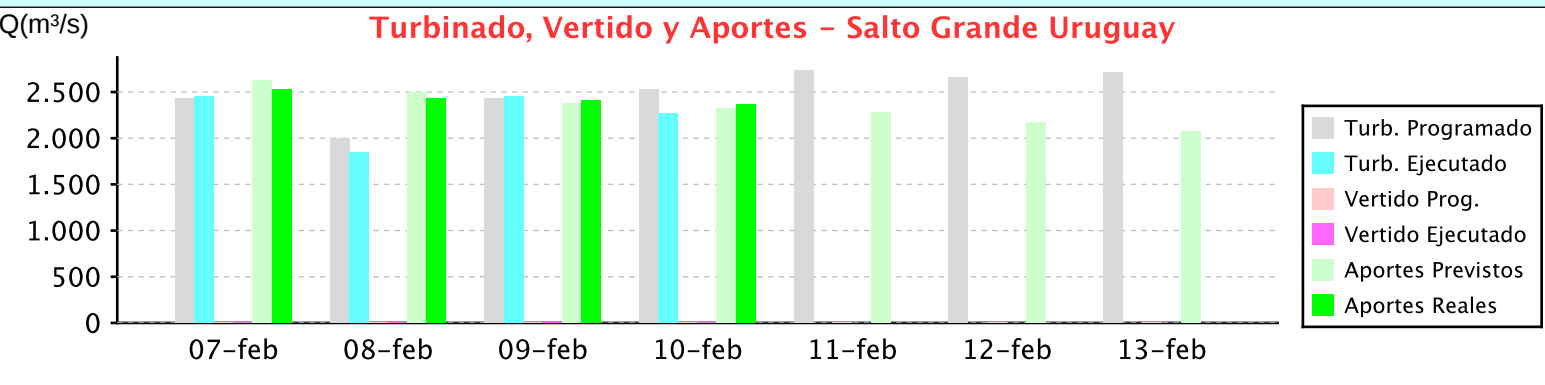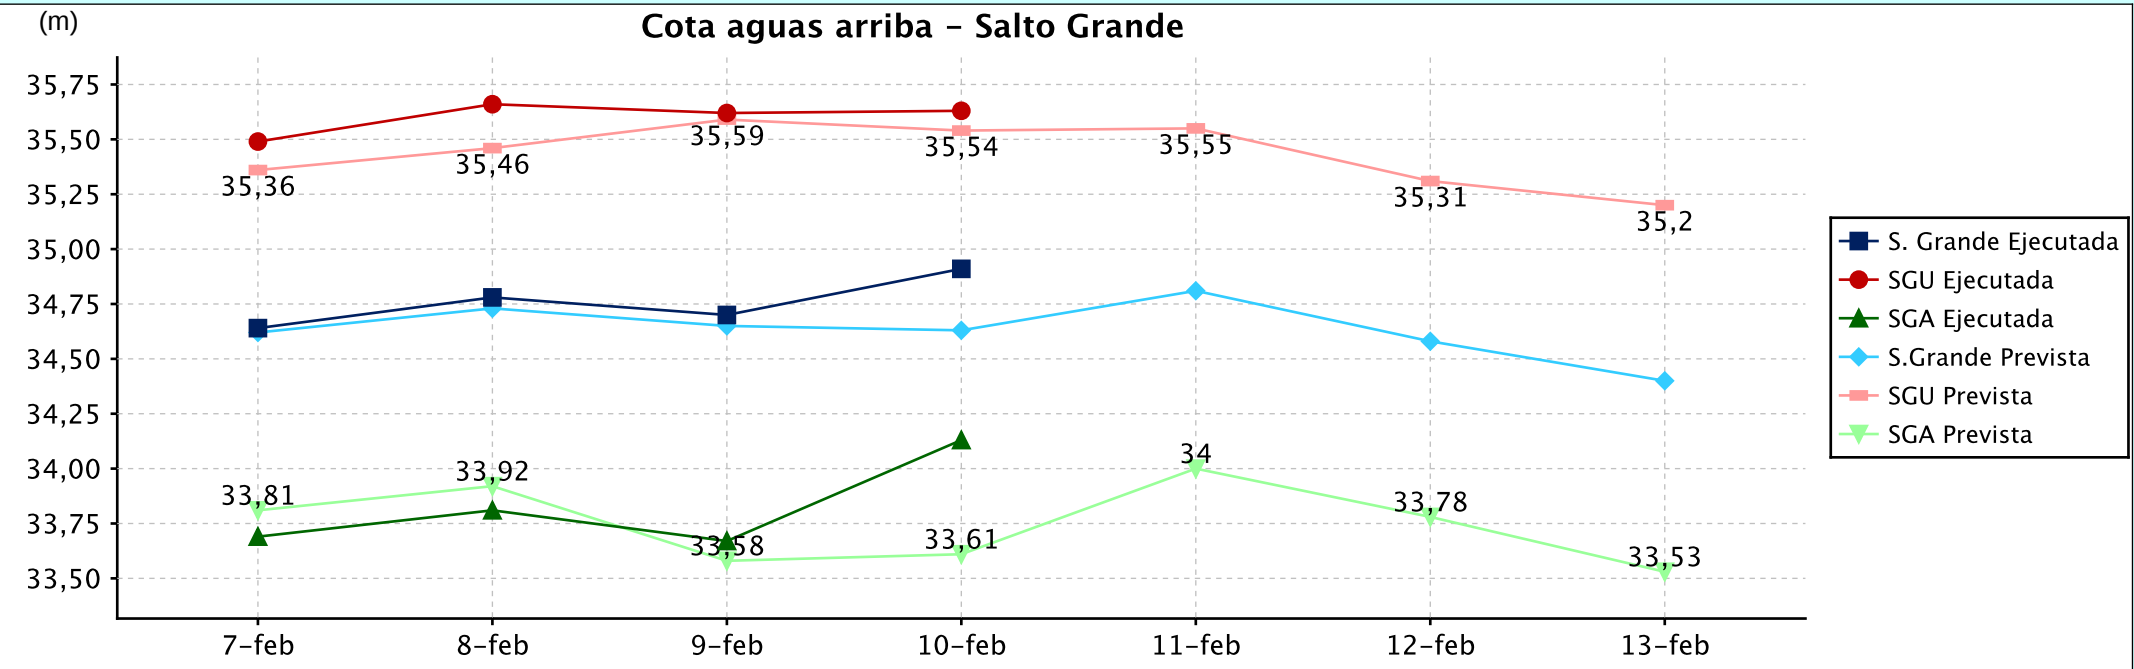

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,63
Cota Vista Arg	34,13
Cota real	34,91

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	34.864
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	621	586
Baygorria	861	598
Palmar	1.213	1.254
SGU	2.529	2.265

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	266
Baygorria	0	35
Palmar	0	-18
SGU	2.325	2.370

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
