



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 11 de febrero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	1.682
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.686
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	112
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.066
C. Baygorria	1.672
C. Palmar	7.325
C. Salto Grande	13.493
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.673
TOTAL Generación	30.974

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.974
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.785
Diferencia (MWh)	-811
Ejecutada - Programada	-2,55 %

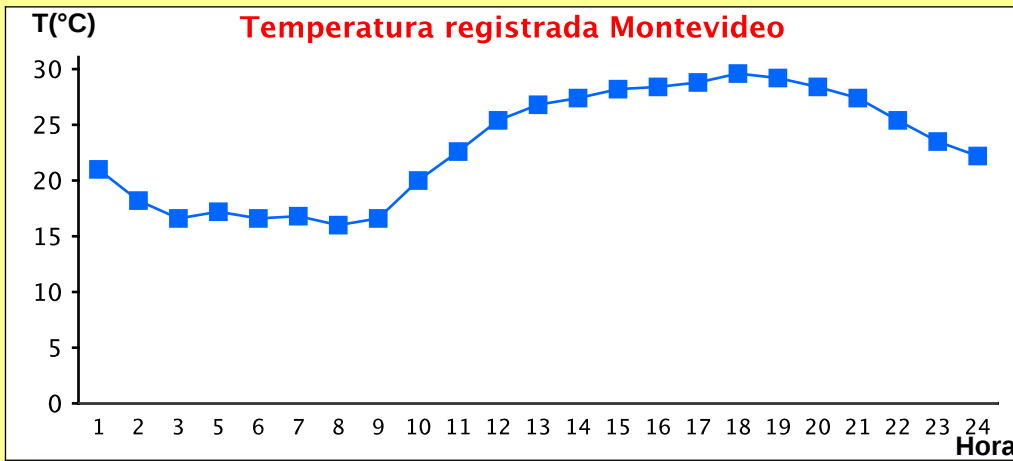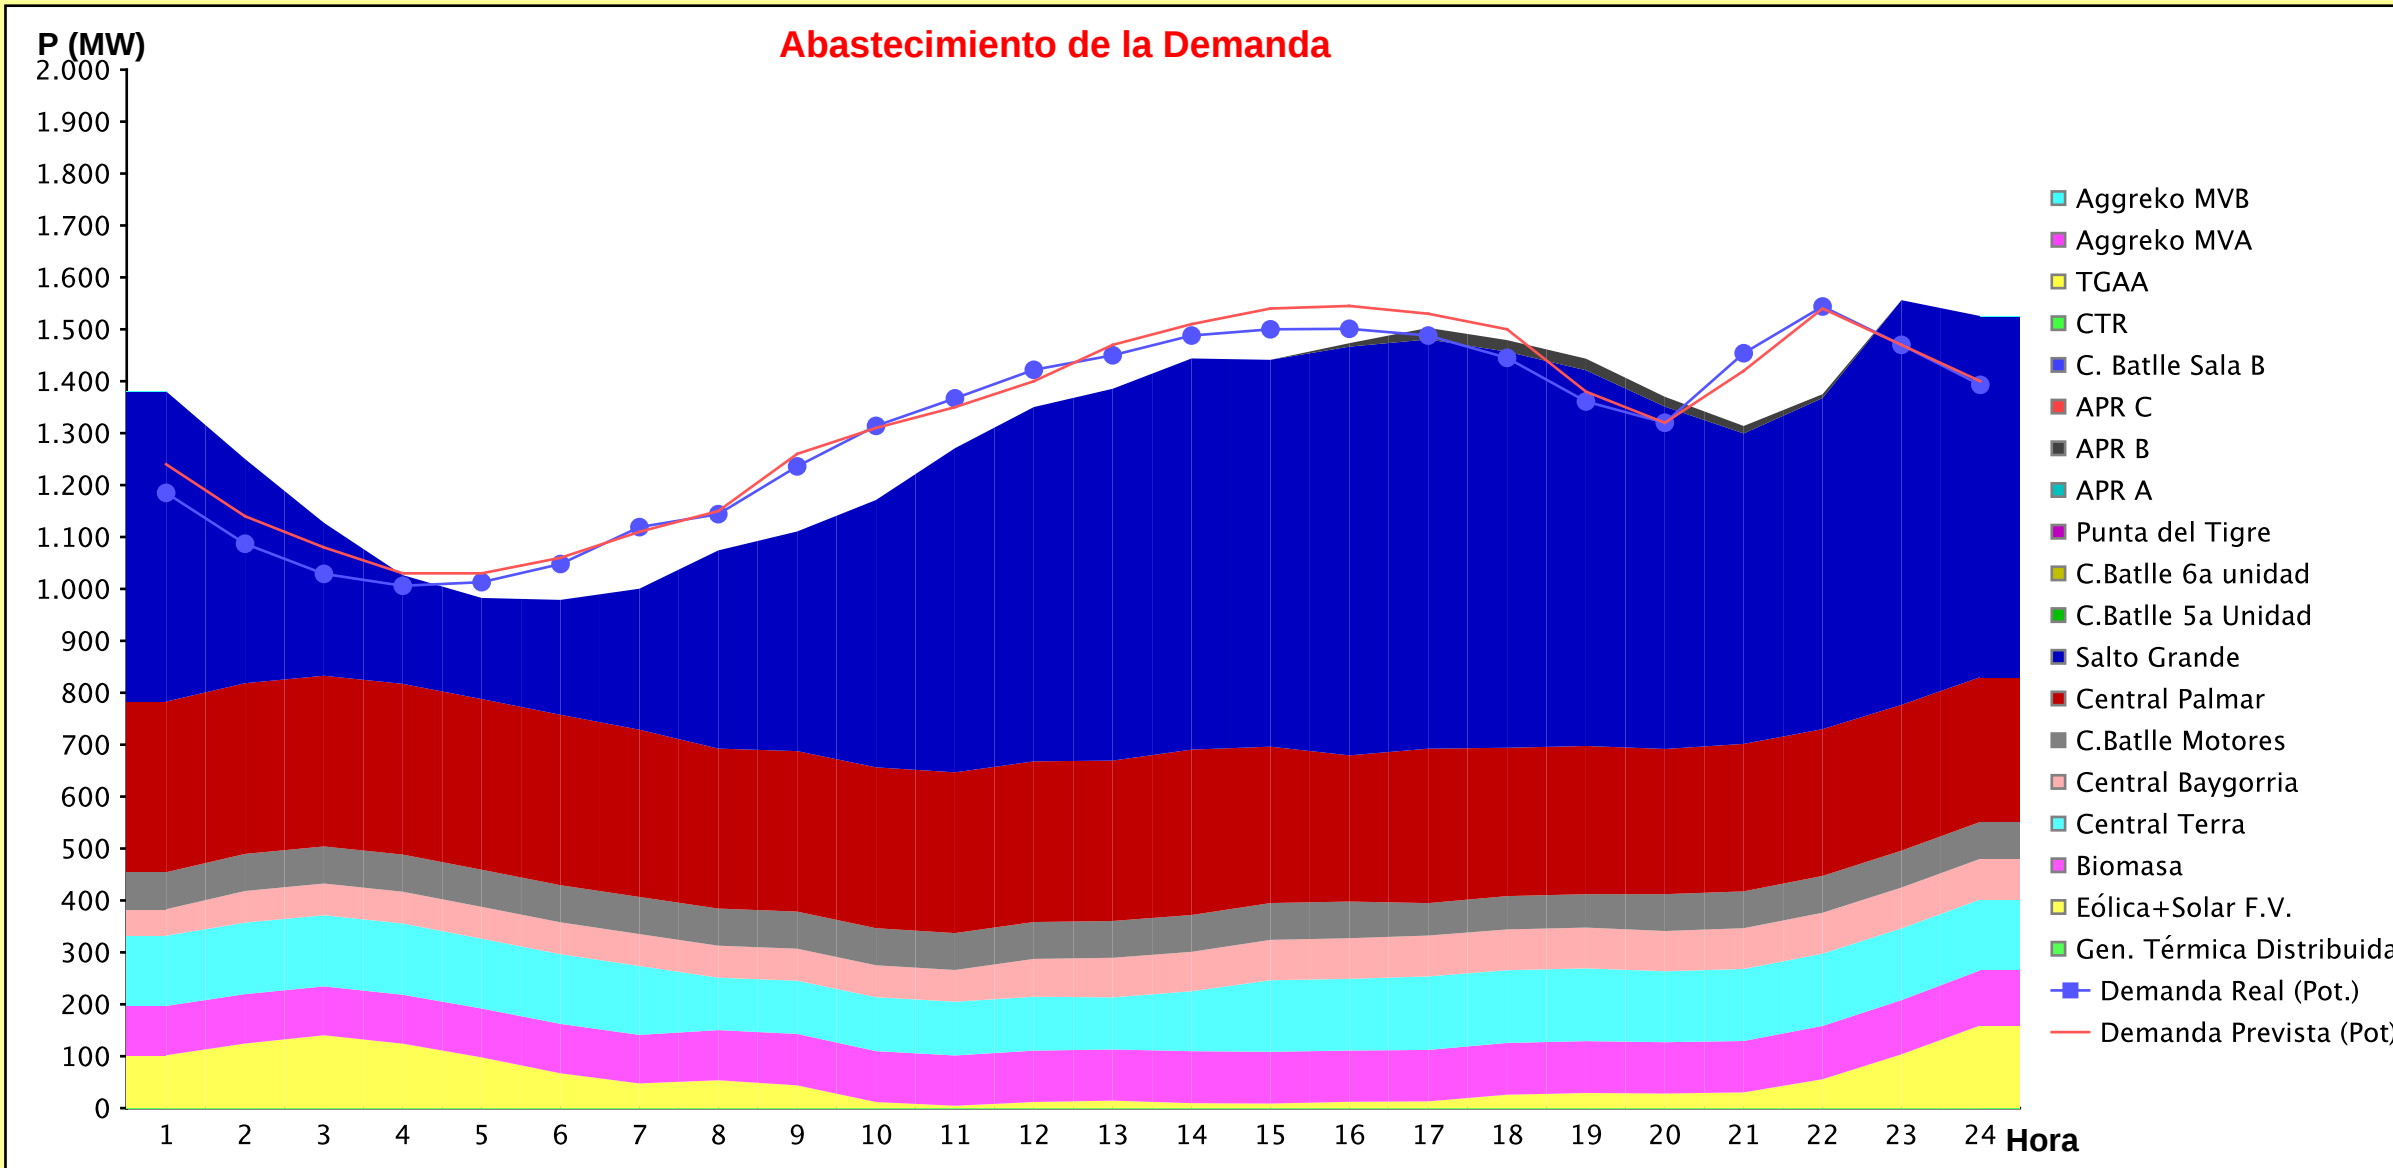



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1507,86 Hora 15:27
Potencia mínima:	994,02 Hora 04:45
Pico noche:	1568,57 Hora 21:44

Generación Media (MW)	
Eólica	56,3
Biomasa	98,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

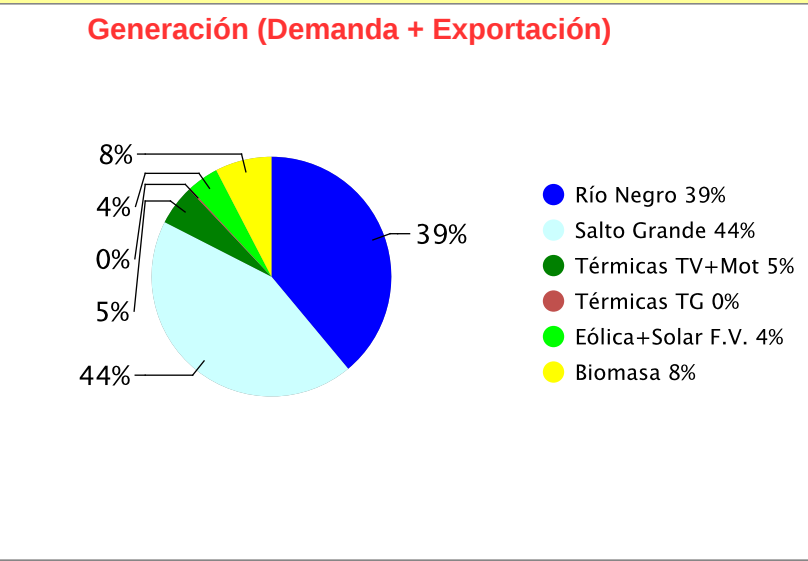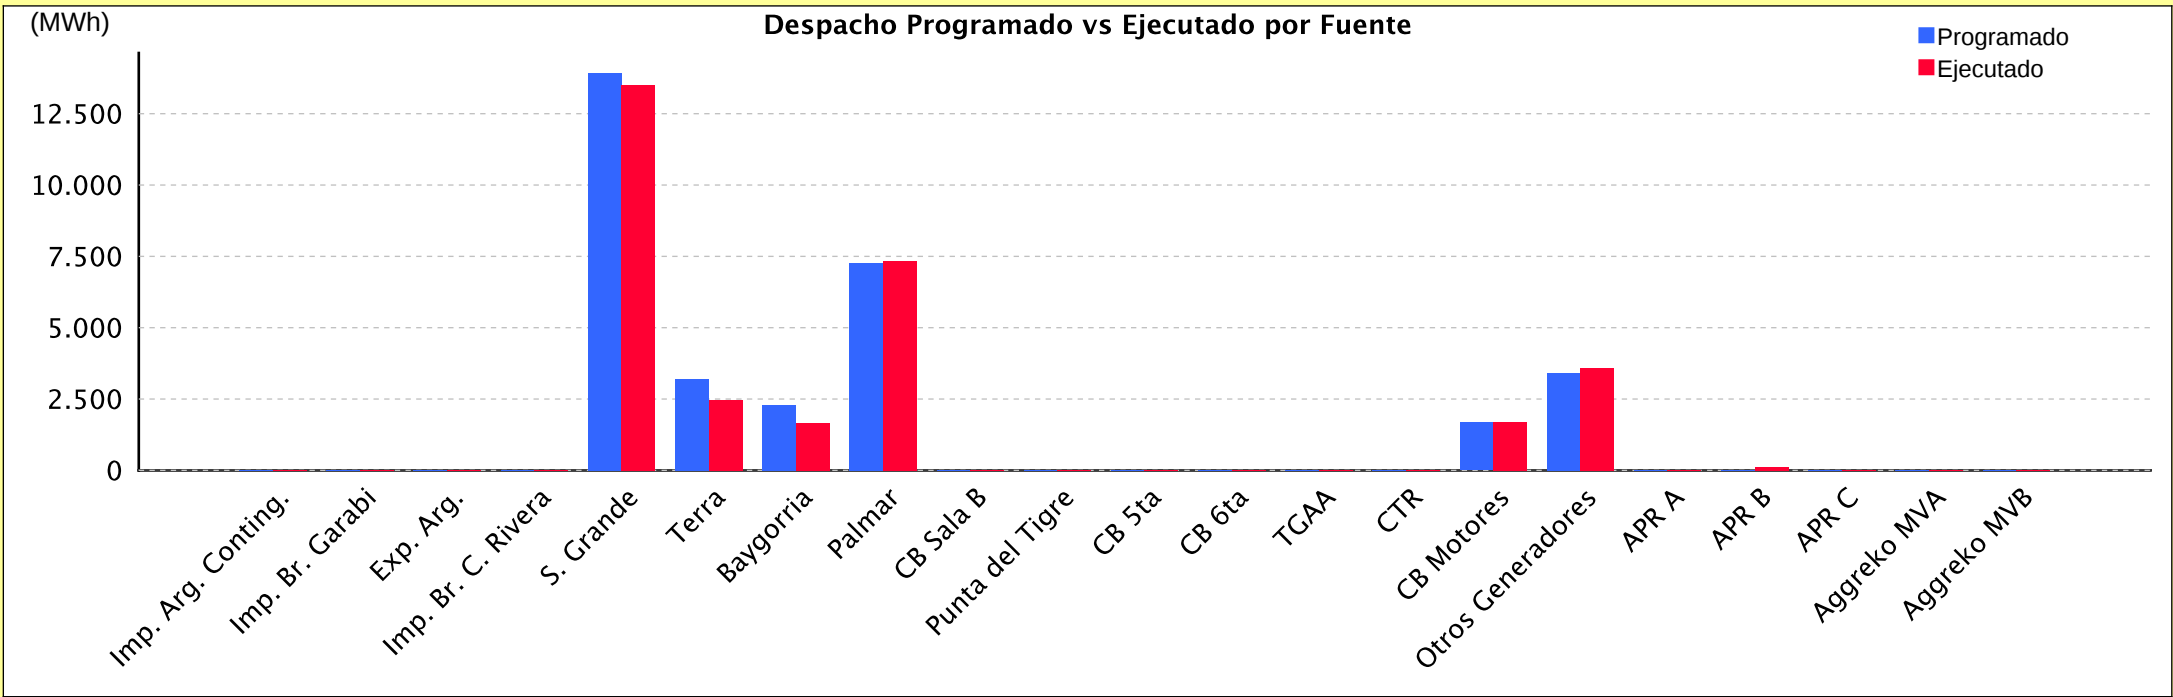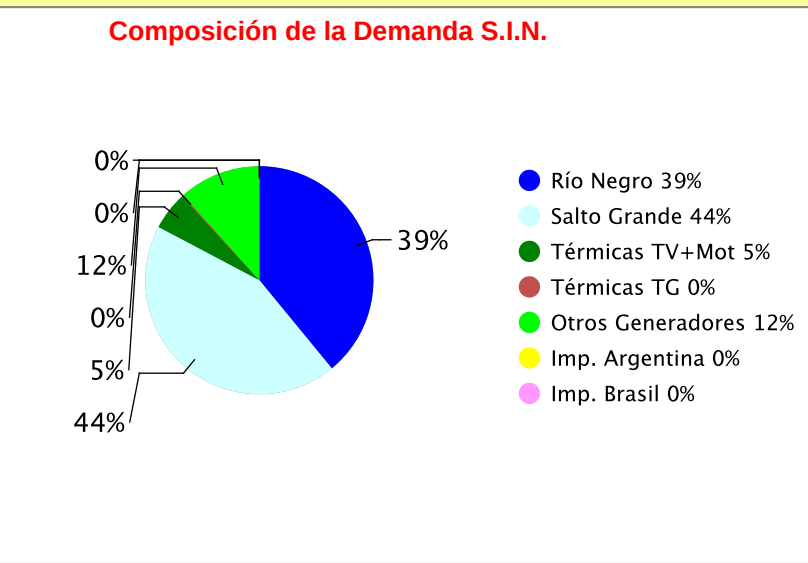



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

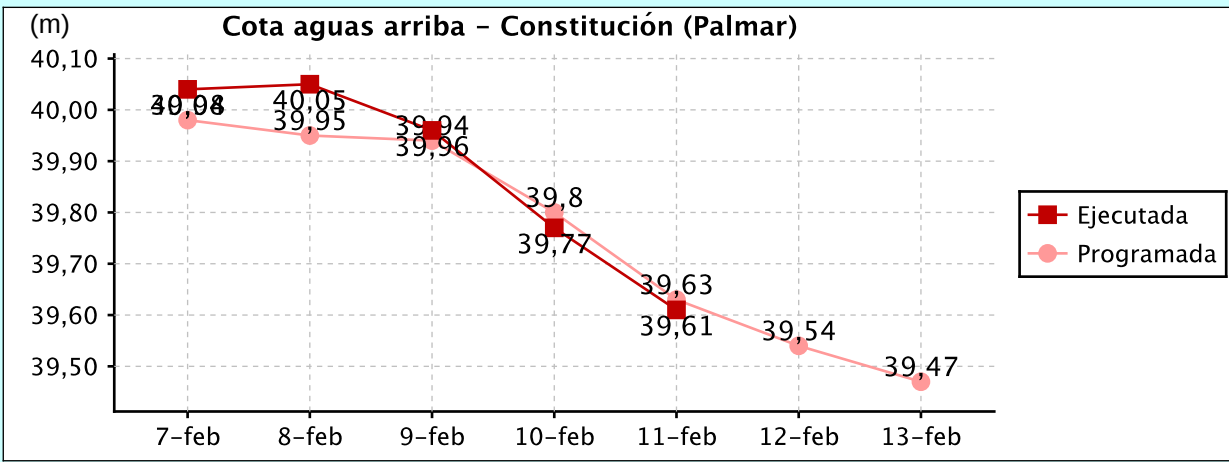
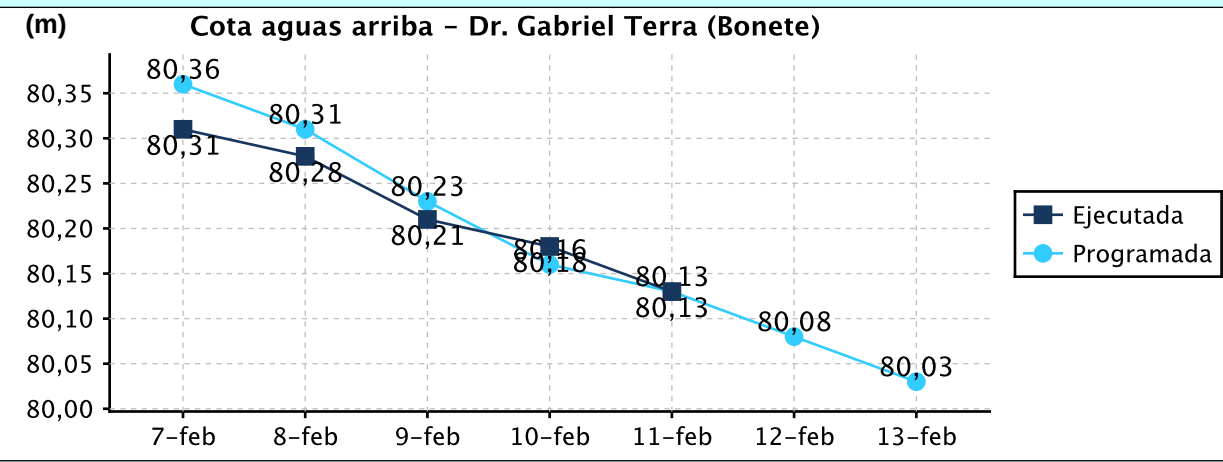


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,13	80,13
Baygorria	53,81	53,78
Palmar	39,63	39,61
SGU	35,55	35,56

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

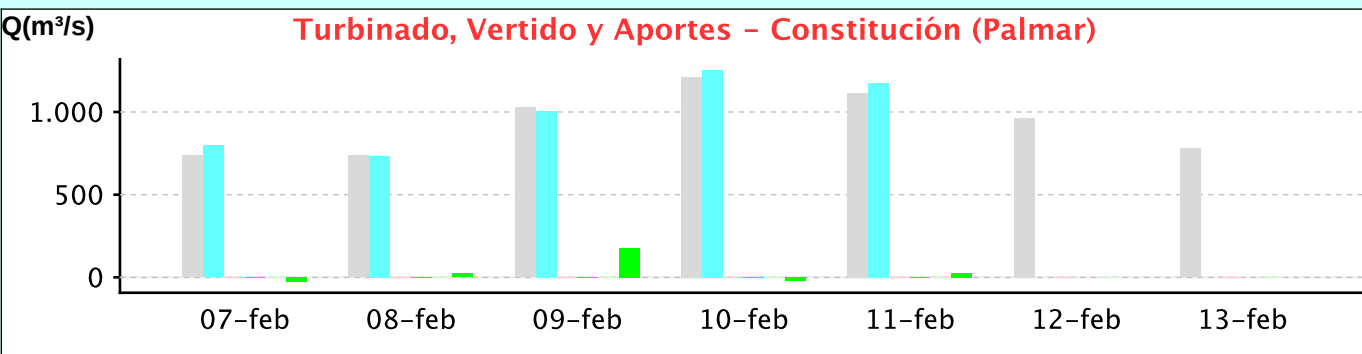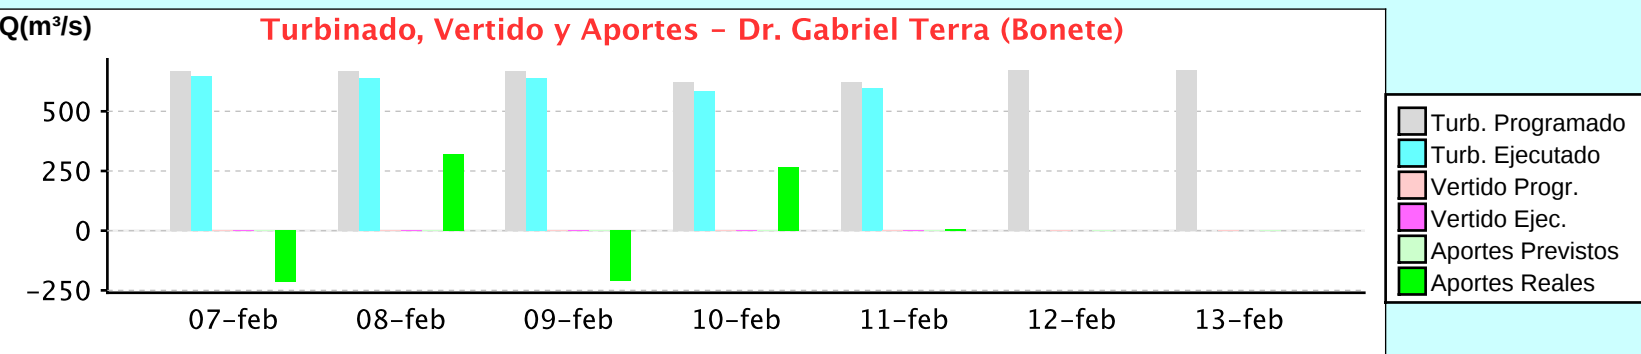

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

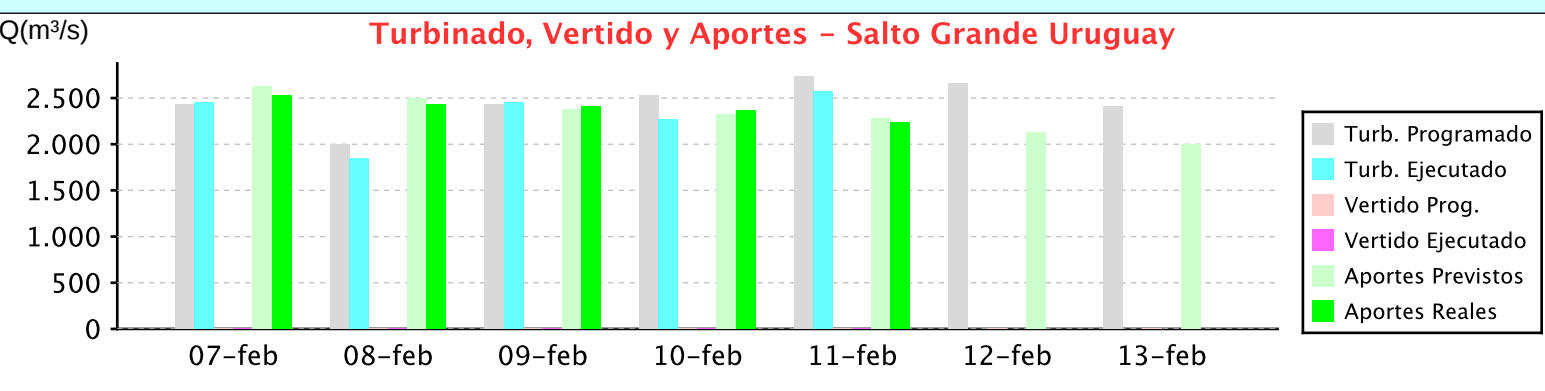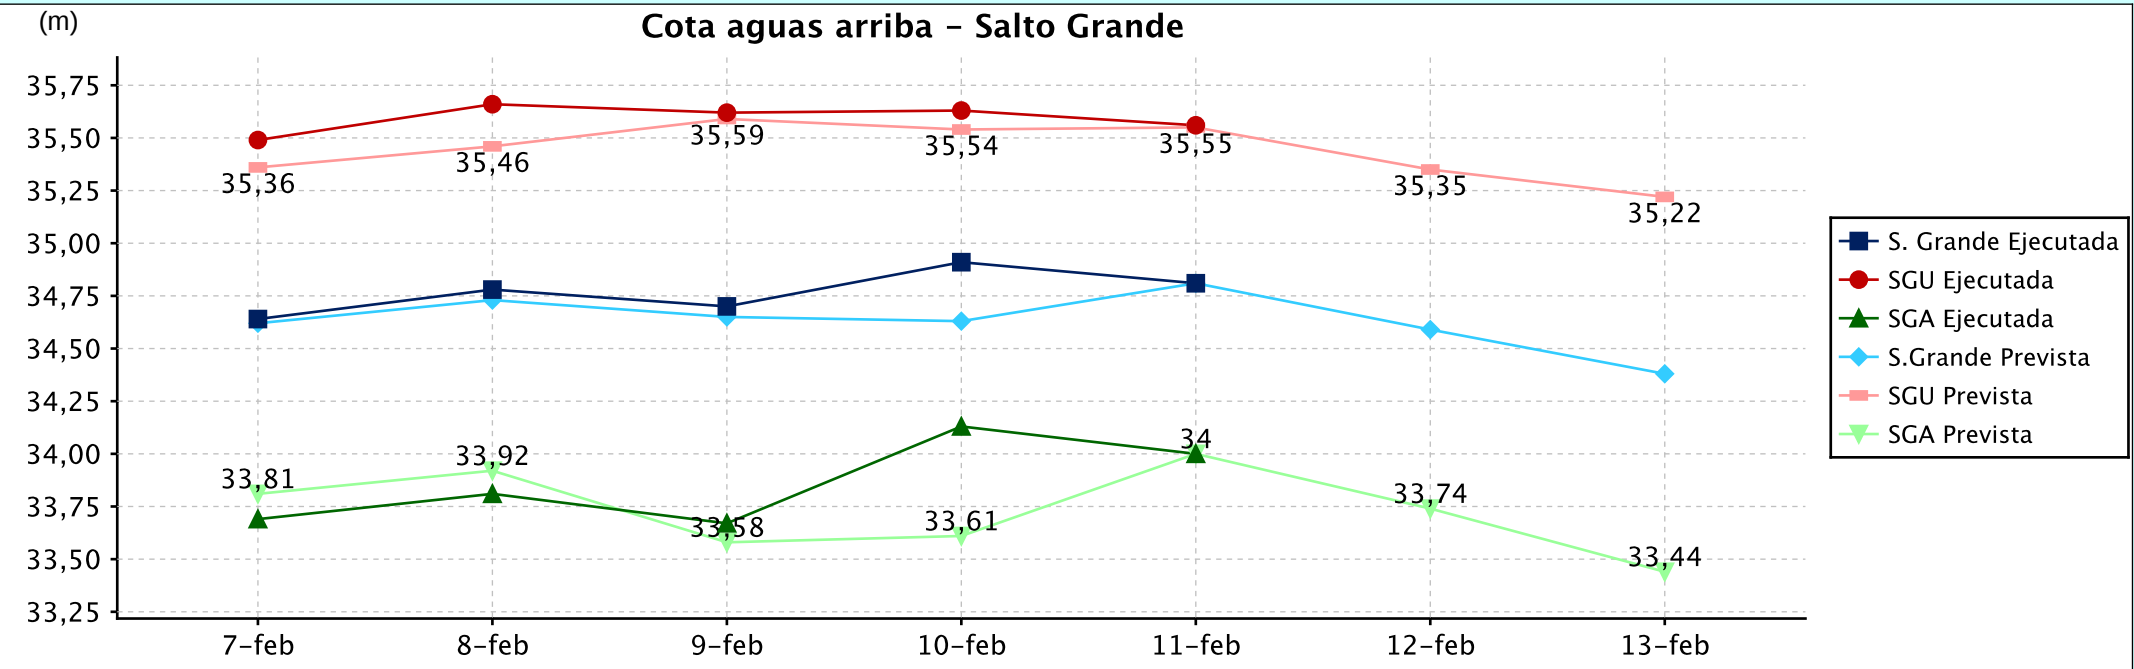

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,56
Cota Vista Arg	34,00
Cota real	34,81

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	35.731
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	621	595
Baygorria	861	589
Palmar	1.114	1.175
SGU	2.738	2.571

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	8
Baygorria	0	-6
Palmar	0	26
SGU	2.275	2.233

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
