



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 15 de febrero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	1.687
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	11
Motores	1.679
Central La Tablada	-96
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-3
APR C	220
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.281
C. Baygorria	1.928
C. Palmar	5.025
C. Salto Grande	3.817
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	9.053
TOTAL Generación	24.906

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.906
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.320
Diferencia (MWh)	-414
Ejecutada - Programada	-1,63 %

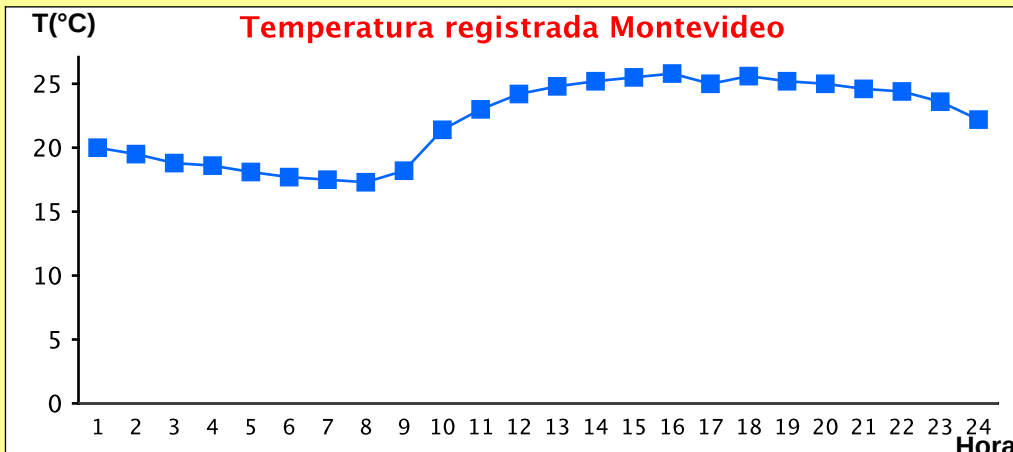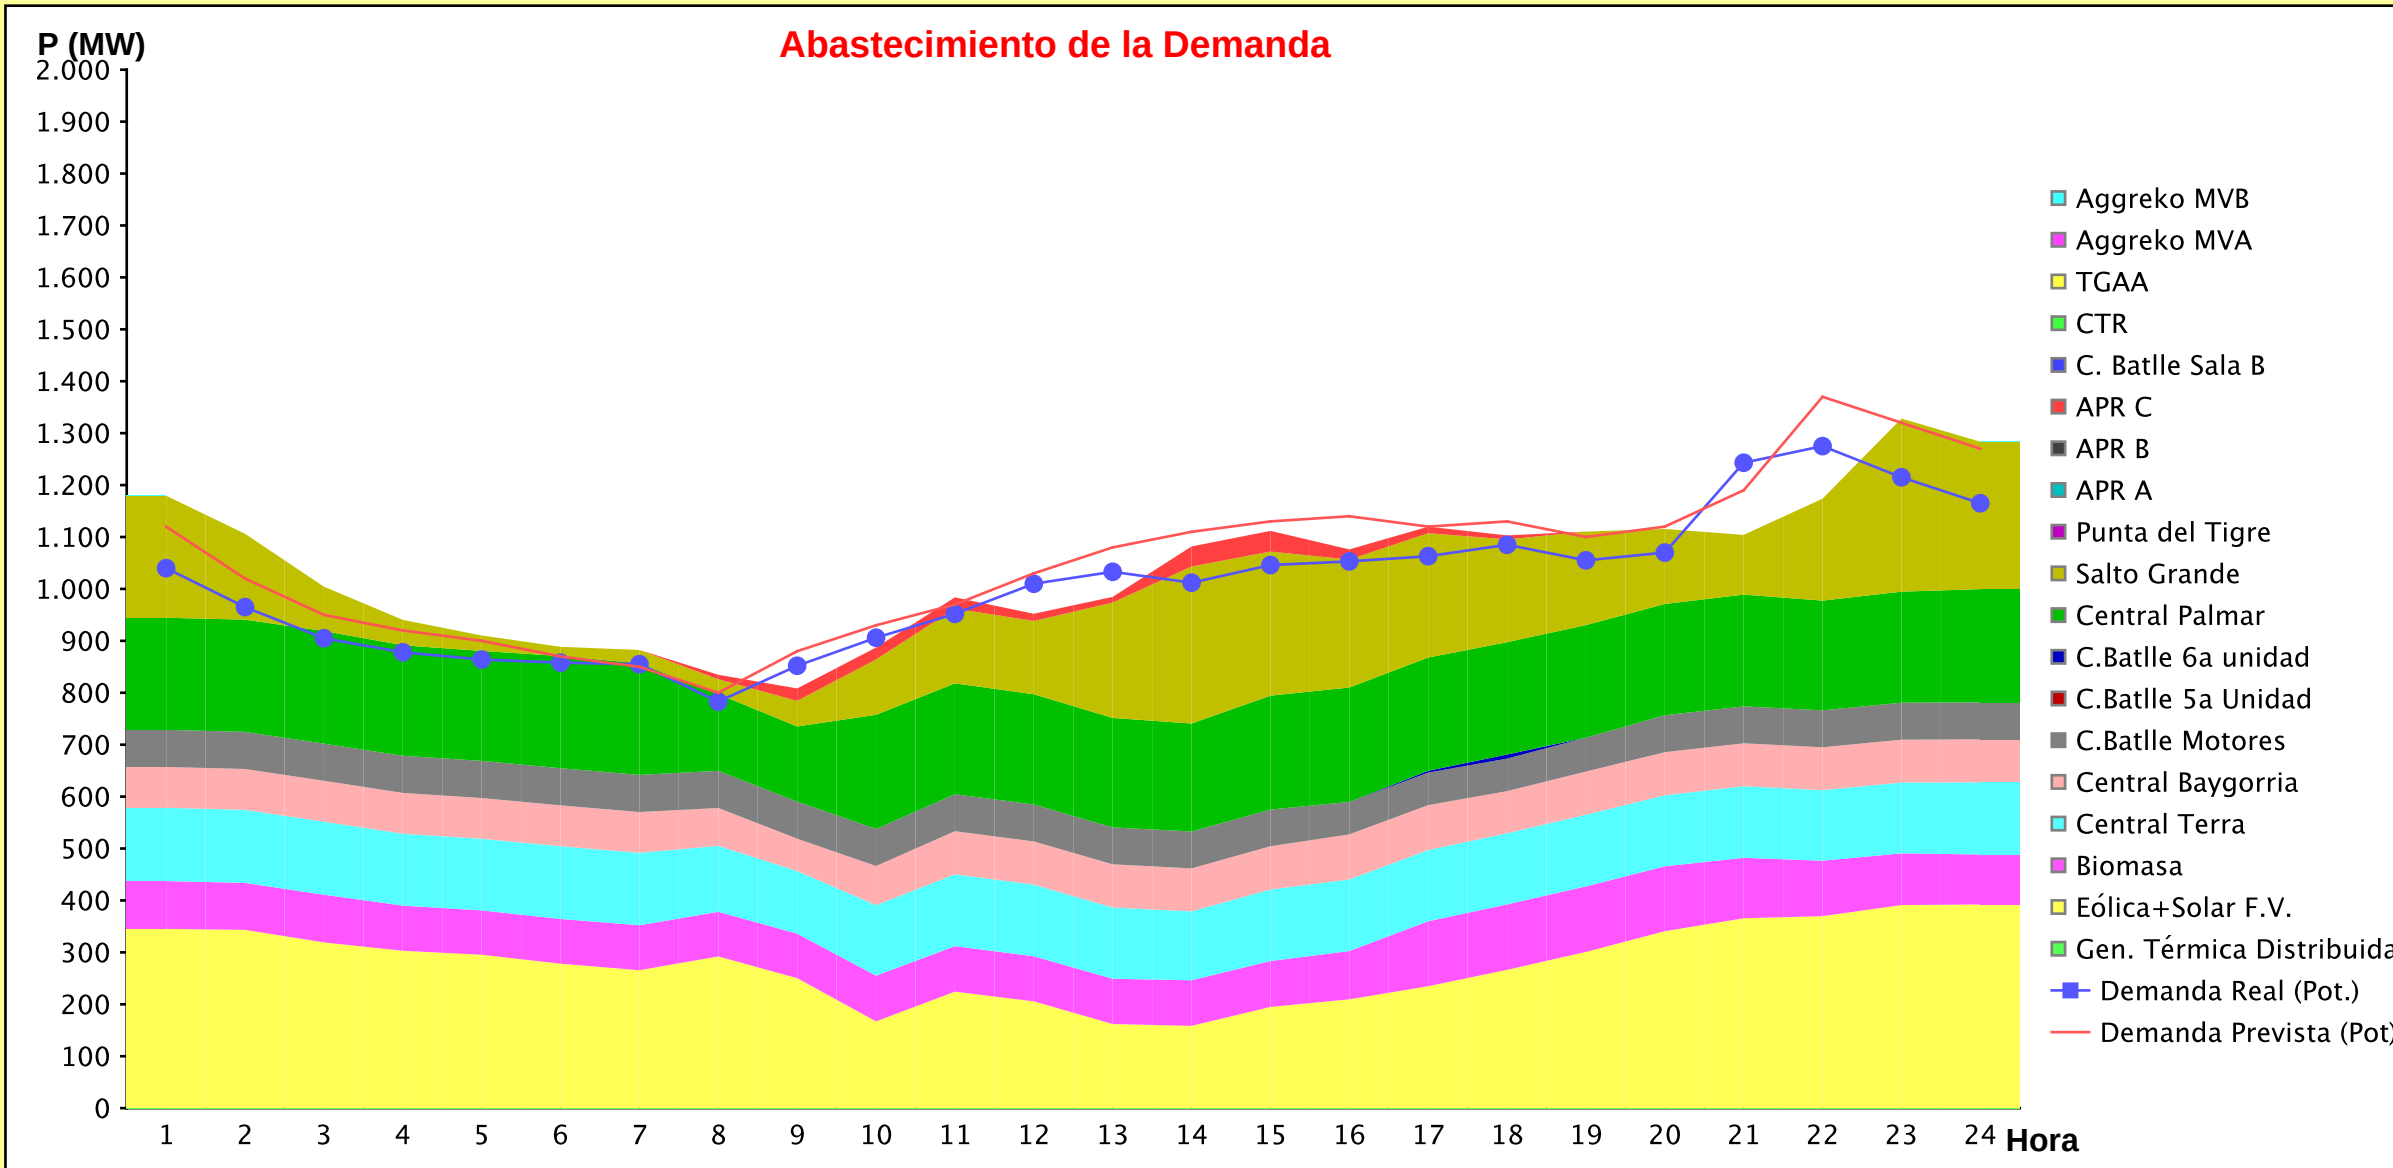



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1080,42 Hora 16:56
Potencia mínima:	793,94 Hora 07:38
Pico noche:	1322,1 Hora 21:38

Generación Media (MW)	
Eólica	278,5
Biomasa	97,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

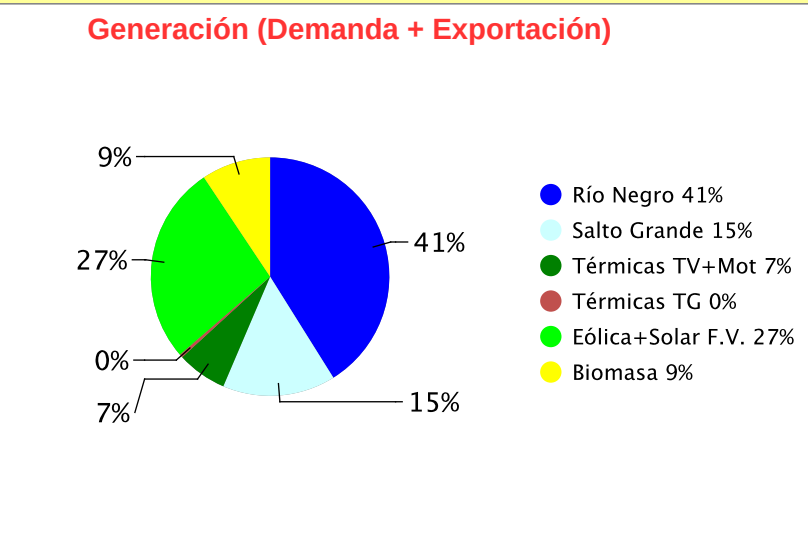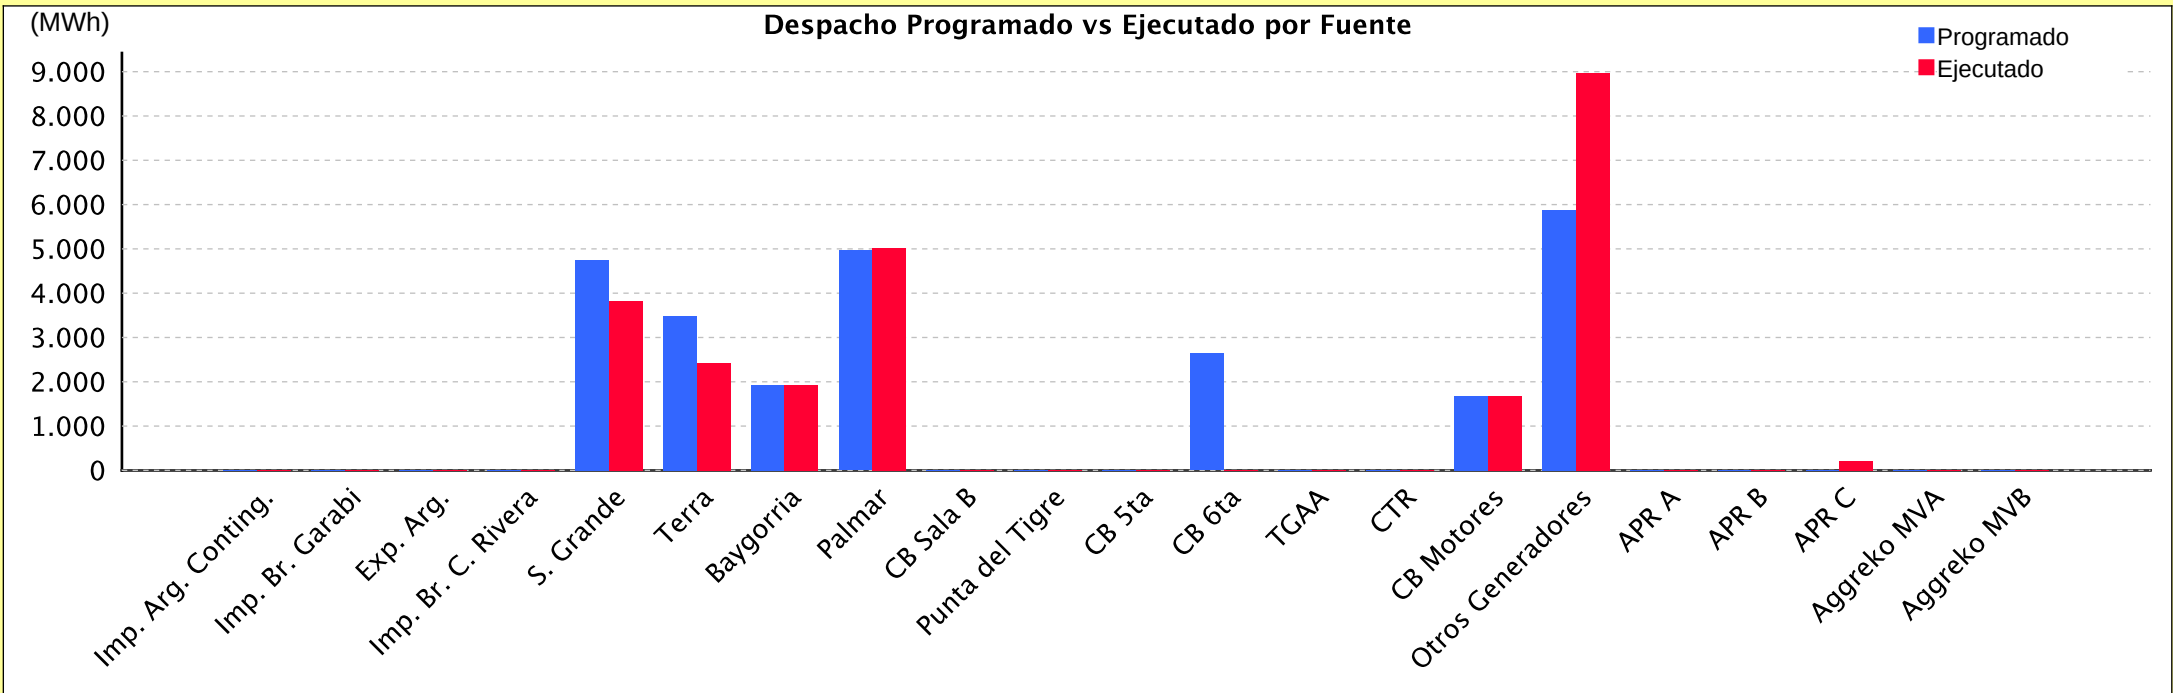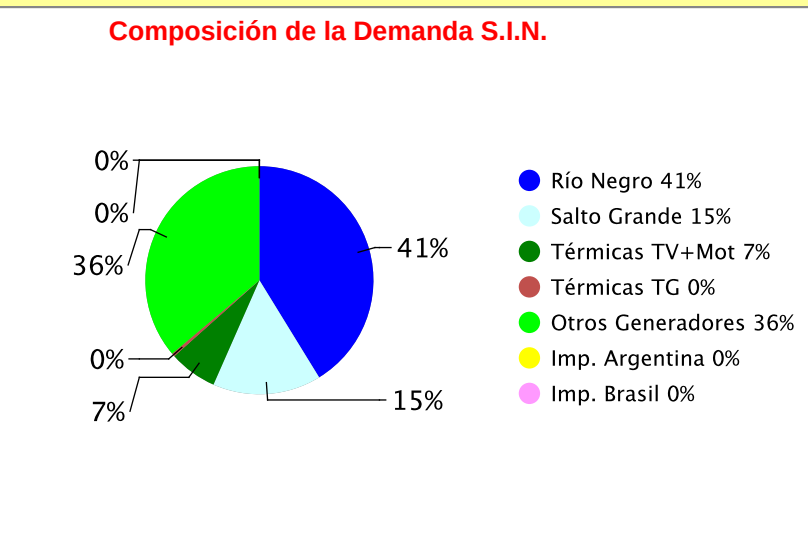



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

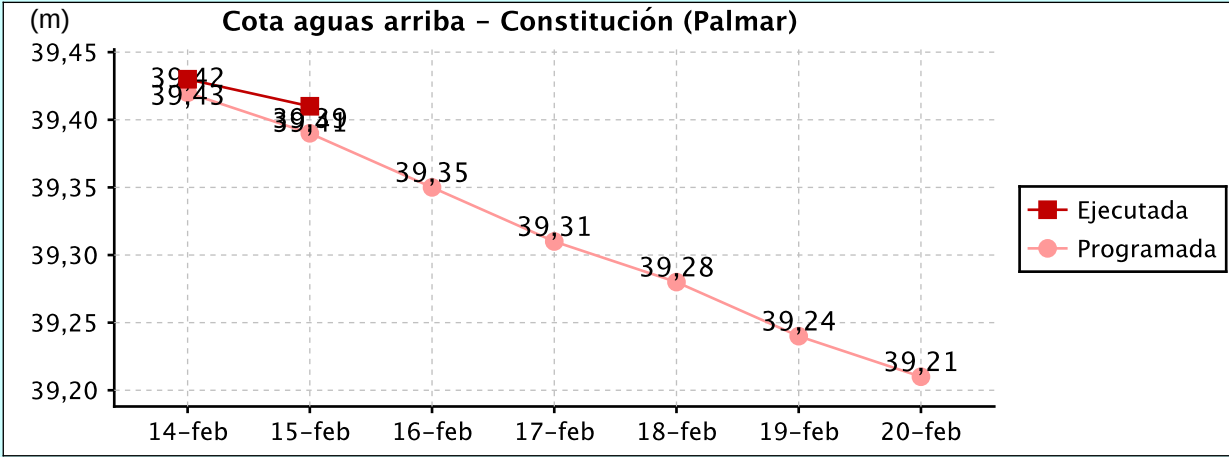
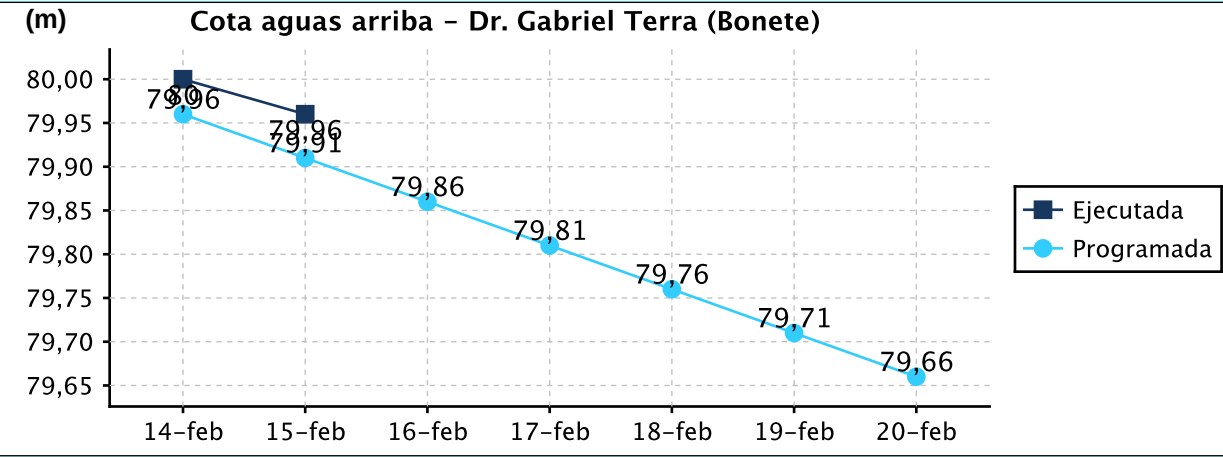


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,91	79,96
Baygorria	53,78	53,78
Palmar	39,39	39,41
SGU	35,59	35,93

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

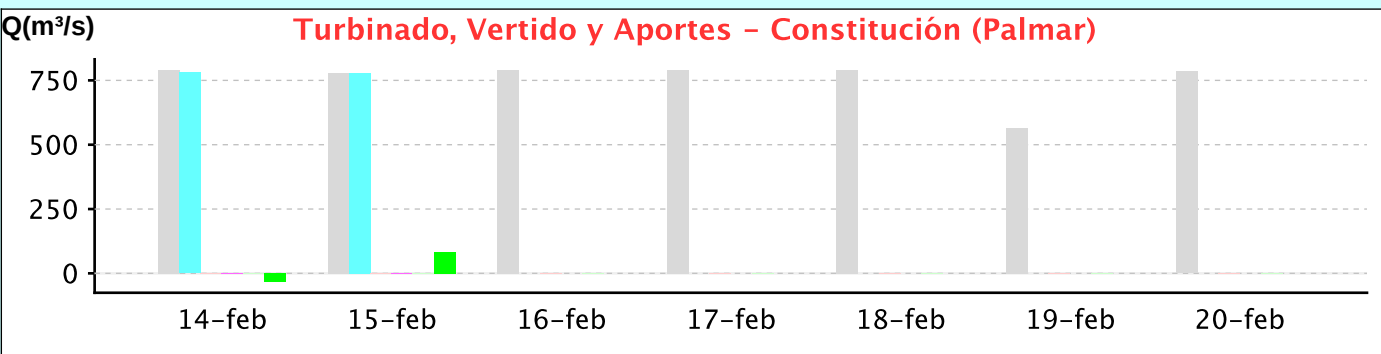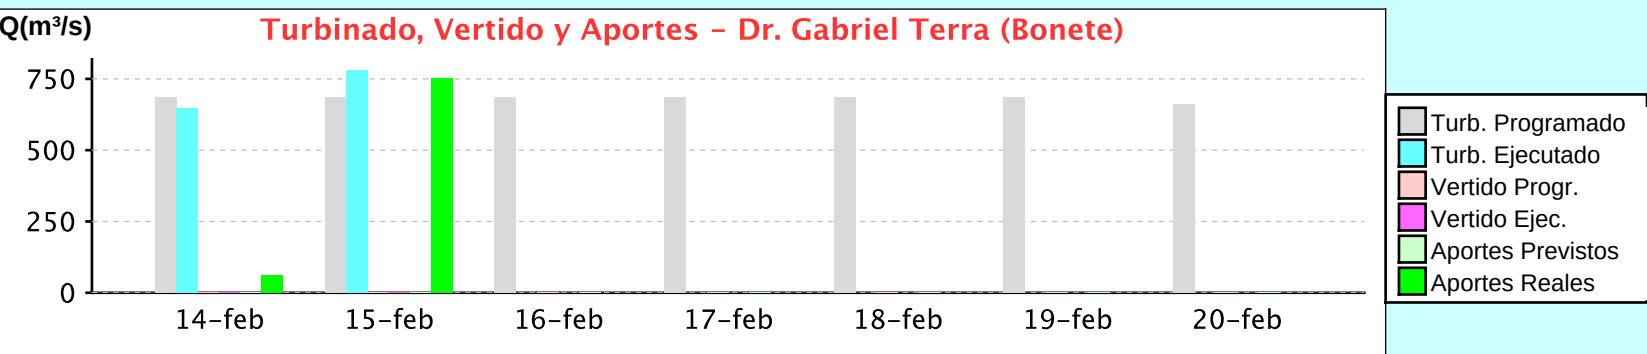

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

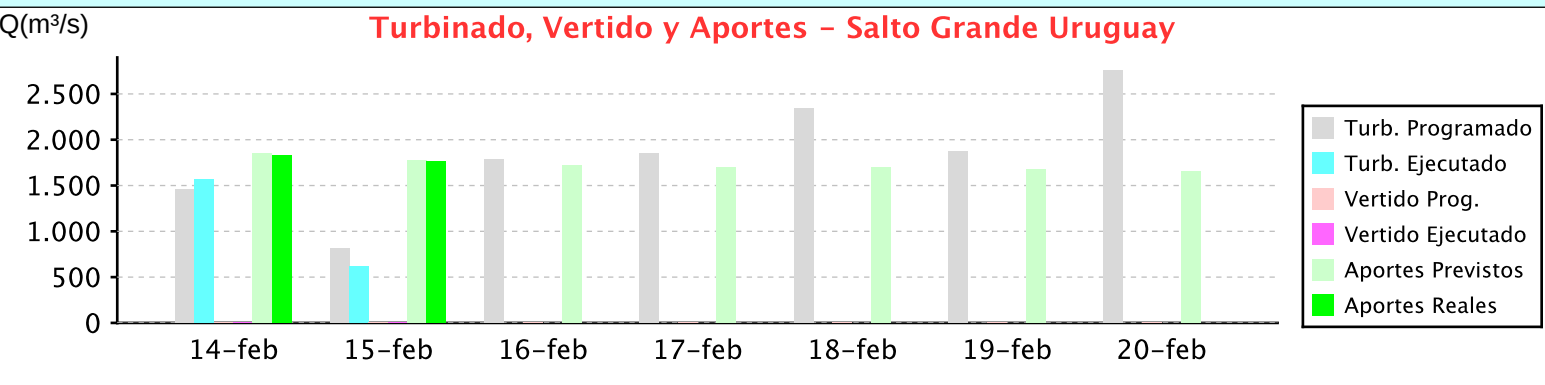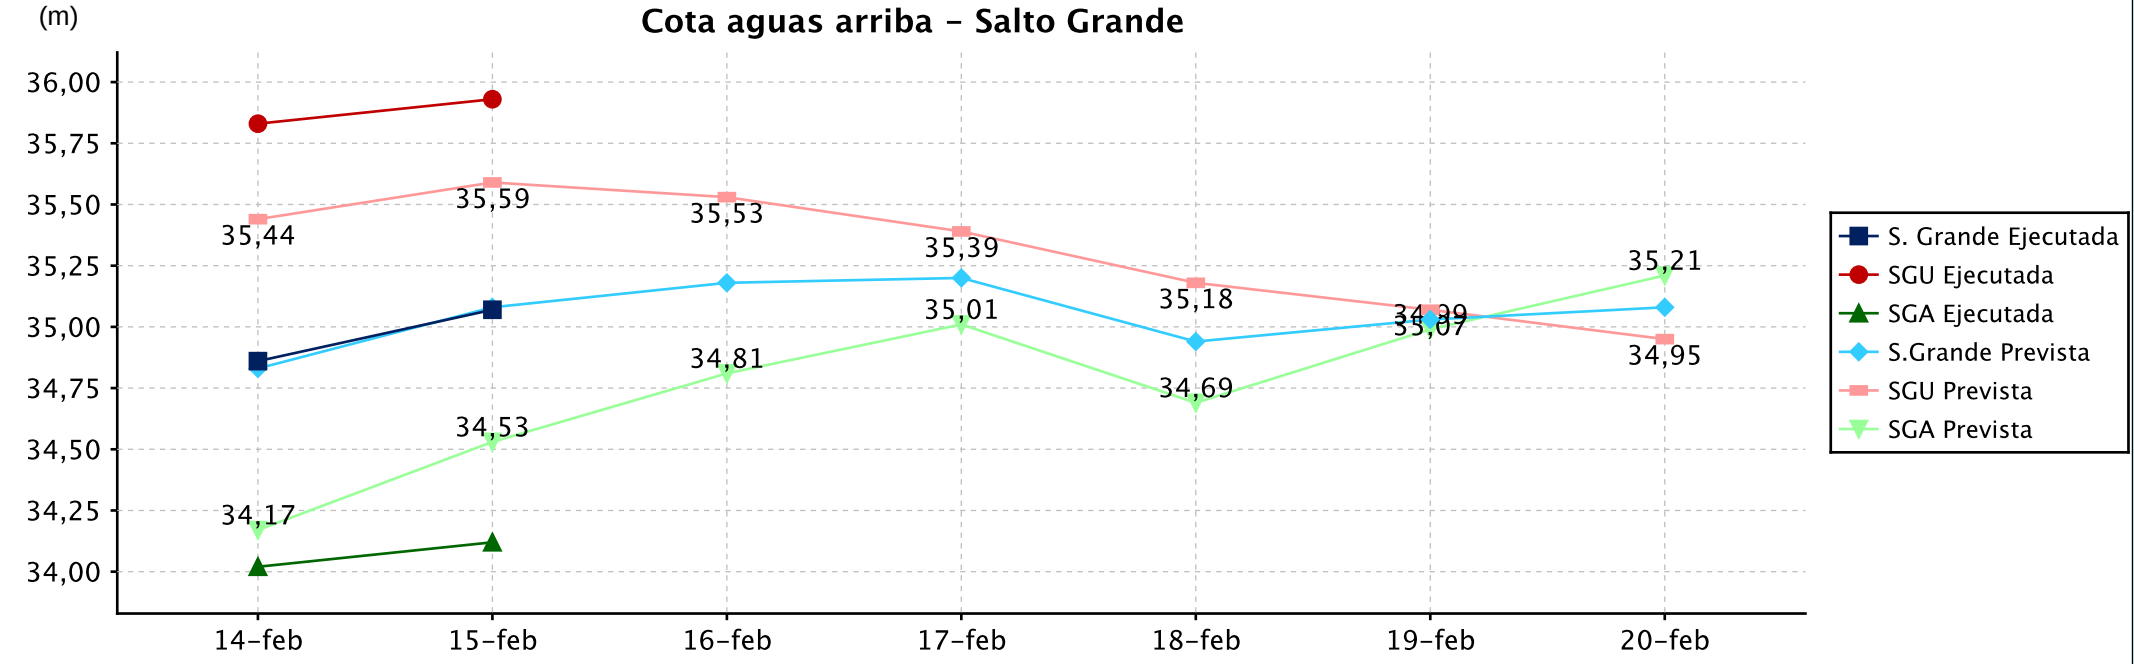

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,93
Cota Vista Arg	34,12
Cota real	35,07

Dif. Energ. (U-A)	Acumulado MWh
42.516	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	684	780
Baygorria	704	668
Palmar	779	780
SGU	814	615

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	751
Baygorria	0	-111
Palmar	0	83
SGU	1.775	1.766

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se despacha APR C forzada.
