



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 16 de febrero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	1.539
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.543
Central La Tablada	-86
Central P. del Tigre	-3
APR A	24
APR B	-2
APR C	200
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.302
C. Baygorria	1.836
C. Palmar	3.903
C. Salto Grande	8.993
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.576
TOTAL Generación	27.279

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.279
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.860
Diferencia (MWh)	-3.581
Ejecutada - Programada	-11,60 %

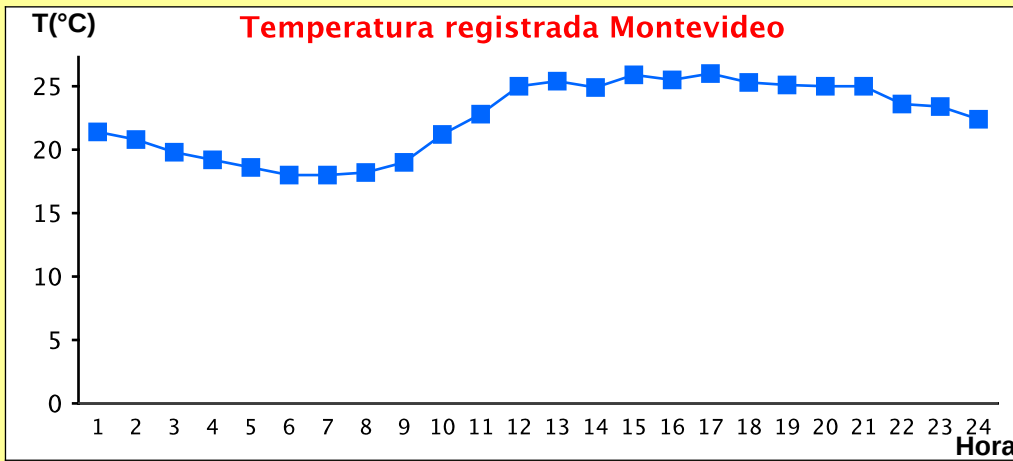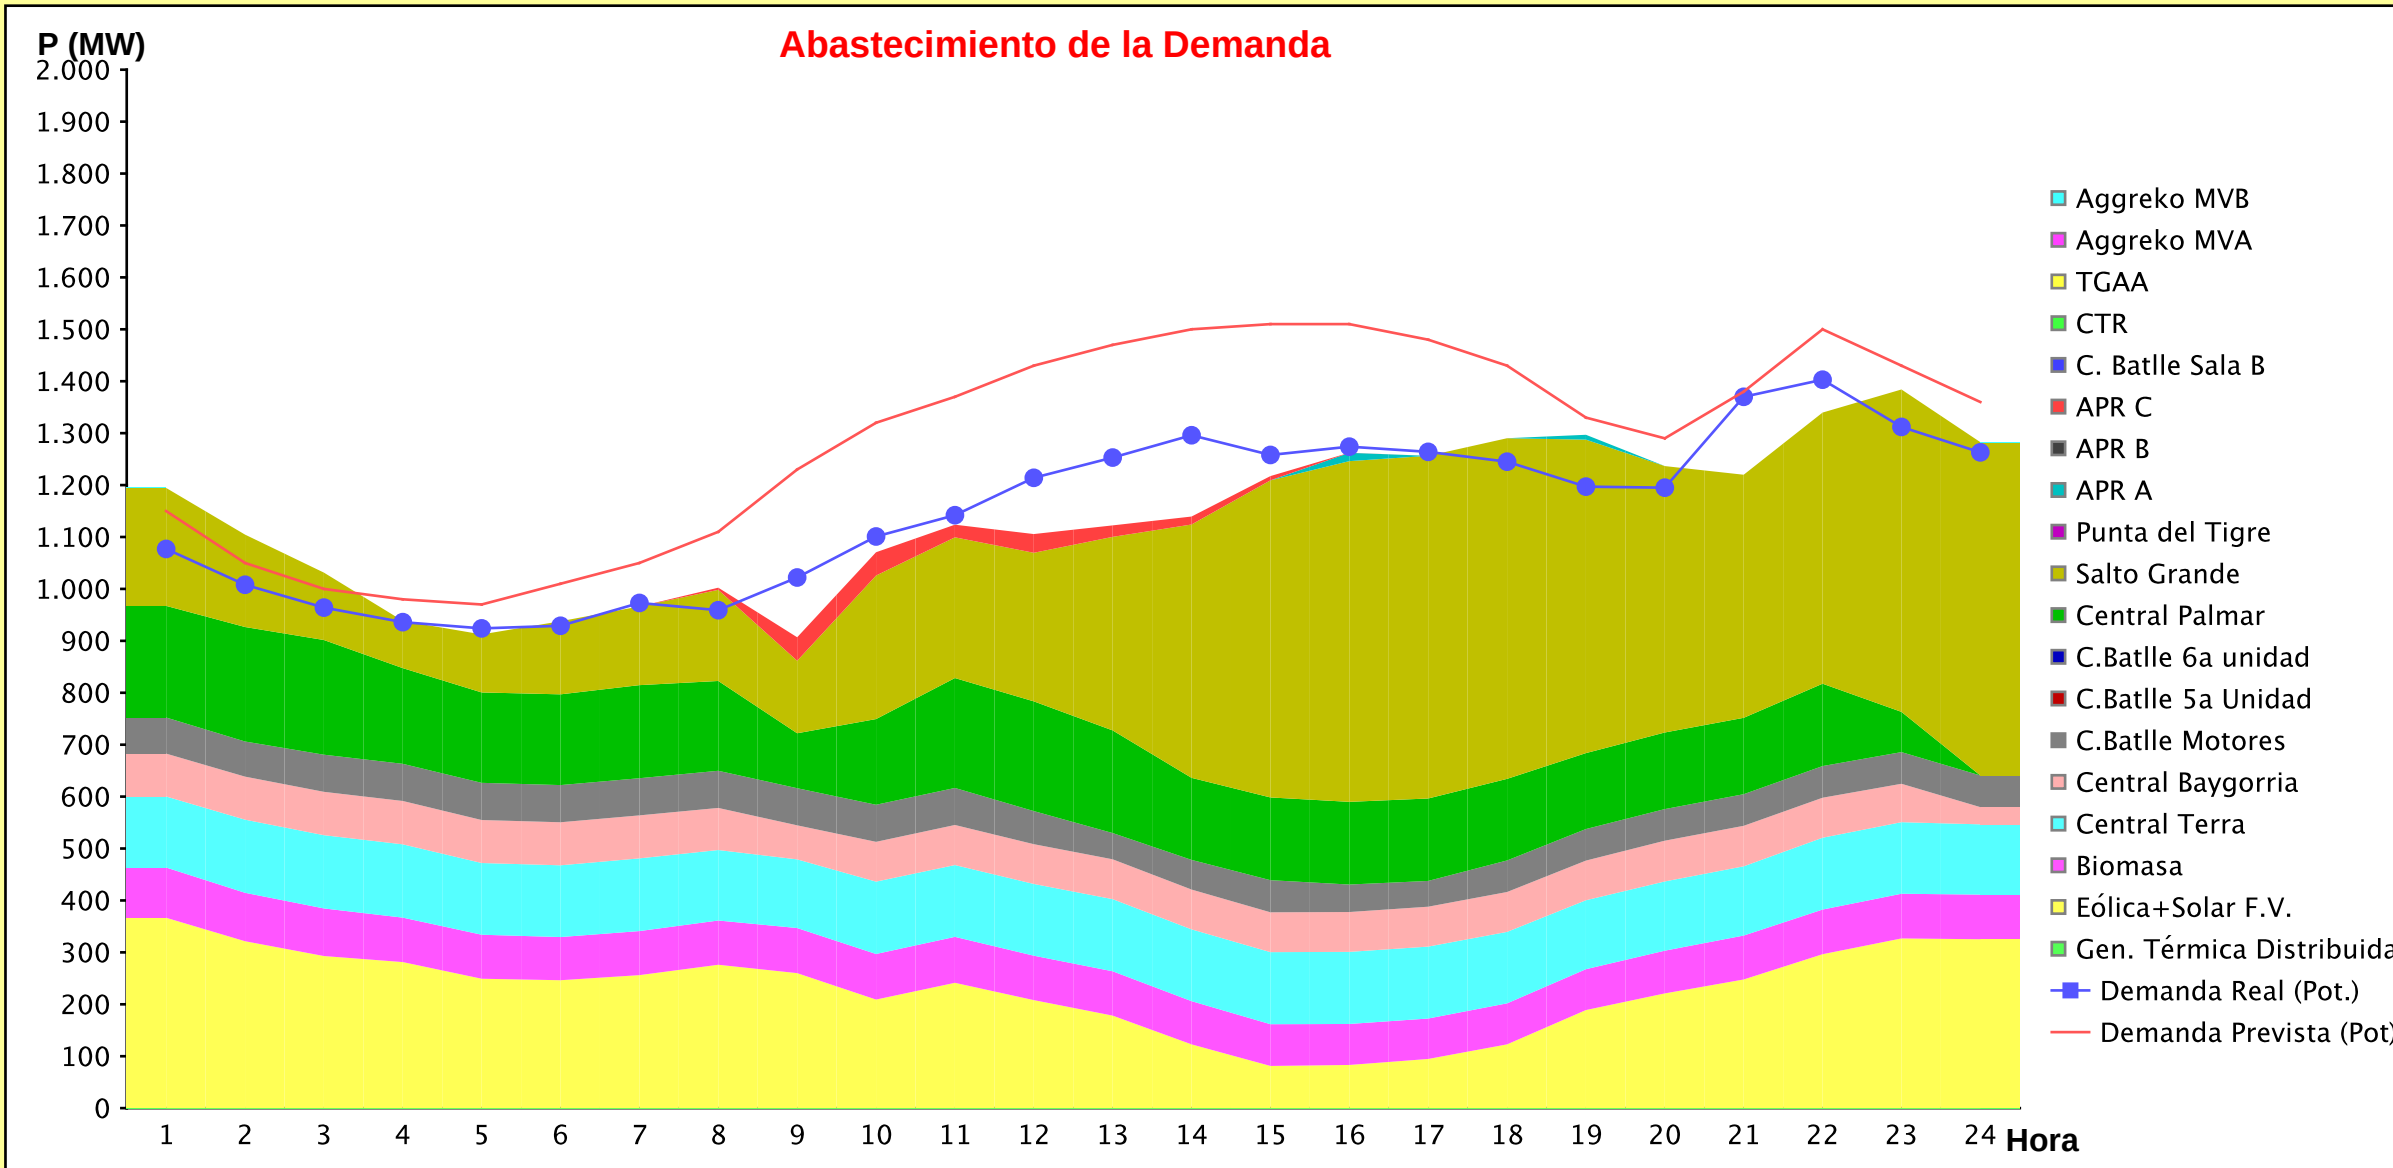



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1281,69 Hora 16:00
Potencia mínima:	927,33 Hora 07:59
Pico noche:	1461,41 Hora 21:41

Generación Media (MW)	
Eólica	229,8
Biomasa	85,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

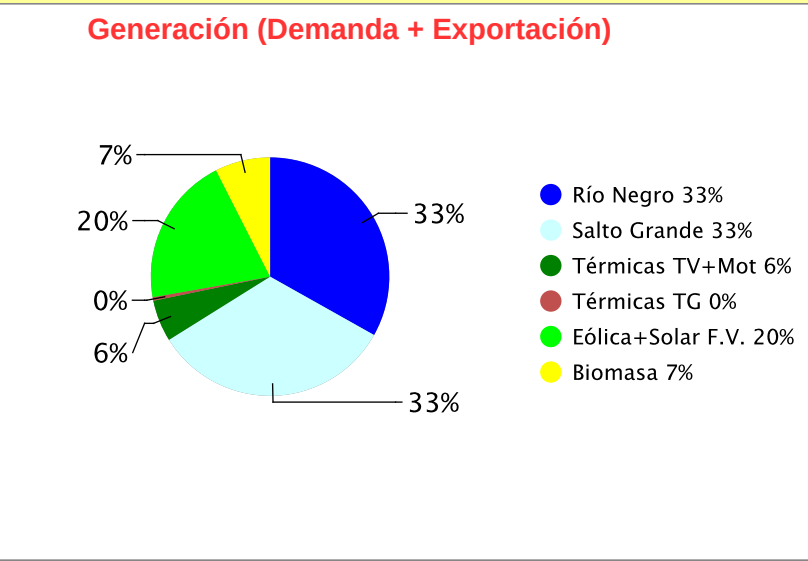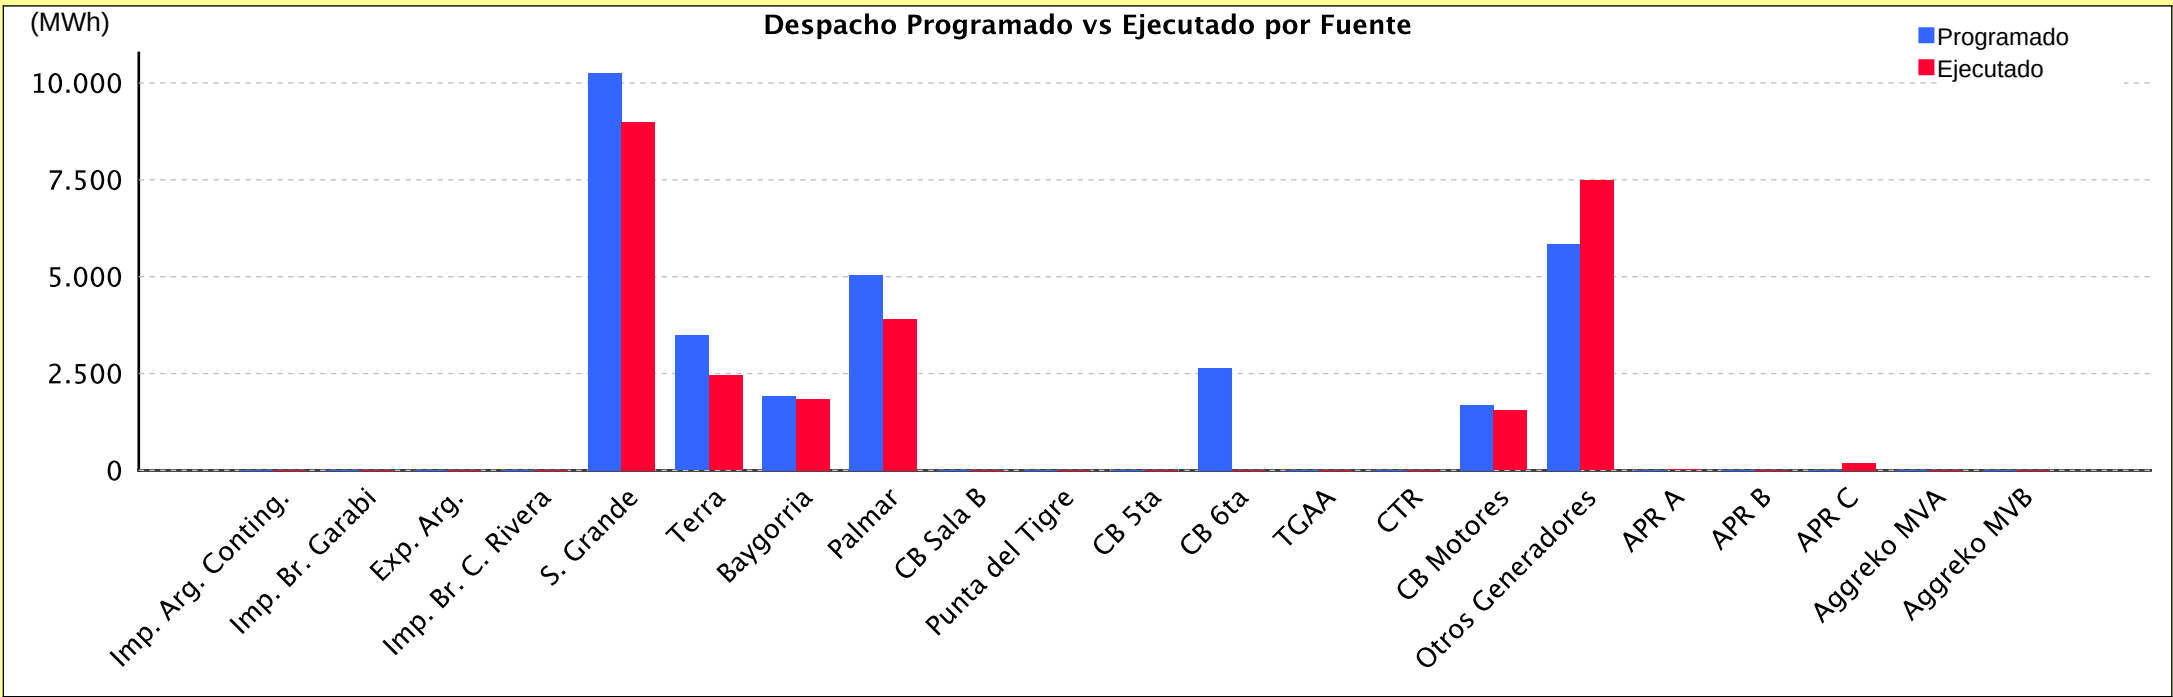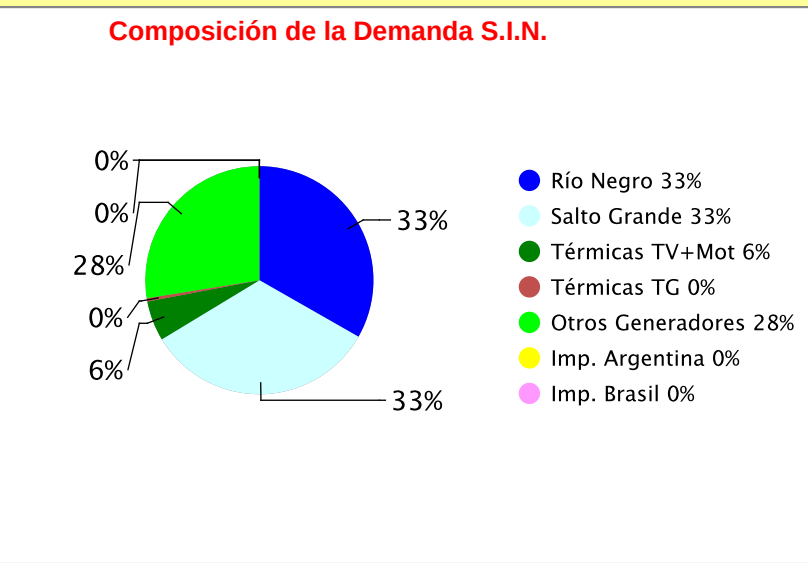



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

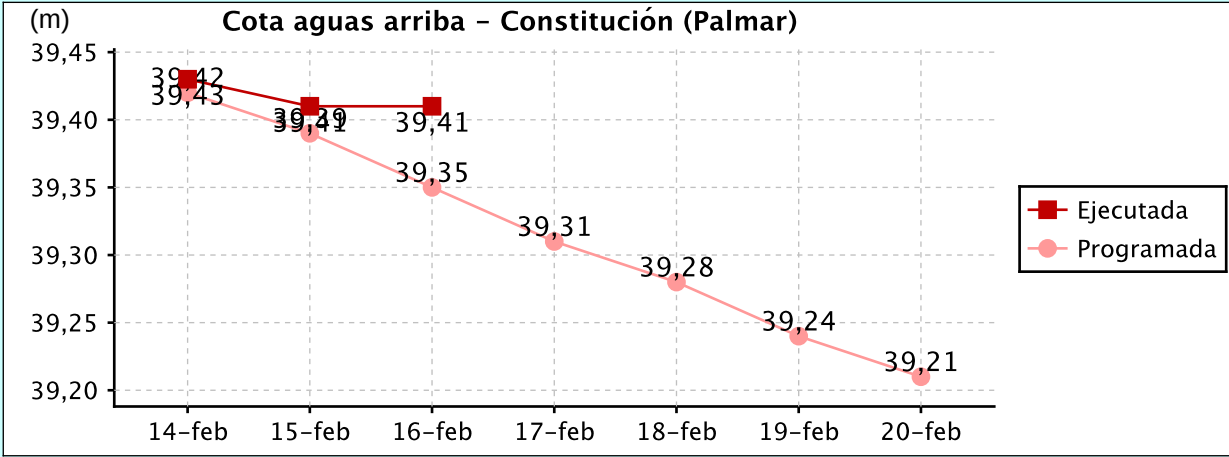
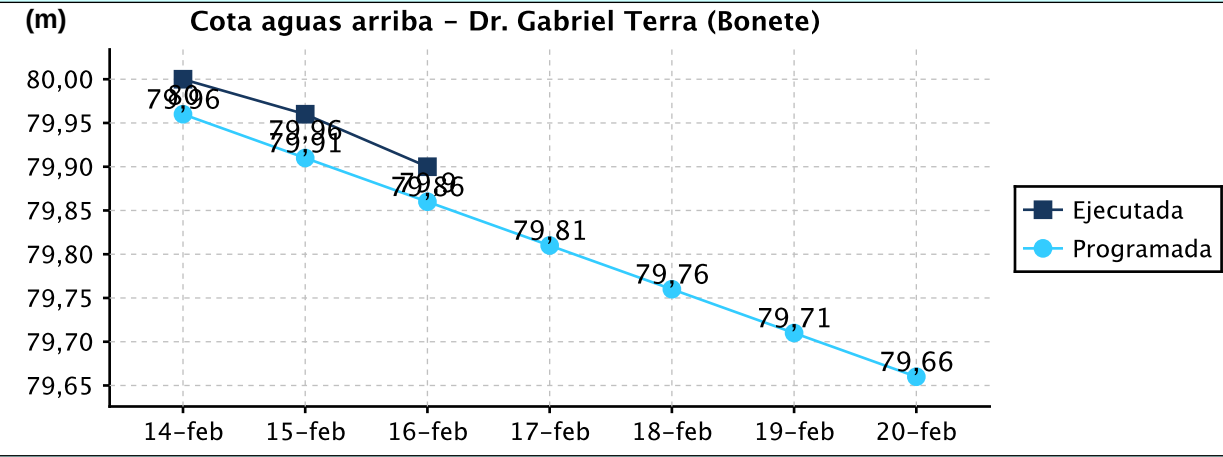


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,86	79,9
Baygorria	53,78	53,75
Palmar	39,35	39,41
SGU	35,53	35,98

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

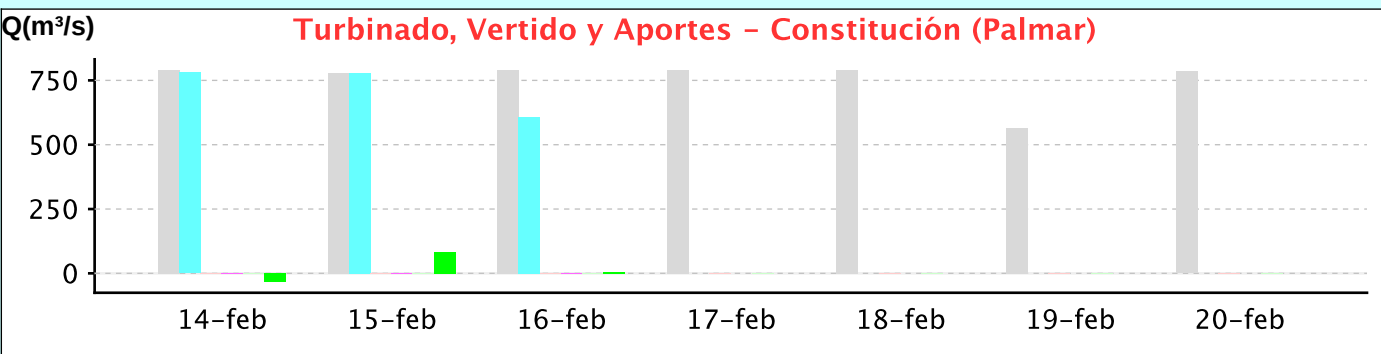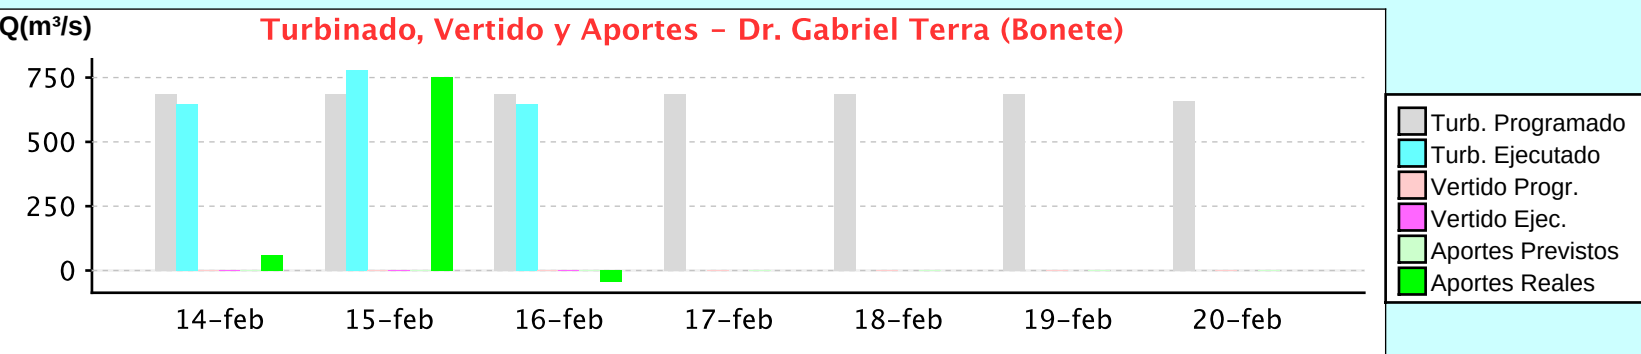

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

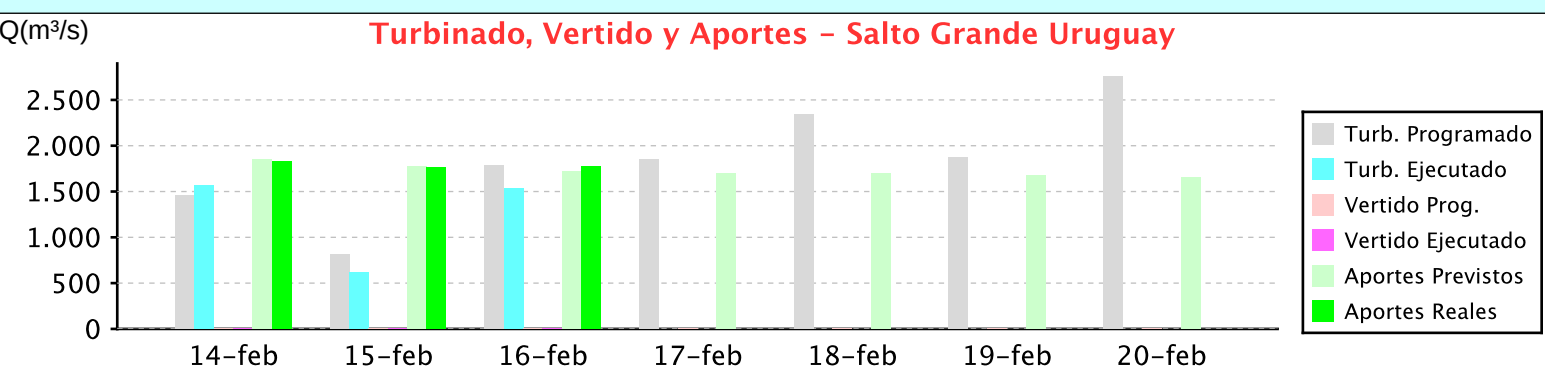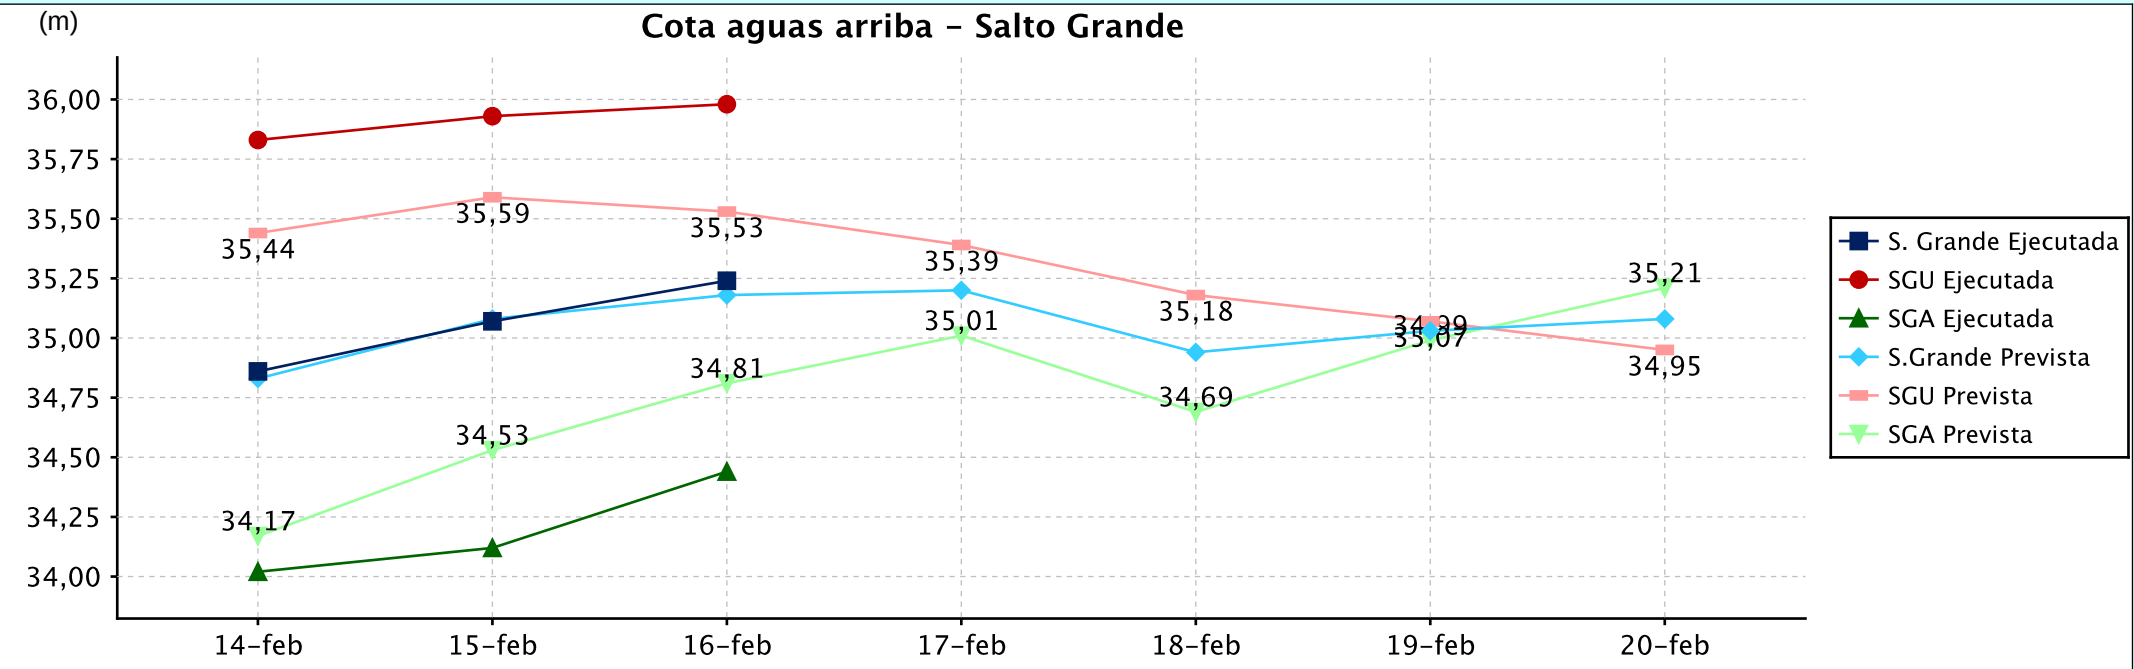

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,98
Cota Vista Arg	34,44
Cota real	35,24

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	36.679
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	684	647
Baygorria	704	632
Palmar	791	608
SGU	1.785	1.534

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-45
Baygorria	0	-38
Palmar	0	6
SGU	1.725	1.774

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

APR A y APR C se despachan forzados.
