



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 18 de febrero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	2.269
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	834
Motores	1.439
Central La Tablada	-76
Central P. del Tigre	-3
APR A	200
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.314
C. Baygorria	1.692
C. Palmar	3.548
C. Salto Grande	13.735
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.378
TOTAL Generación	31.054

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.054
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.220
Diferencia (MWh)	-166
Ejecutada - Programada	-0,53 %

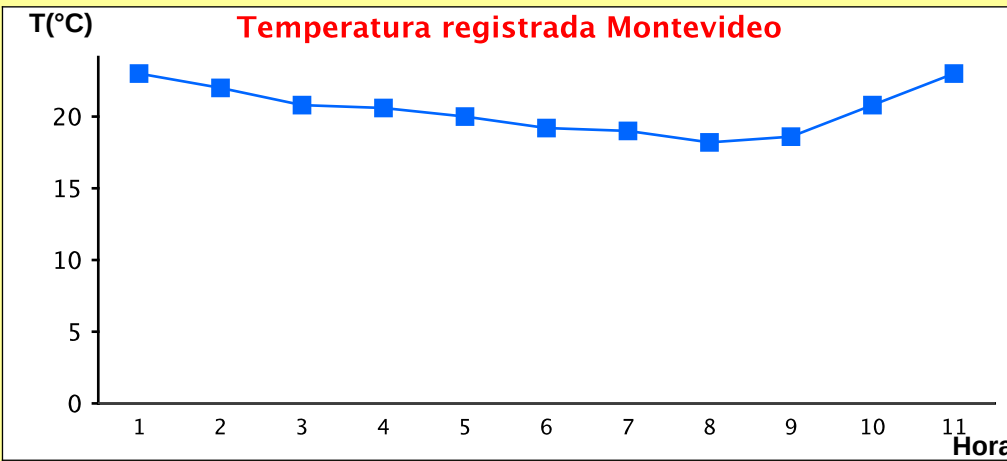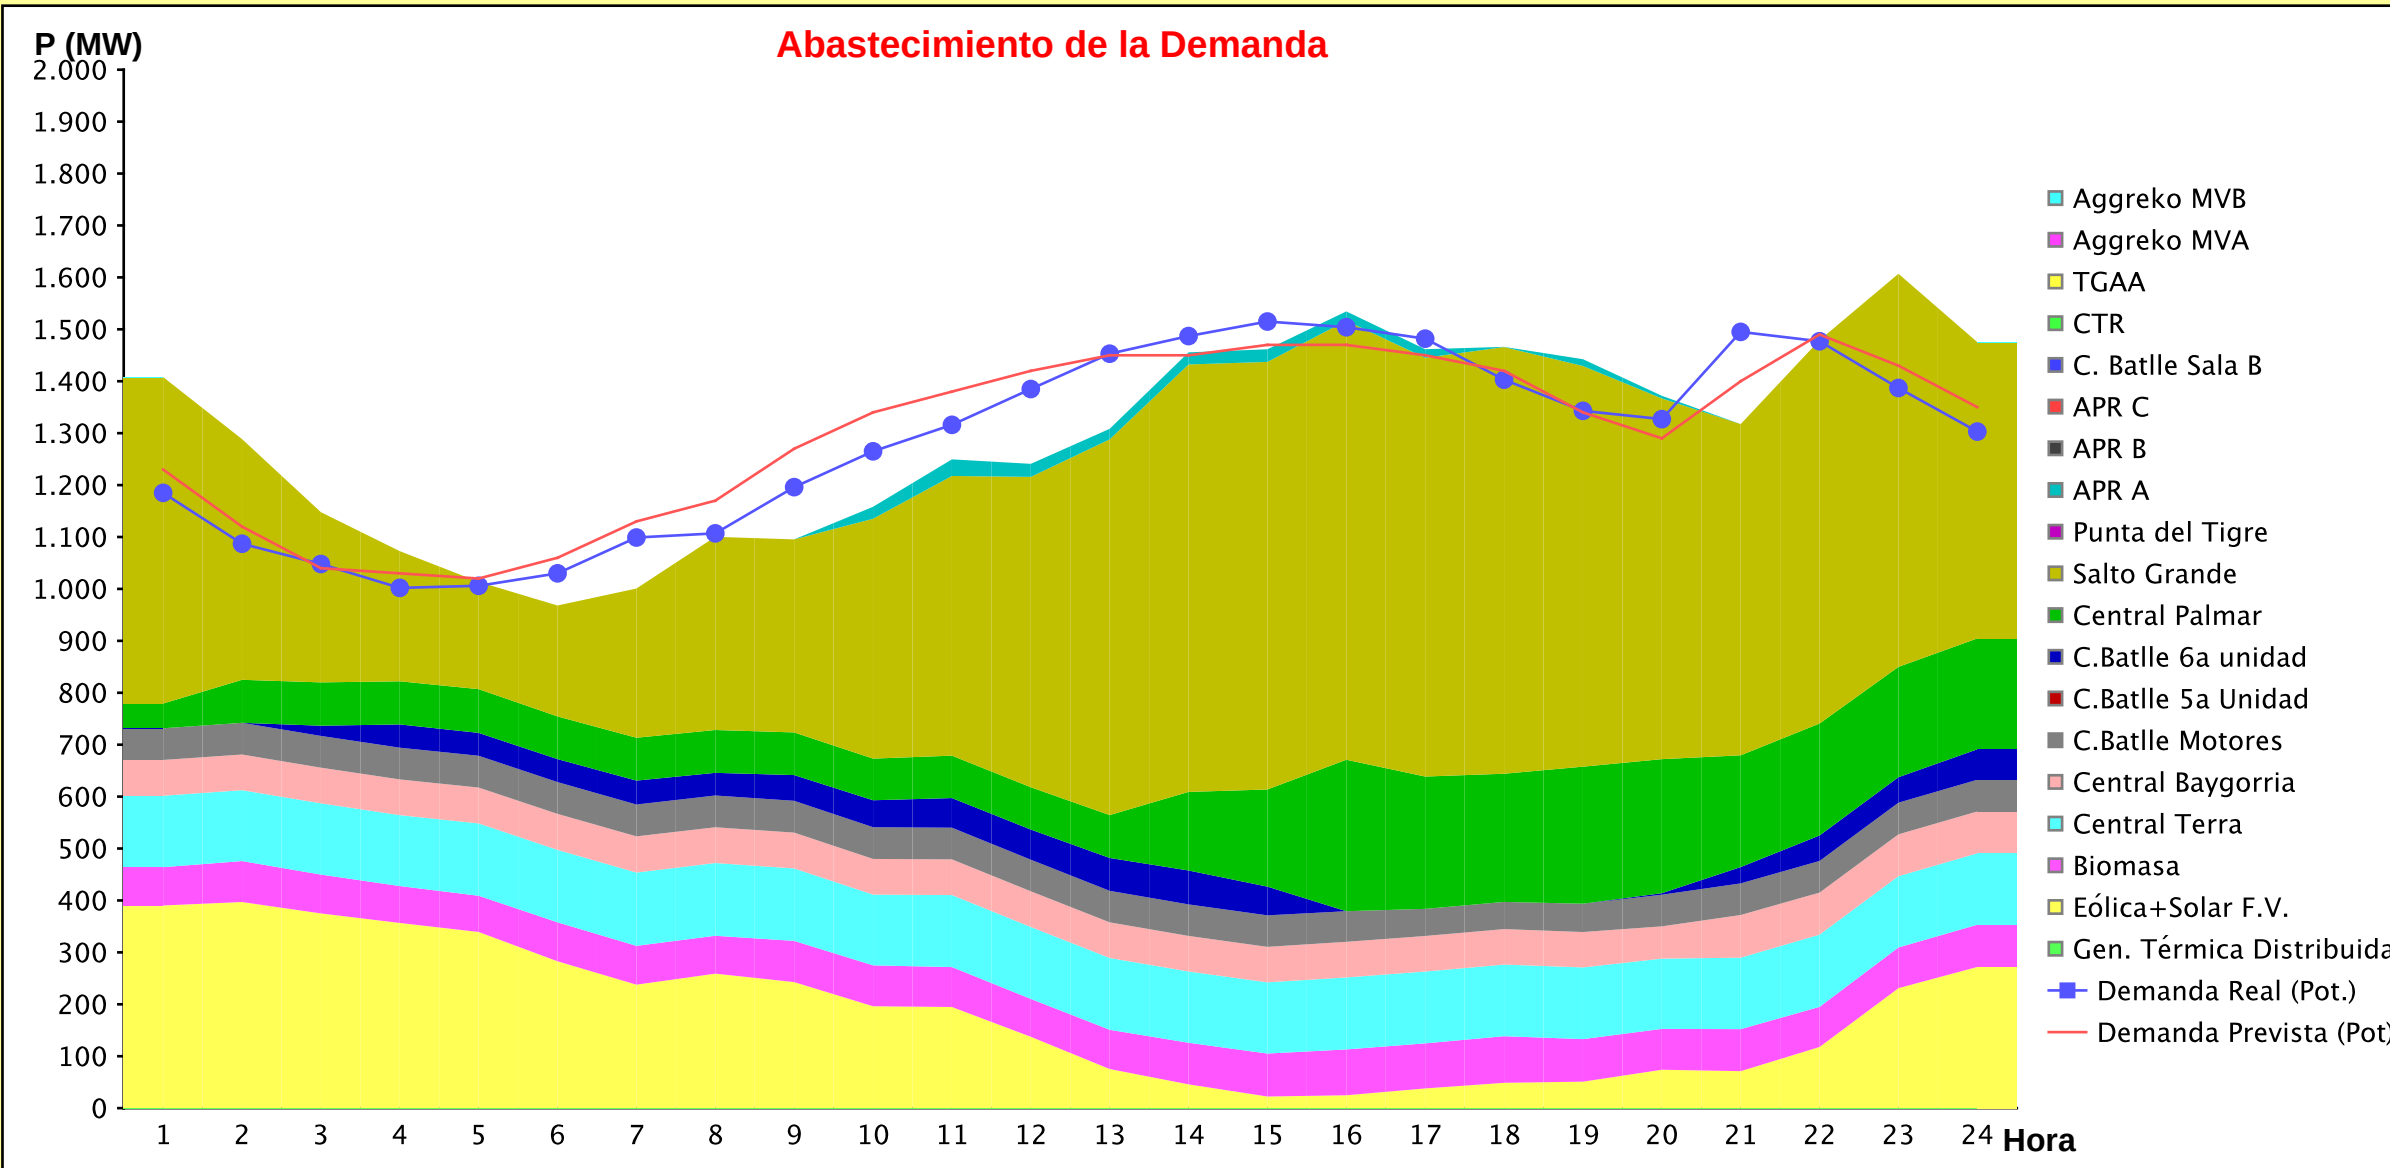



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1521,73 Hora 15:25
Potencia mínima:	1000,81 Hora 04:20
Pico noche:	1555,5 Hora 21:19

Generación Media (MW)	
Eólica	187,4
Biomasa	79,4
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

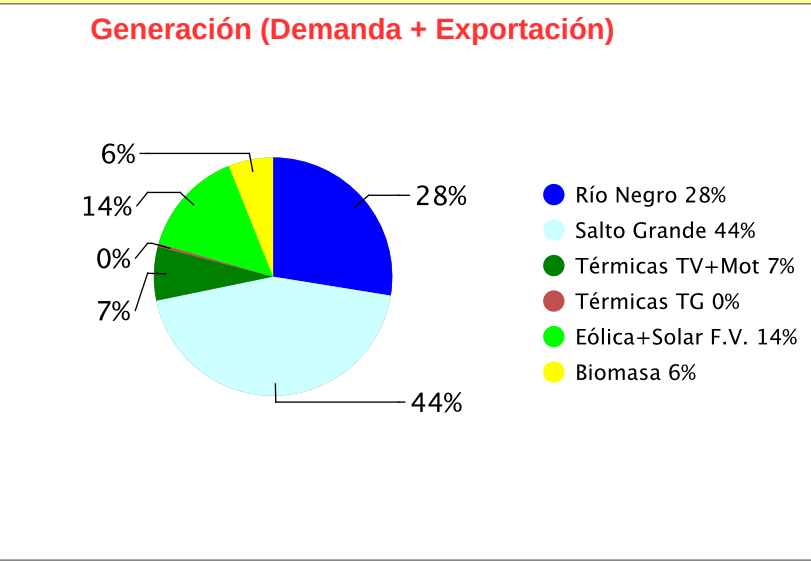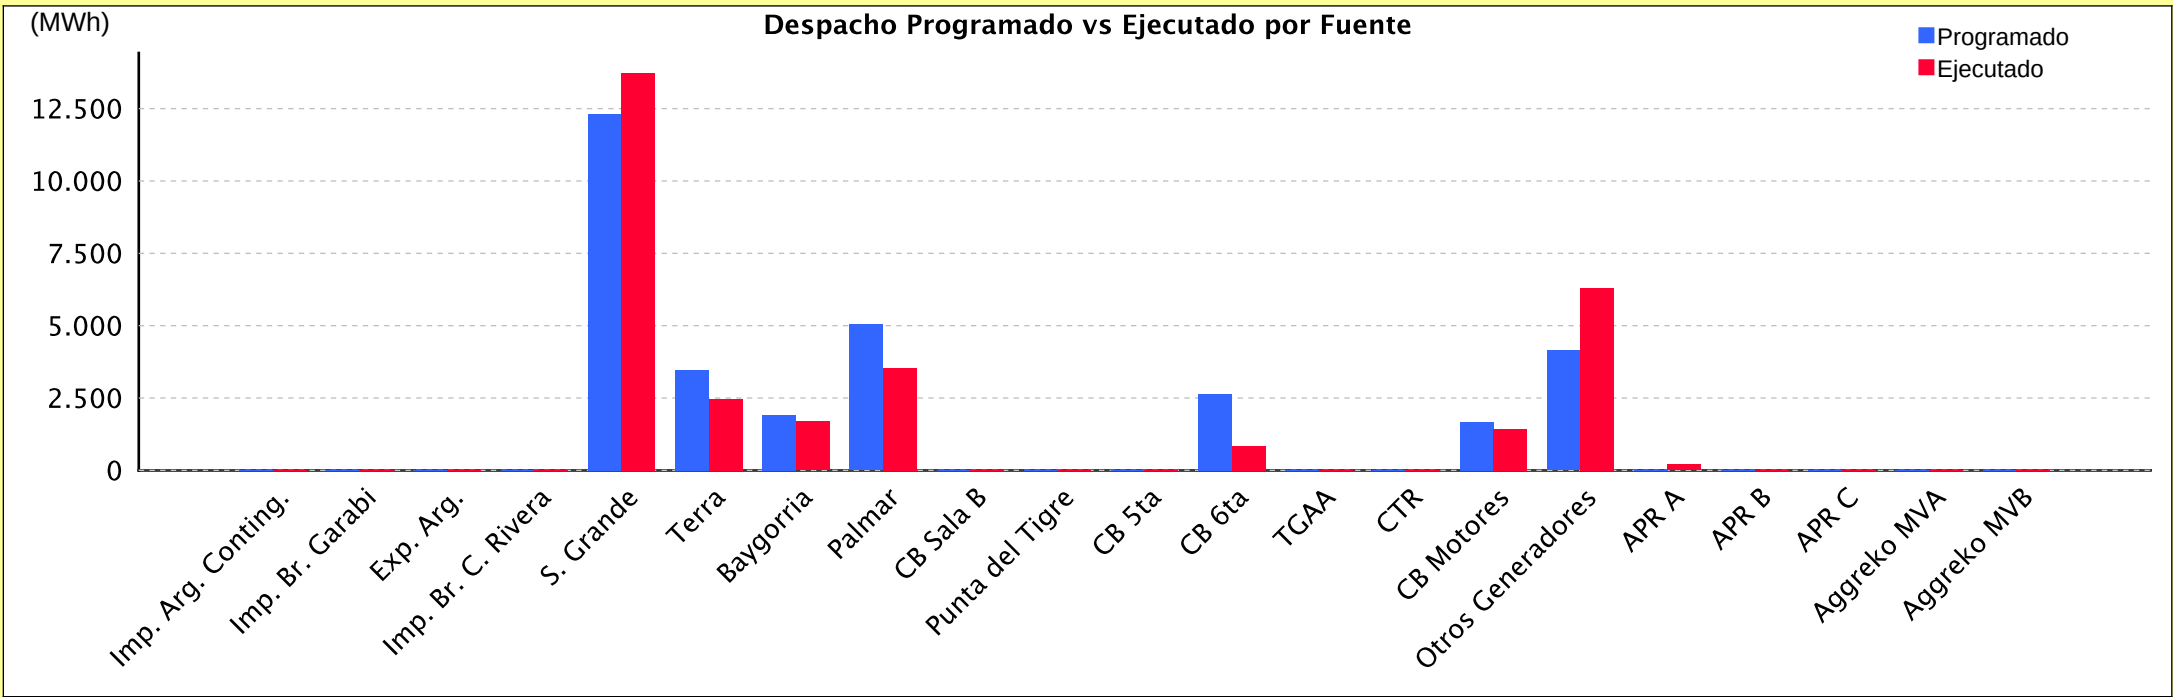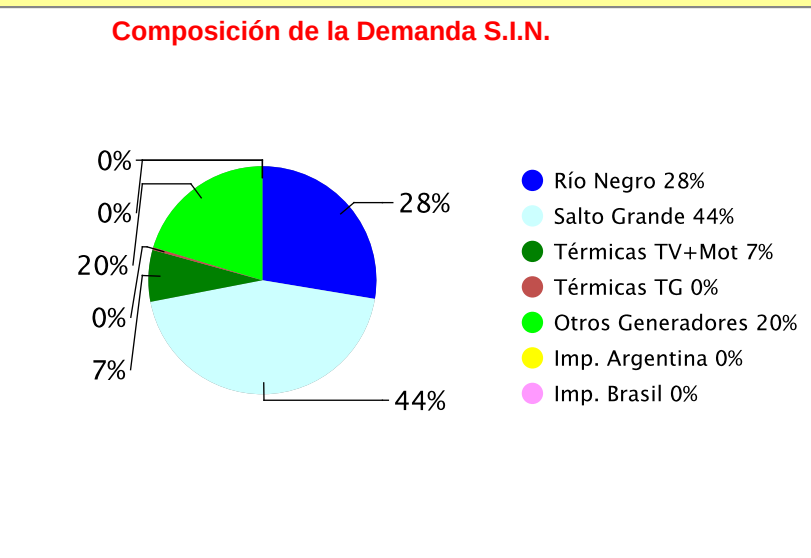



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

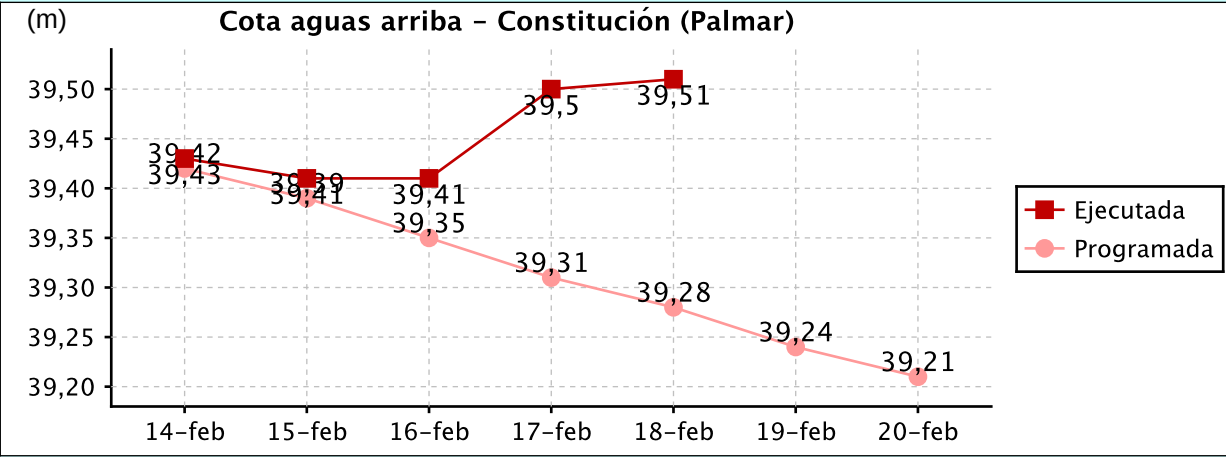
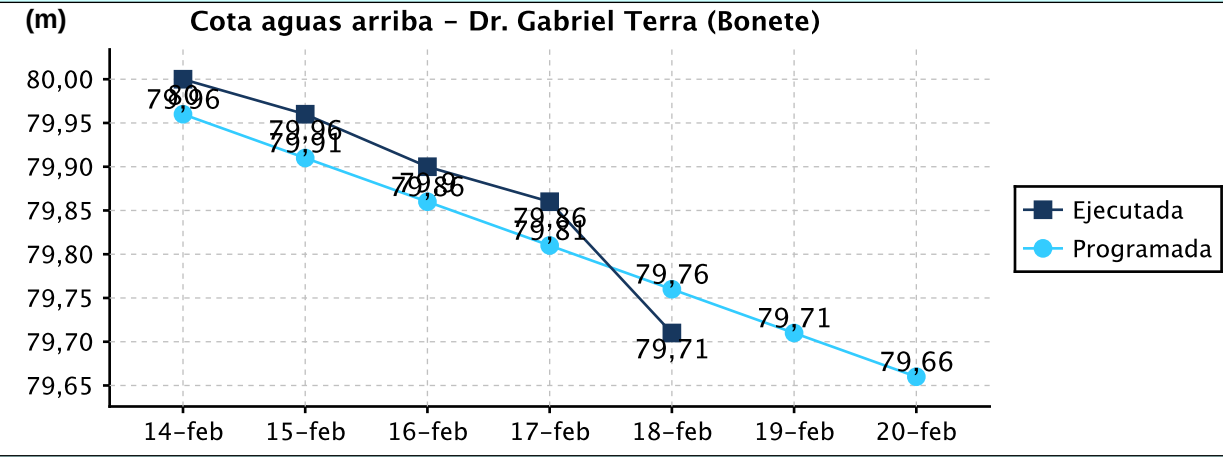


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,76	79,71
Baygorria	53,78	53,99
Palmar	39,28	39,51
SGU	35,18	35,5

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

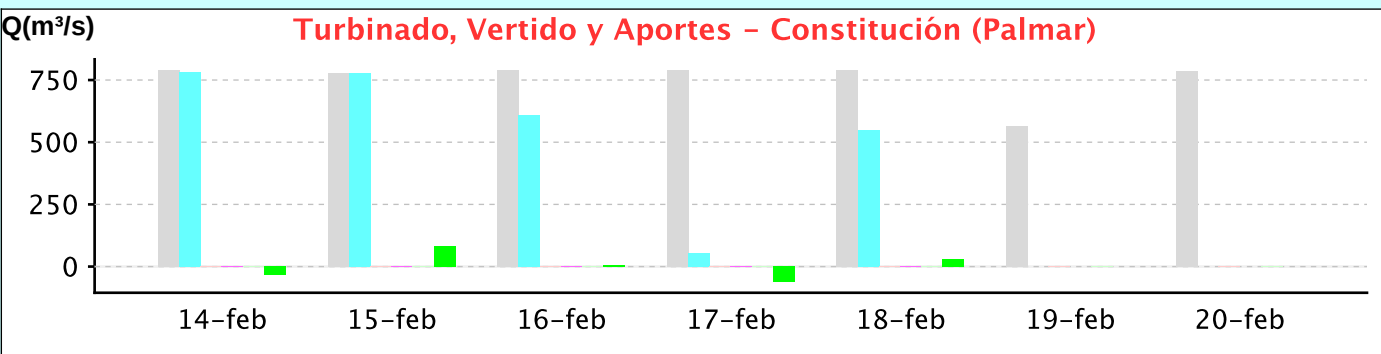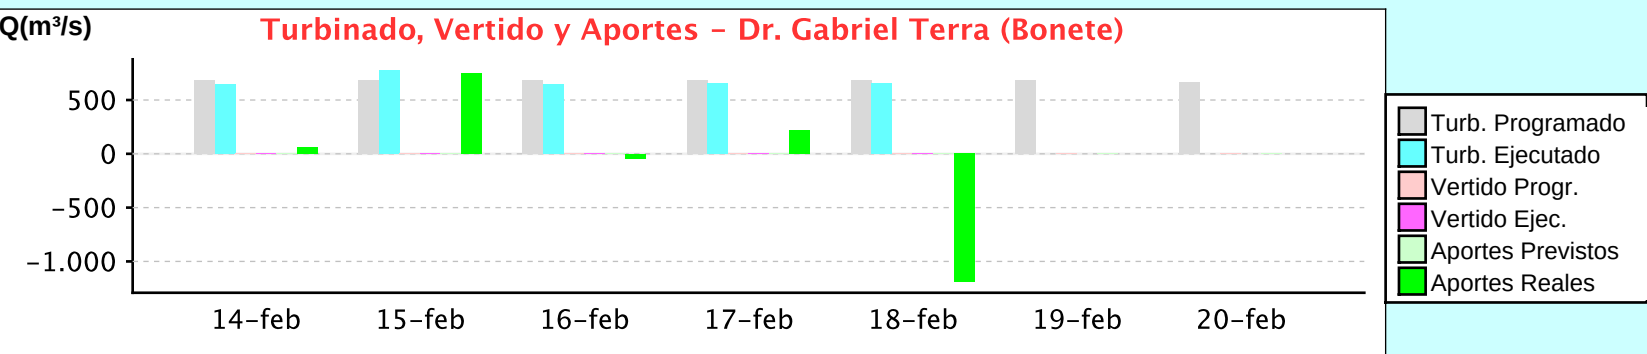

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

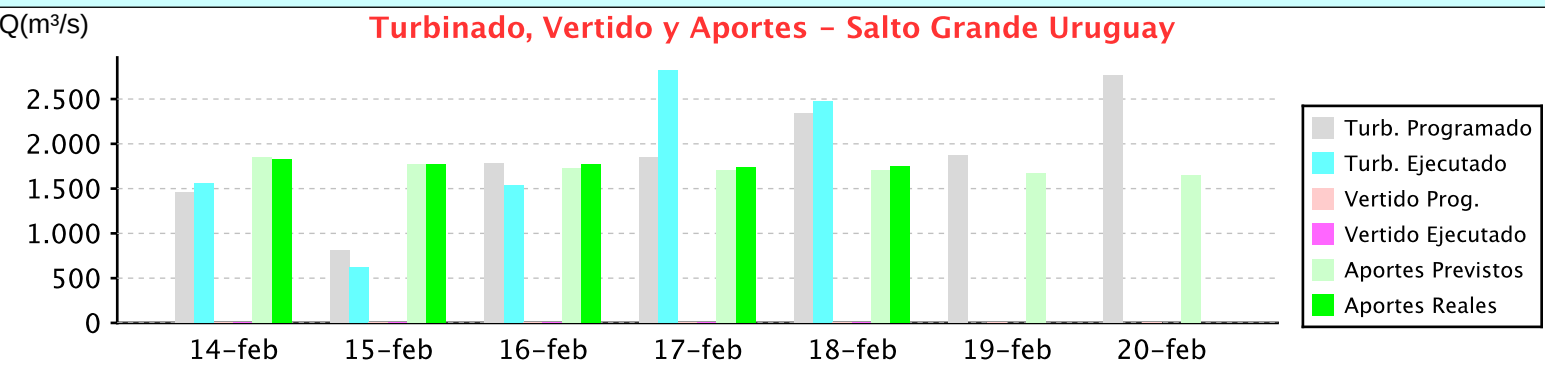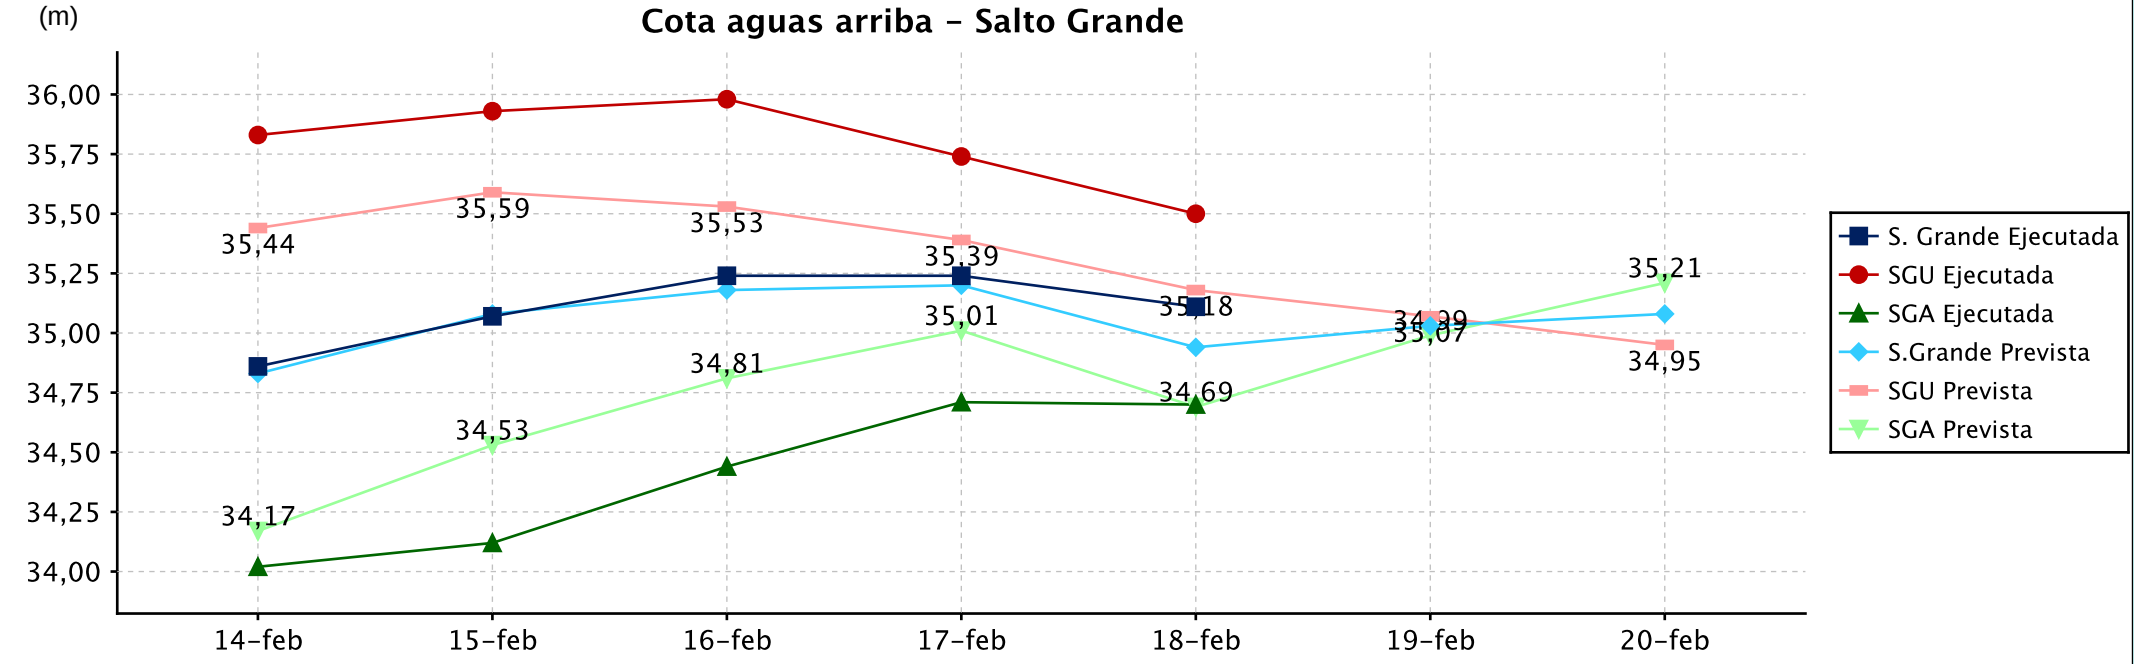

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,50
Cota Vista Arg	34,70
Cota real	35,11

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	19.075
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	684	657
Baygorria	704	581
Palmar	791	547
SGU	2.341	2.473

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-1.193
Baygorria	0	5
Palmar	0	30
SGU	1.700	1.751

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se despacha forzado APR A.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

19/02/2015 15:26
