




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 23 de febrero de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.440
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	355
Motores	1.090
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	285
APR A	-2
APR B	-2
APR C	15
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.317
C. Baygorria	2.184
C. Palmar	4.832
C. Salto Grande	16.578
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.530
TOTAL Generación	32.098

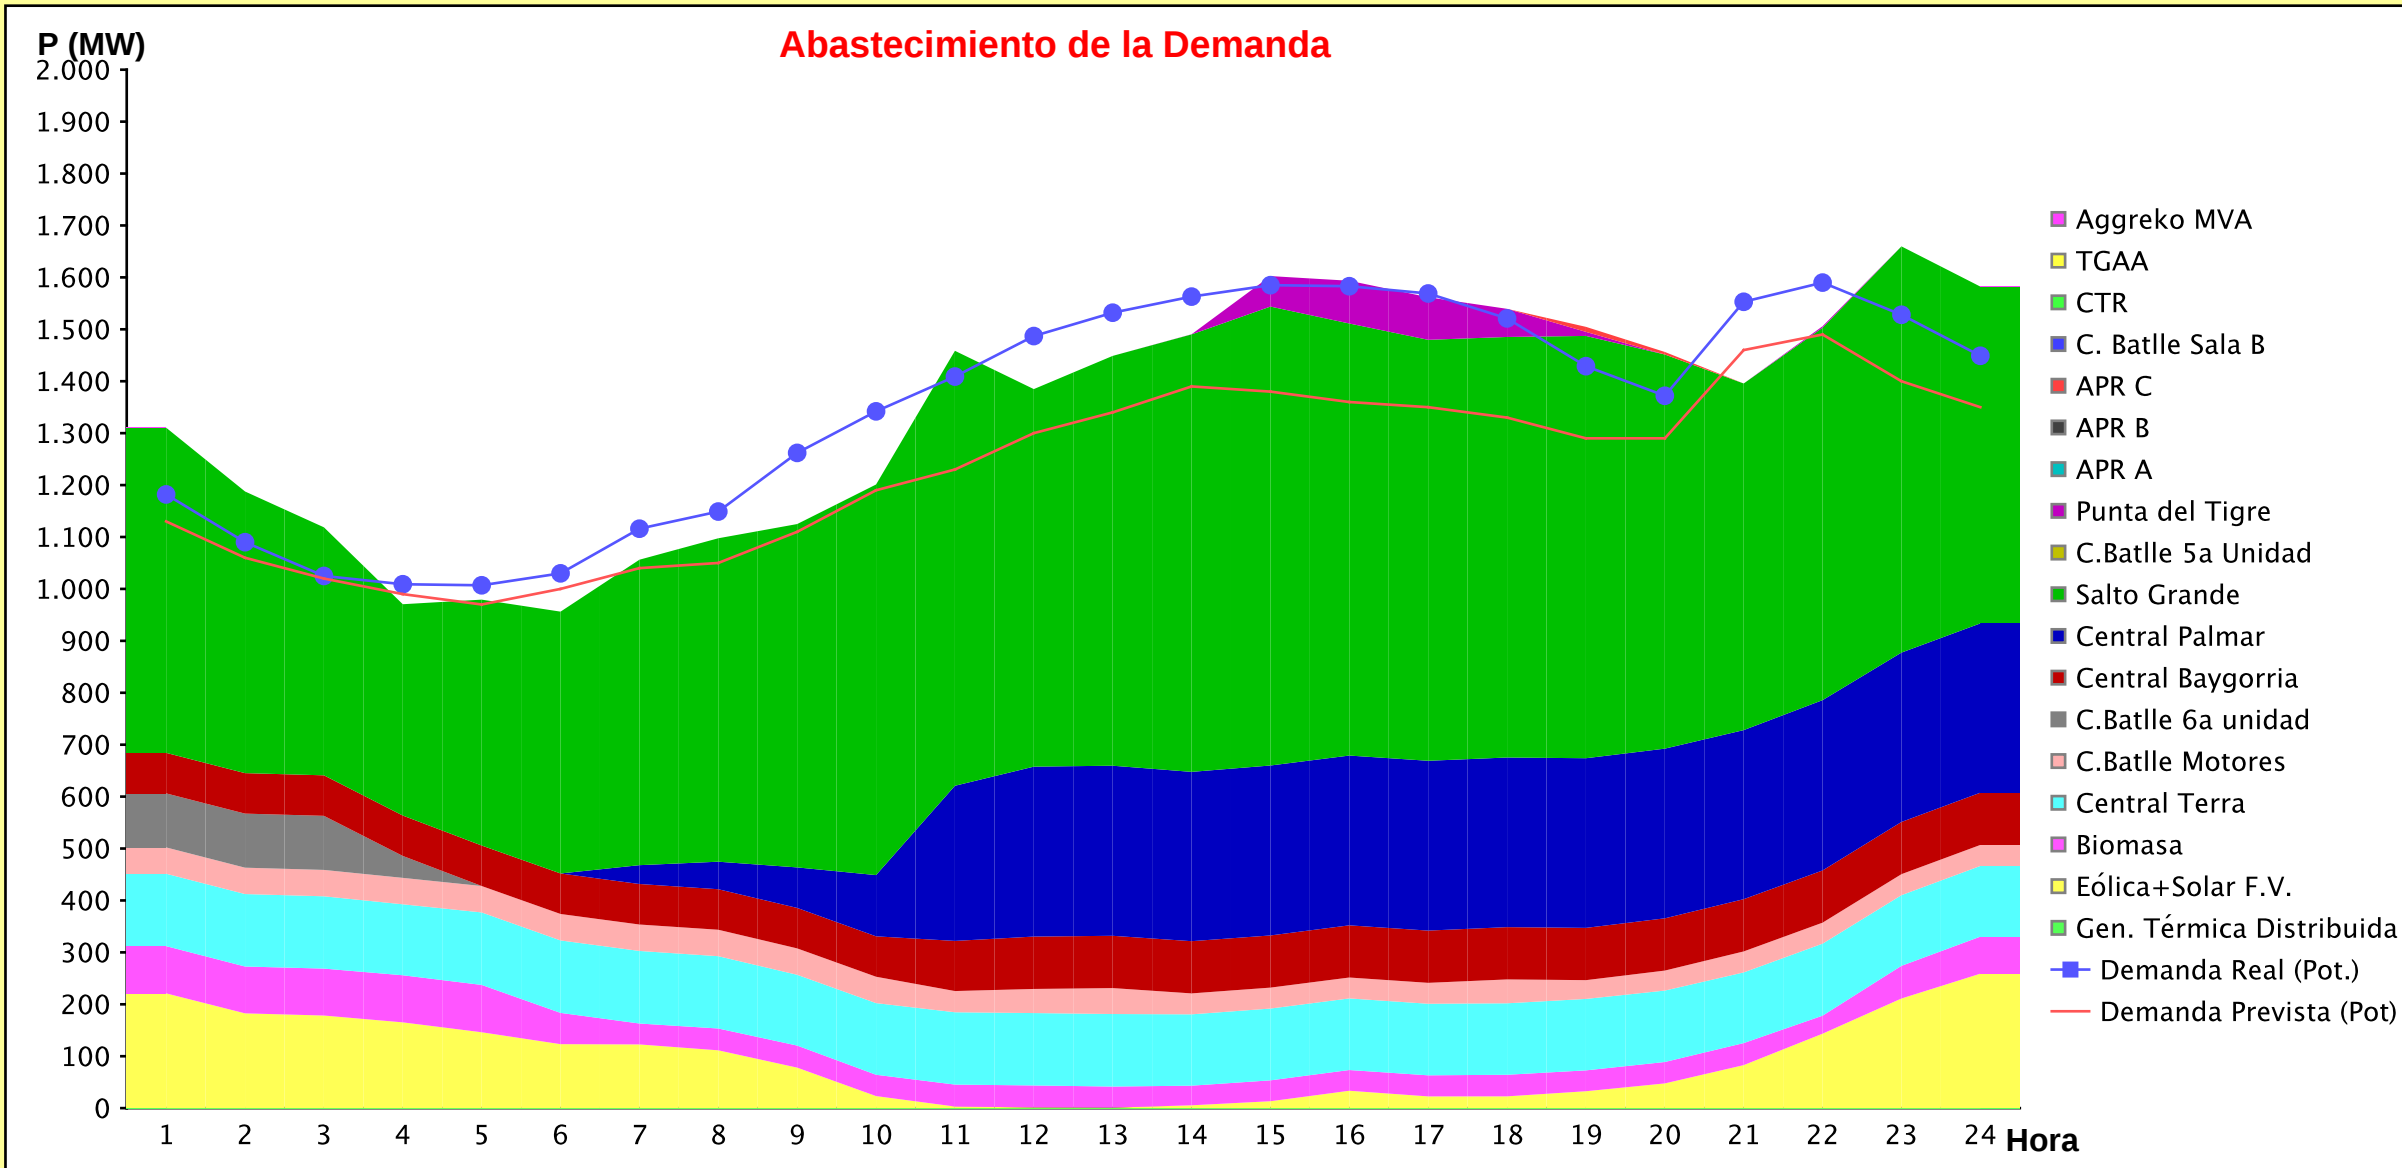

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.098
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.520
Diferencia (MWh)	2.578
Ejecutada - Programada	8,73 %

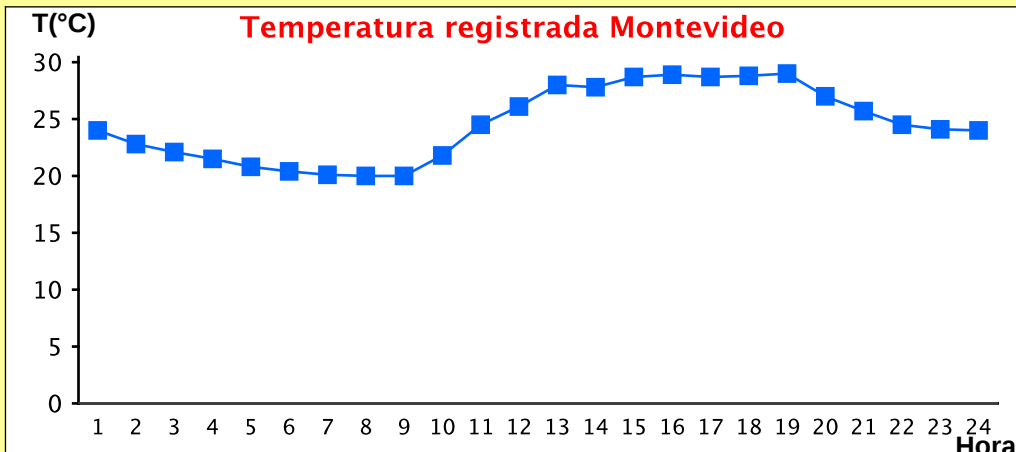


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1598,38 Hora 15:07
Potencia mínima:	977,78 Hora 03:24
Pico noche:	1674,7 Hora 21:25

Generación Media (MW)	
Eólica	94,0
Biomasa	55,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

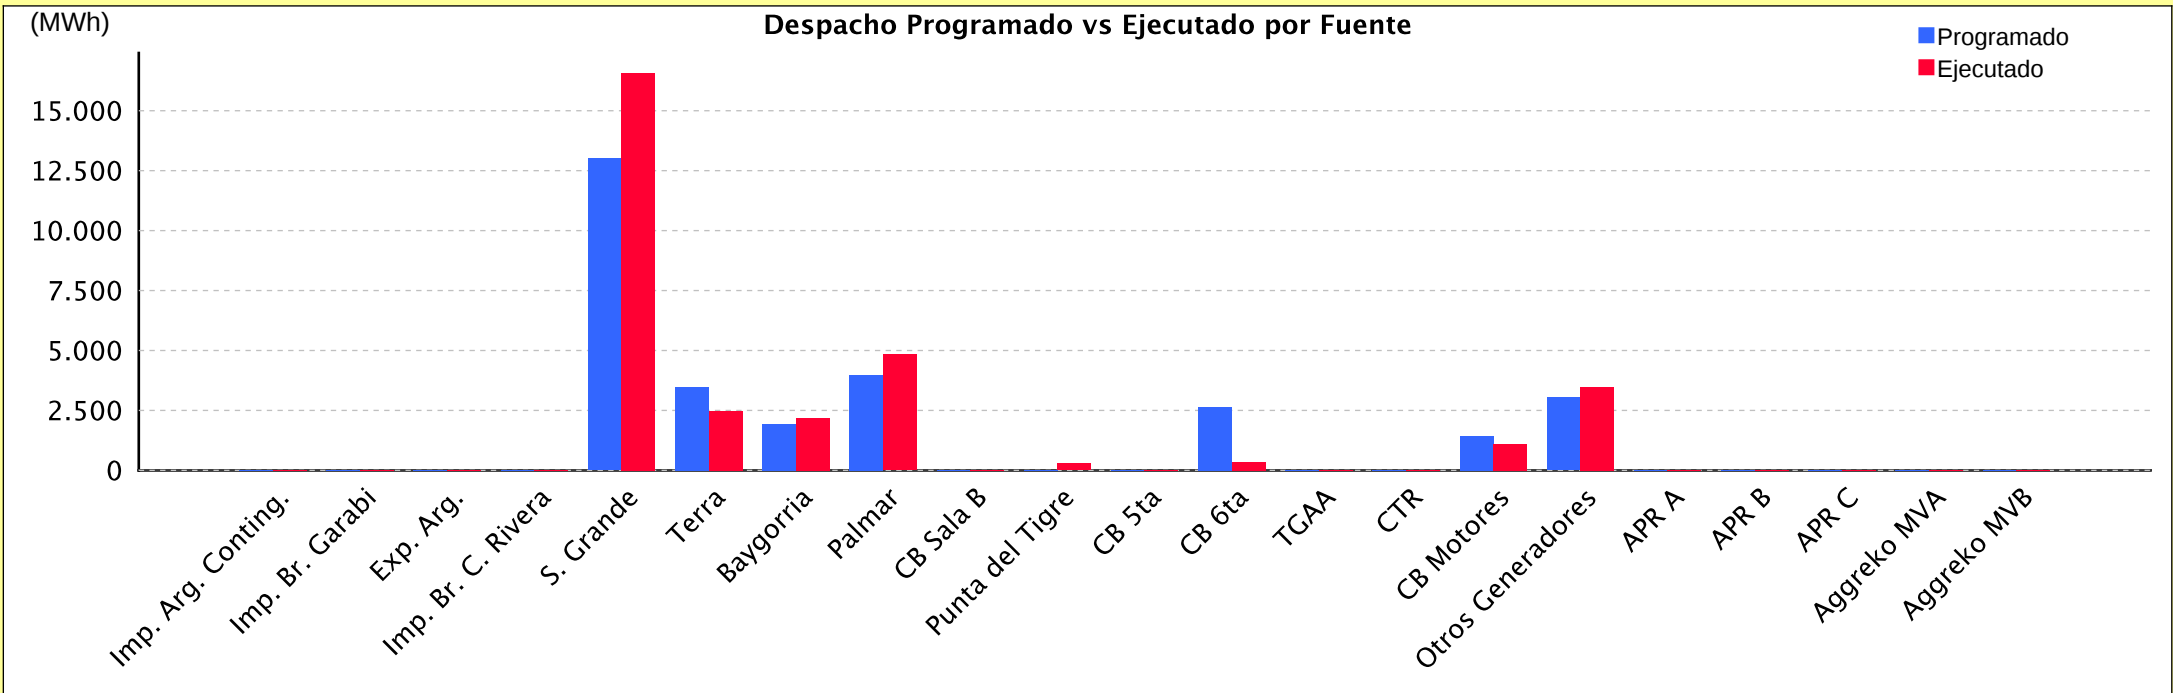
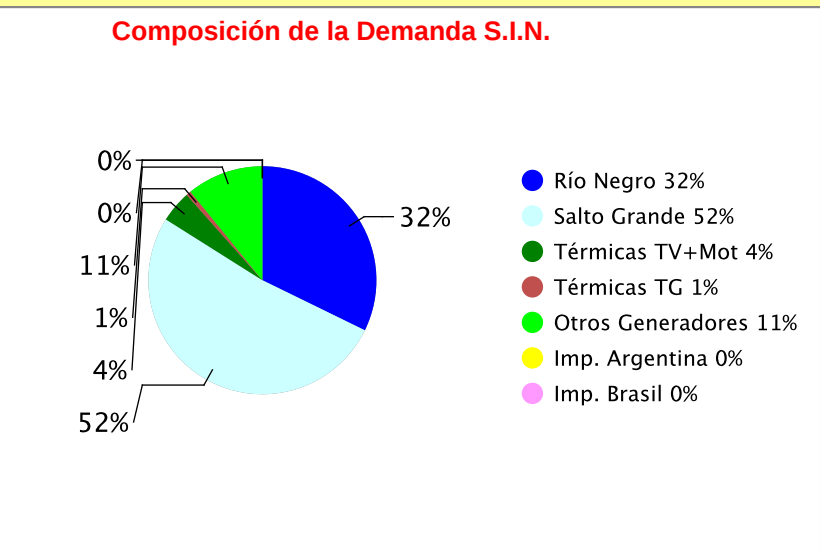


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

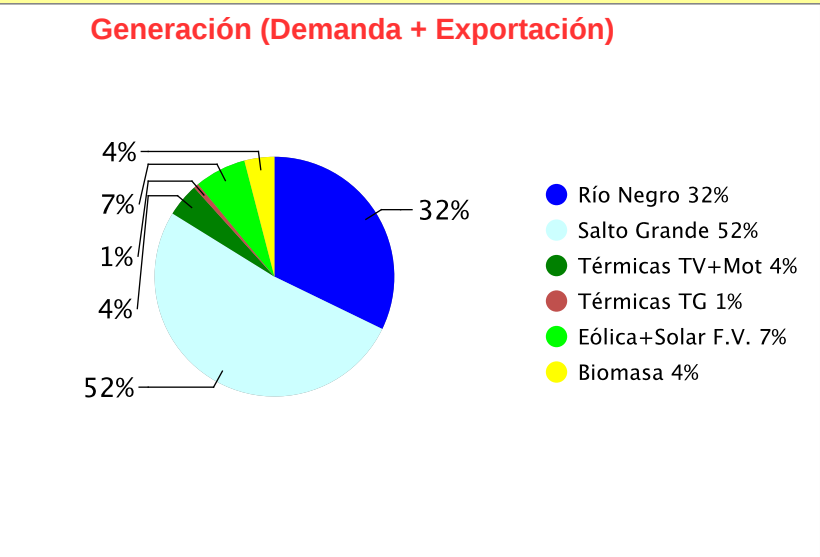



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

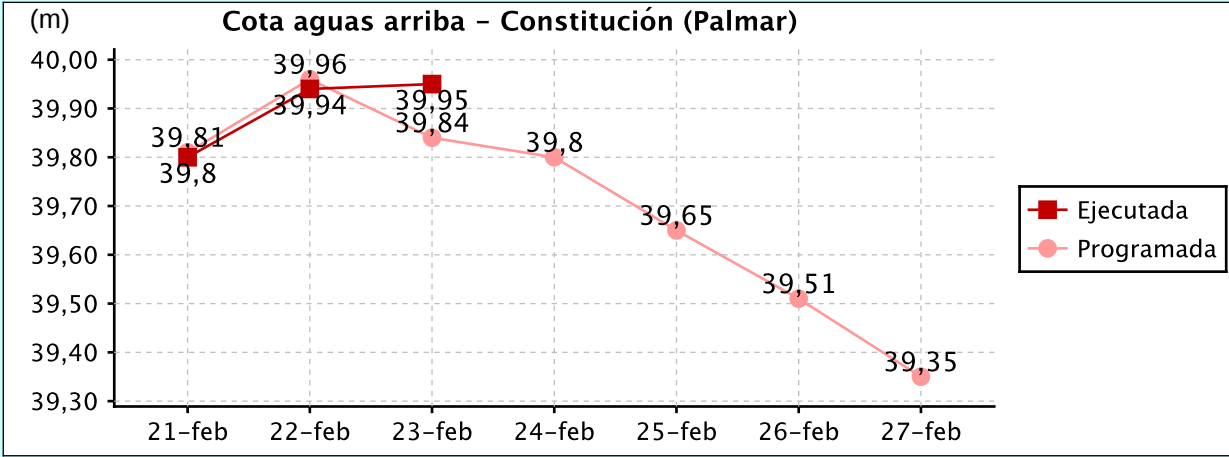
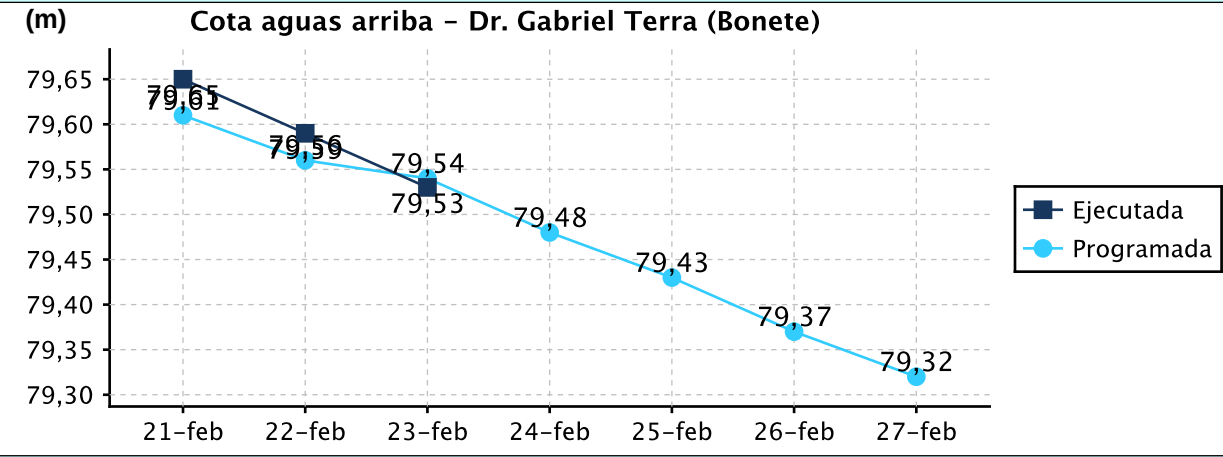


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,54	79,53
Baygorria	54,23	54,19
Palmar	39,84	39,95
SGU	35,04	34,94

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

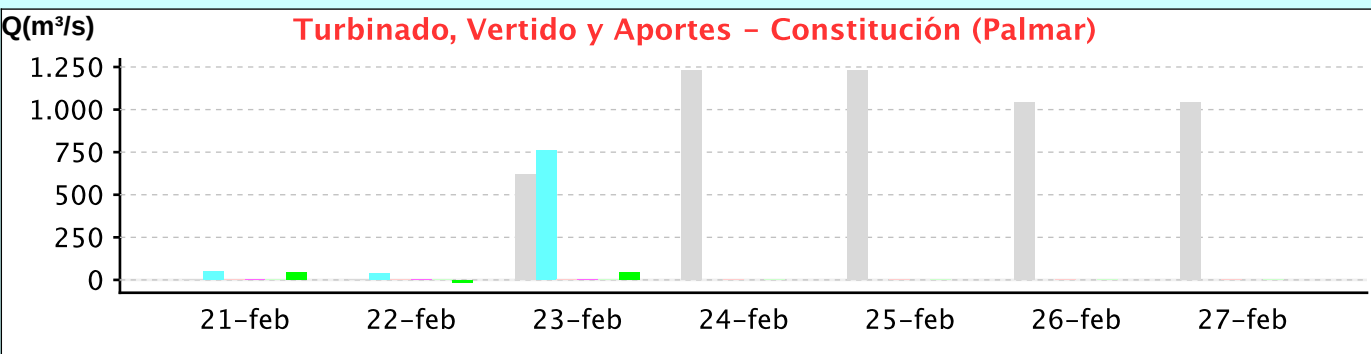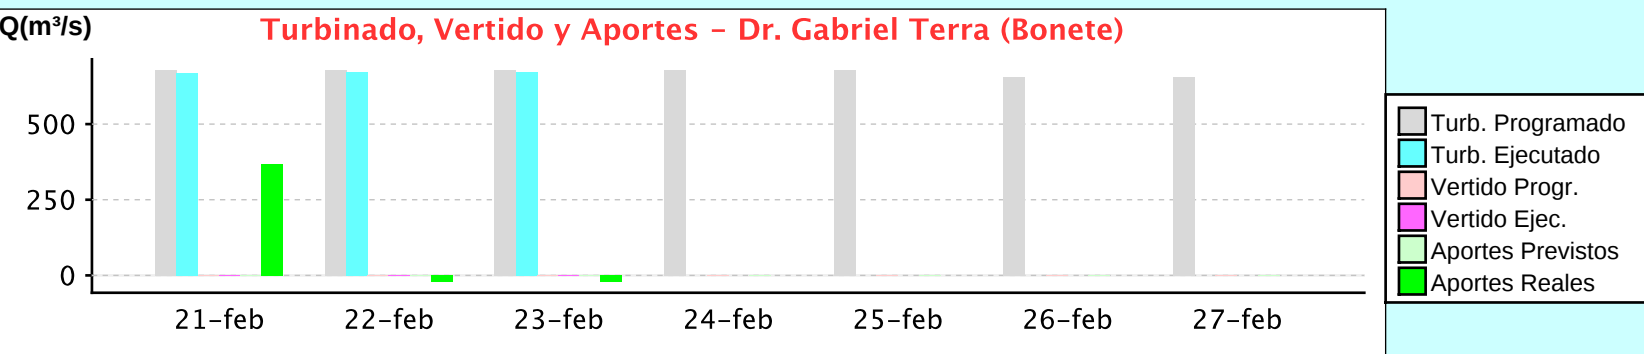

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

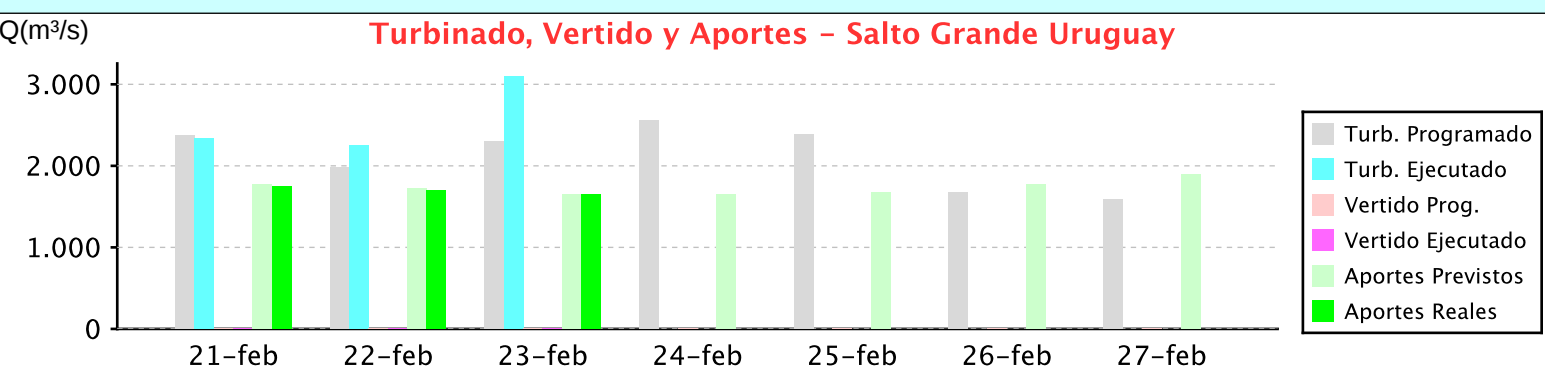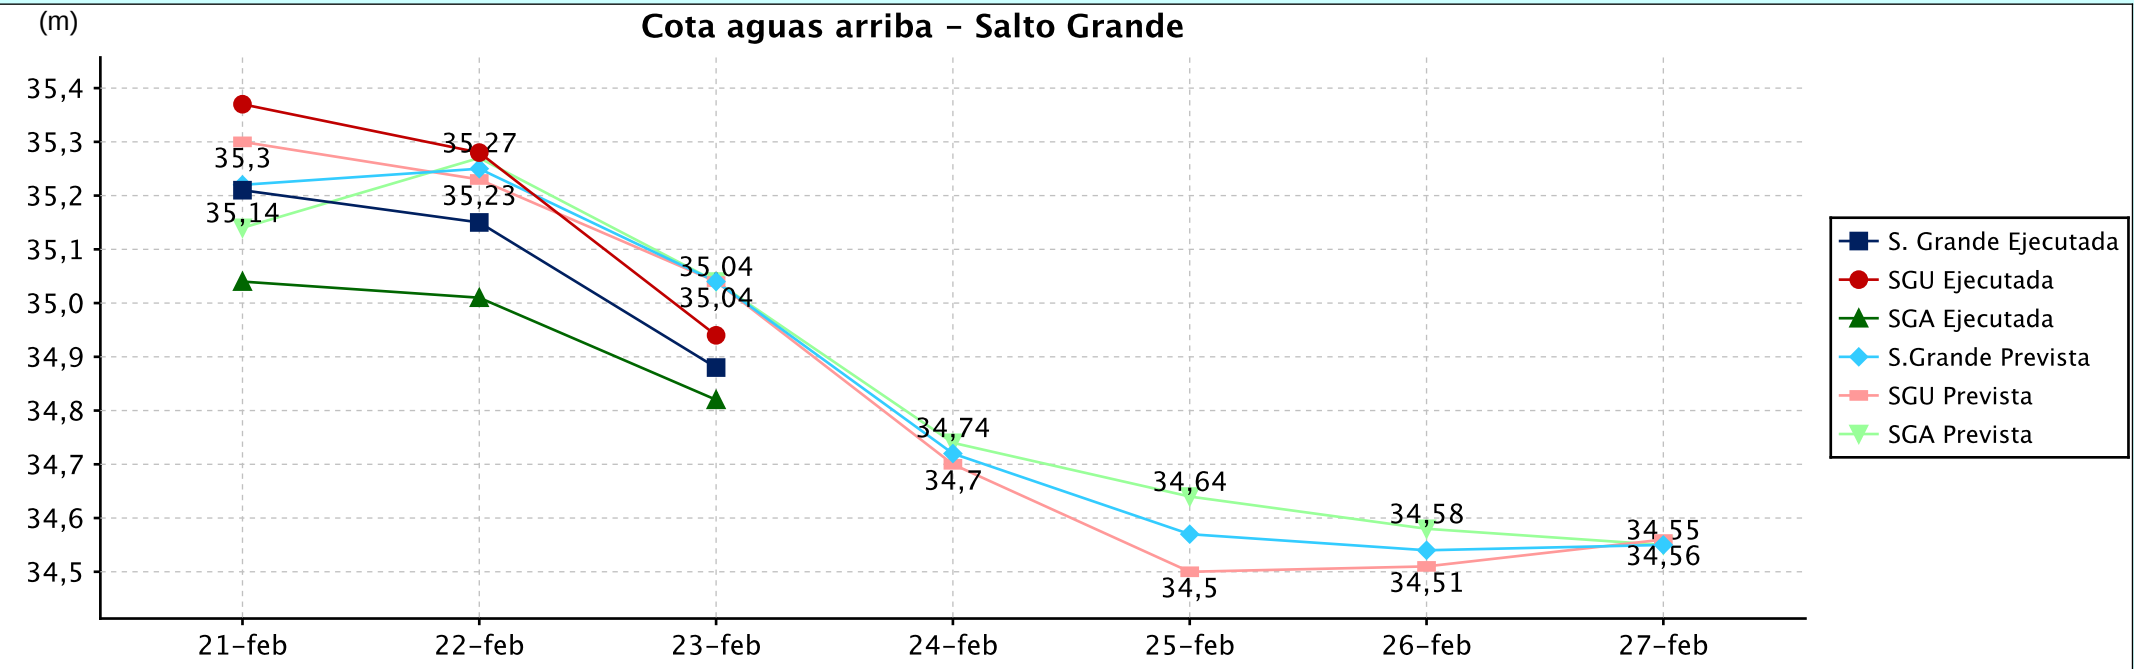

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,94
Cota Vista Arg	34,82
Cota real	34,88
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	2.799

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	679	672
Baygorria	663	782
Palmar	621	760
SGU	2.303	3.101

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-22
Baygorria	0	53
Palmar	0	44
SGU	1.650	1.651

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
