



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 26 de febrero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	764
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	768
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-3
APR C	7
Aggreko	0
Aggreko MVA	0
Aggreko MVB	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.315
C. Baygorria	2.373
C. Palmar	6.341
C. Salto Grande	13.898
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.992
TOTAL Generación	30.605

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.605
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.290
Diferencia (MWh)	-685
Ejecutada - Programada	-2,19 %

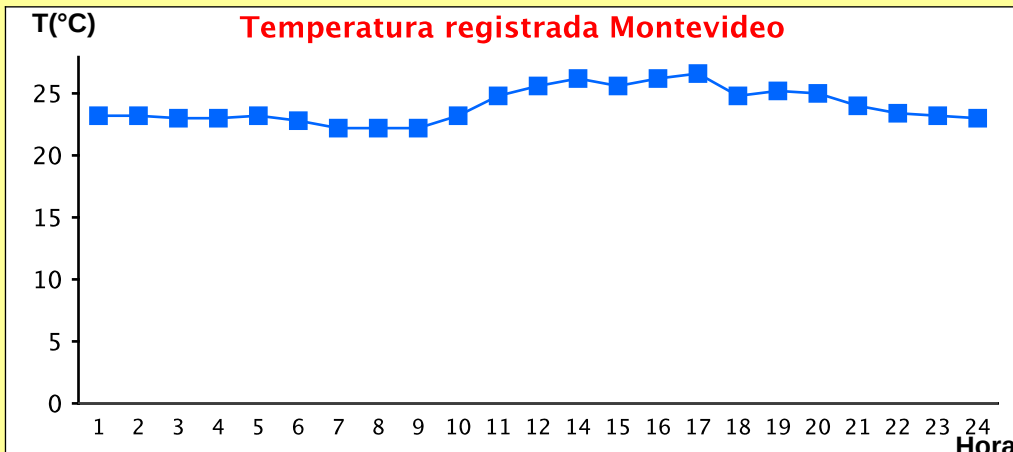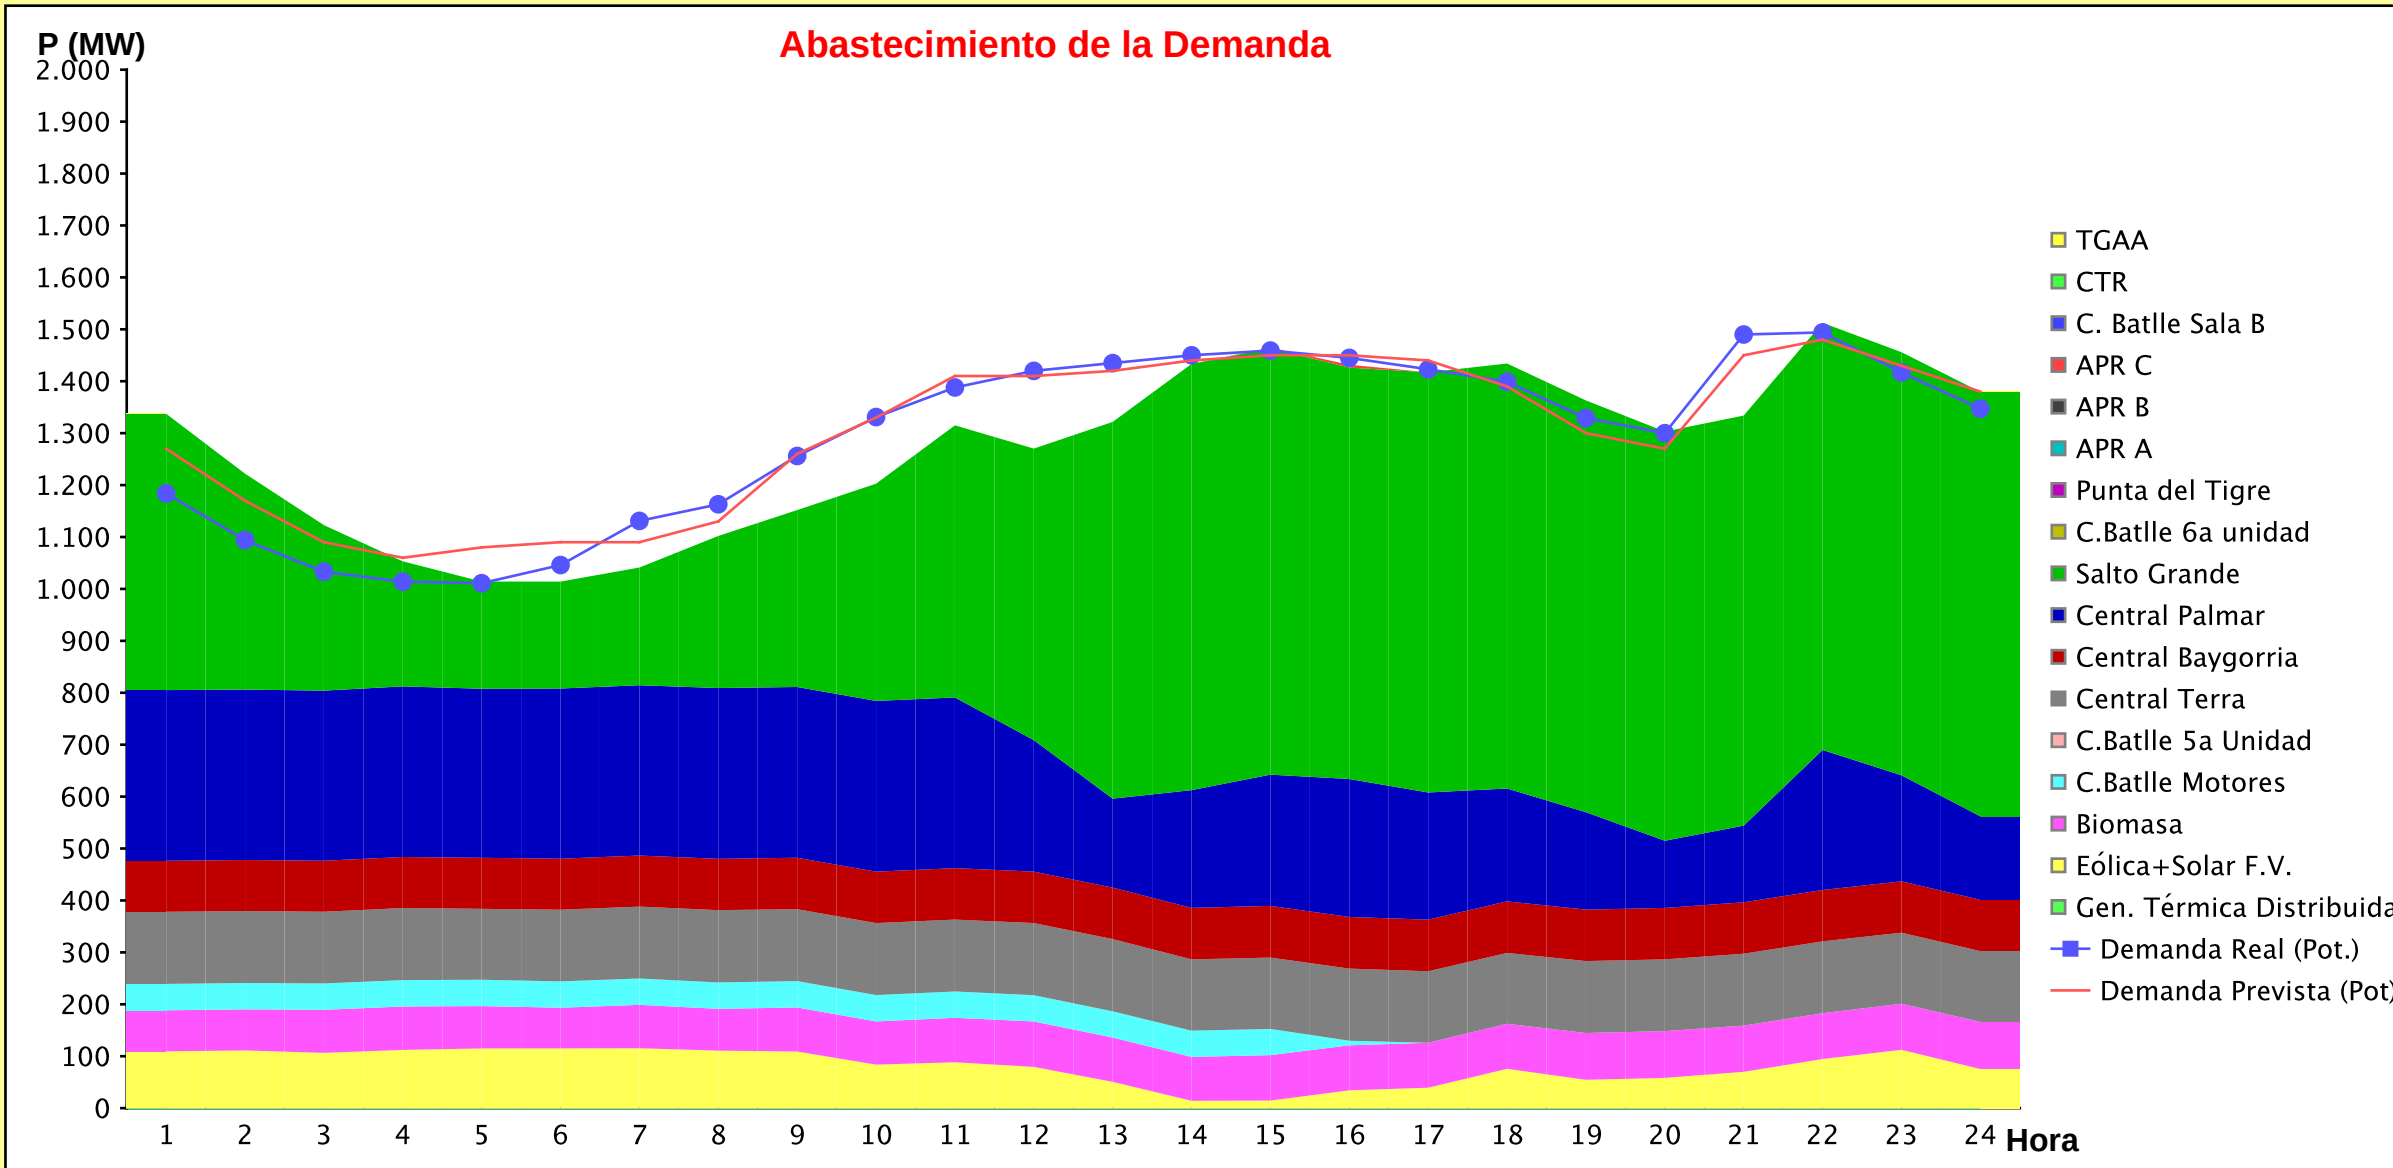



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1459,4 Hora 13:33
Potencia mínima:	999,72 Hora 03:53
Pico noche:	1521,39 Hora 21:35

Generación Media (MW)	
Eólica	82,3
Biomasa	85,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

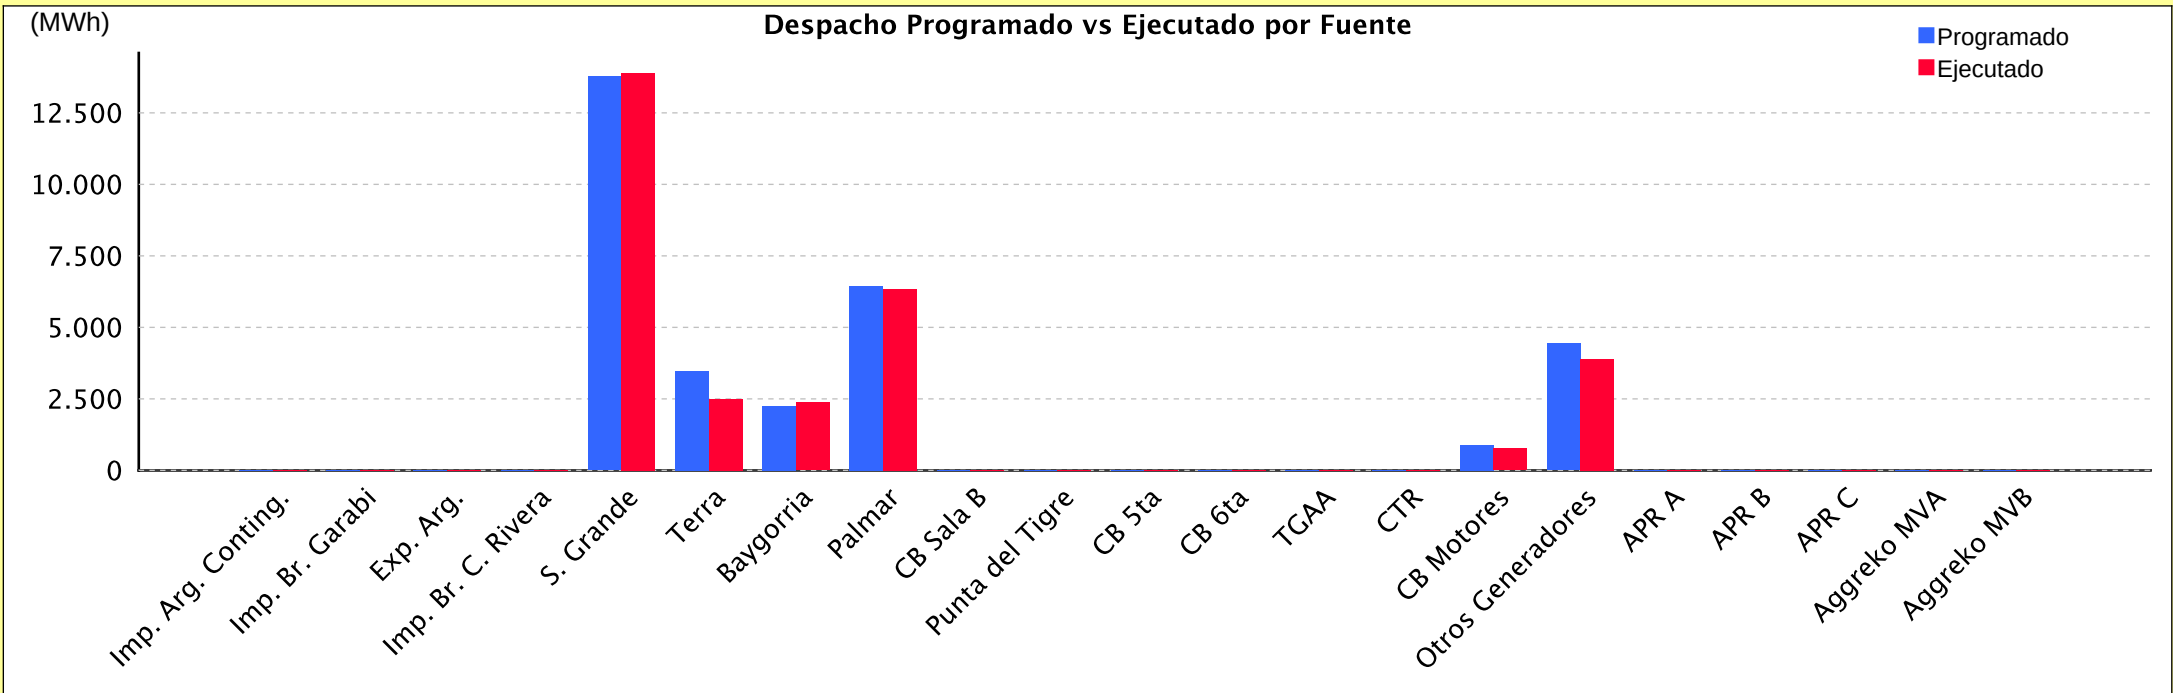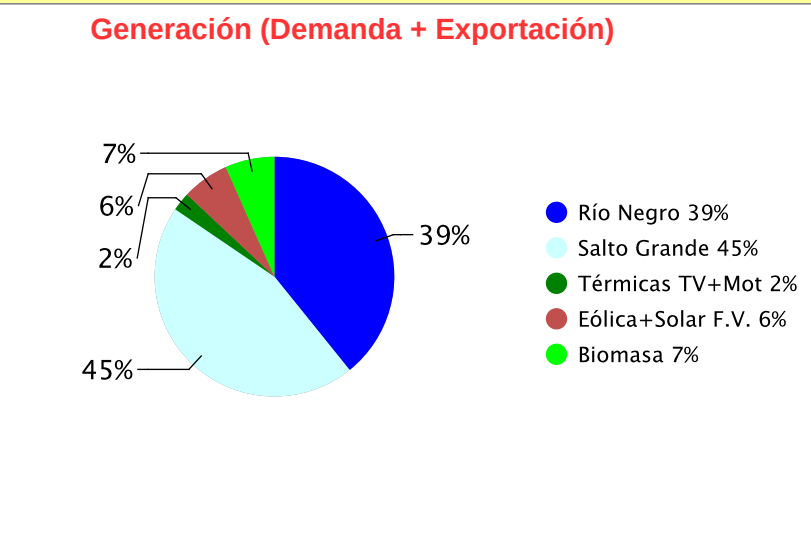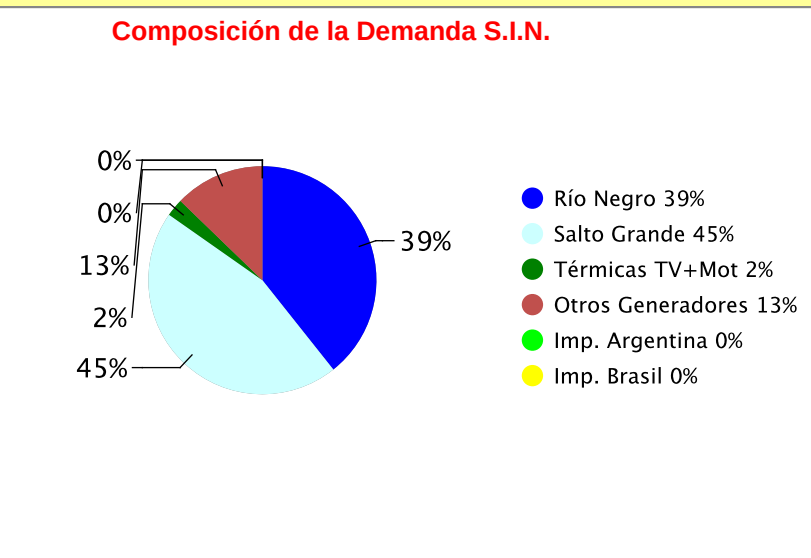



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

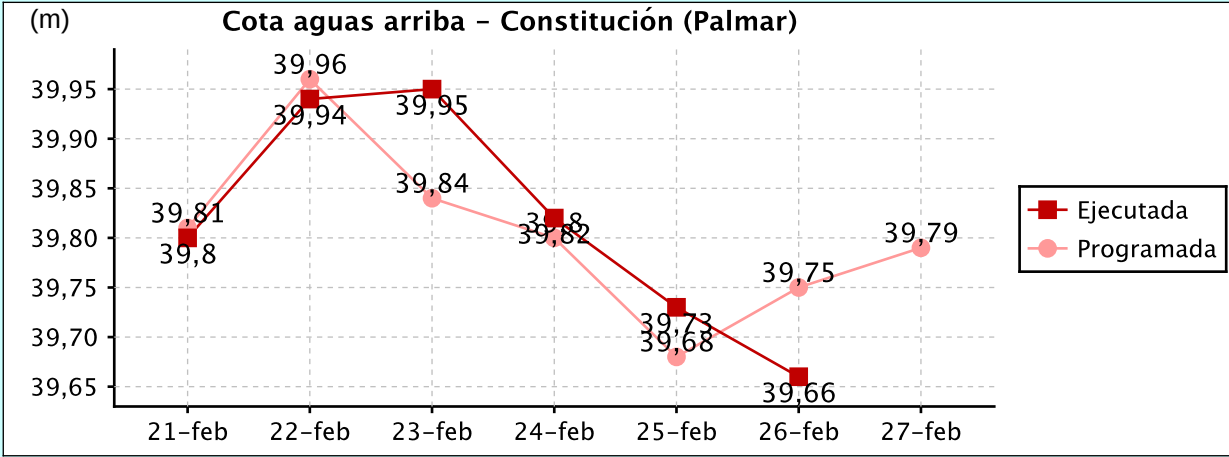
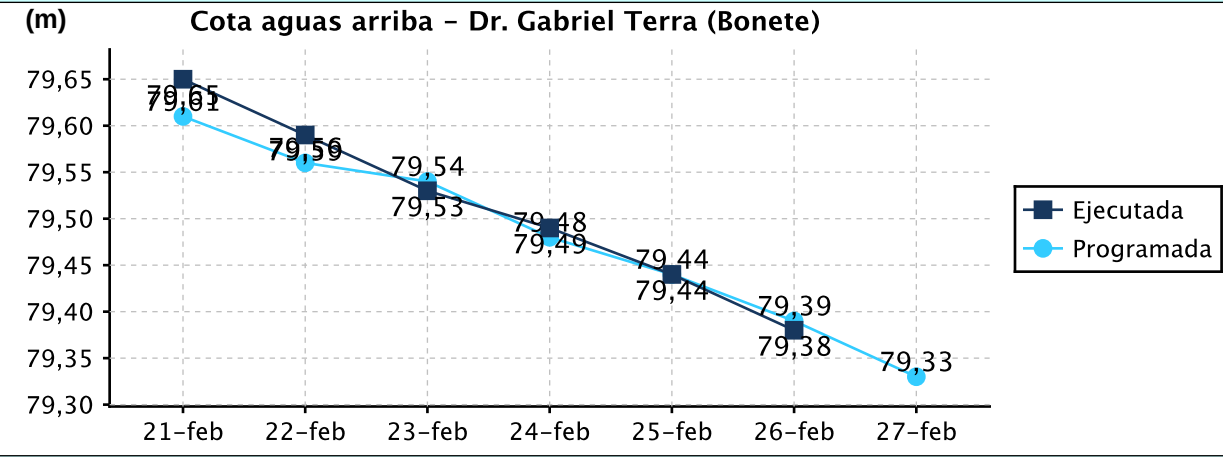


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,39	79,38
Baygorria	53,92	53,78
Palmar	39,75	39,66
SGU	34,62	34,48

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

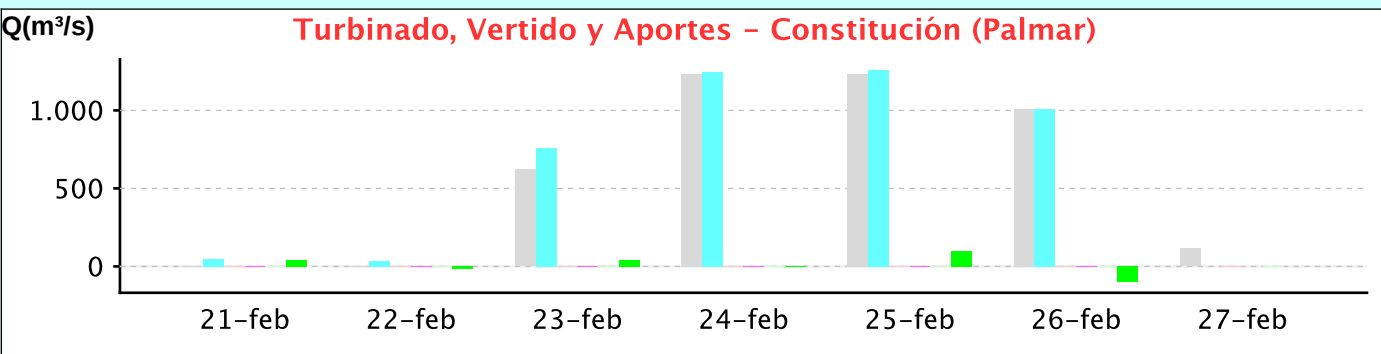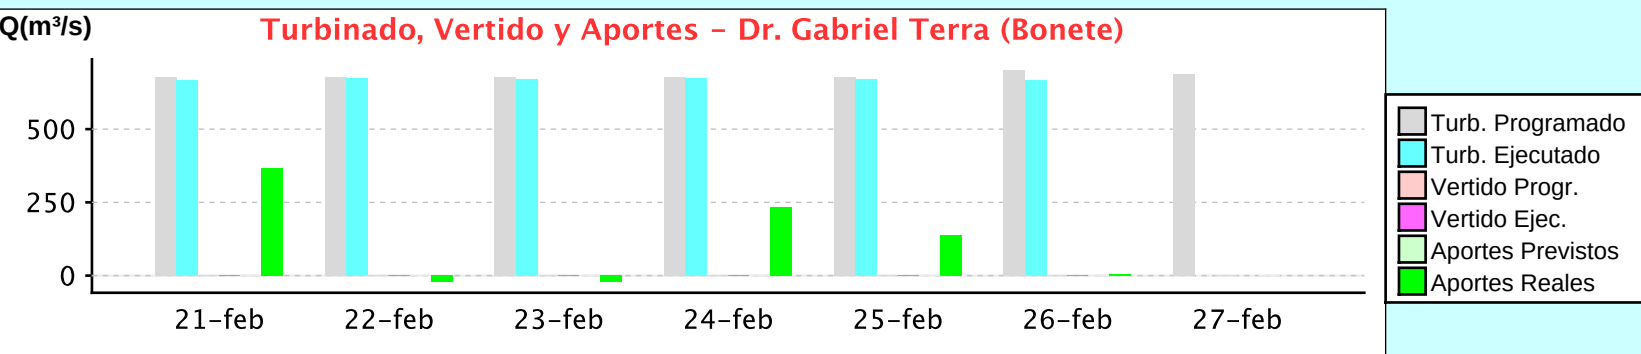

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

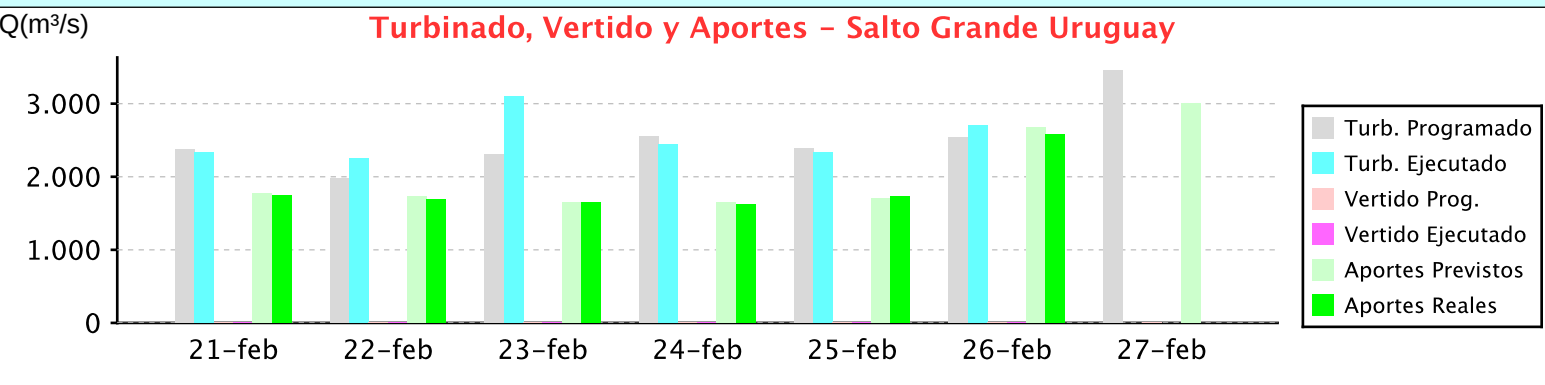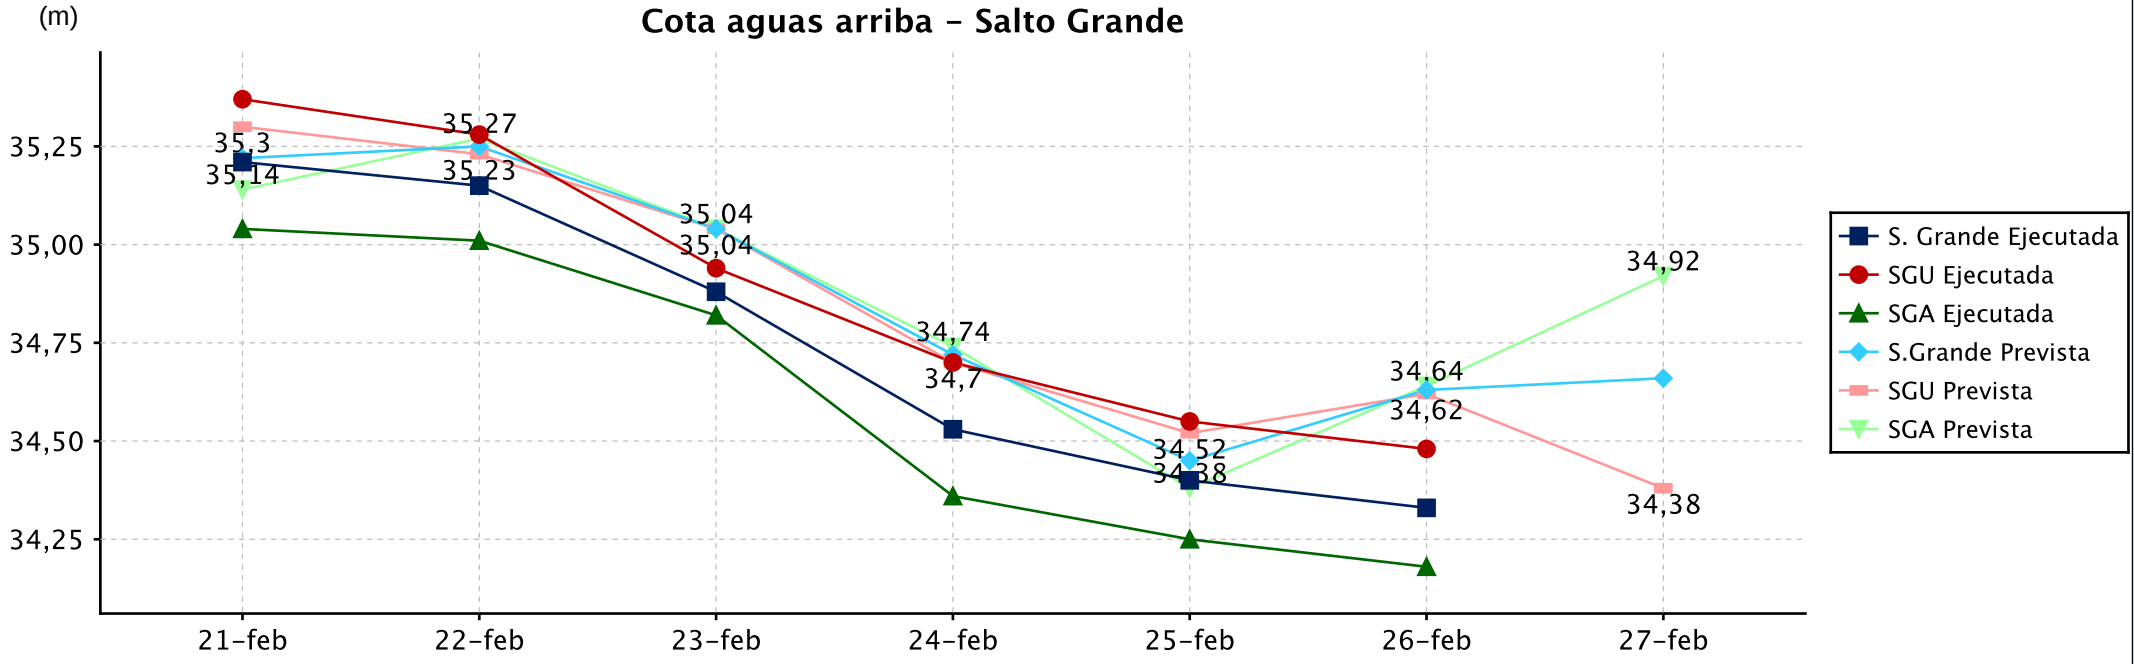

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,48
Cota Vista Arg	34,18
Cota real	34,33
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	6.500

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	702	666
Baygorria	803	875
Palmar	1.010	1.009
SGU	2.540	2.706

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	5
Baygorria	0	35
Palmar	0	-101
SGU	2.675	2.584

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
