




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 27 de febrero de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-79
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	4
Aggreko	0
Aggreko MVA	0
Aggreko MVB	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.246
C. Baygorria	1.656
C. Palmar	824
C. Salto Grande	18.395
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.816
TOTAL Generación	29.850

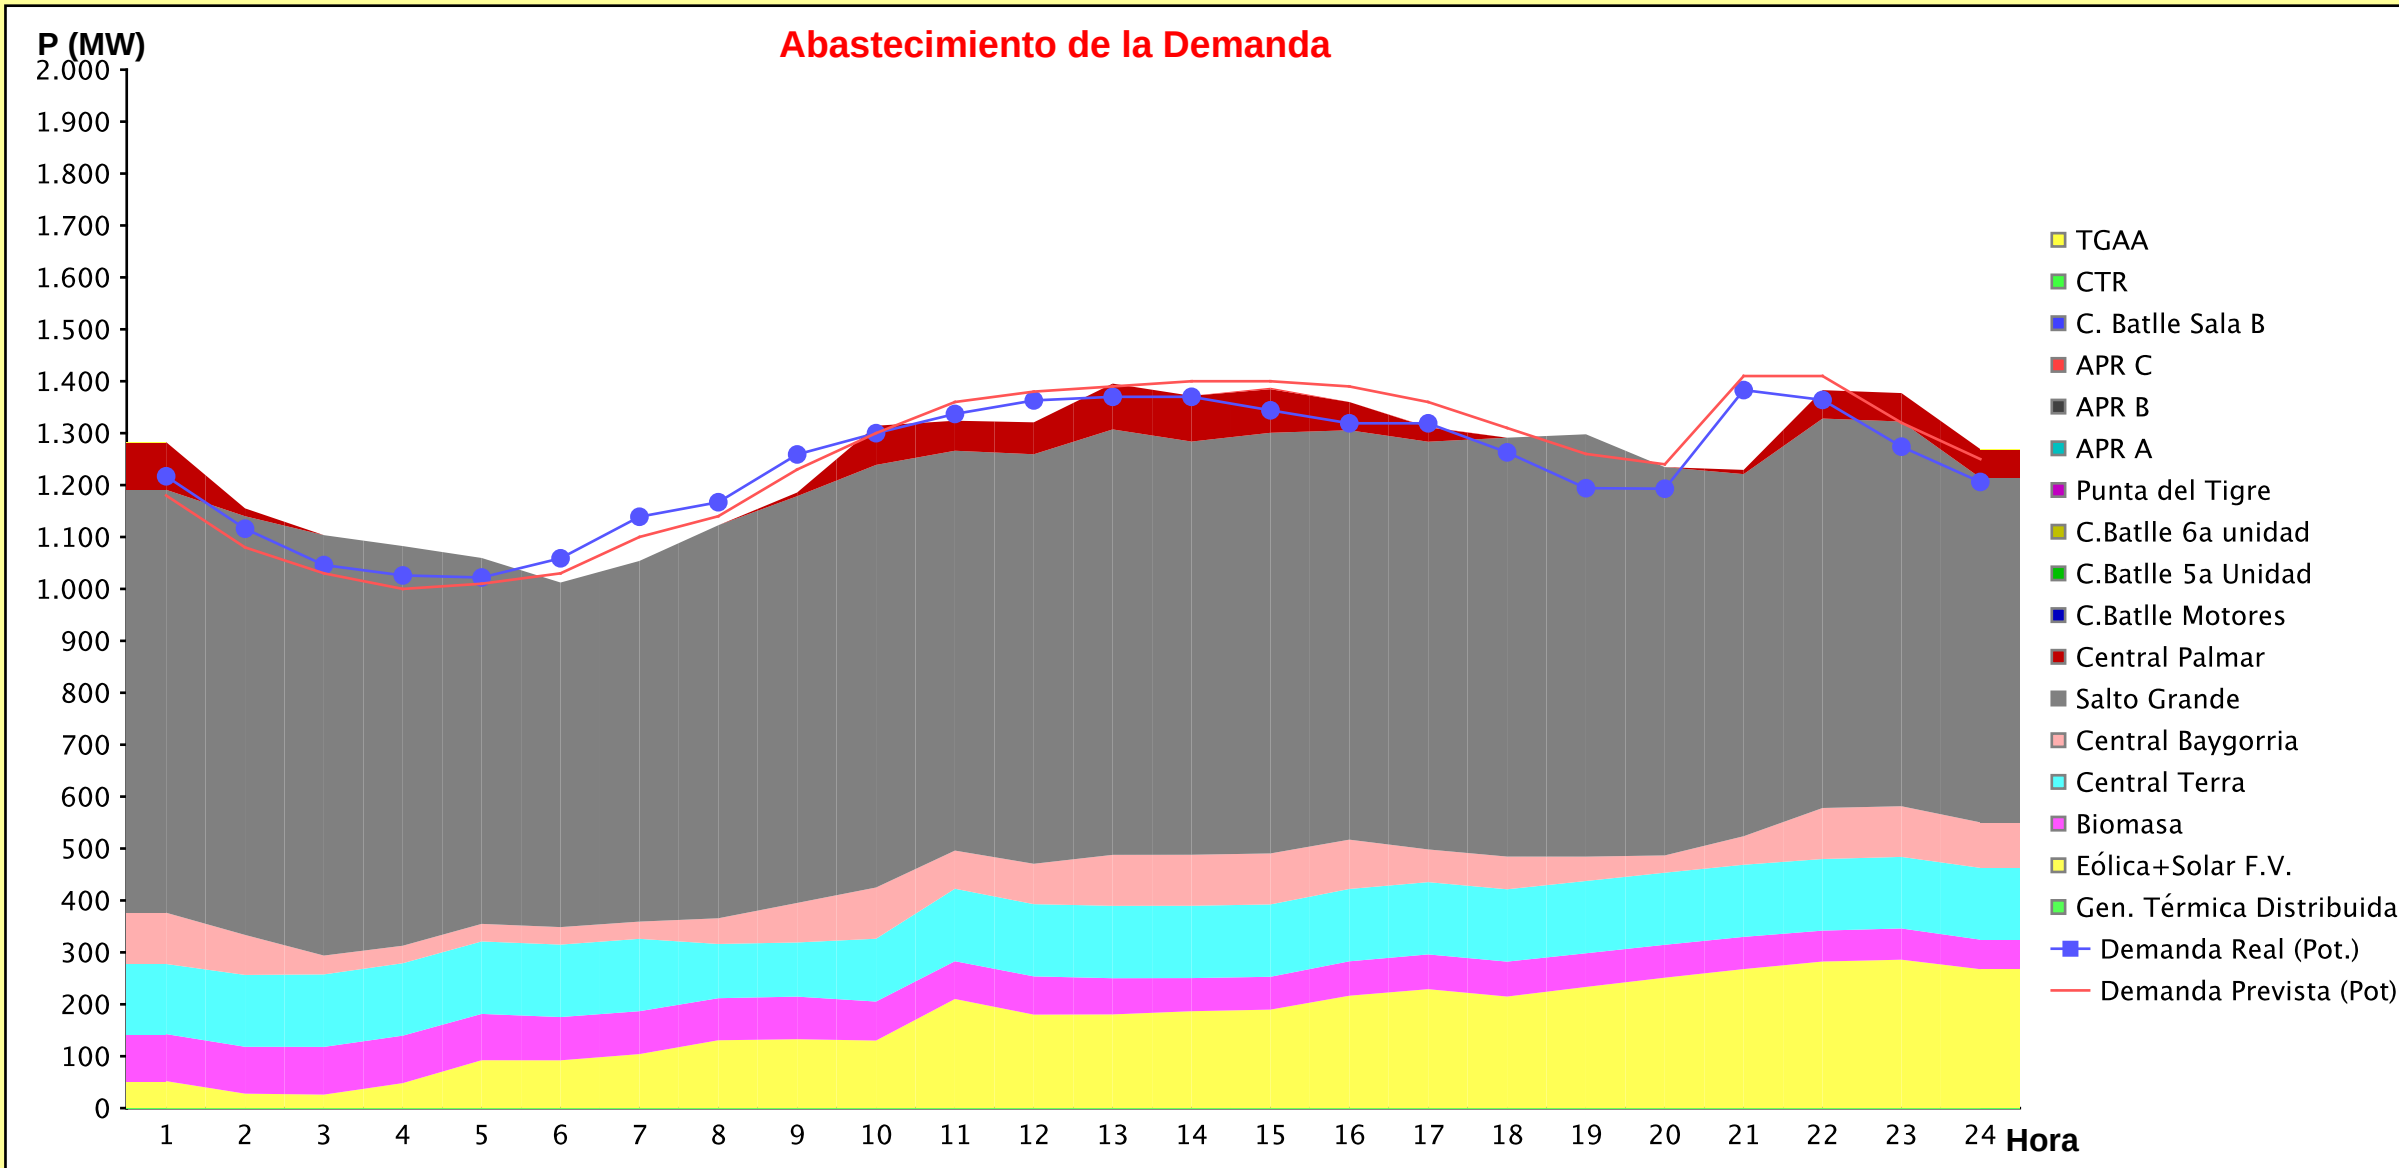

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.850
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.980
Diferencia (MWh)	-130
Ejecutada - Programada	-0,43 %

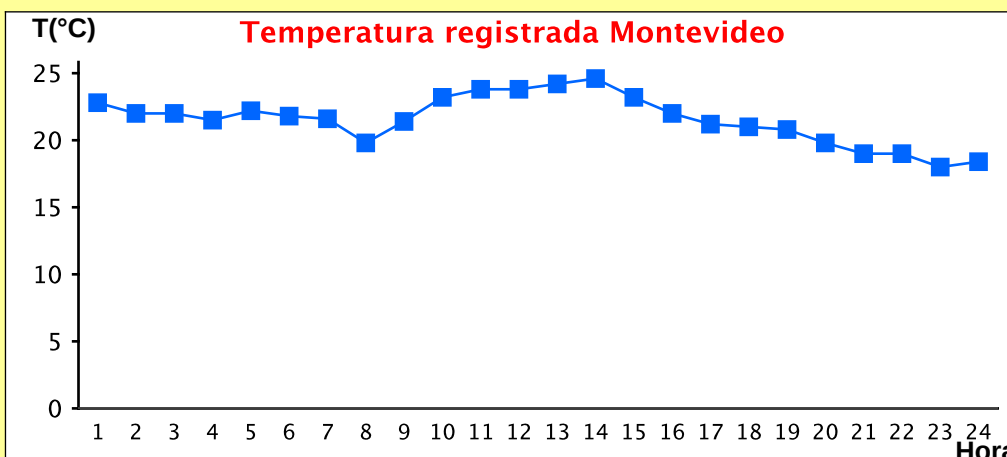



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1387,85 Hora 13:25
Potencia mínima:	1007,85 Hora 04:27
Pico noche:	1405,92 Hora 21:22

Generación Media (MW)	
Eólica	168,8
Biomasa	74,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

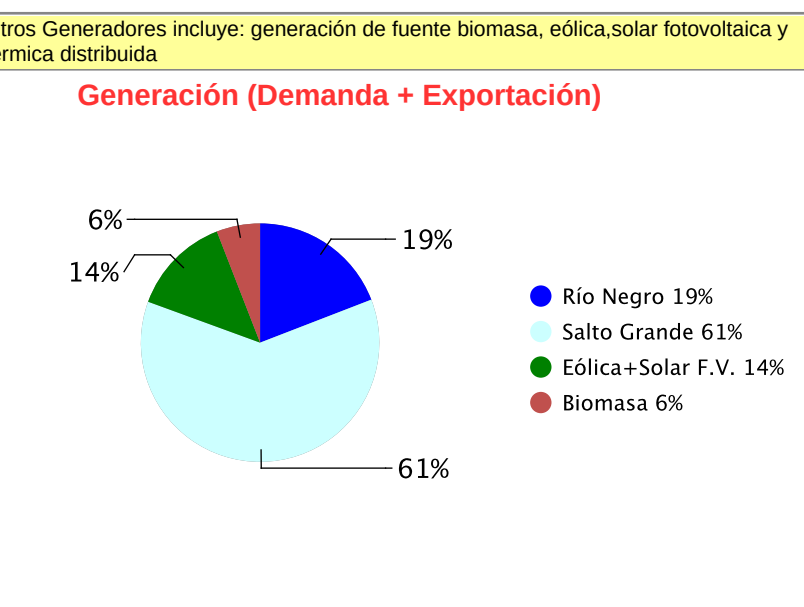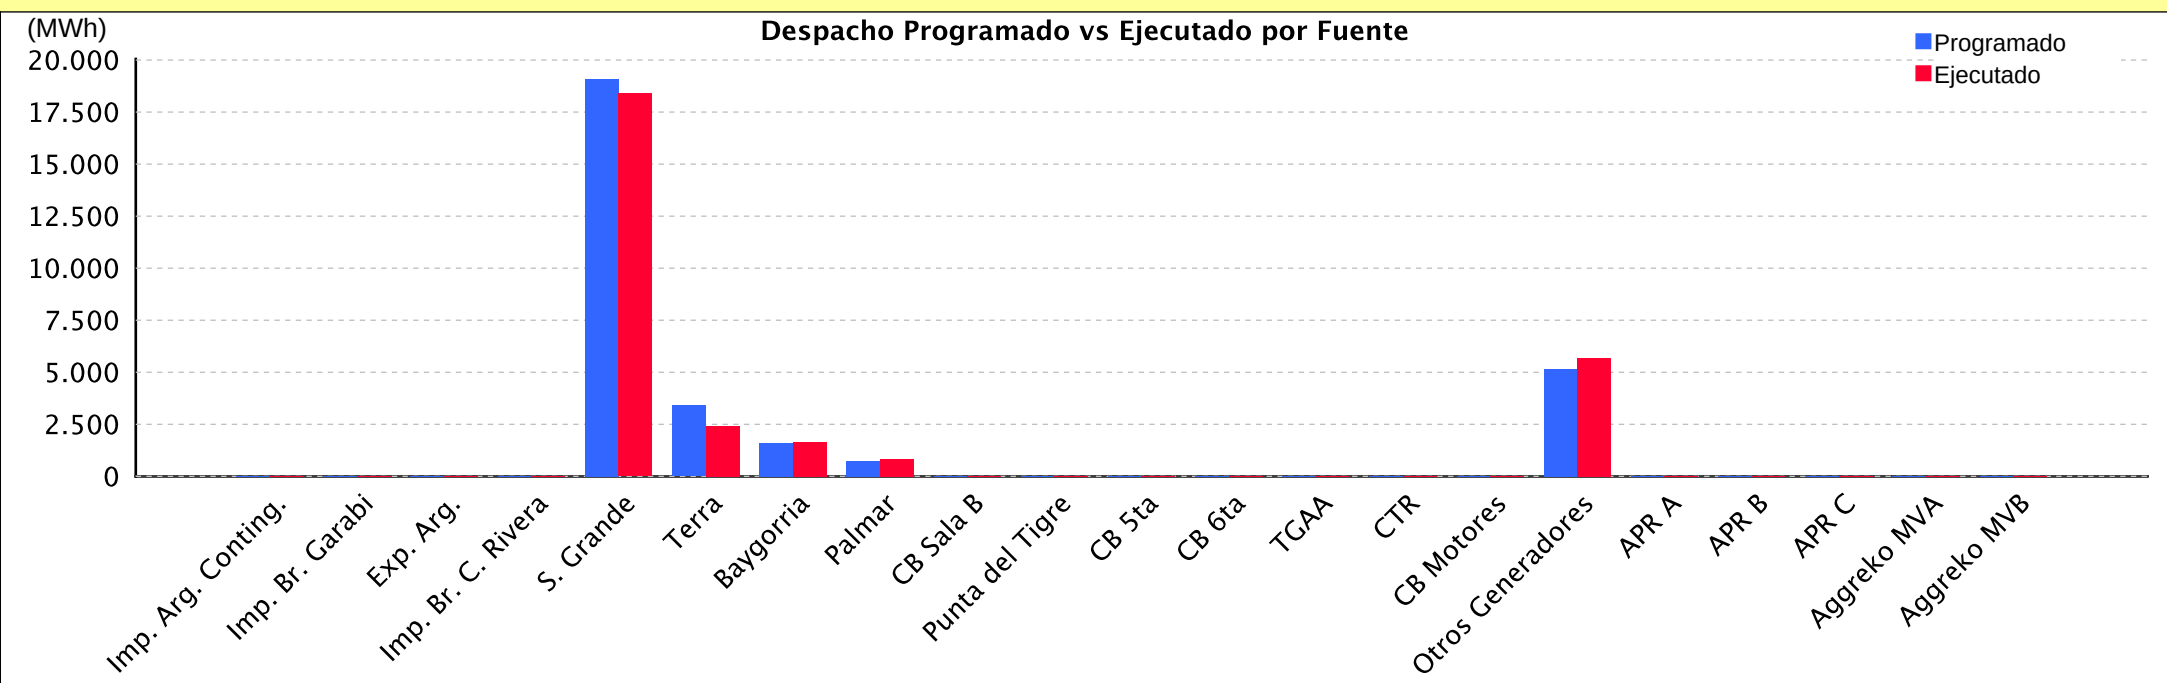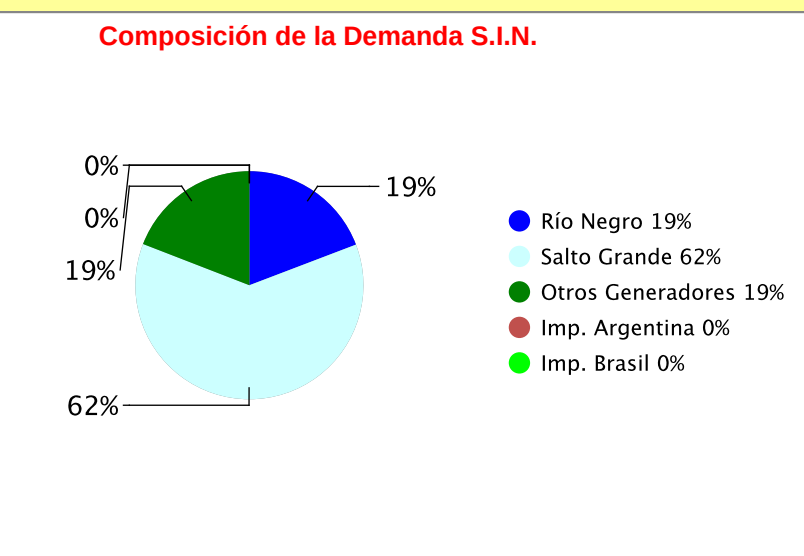



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

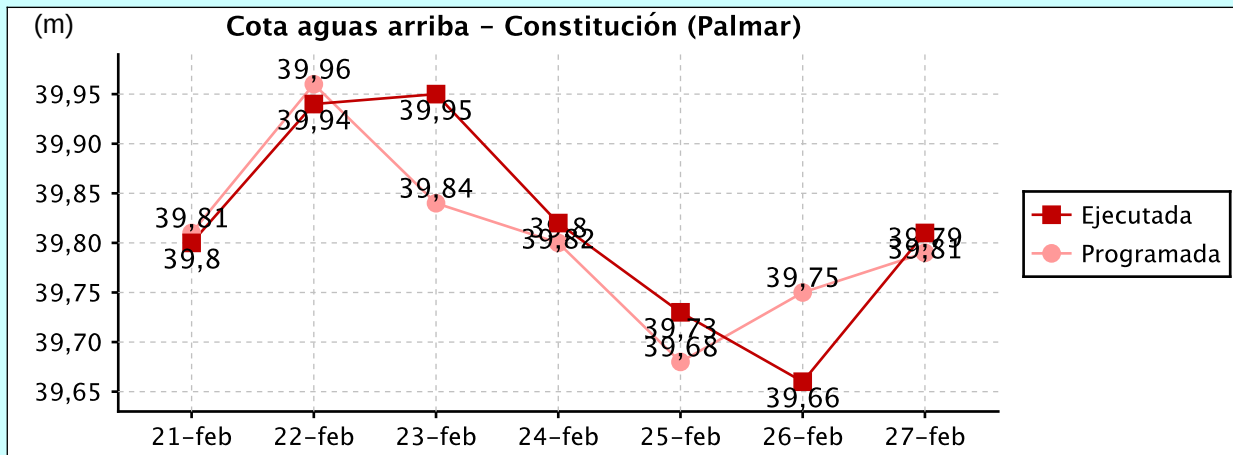
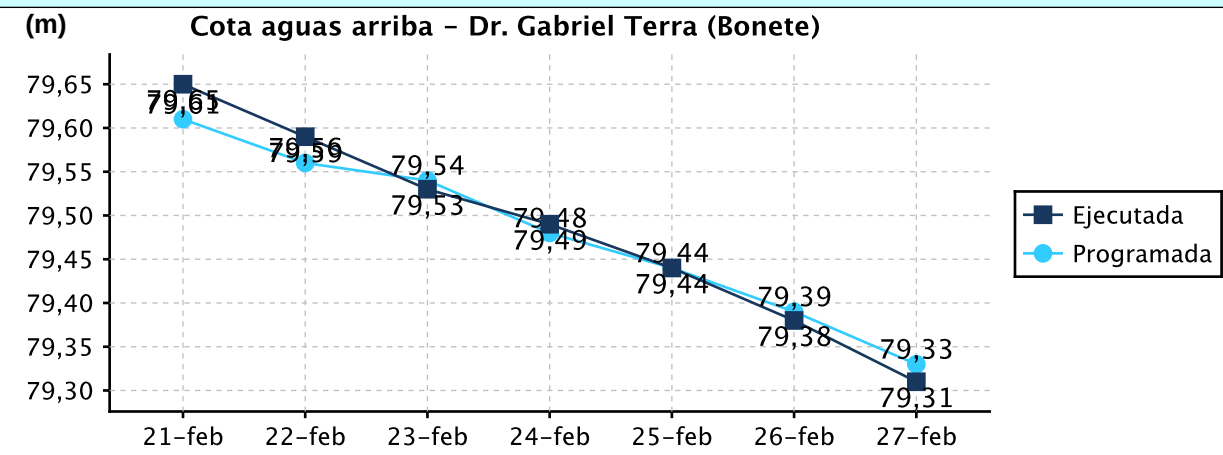


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,33	79,31
Baygorria	53,88	53,8
Palmar	39,79	39,81
SGU	34,38	34,28

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

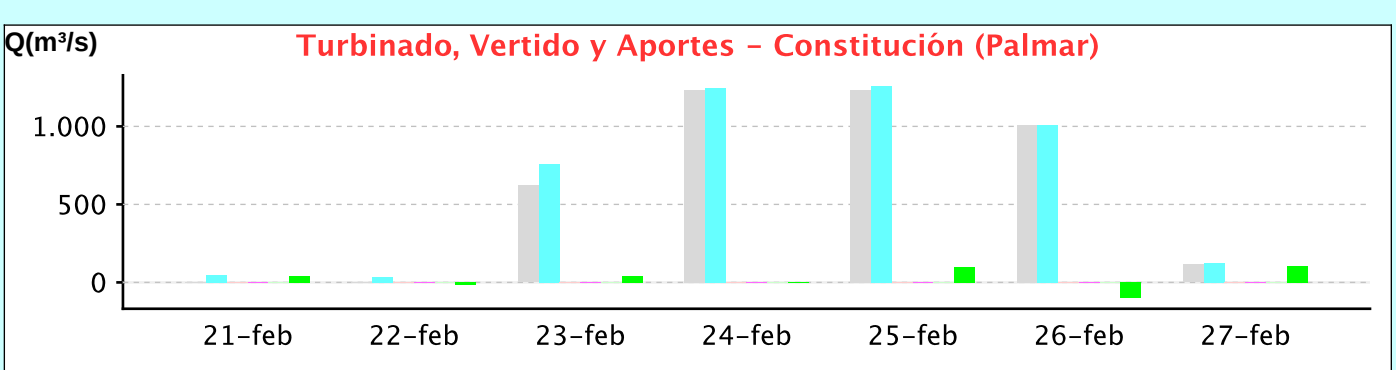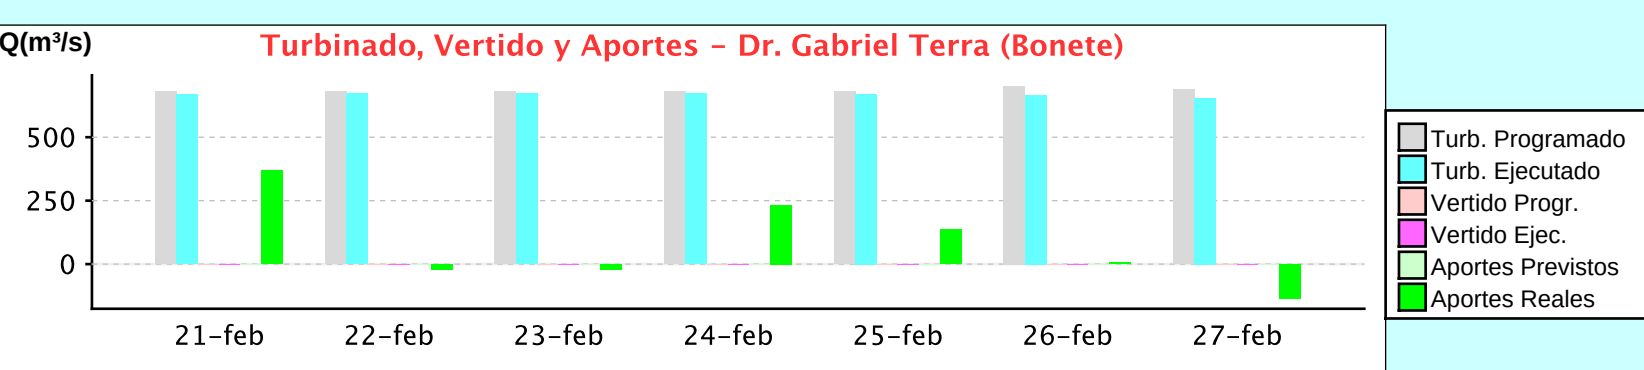

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

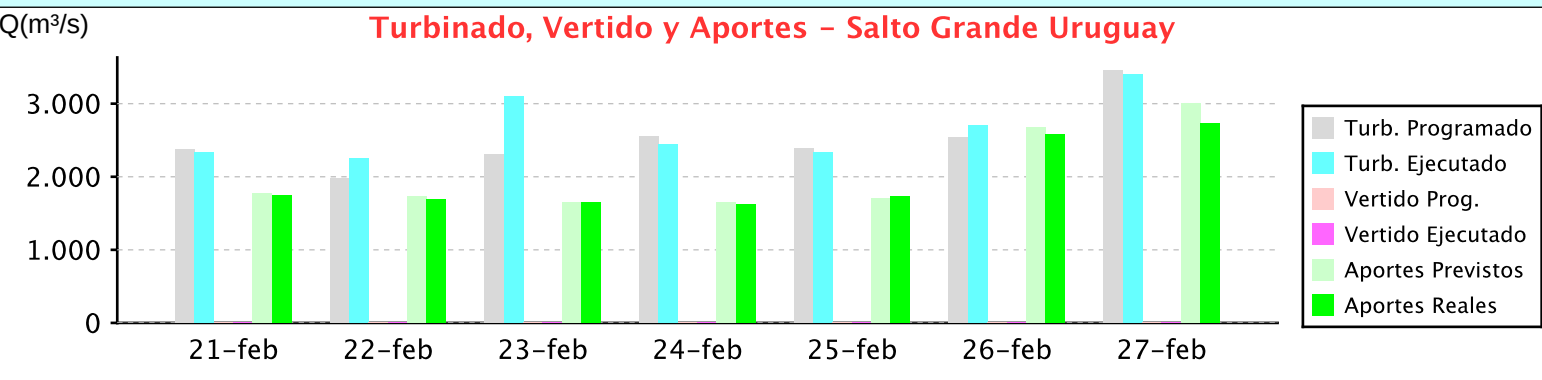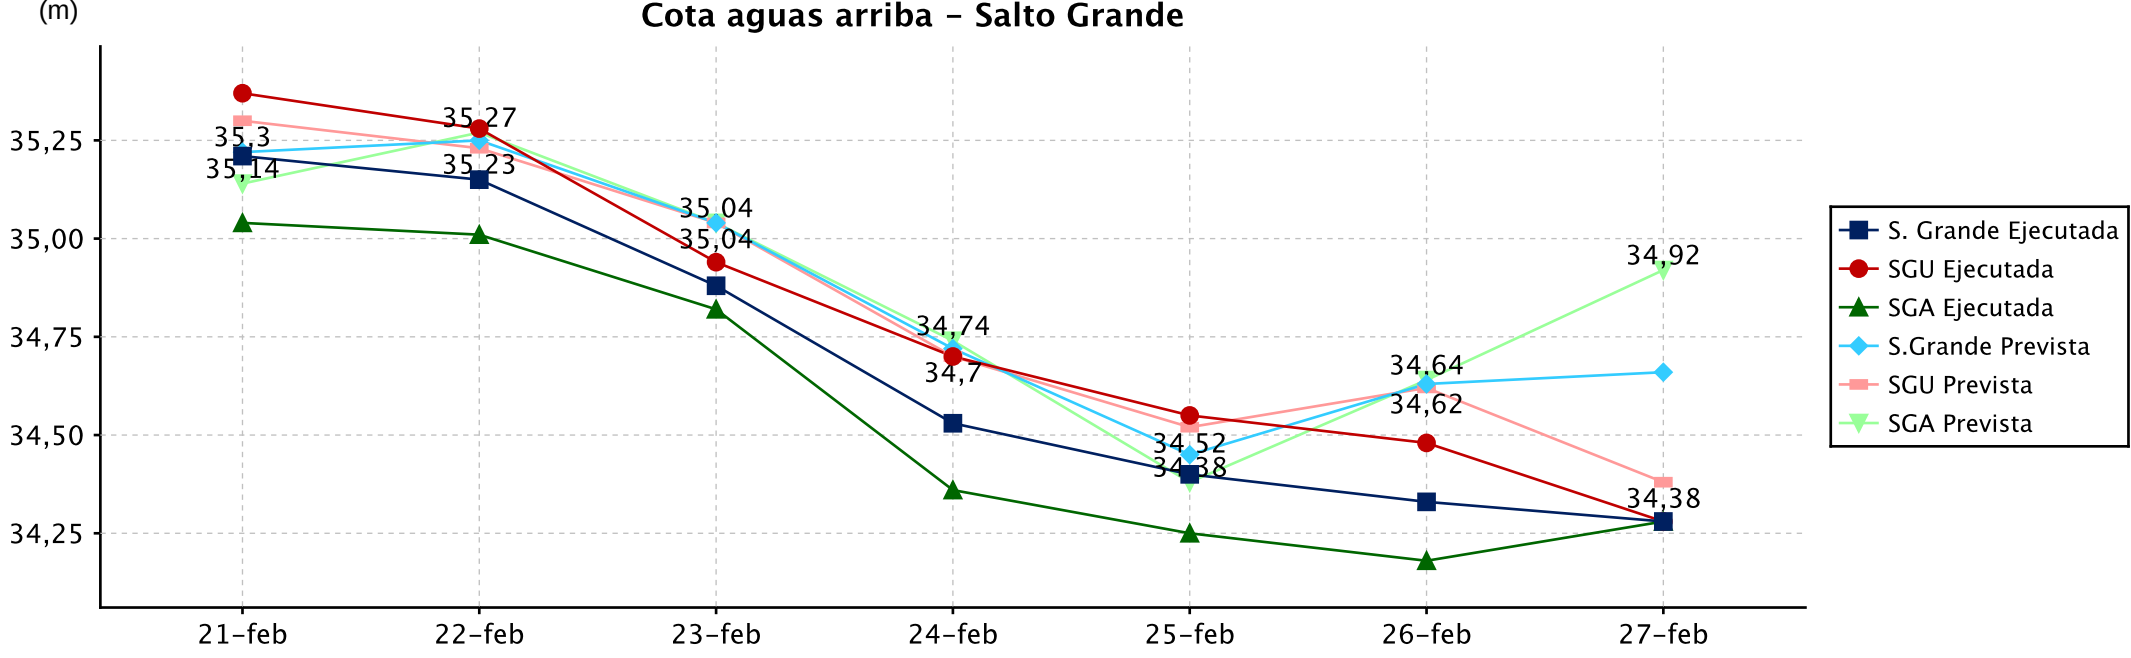

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,28
Cota Vista Arg	34,28
Cota real	34,28

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	39
---------------------------------	----

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	688	654
Baygorria	570	609
Palmar	114	126
SGU	3.459	3.395

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-134
Baygorria	0	-11
Palmar	0	103
SGU	3.000	2.725

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
