




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 05 de marzo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	25
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	28
Central La Tablada	-56
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	0
Aggreko MVA	0
Aggreko MVB	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.233
C. Baygorria	2.069
C. Palmar	6.809
C. Salto Grande	14.854
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.313
TOTAL Generación	30.239

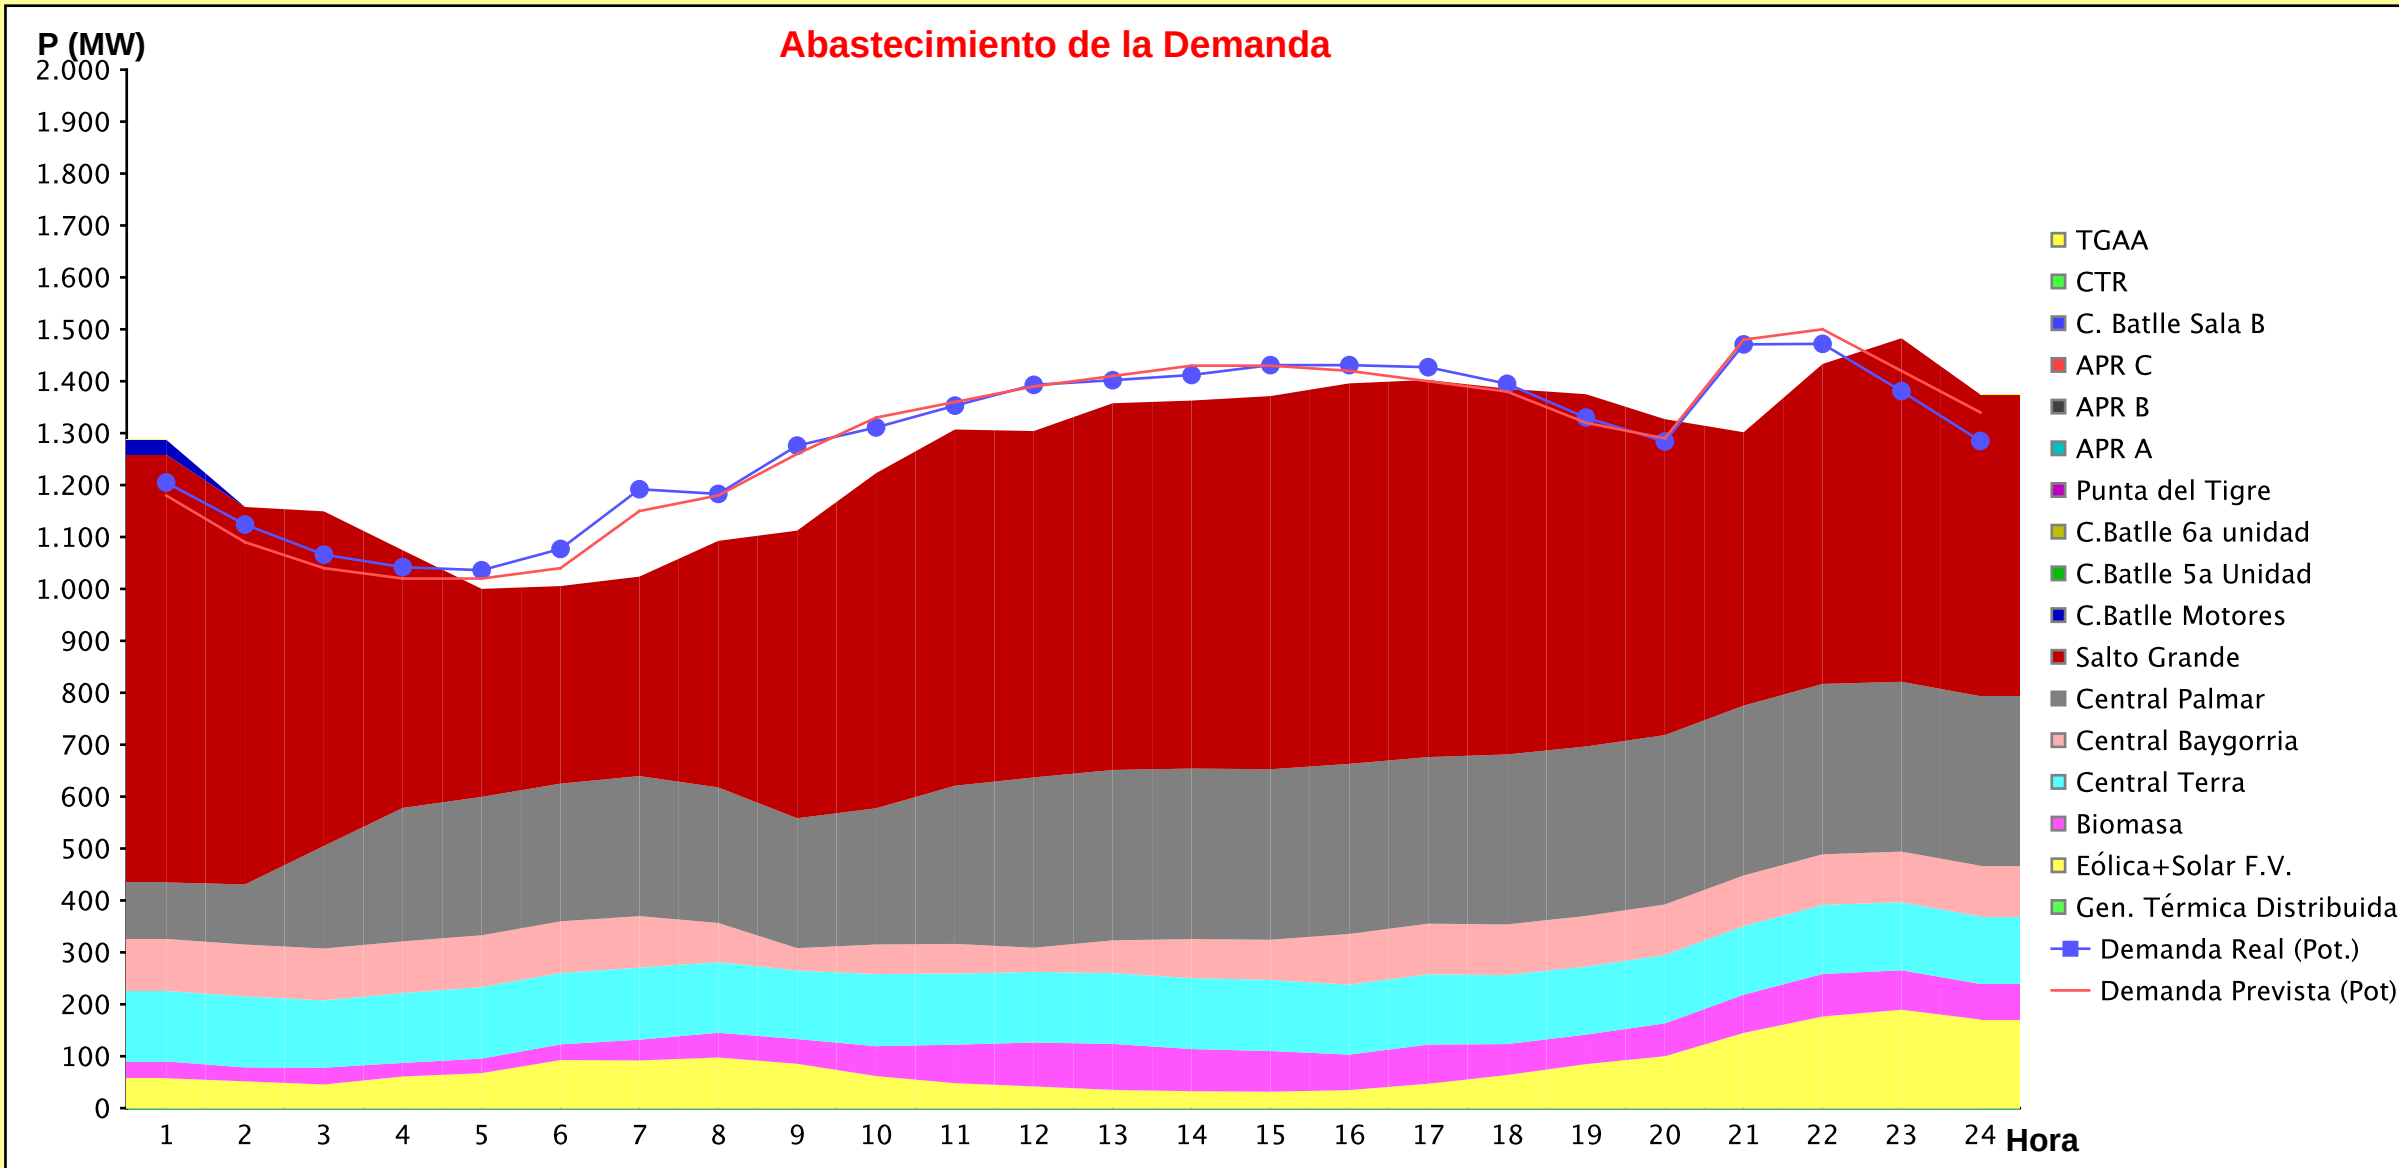

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.239
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.880
Diferencia (MWh)	-641
Ejecutada - Programada	-2,08 %

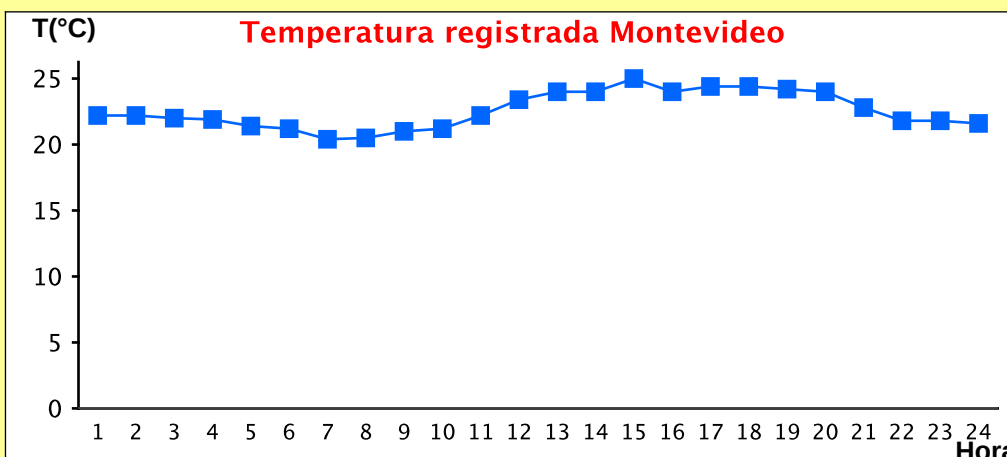



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1411 Hora 16:55
Potencia mínima:	993 Hora 04:26
Pico noche:	1489 Hora 21:23

Generación Media (MW)	
Eólica	80,6
Biomasa	65,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

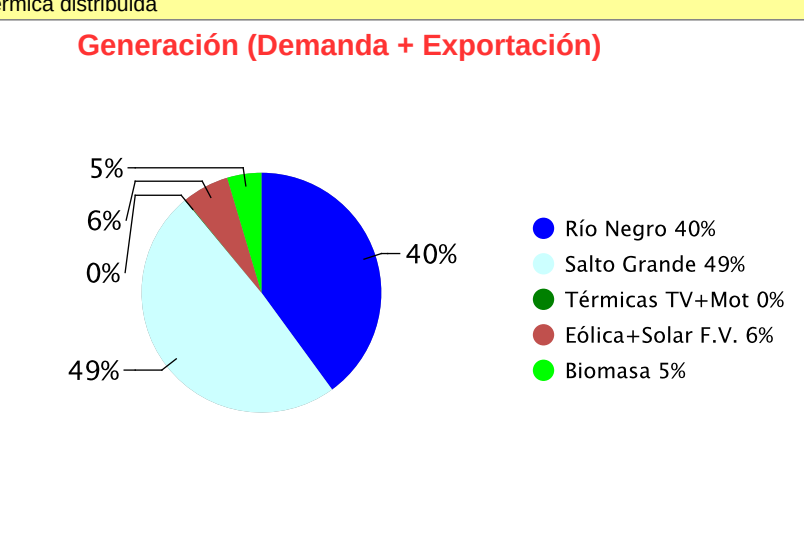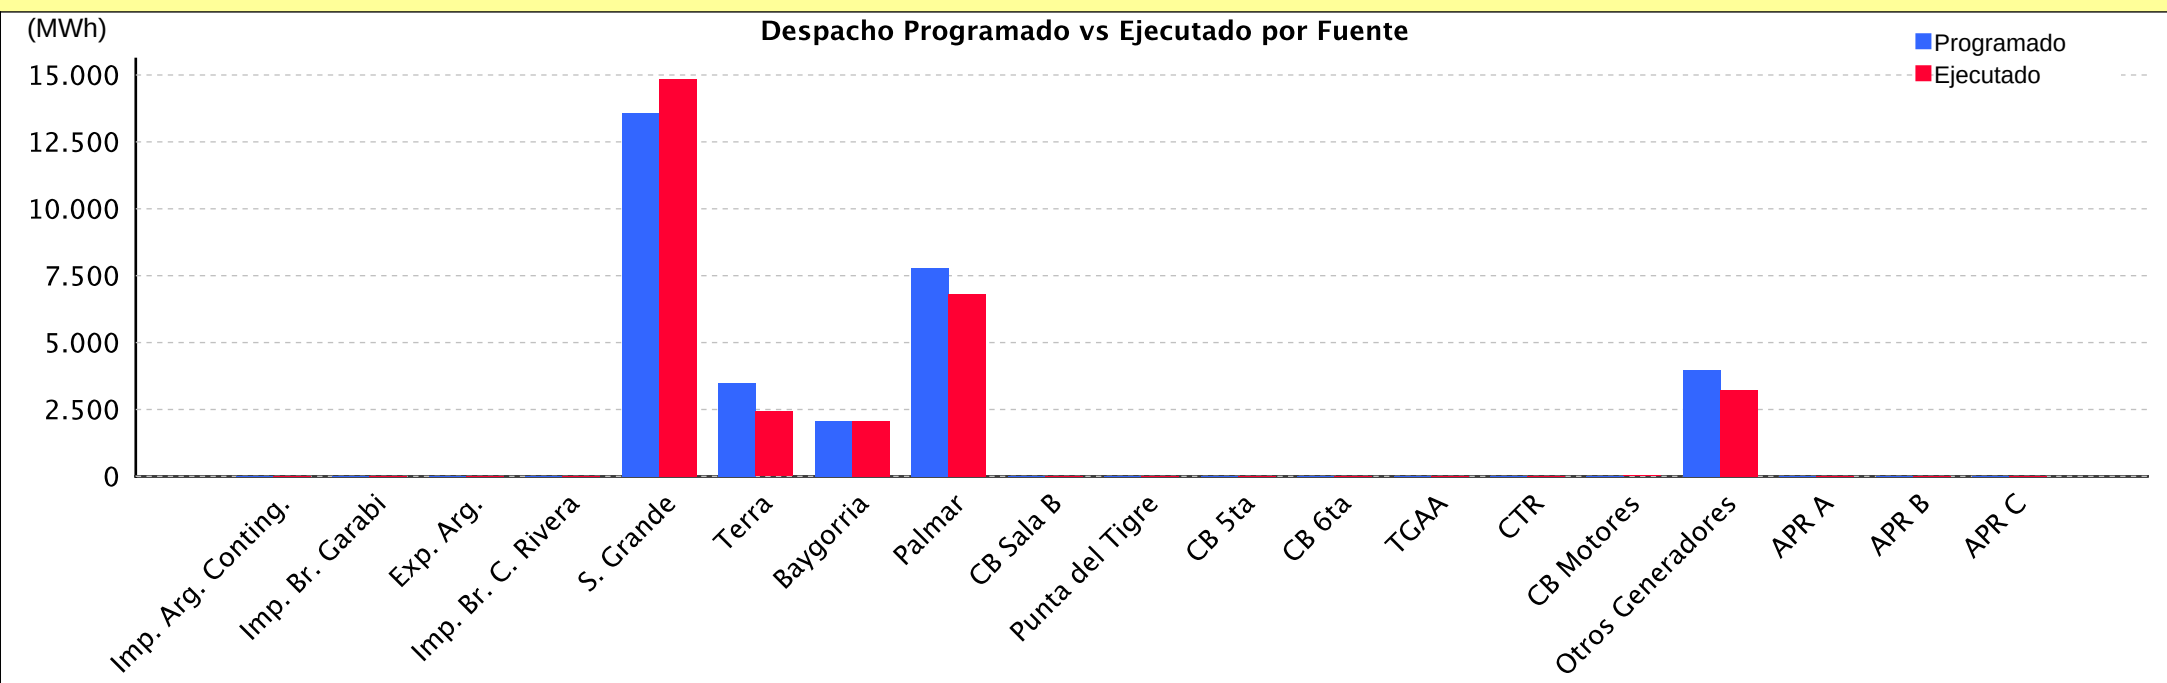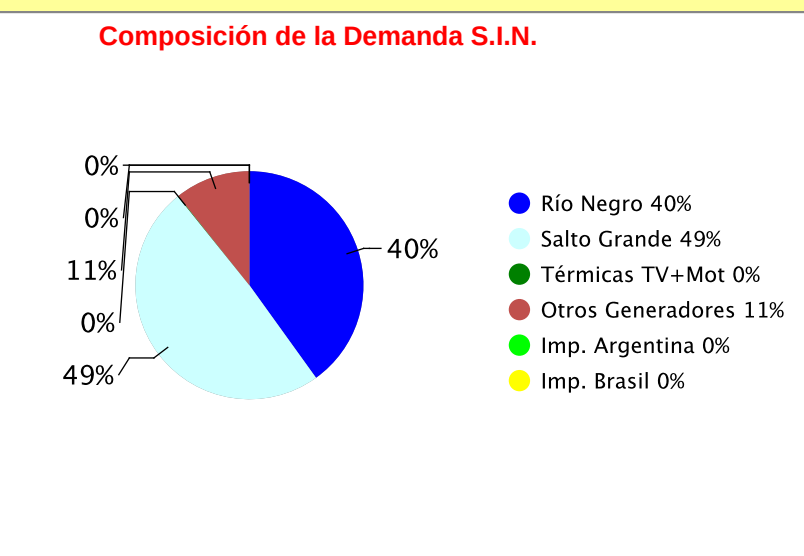



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

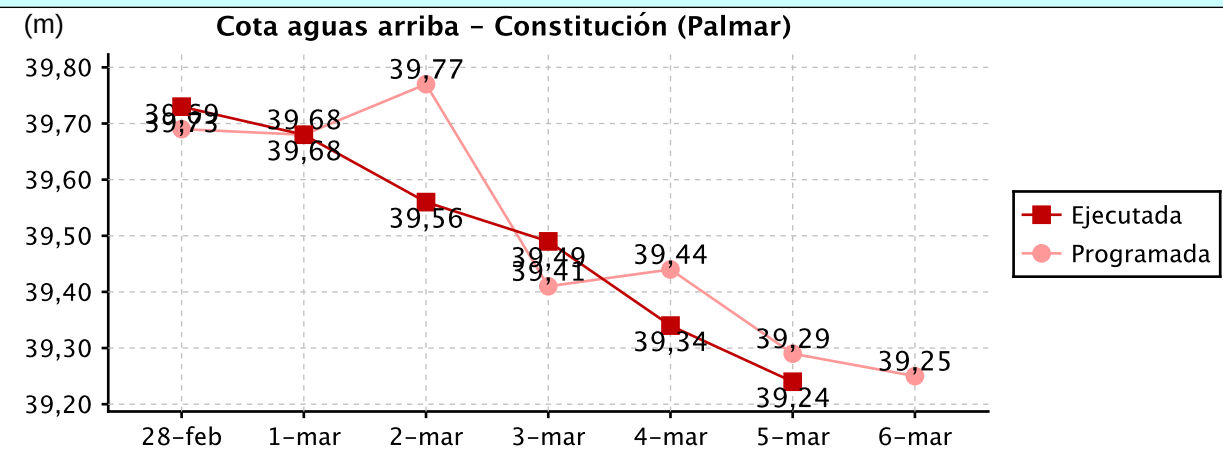
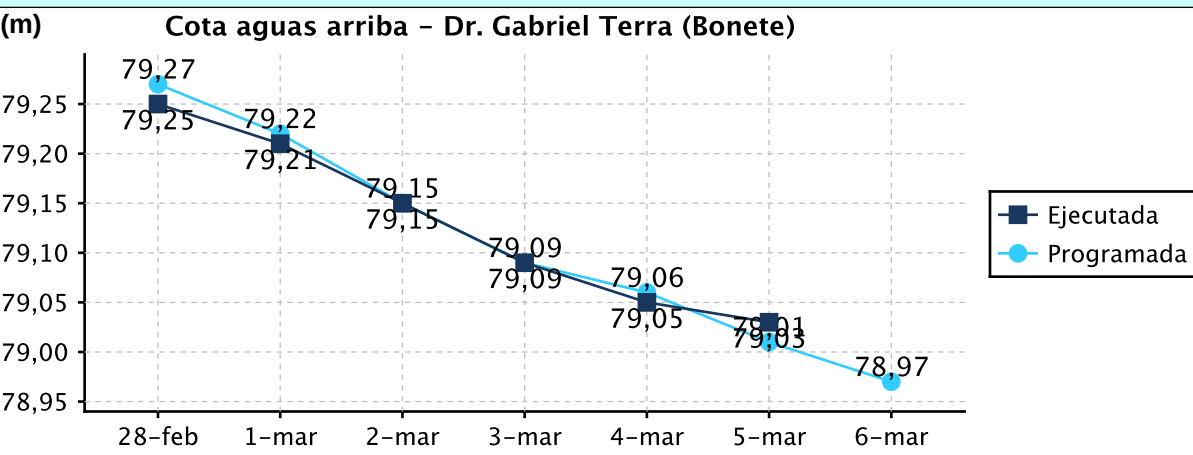


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,01	79,03
Baygorria	53,72	53,65
Palmar	39,29	39,24
SGU	35,20	35,22

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

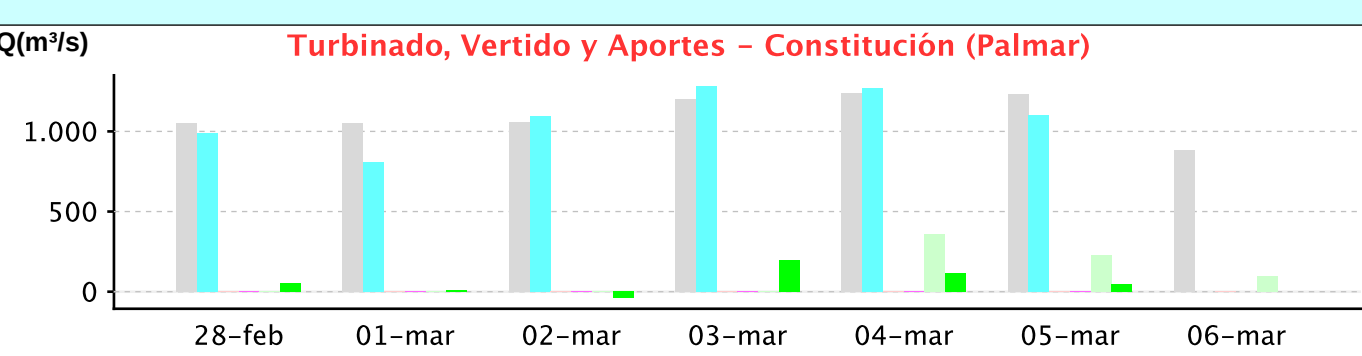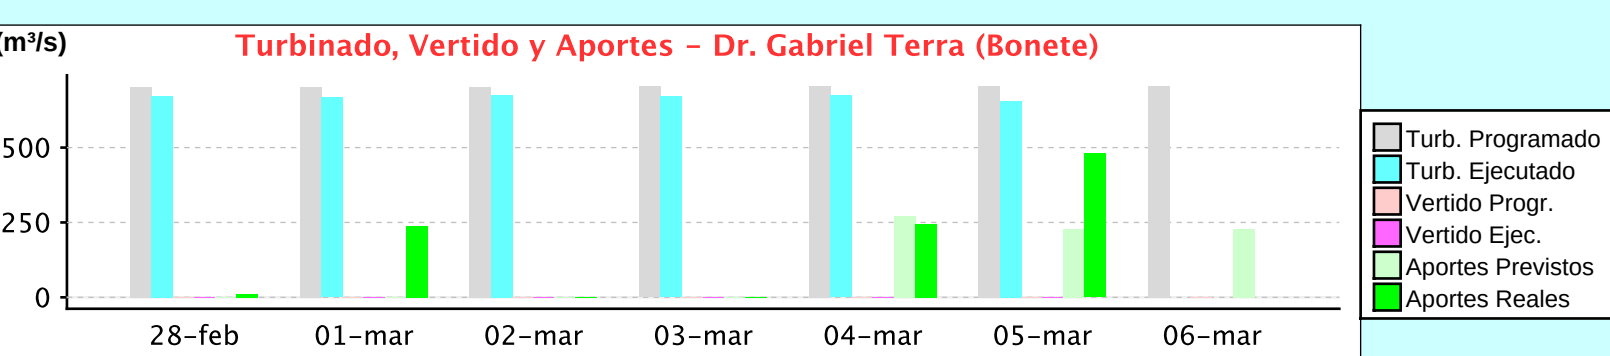

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

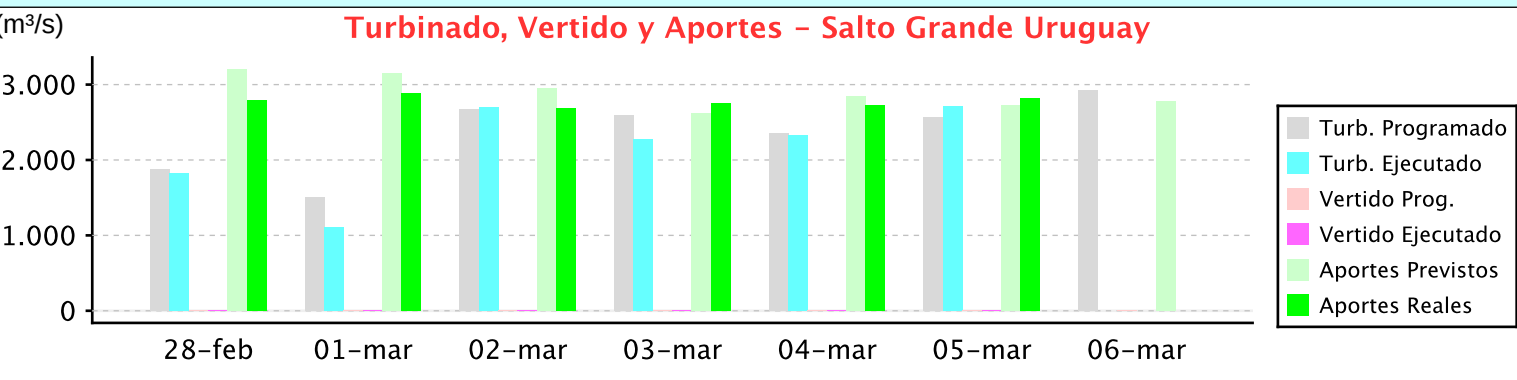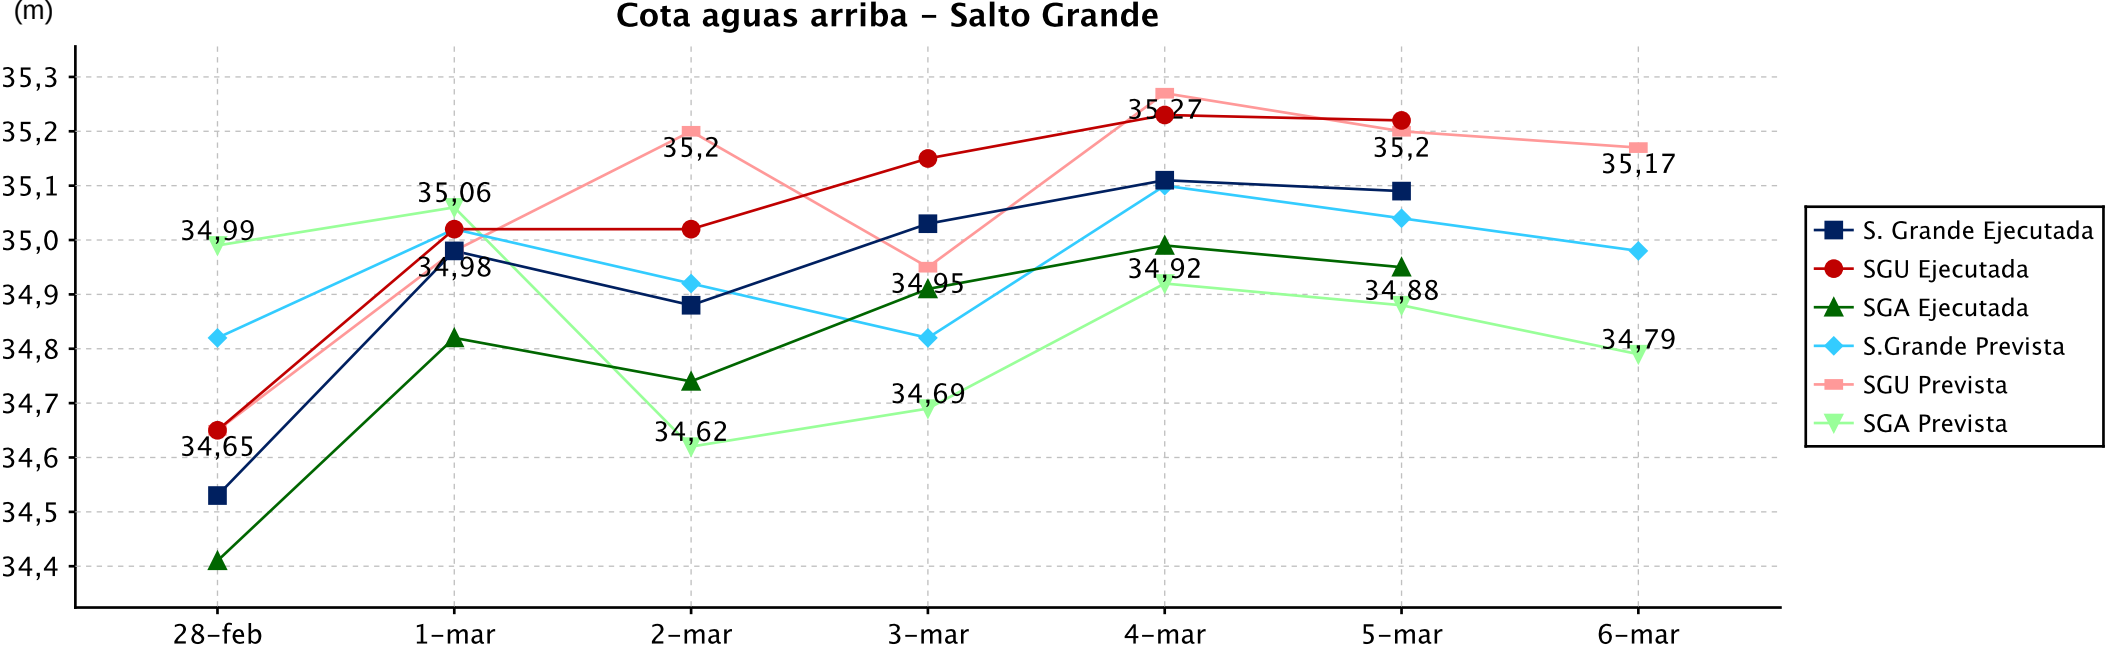

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,22
Cota Vista Arg	34,95
Cota real	35,09

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	6.330
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	705	657
Baygorria	740	753
Palmar	1.234	1.100
SGU	2.565	2.713

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	228	481
Baygorria	38	37
Palmar	229	49
SGU	2.725	2.822

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	-1	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Motores despacho forzado (Pruebas)
