



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 09 de marzo de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	179
Sala B	-47
5ta.	0
6ta.	-10
Motores	236
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	94
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	0
Aggreko MVA	0
Aggreko MVB	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.199
C. Baygorria	2.039
C. Palmar	4.774
C. Salto Grande	14.430
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.702
TOTAL Generación	31.335

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.335
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.901
Diferencia (MWh)	434
Ejecutada - Programada	1,40 %

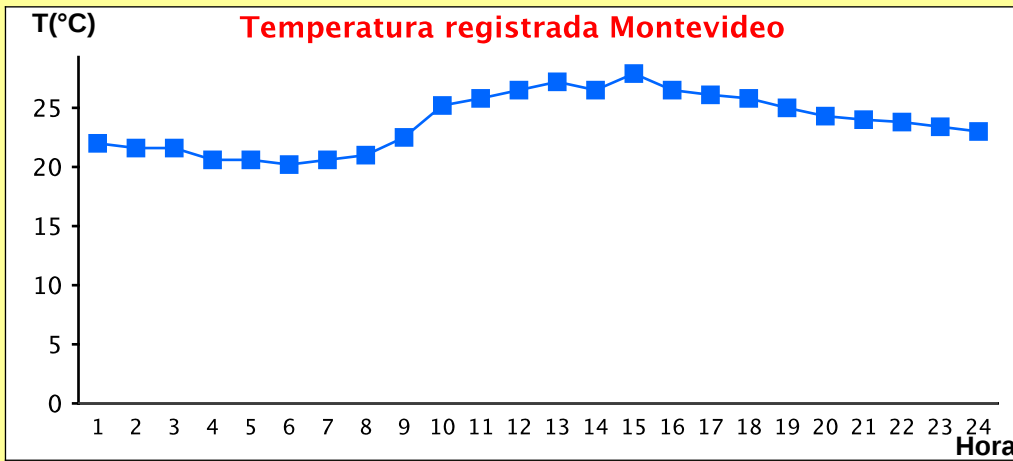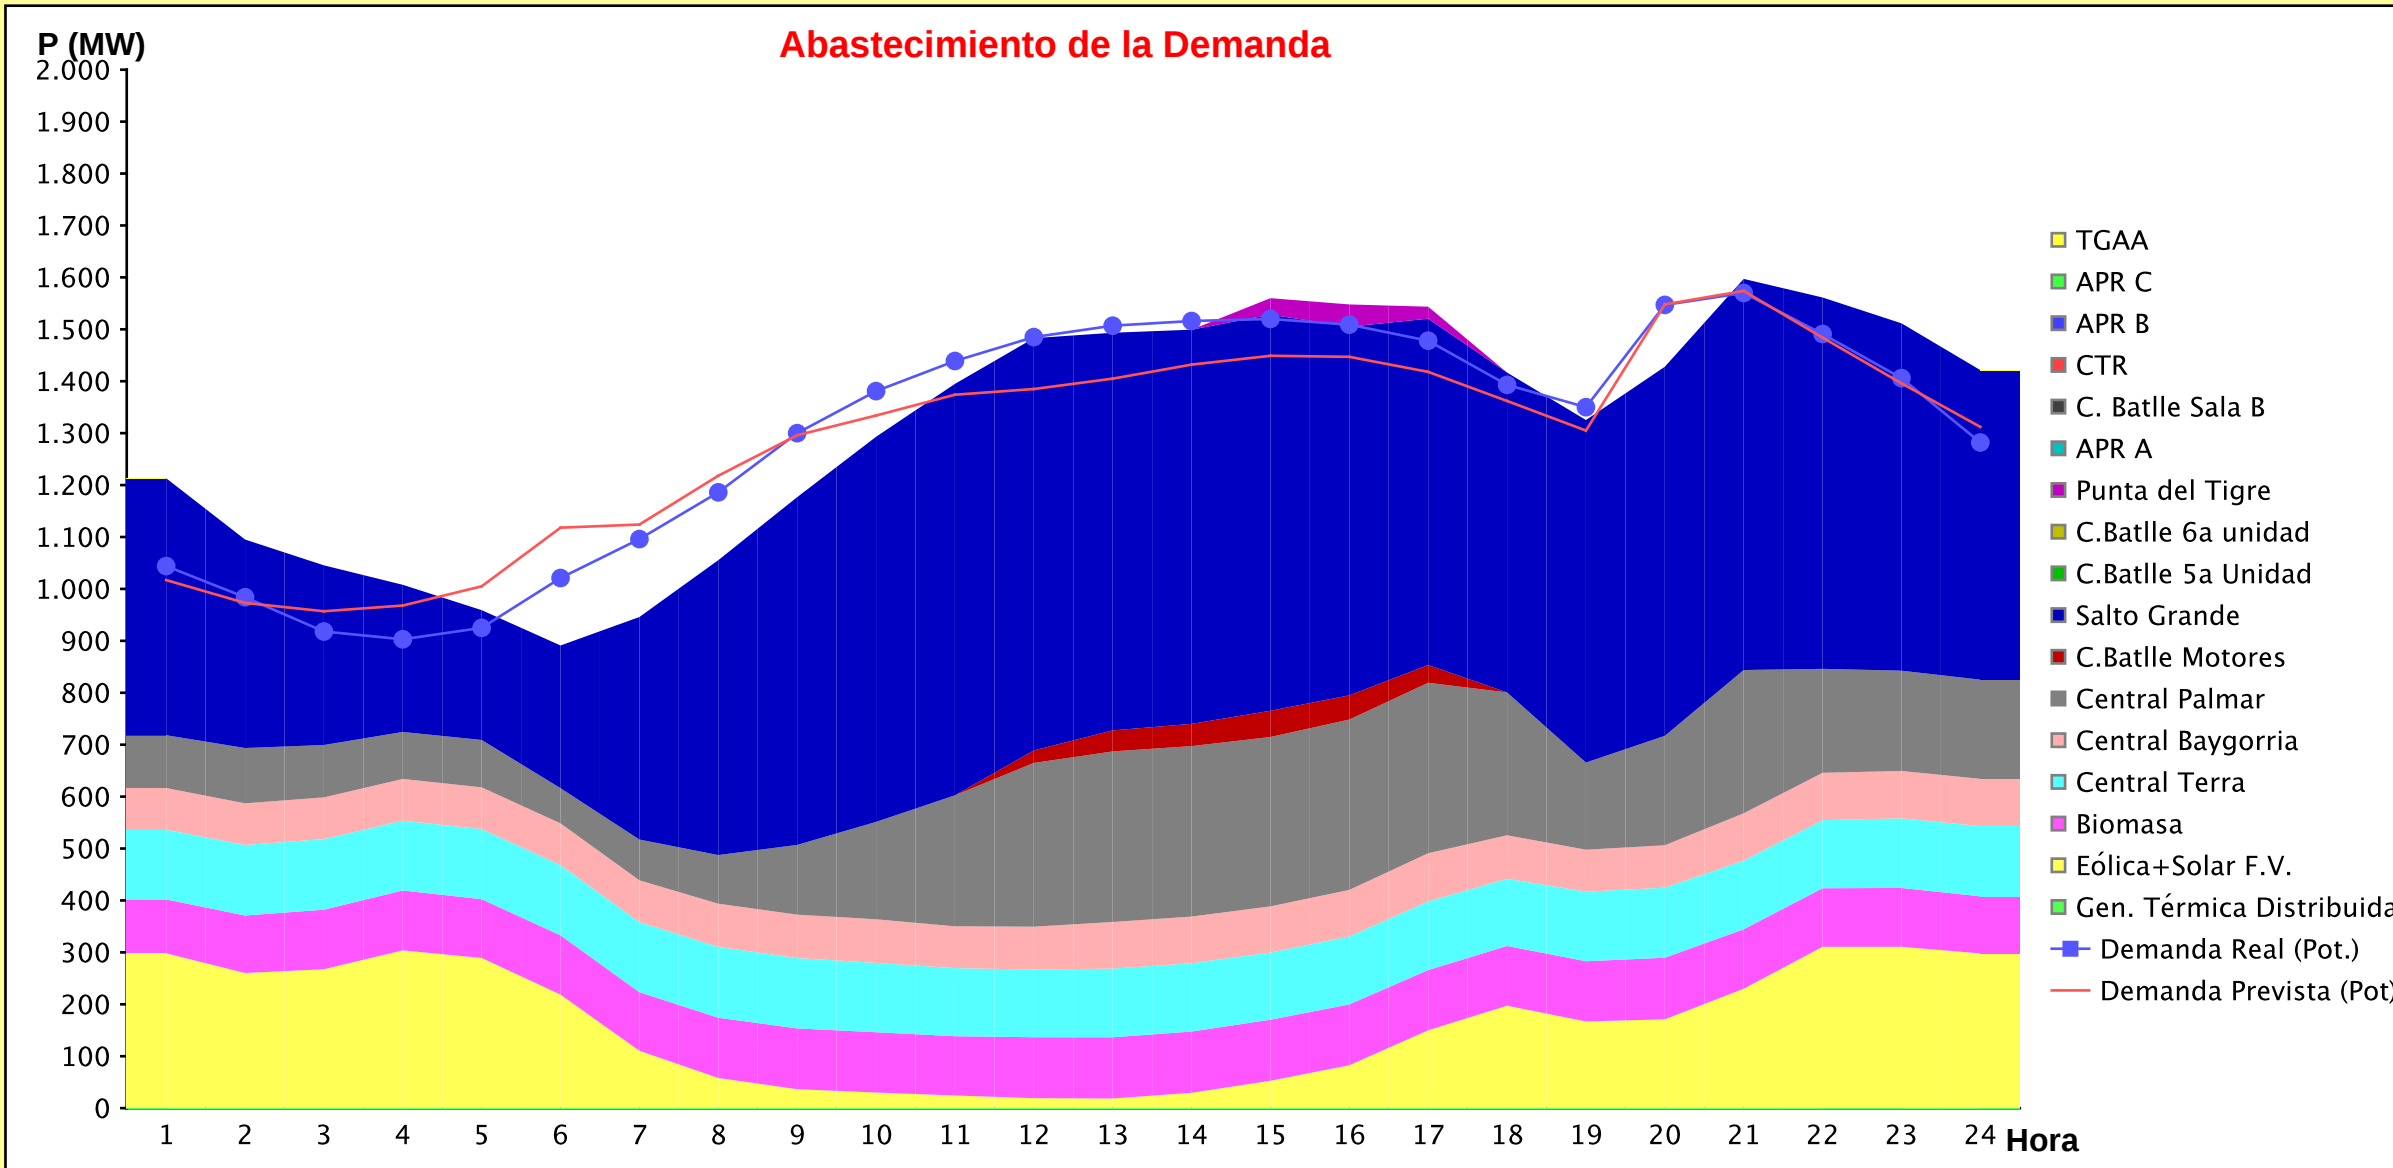



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1534,98 Hora 14:42
Potencia mínima:	952,7 Hora 03:51
Pico noche:	1574,73 Hora 20:40

Generación Media (MW)	
Eólica	164,6
Biomasa	115,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

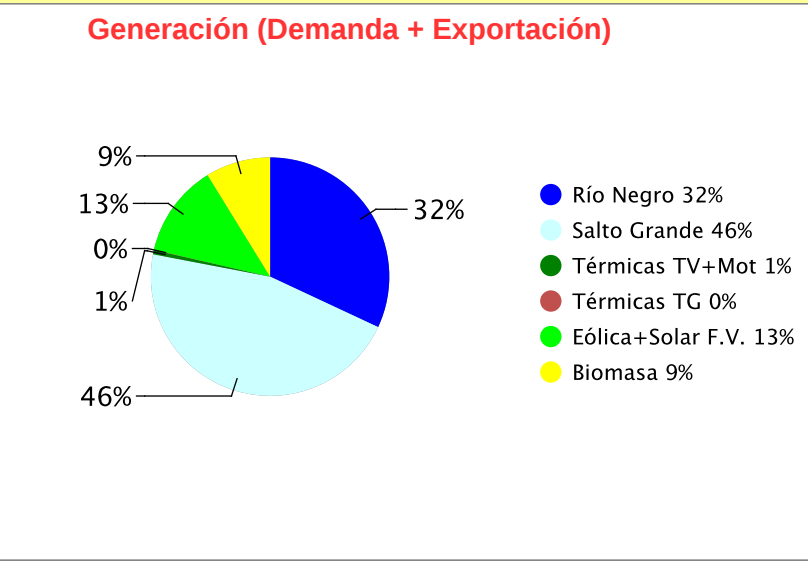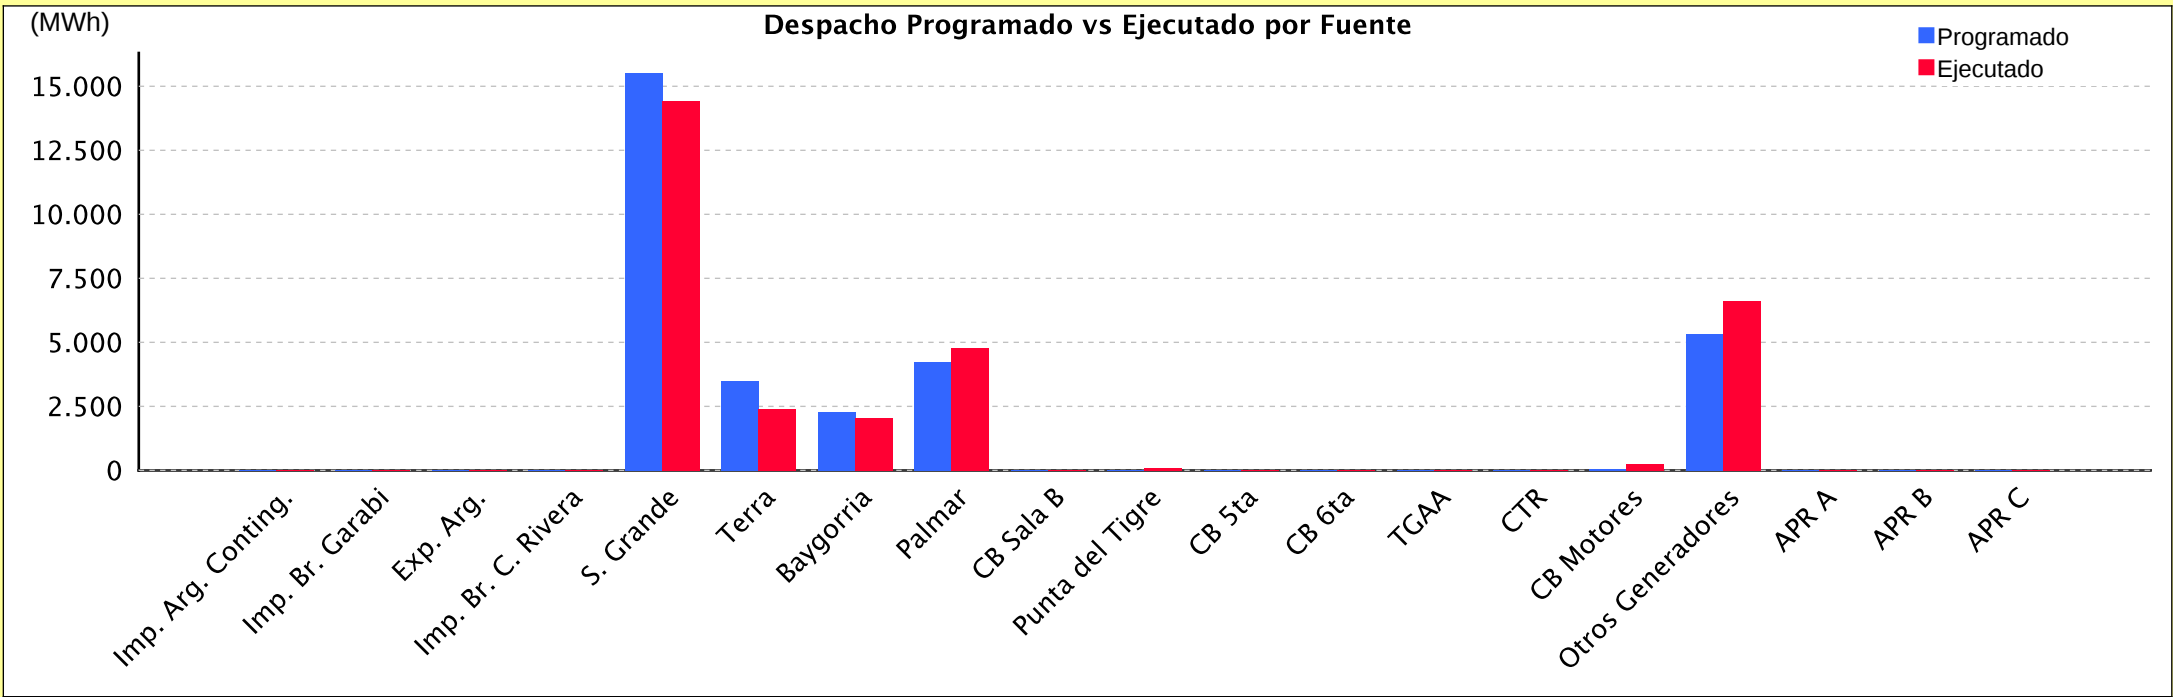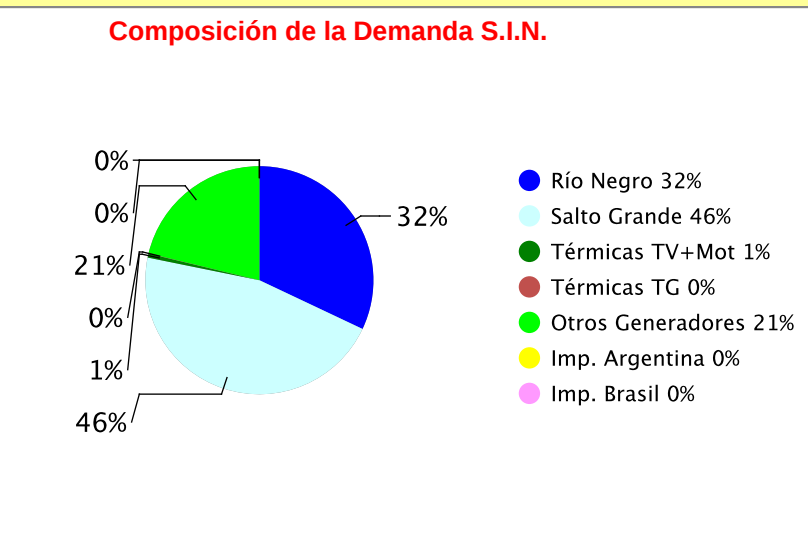



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

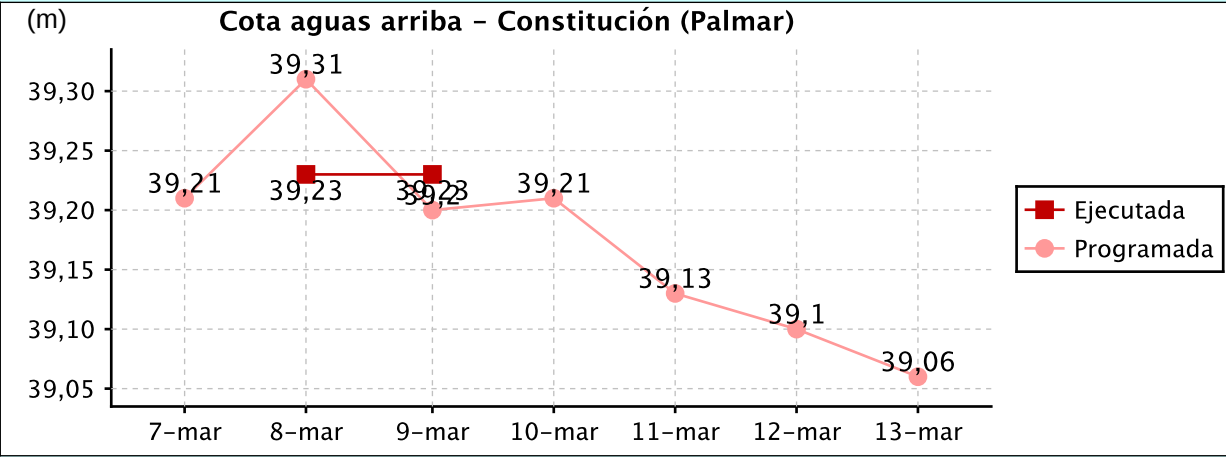
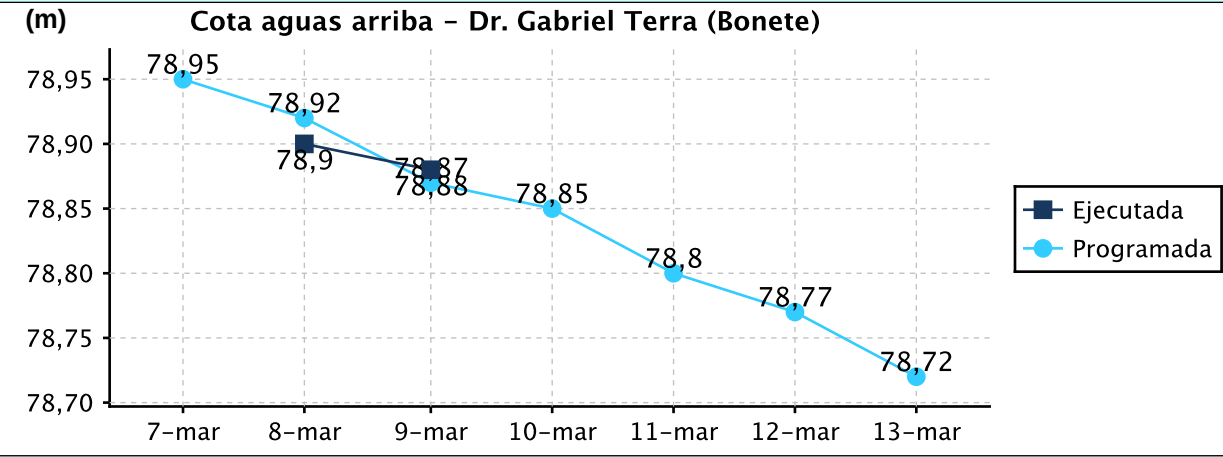


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,87	78,88
Baygorria	54,03	53,95
Palmar	39,20	39,23
SGU	35,45	35,55

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

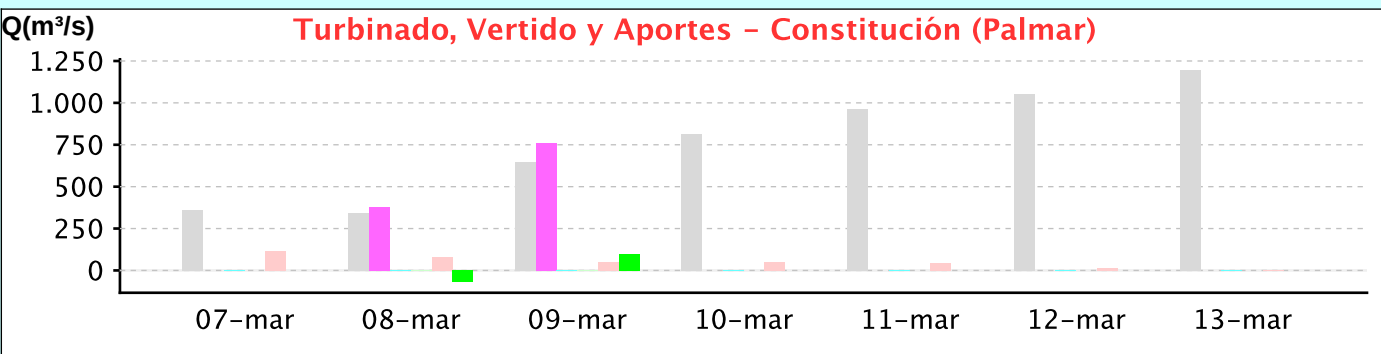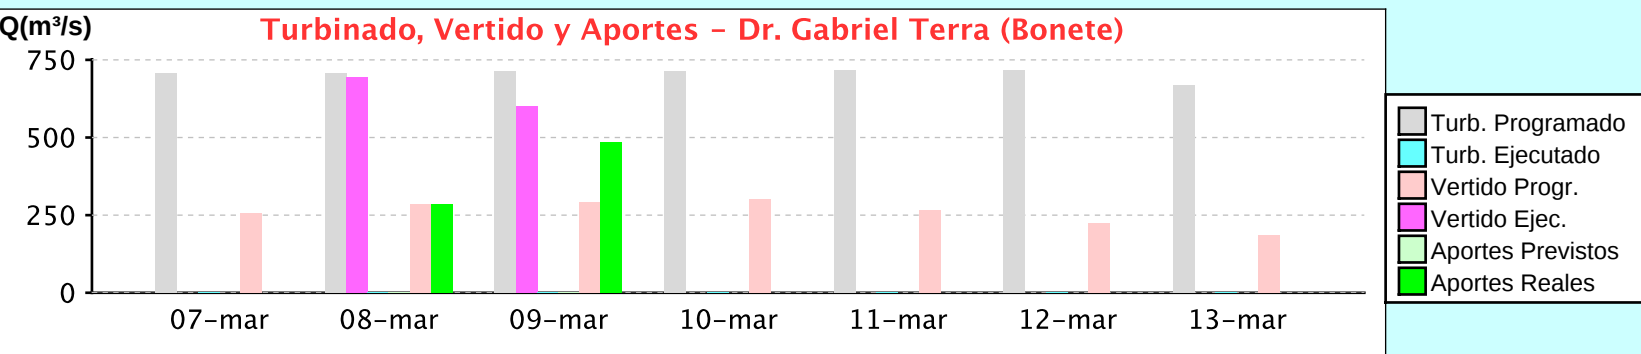

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

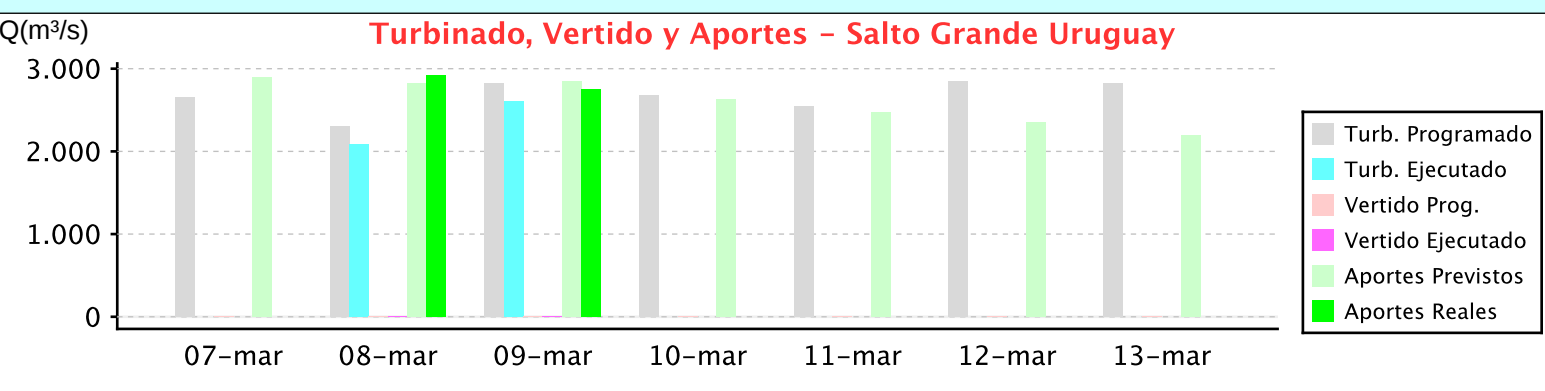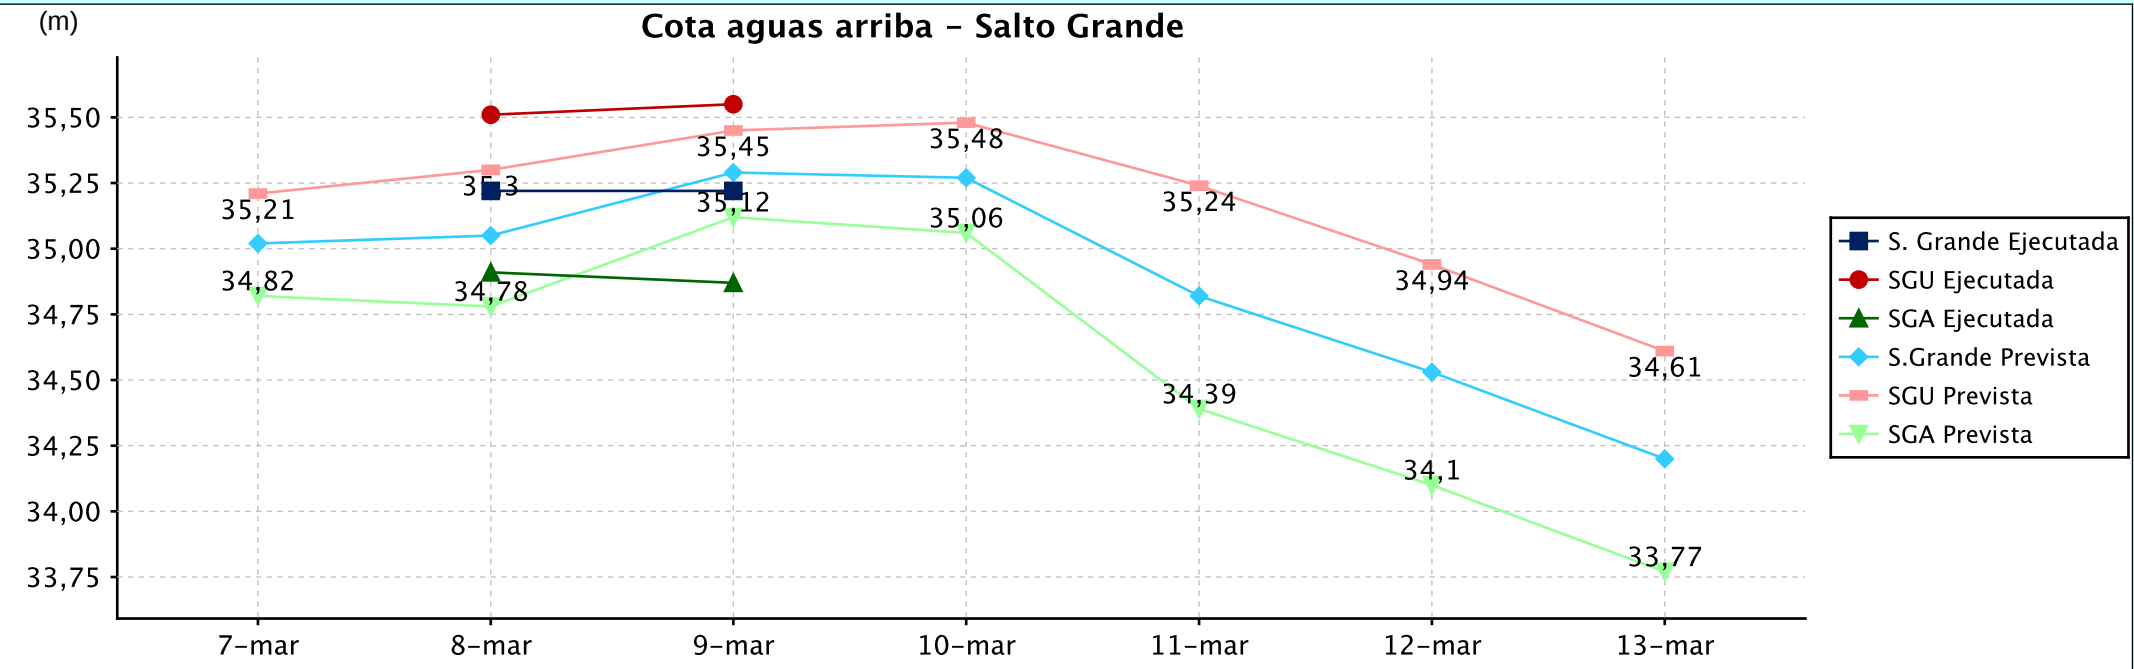

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,55
Cota Vista Arg	34,87
Cota real	35,22
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	16.443

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	714	601
Baygorria	757	689
Palmar	648	759
SGU	2.828	2.603

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	290	485
Baygorria	0	75
Palmar	50	96
SGU	2.850	2.750

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	-1	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
