




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


jueves 12 de marzo de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	572
Sala B	-44
5ta.	0
6ta.	-7
Motores	623
Central La Tablada	-24
Central P. del Tigre	484
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.194
C. Baygorria	1.981
C. Palmar	6.494
C. Salto Grande	14.536
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.364
TOTAL Generación	31.595



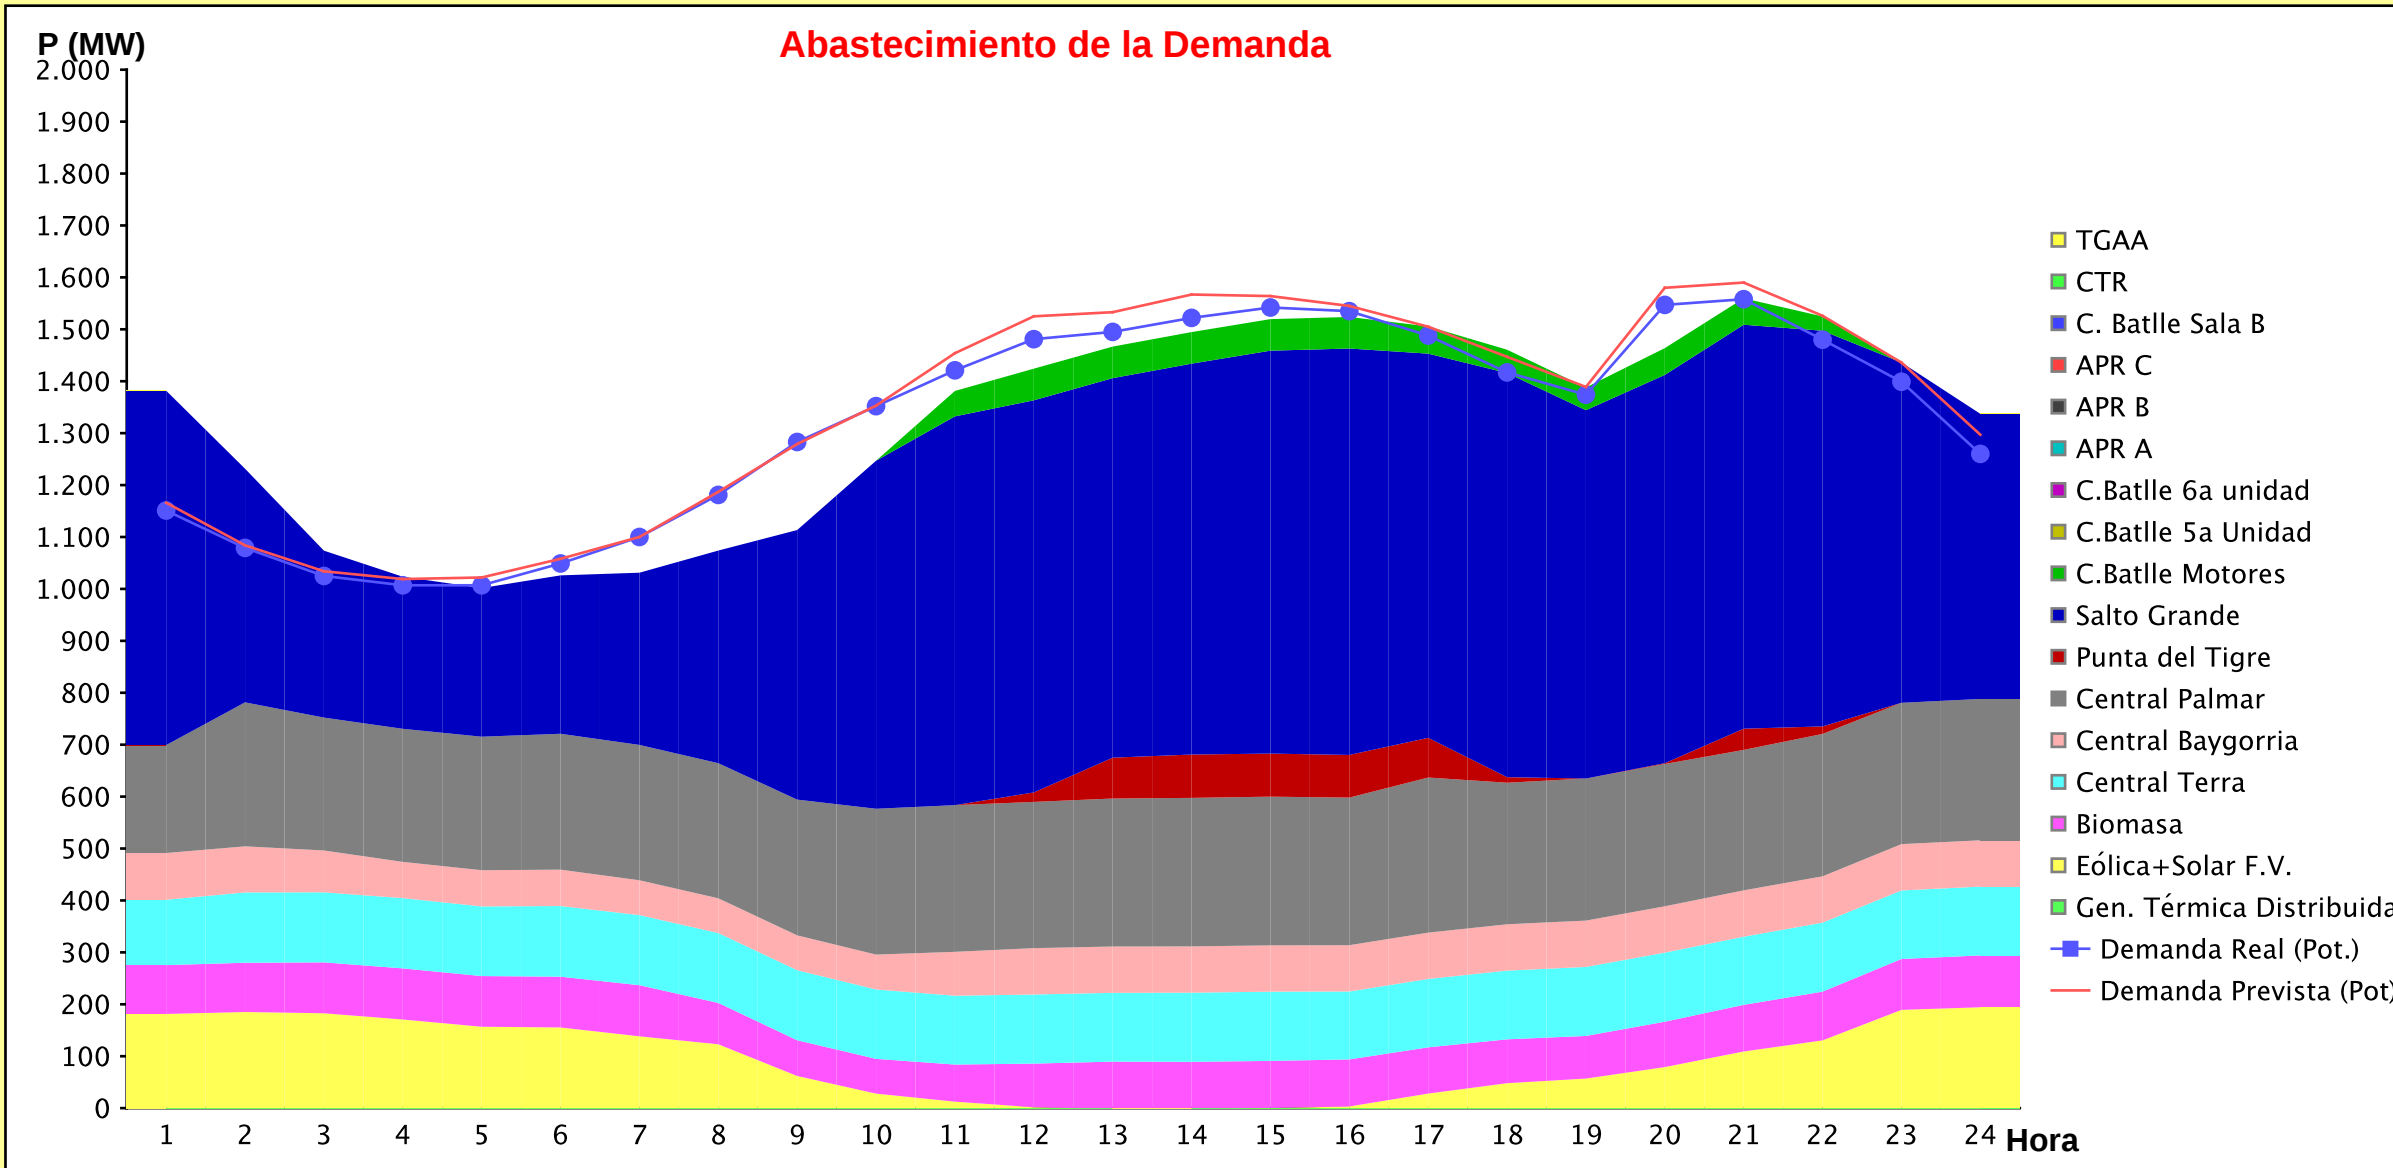


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.595
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	32.260
Diferencia (MWh)	-665
Ejecutada - Programada	-2,06 %


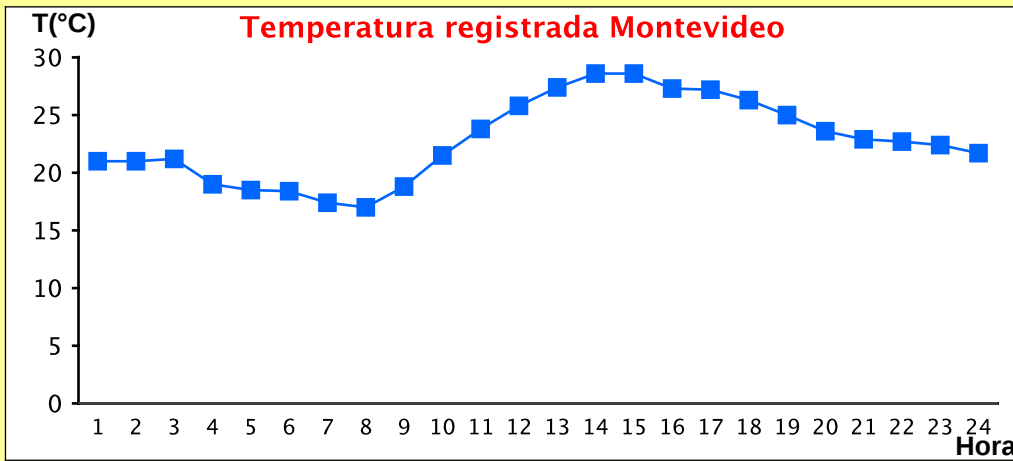


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1547,13 Hora 14:46
Potencia mínima:	989,06 Hora 03:43
Pico noche:	1569,72 Hora 20:42
Generación Media (MW)	
Eólica	94,4
Biomasa	89,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

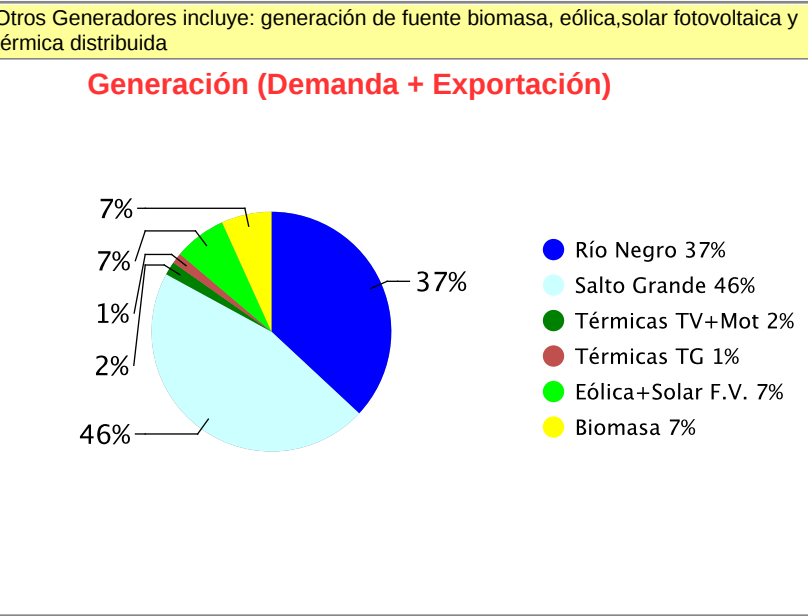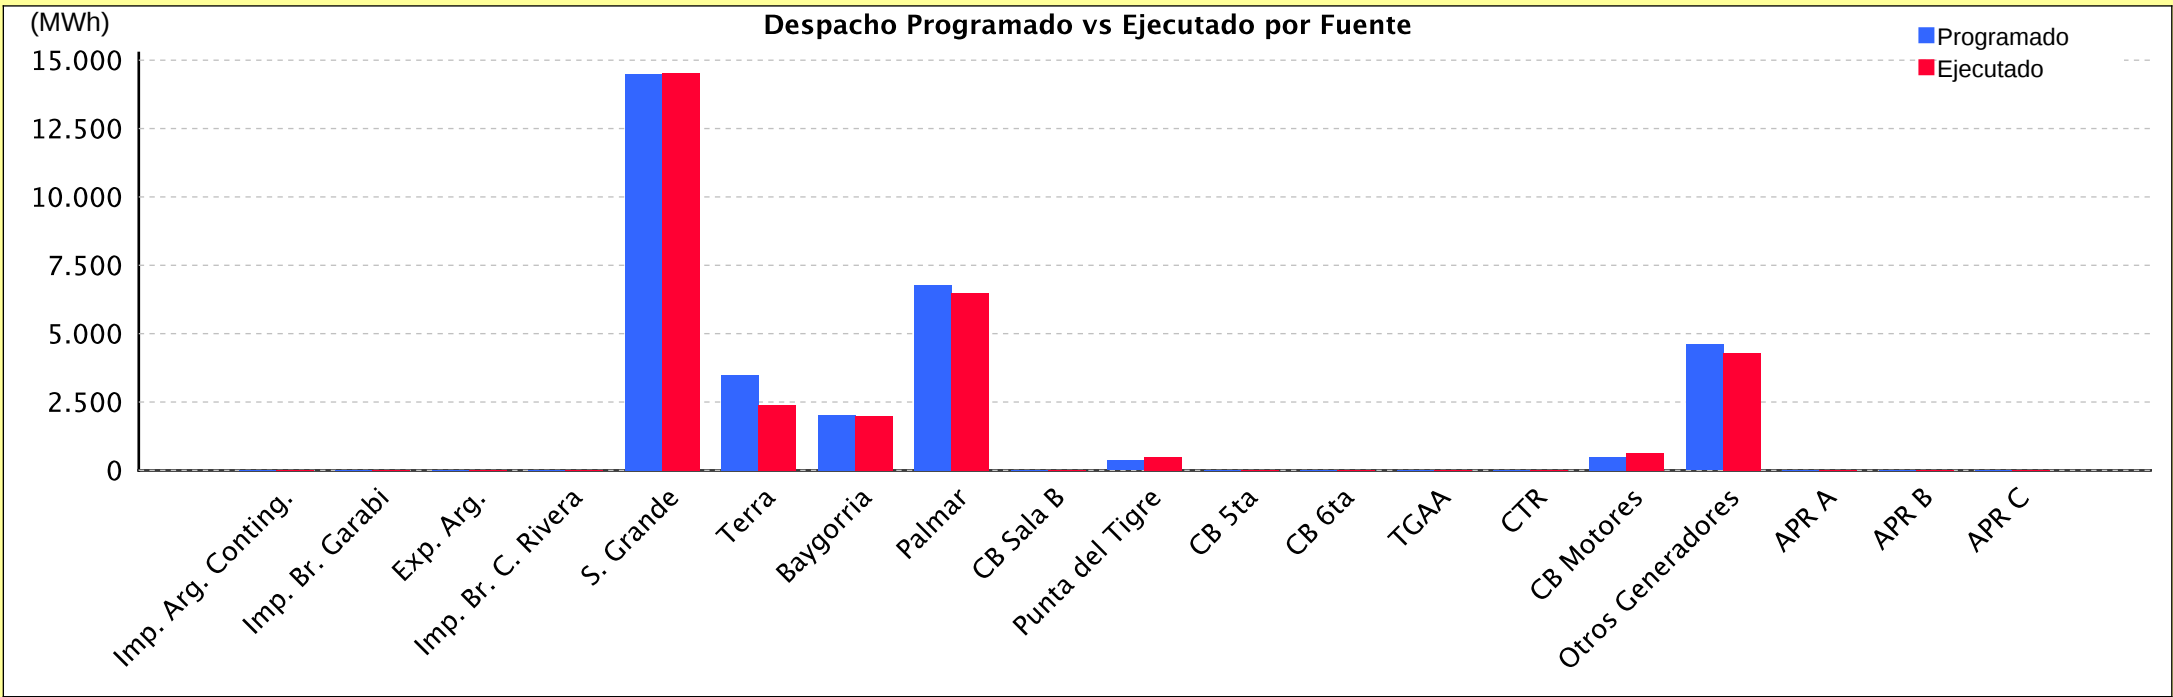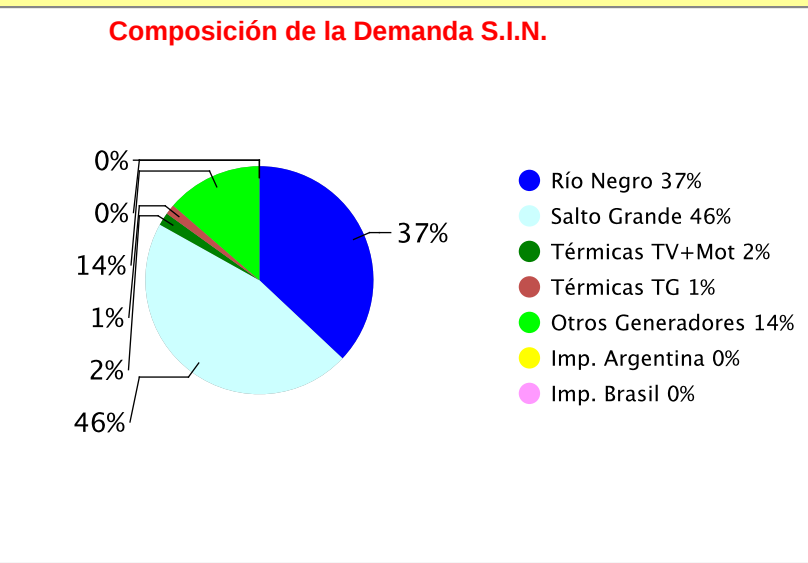



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

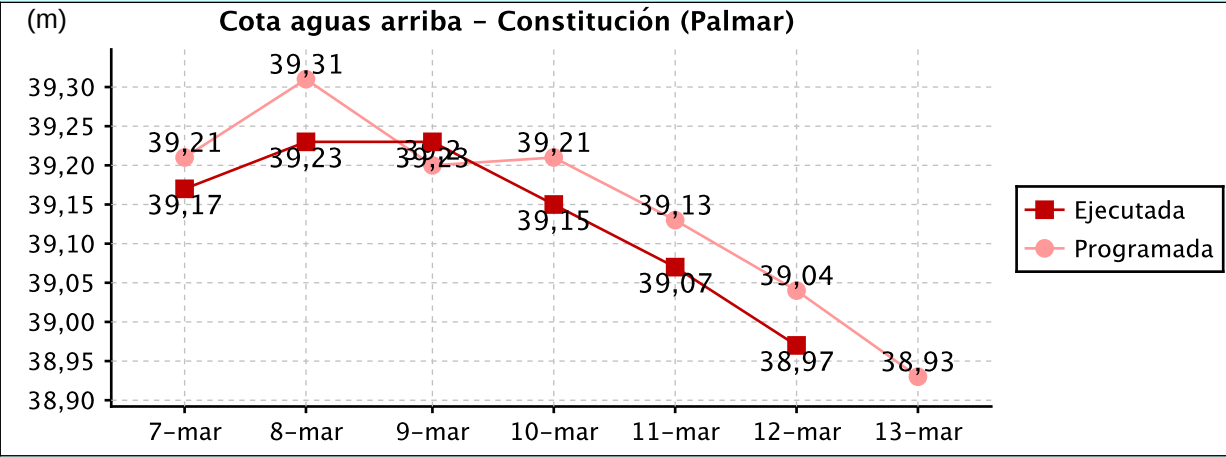
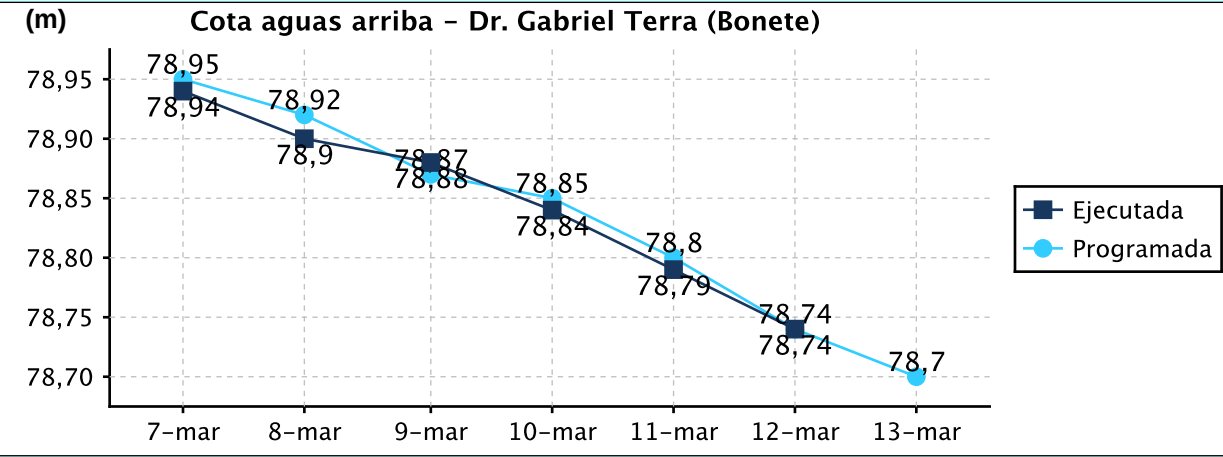


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,74	78,74
Baygorria	53,95	53,89
Palmar	39,04	38,97
SGU	35,13	35,3

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

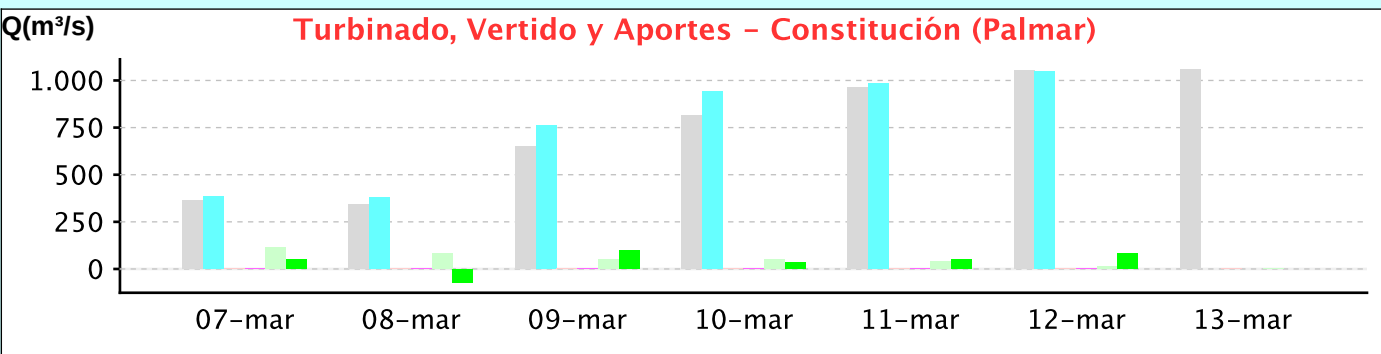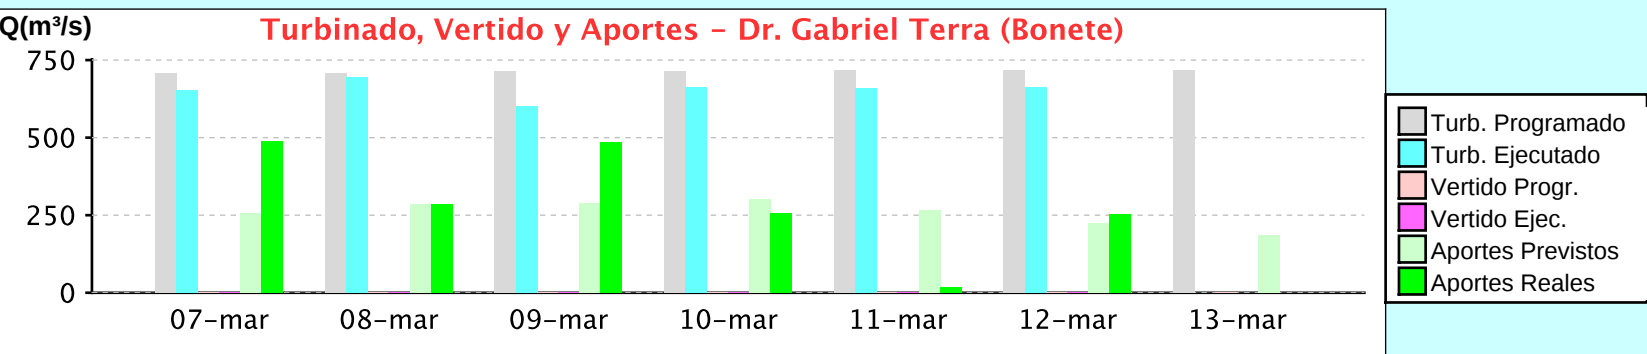

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

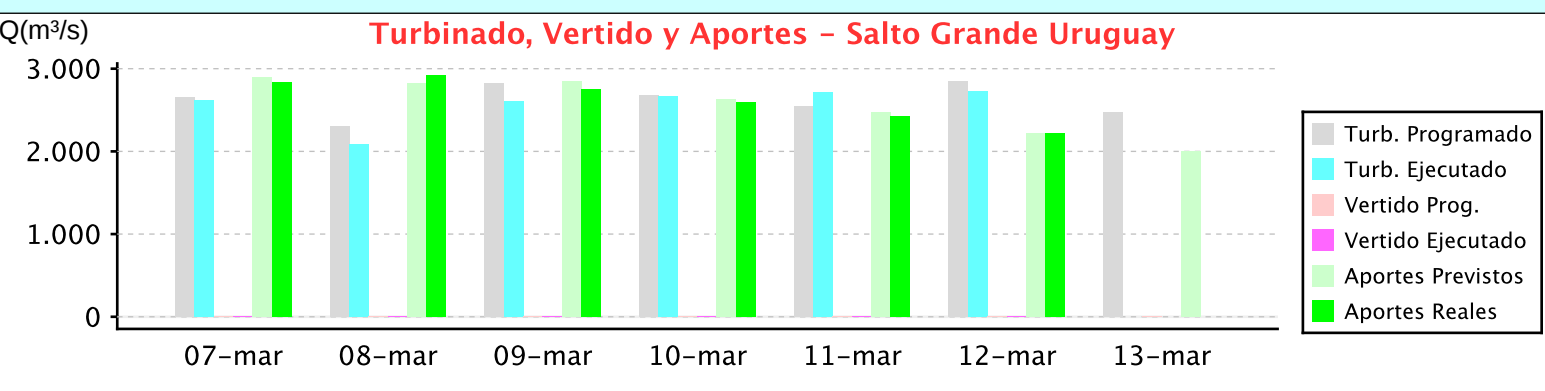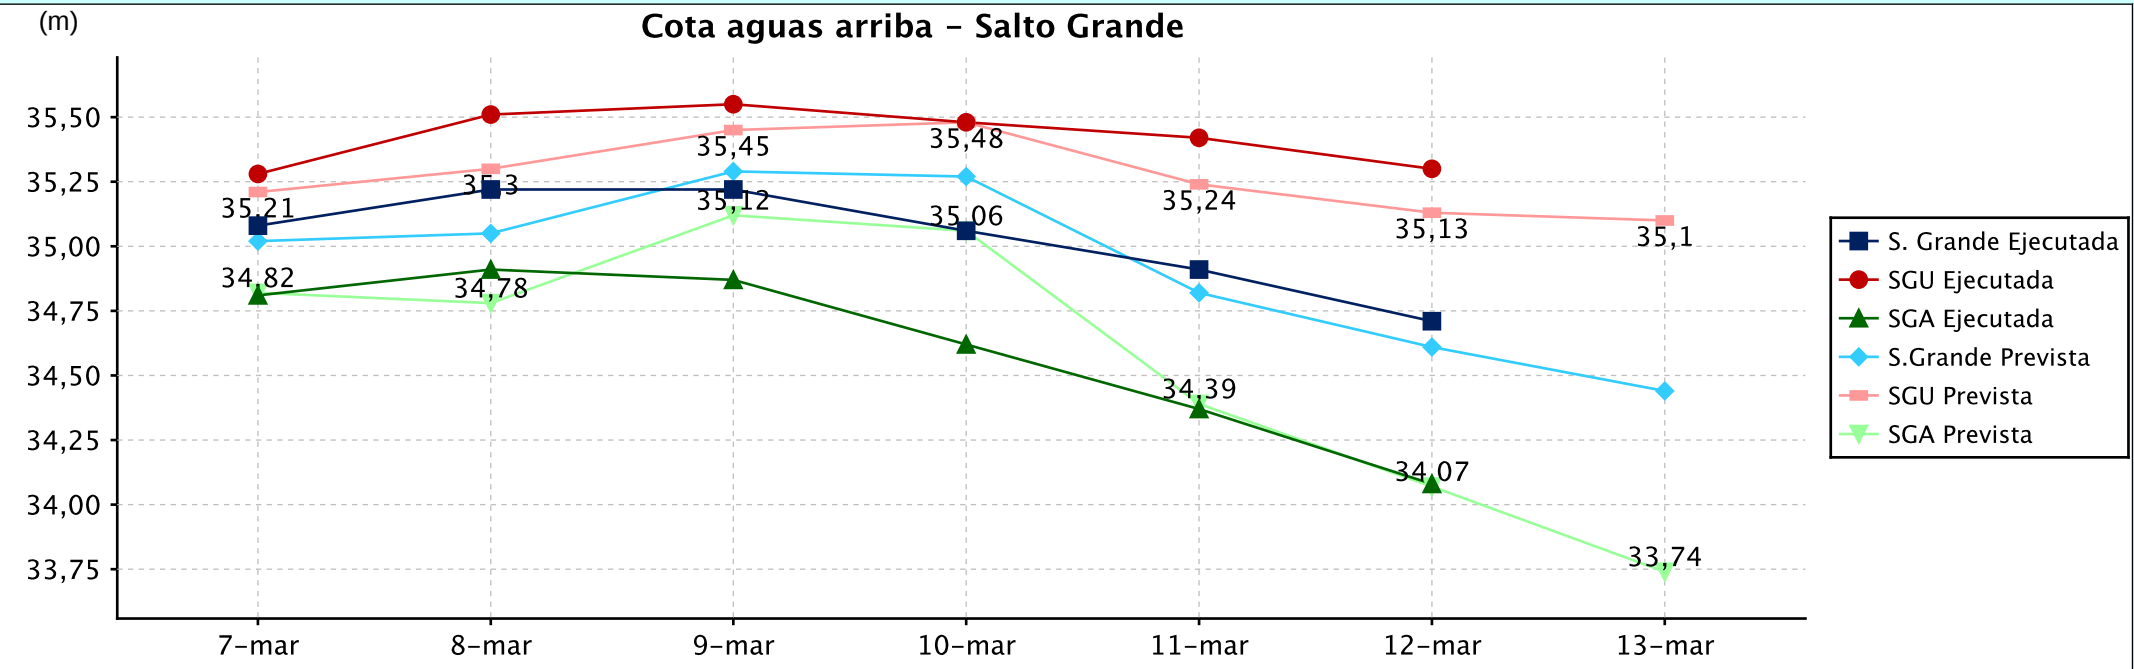

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,30
Cota Vista Arg	34,08
Cota real	34,71

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	27.498
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	716	663
Baygorria	675	666
Palmar	1.053	1.047
SGU	2.851	2.723

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	224	254
Baygorria	0	14
Palmar	12	81
SGU	2.225	2.214

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	-1	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
