



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 14 de marzo de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	1.368
Sala B	-17
5ta.	0
6ta.	-11
Motores	1.396
Central La Tablada	-47
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	0
Aggreko MVA	0
Aggreko MVB	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.187
C. Baygorria	1.978
C. Palmar	6.361
C. Salto Grande	11.119
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.957
TOTAL Generación	28.910

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.910
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.495
Diferencia (MWh)	1.415
Ejecutada - Programada	5,15 %

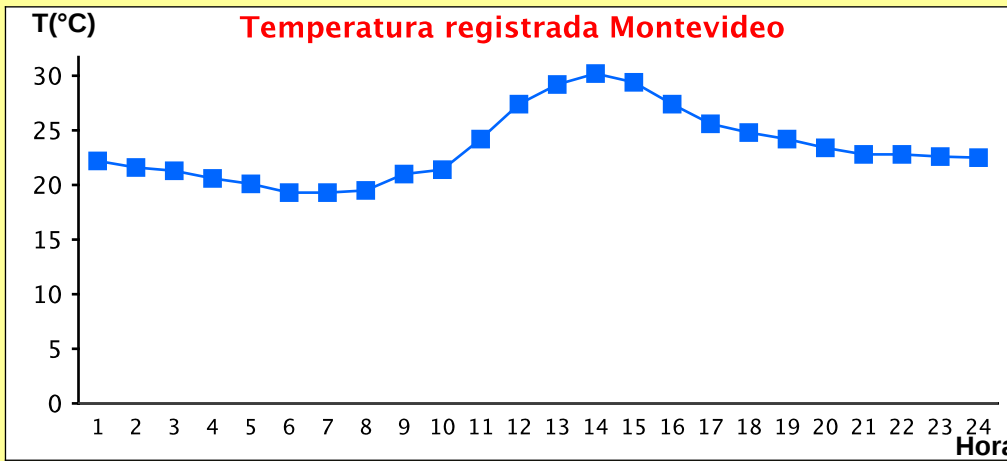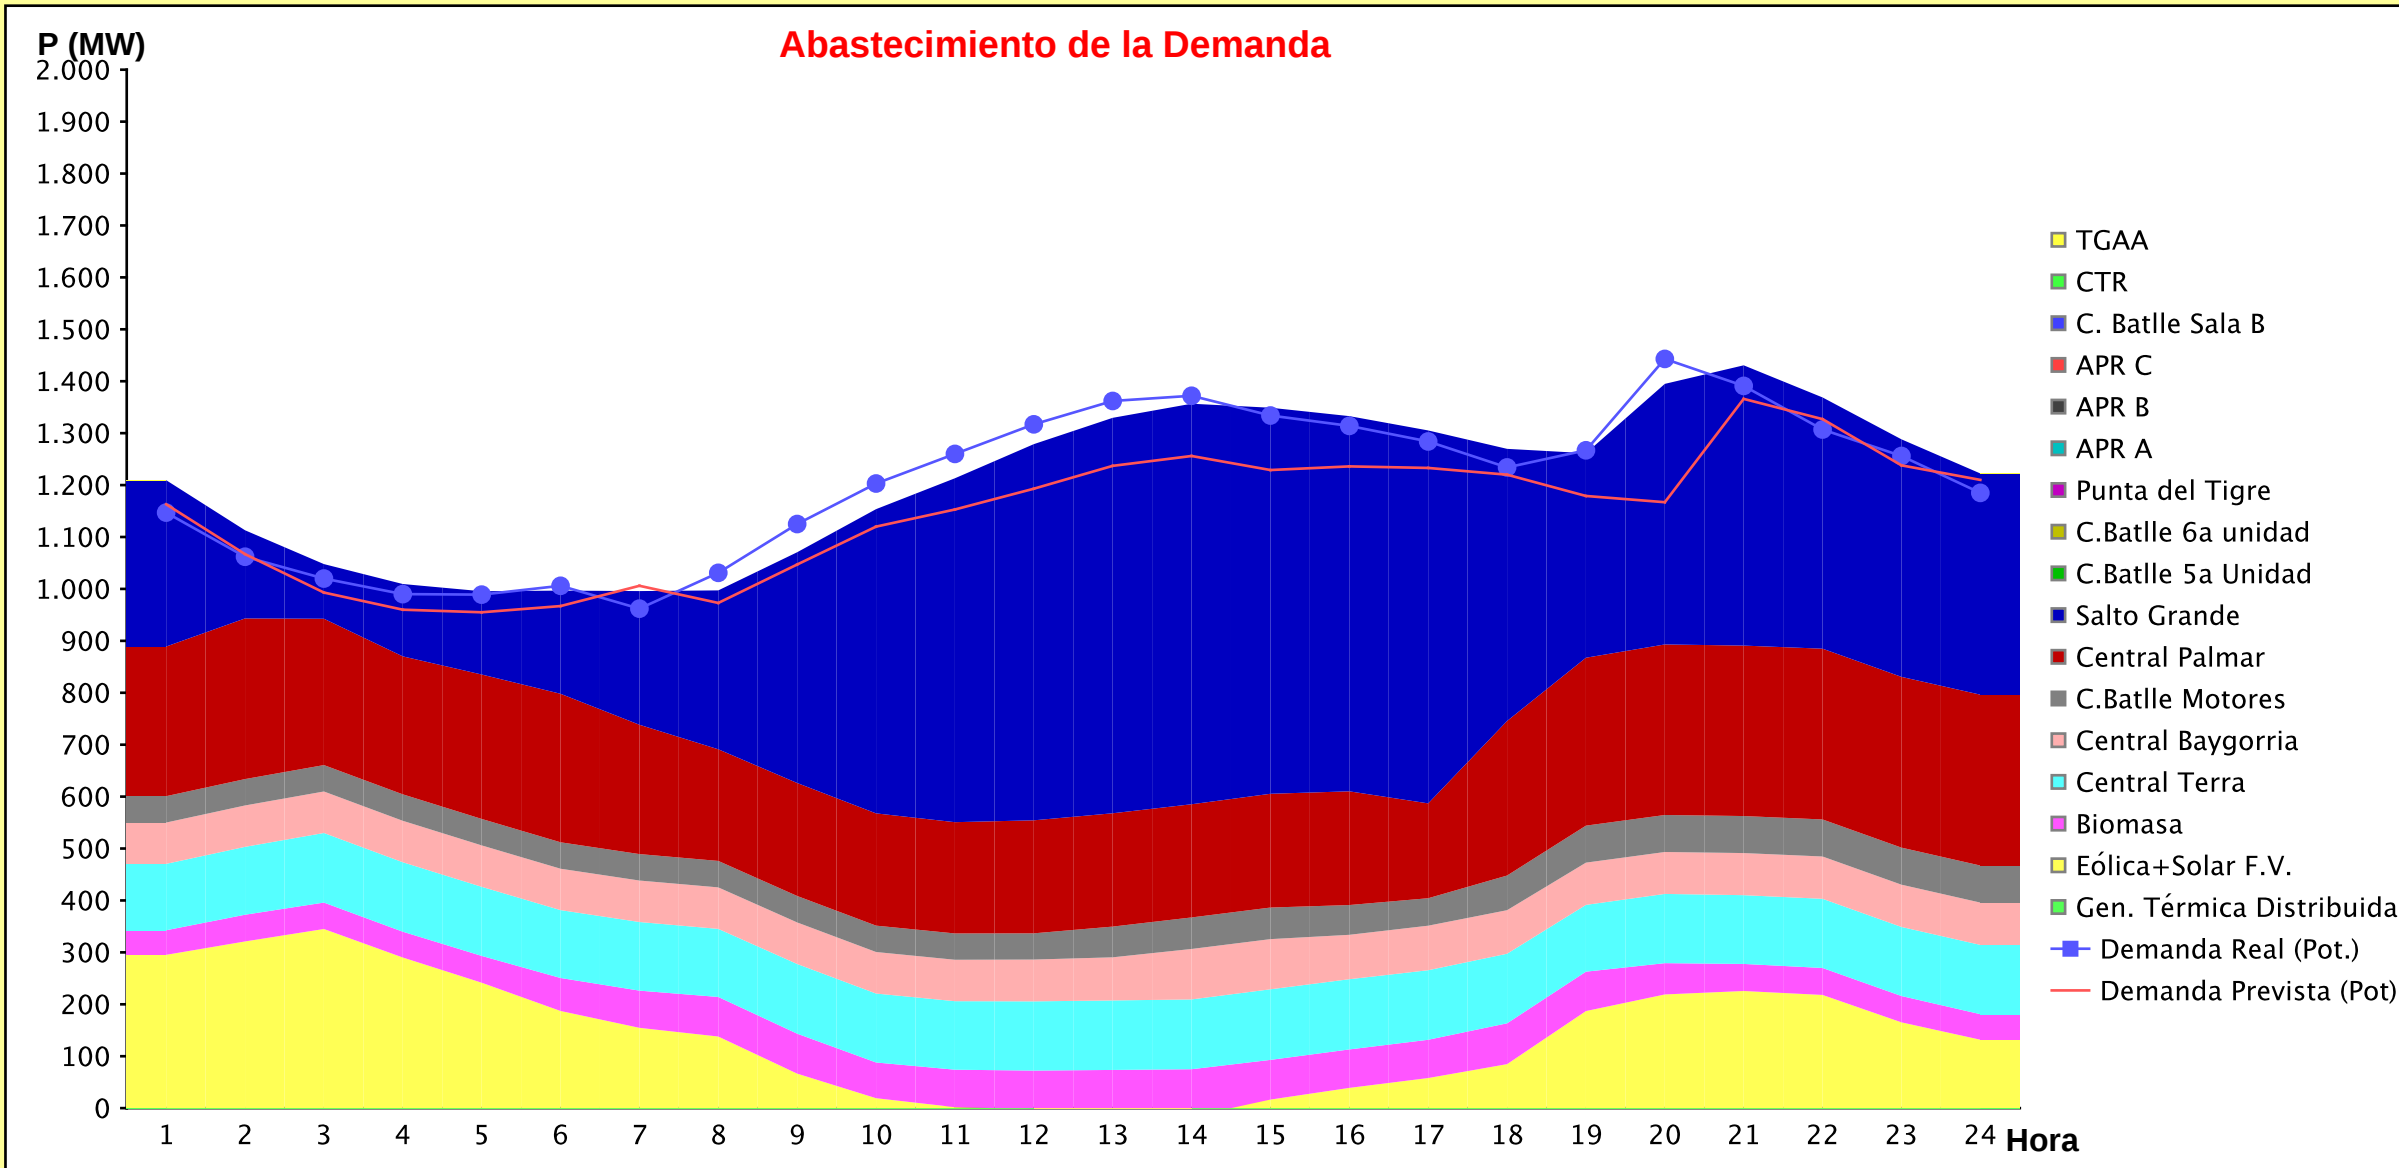



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1376,74 Hora 13:28
Potencia mínima:	952,04 Hora 06:53
Pico noche:	1440,65 Hora 20:05

Generación Media (MW)	
Eólica	142,7
Biomasa	64,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

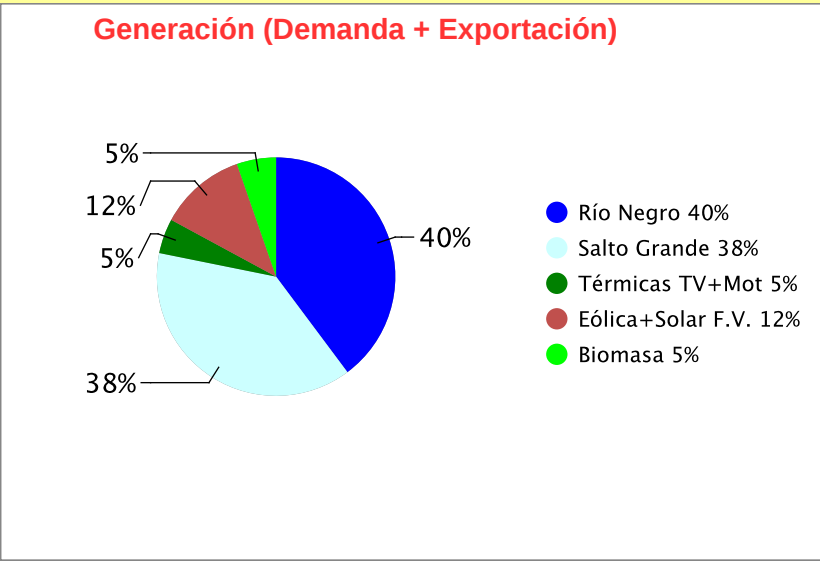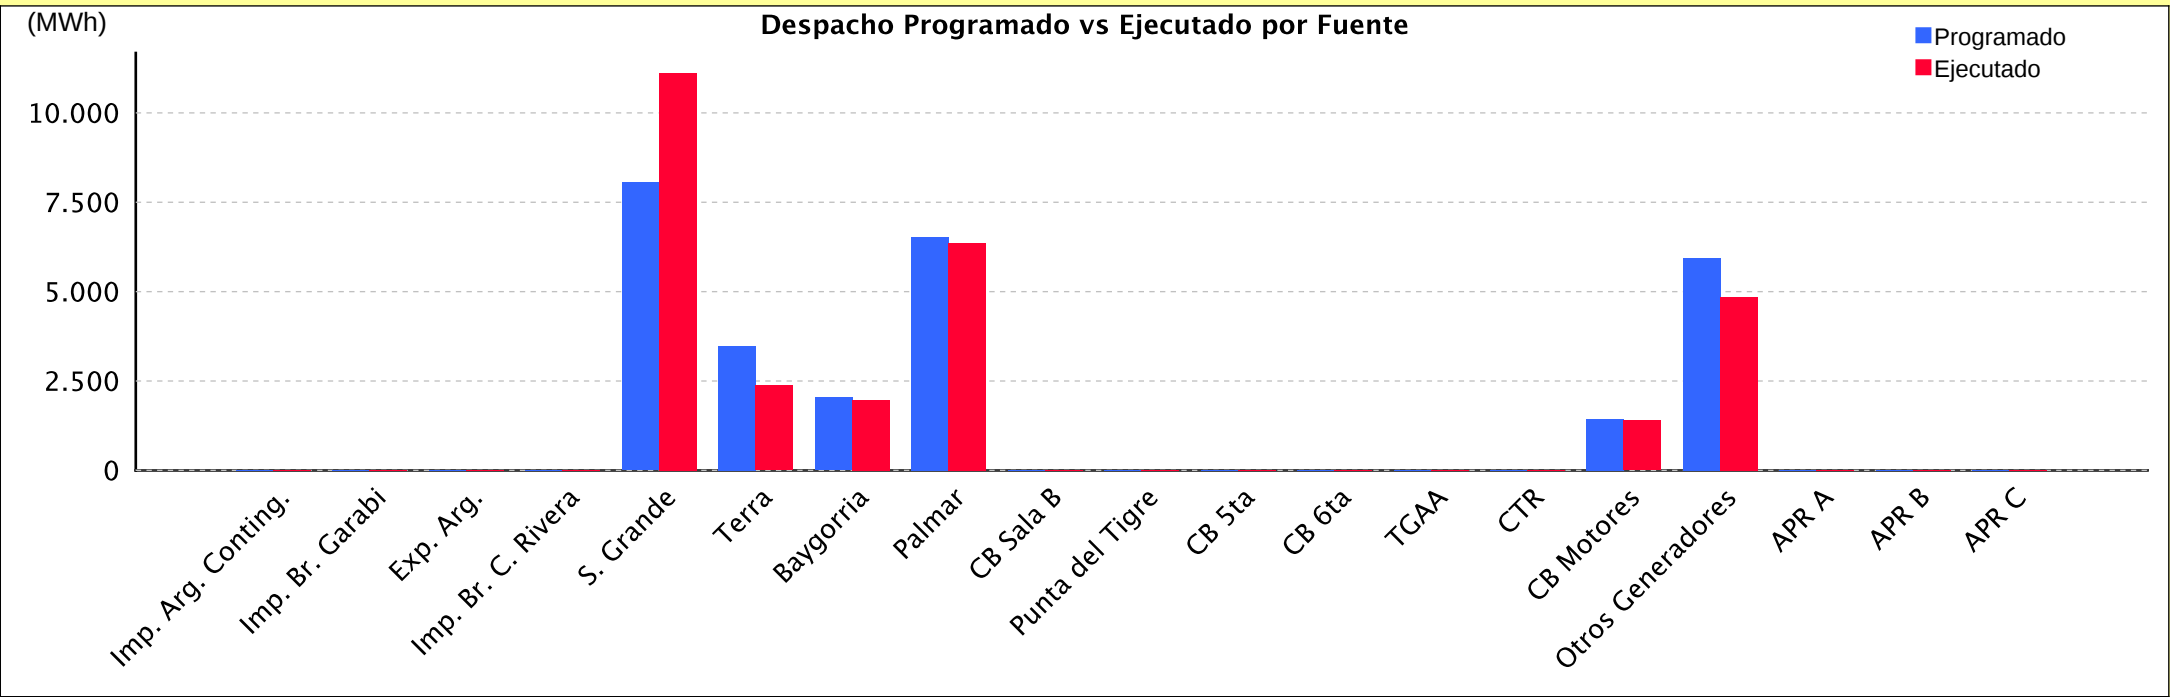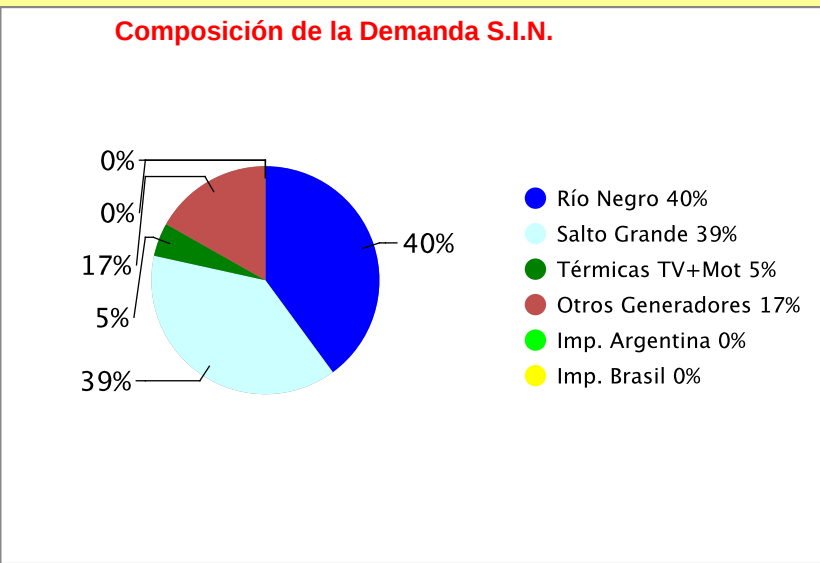



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

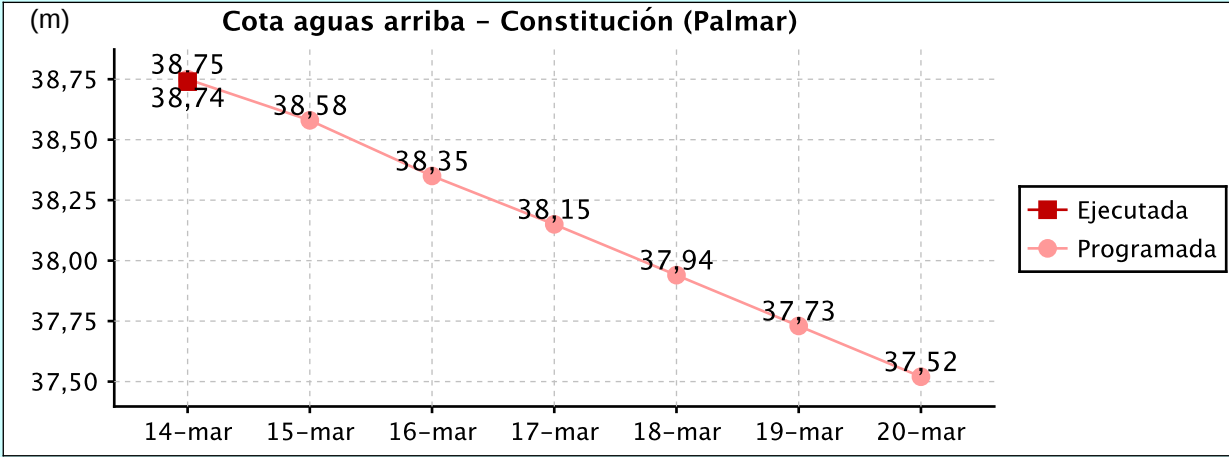
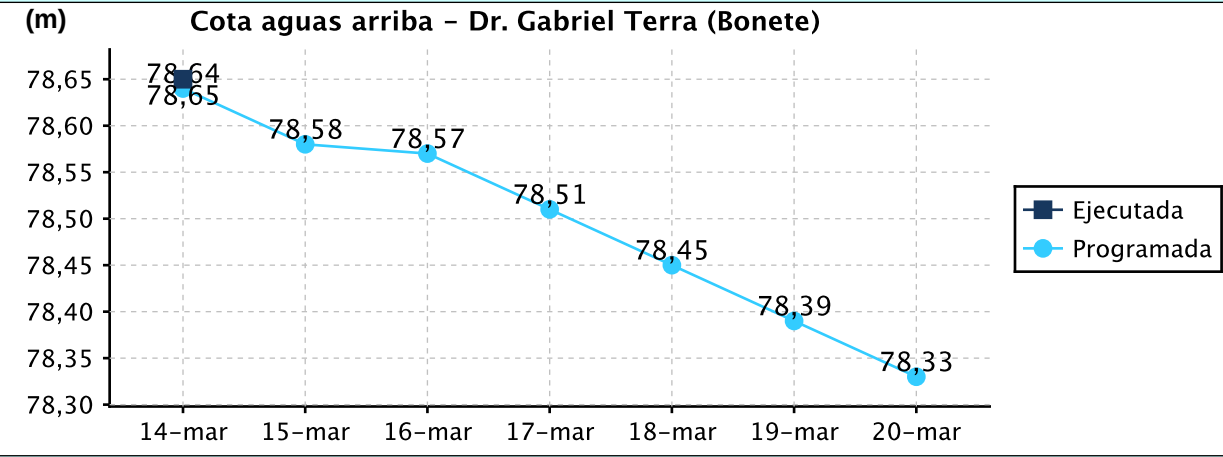


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,64	78,65
Baygorria	53,98	53,9
Palmar	38,75	38,74
SGU	35,18	35,12

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

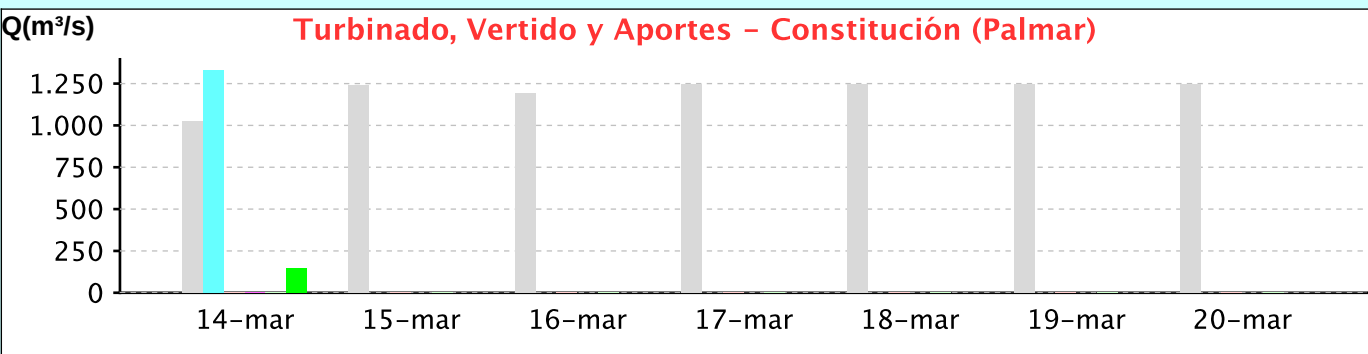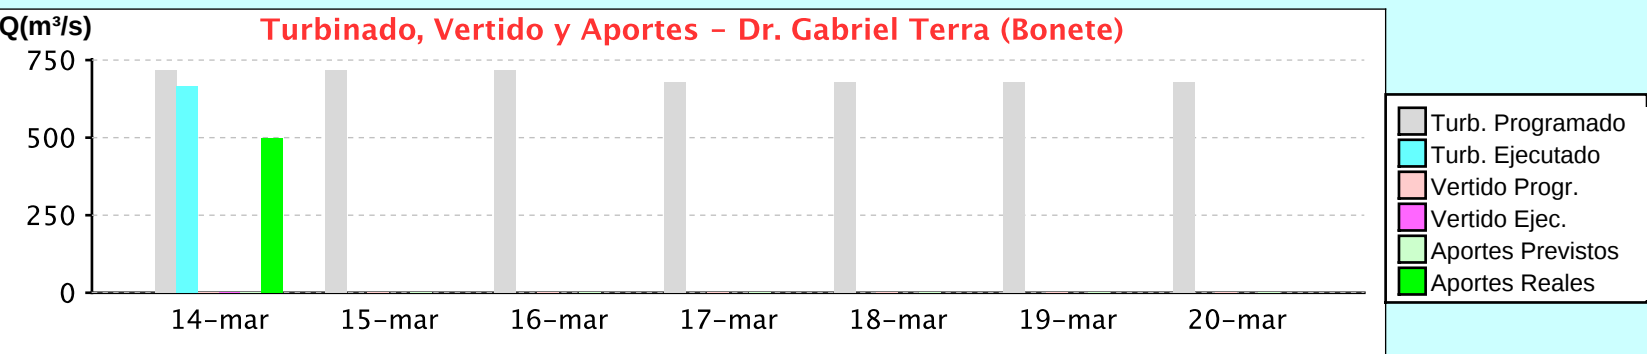

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

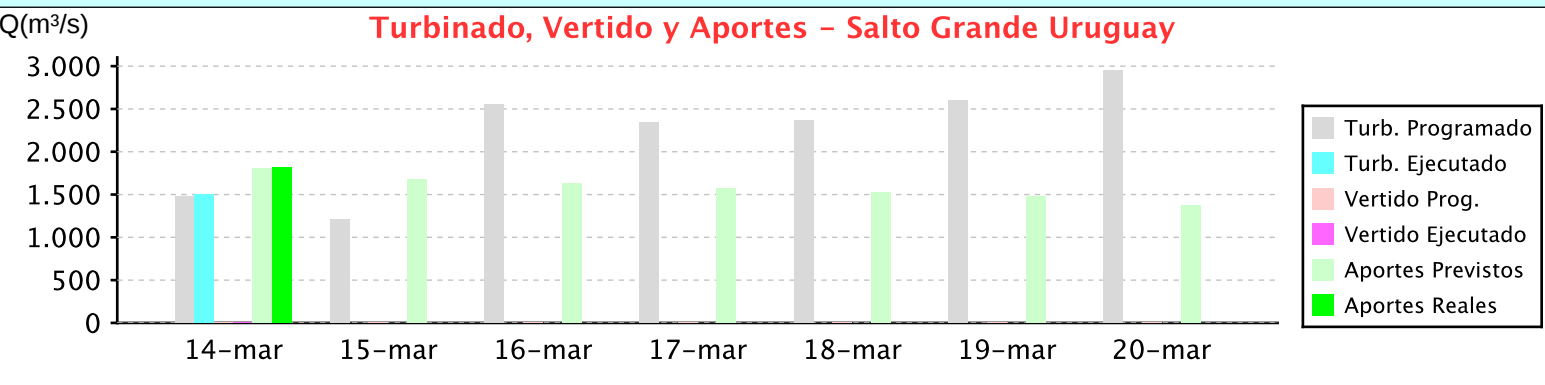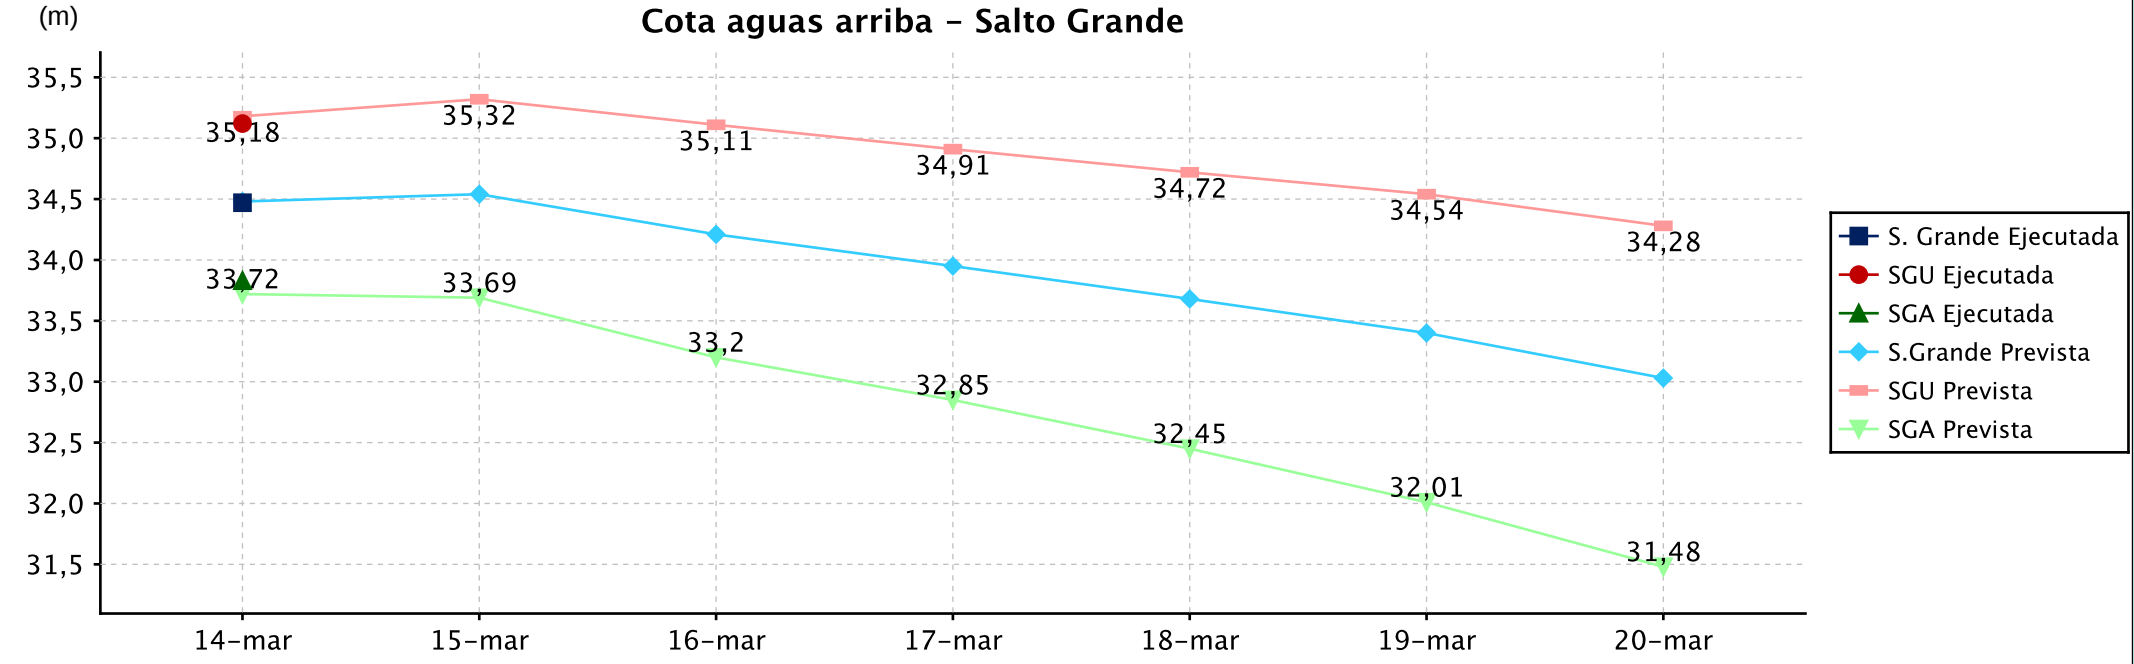

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,12
Cota Vista Arg	33,83
Cota real	34,47
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	28.682

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	717	665
Baygorria	685	642
Palmar	1.026	1.329
SGU	1.477	1.506

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	498
Baygorria	0	-12
Palmar	0	144
SGU	1.800	1.820

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
