




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 21 de marzo de 2015


Generación Térmica	
Central Batlle	1.257
Sala B	-4
5ta.	50
6ta.	-0
Motores	1.211
Central La Tablada	-92
Central P. del Tigre	6.321
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.125
C. Baygorria	1.527
C. Palmar	1.985
C. Salto Grande	4.175
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.736
TOTAL Generación	26.030

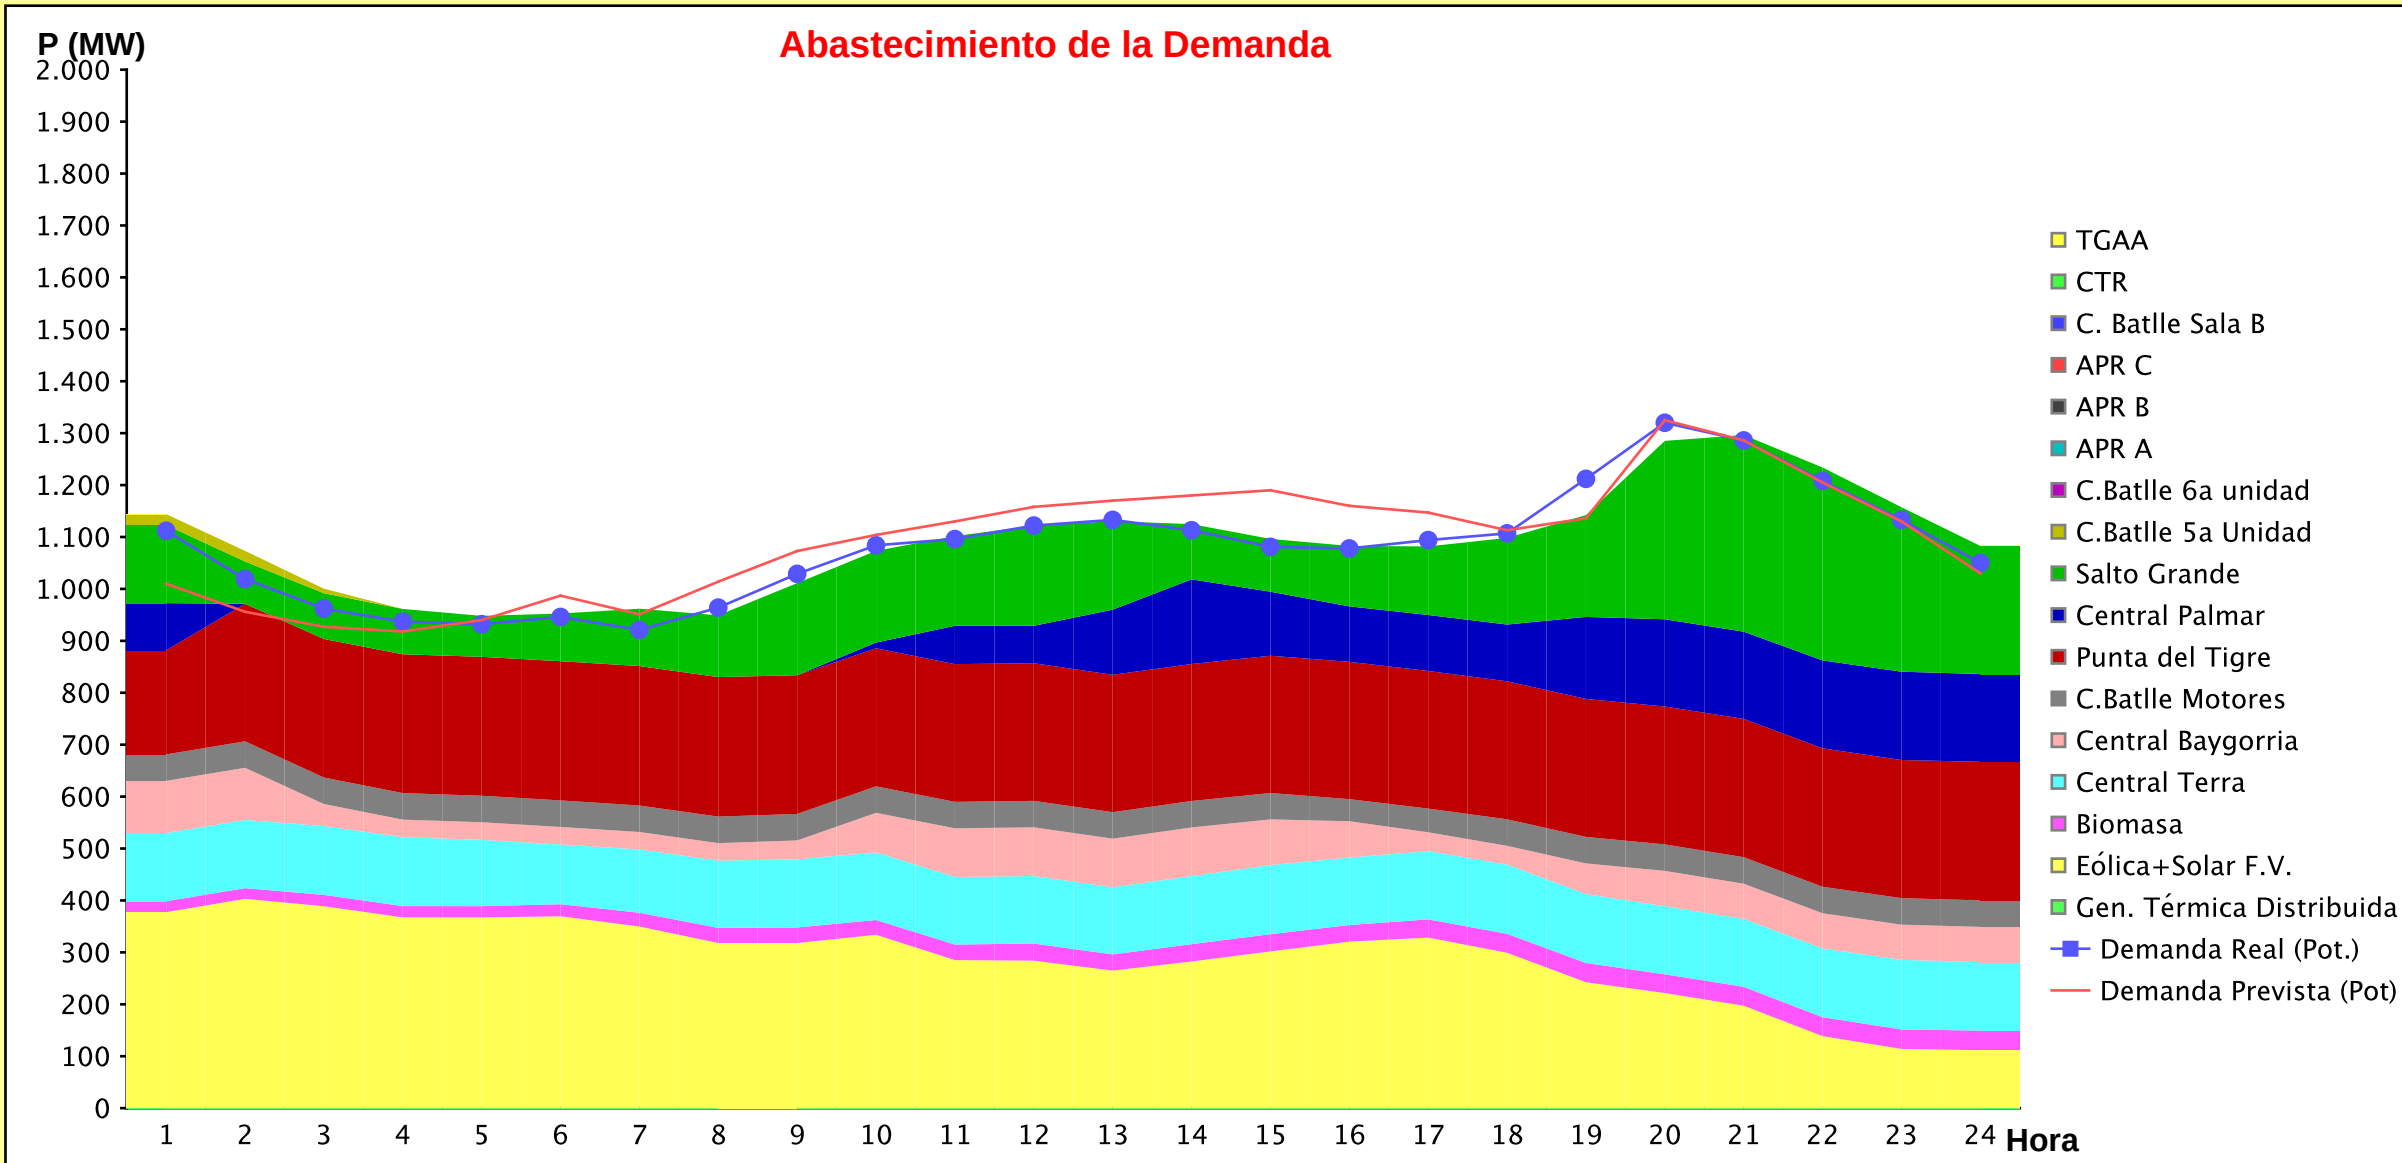

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.030
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	26.240
Diferencia (MWh)	-210
Ejecutada - Programada	-0,80 %

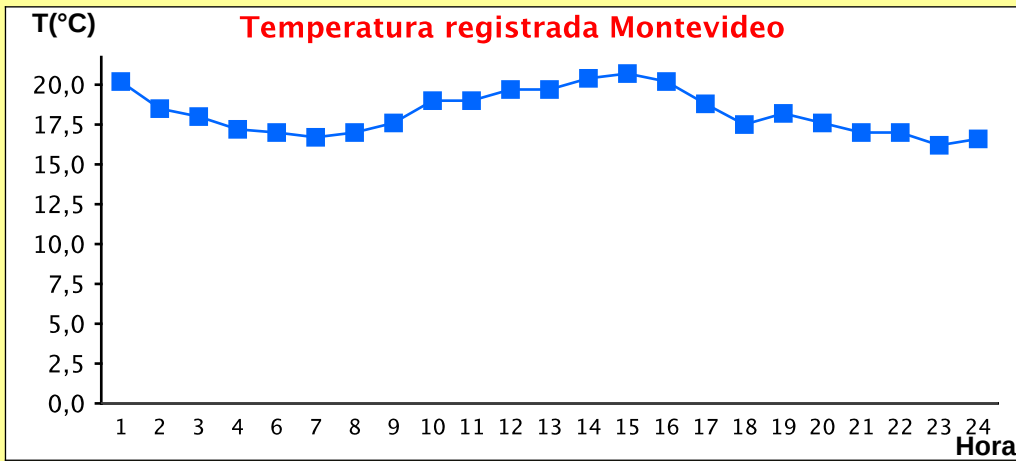

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1132,49 Hora 12:58
Potencia mínima:	875,61 Hora 07:07
Pico noche:	1320,61 Hora 19:59



Generación Media (MW)	
Eólica	291,1
Biomasa	37,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

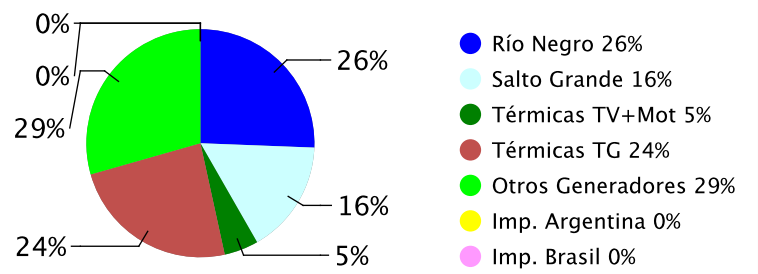



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

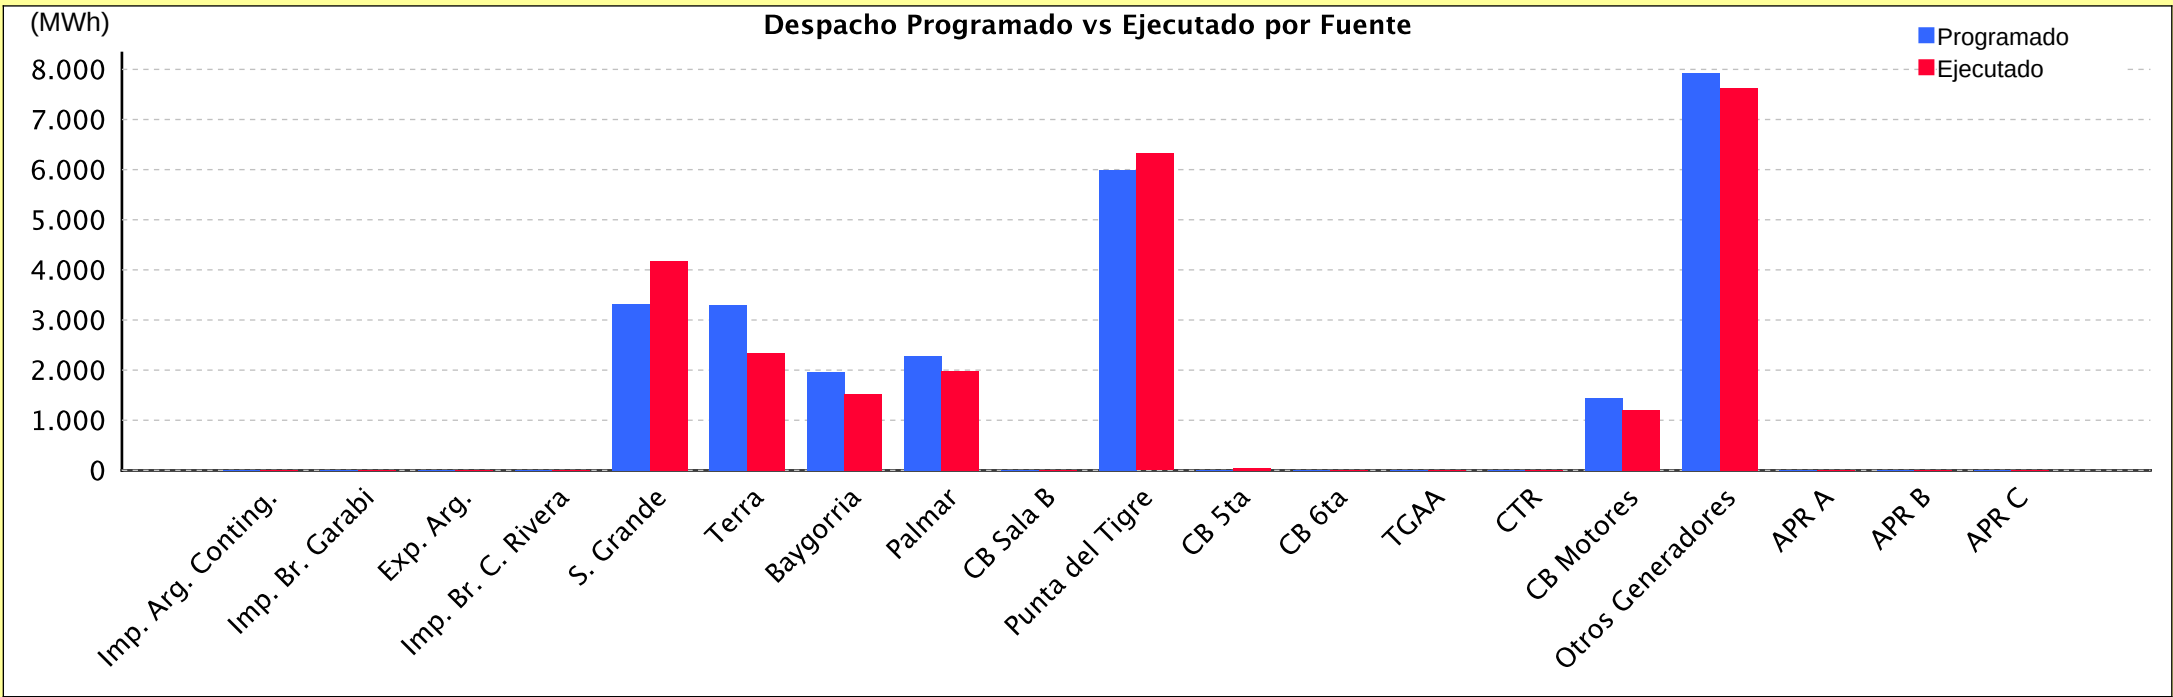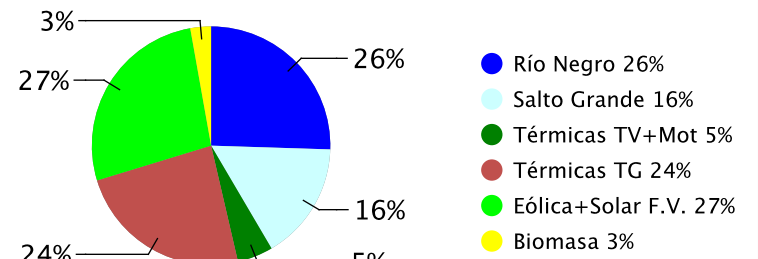



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

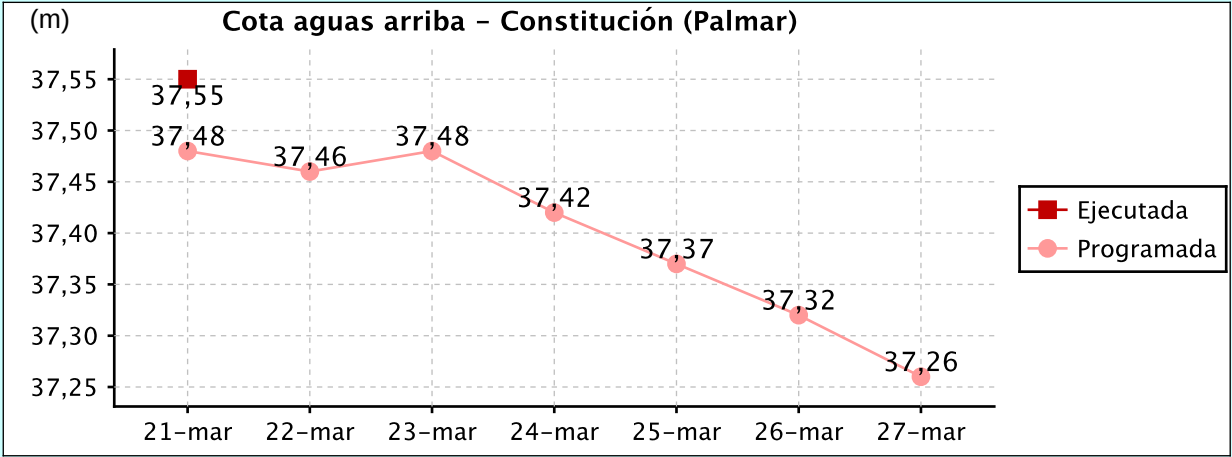
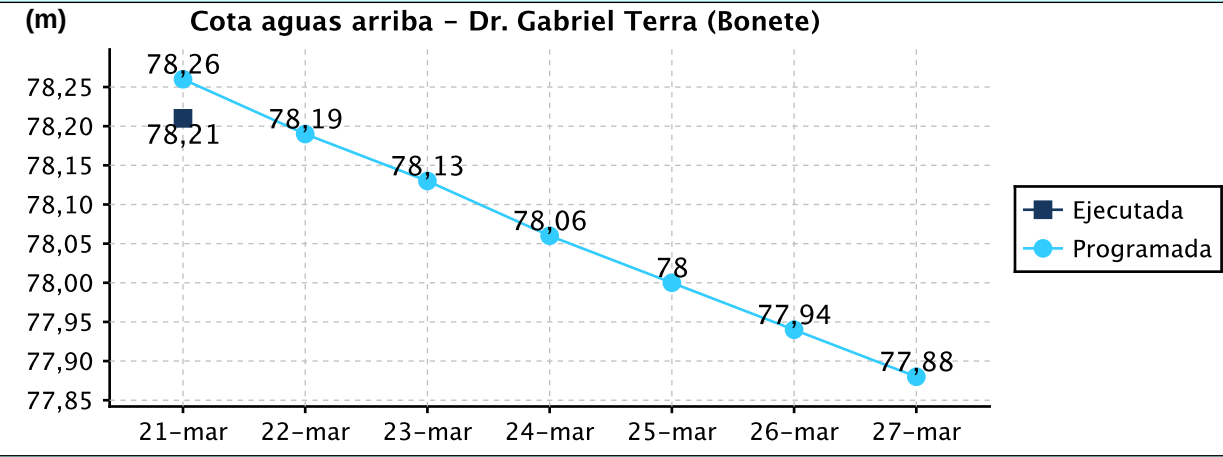


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,26	78,21
Baygorria	53,82	53,82
Palmar	37,48	37,55
SGU	34,12	34,15

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

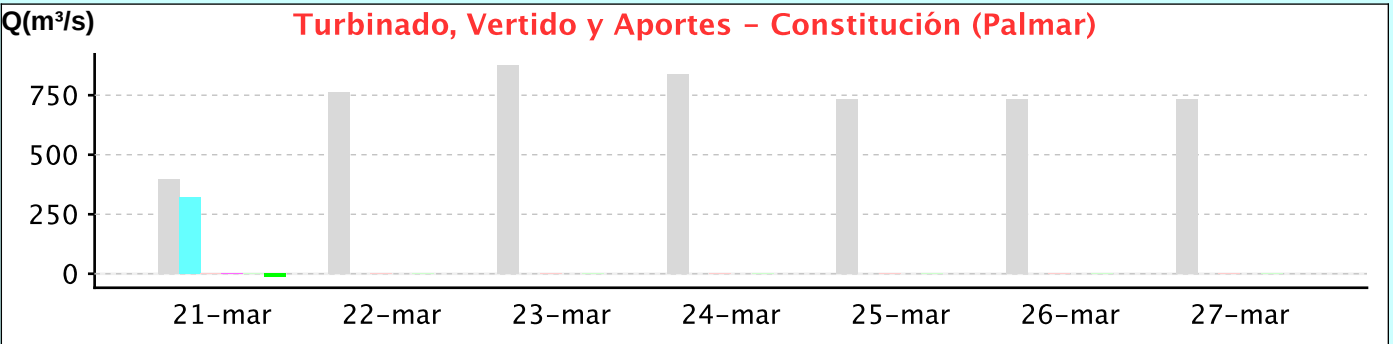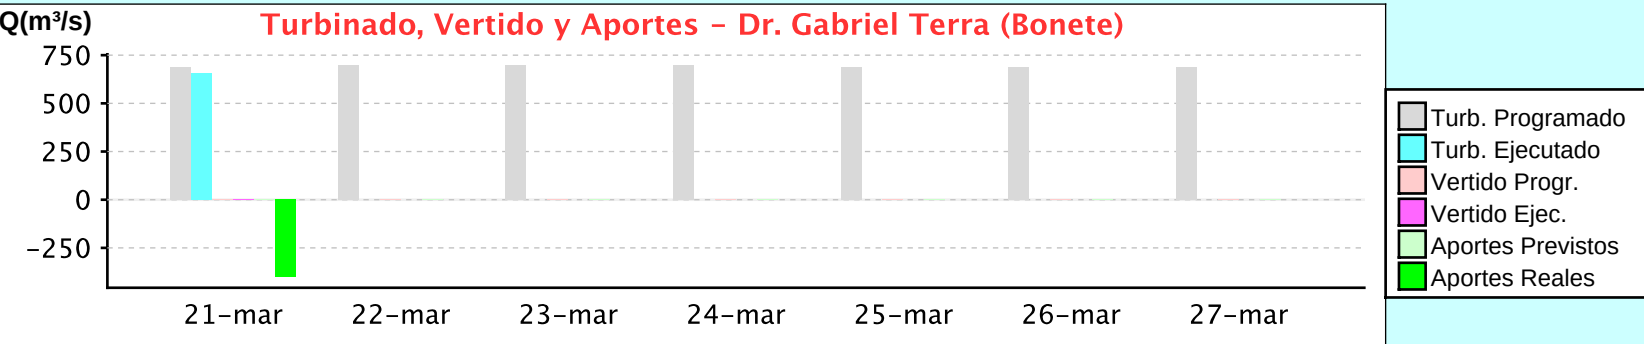

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

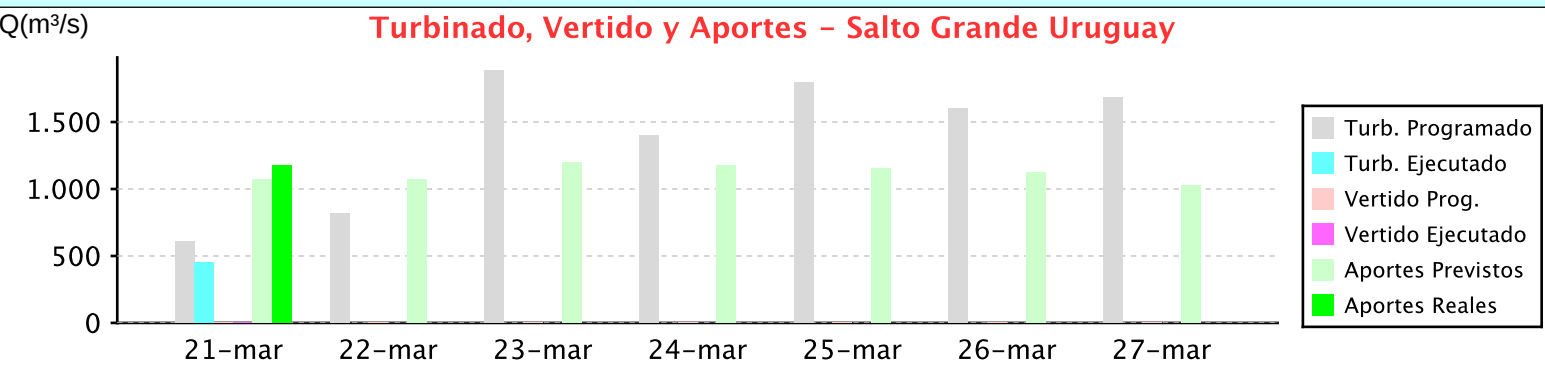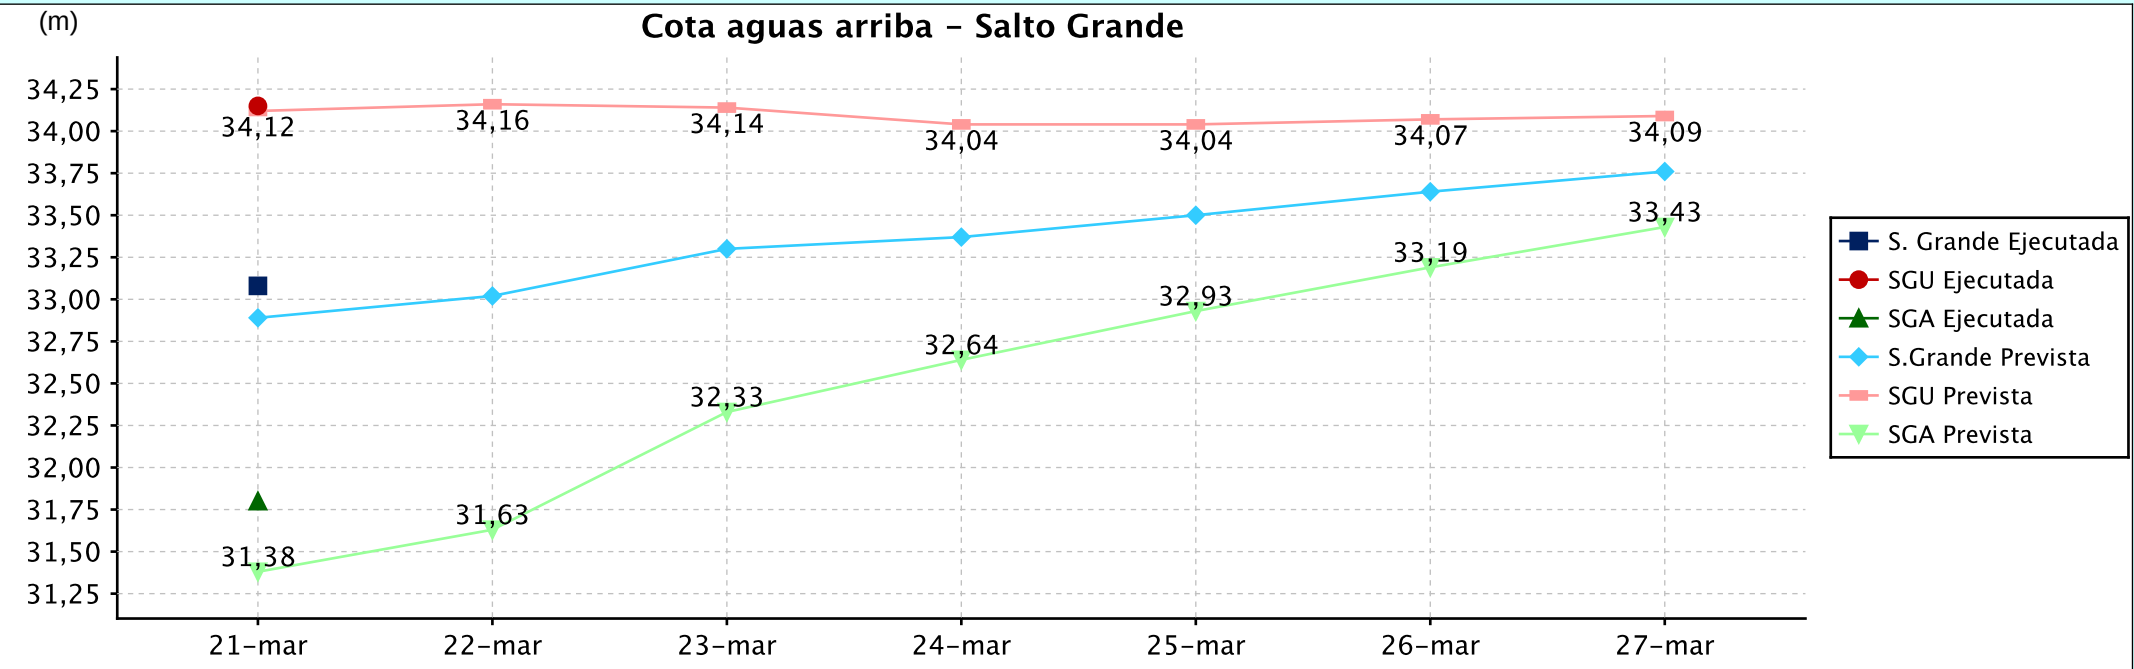

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,15
Cota Vista Arg	31,80
Cota real	33,08
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
41.829	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	687	658
Baygorria	629	472
Palmar	398	322
SGU	610	450

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-402
Baygorria	0	-36
Palmar	0	-14
SGU	1.075	1.180

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
