




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 22 de marzo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.213
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	-1
Motores	1.217
Central La Tablada	-96
Central P. del Tigre	6.389
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.116
C. Baygorria	1.388
C. Palmar	3.822
C. Salto Grande	4.357
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.066
TOTAL Generación	23.250

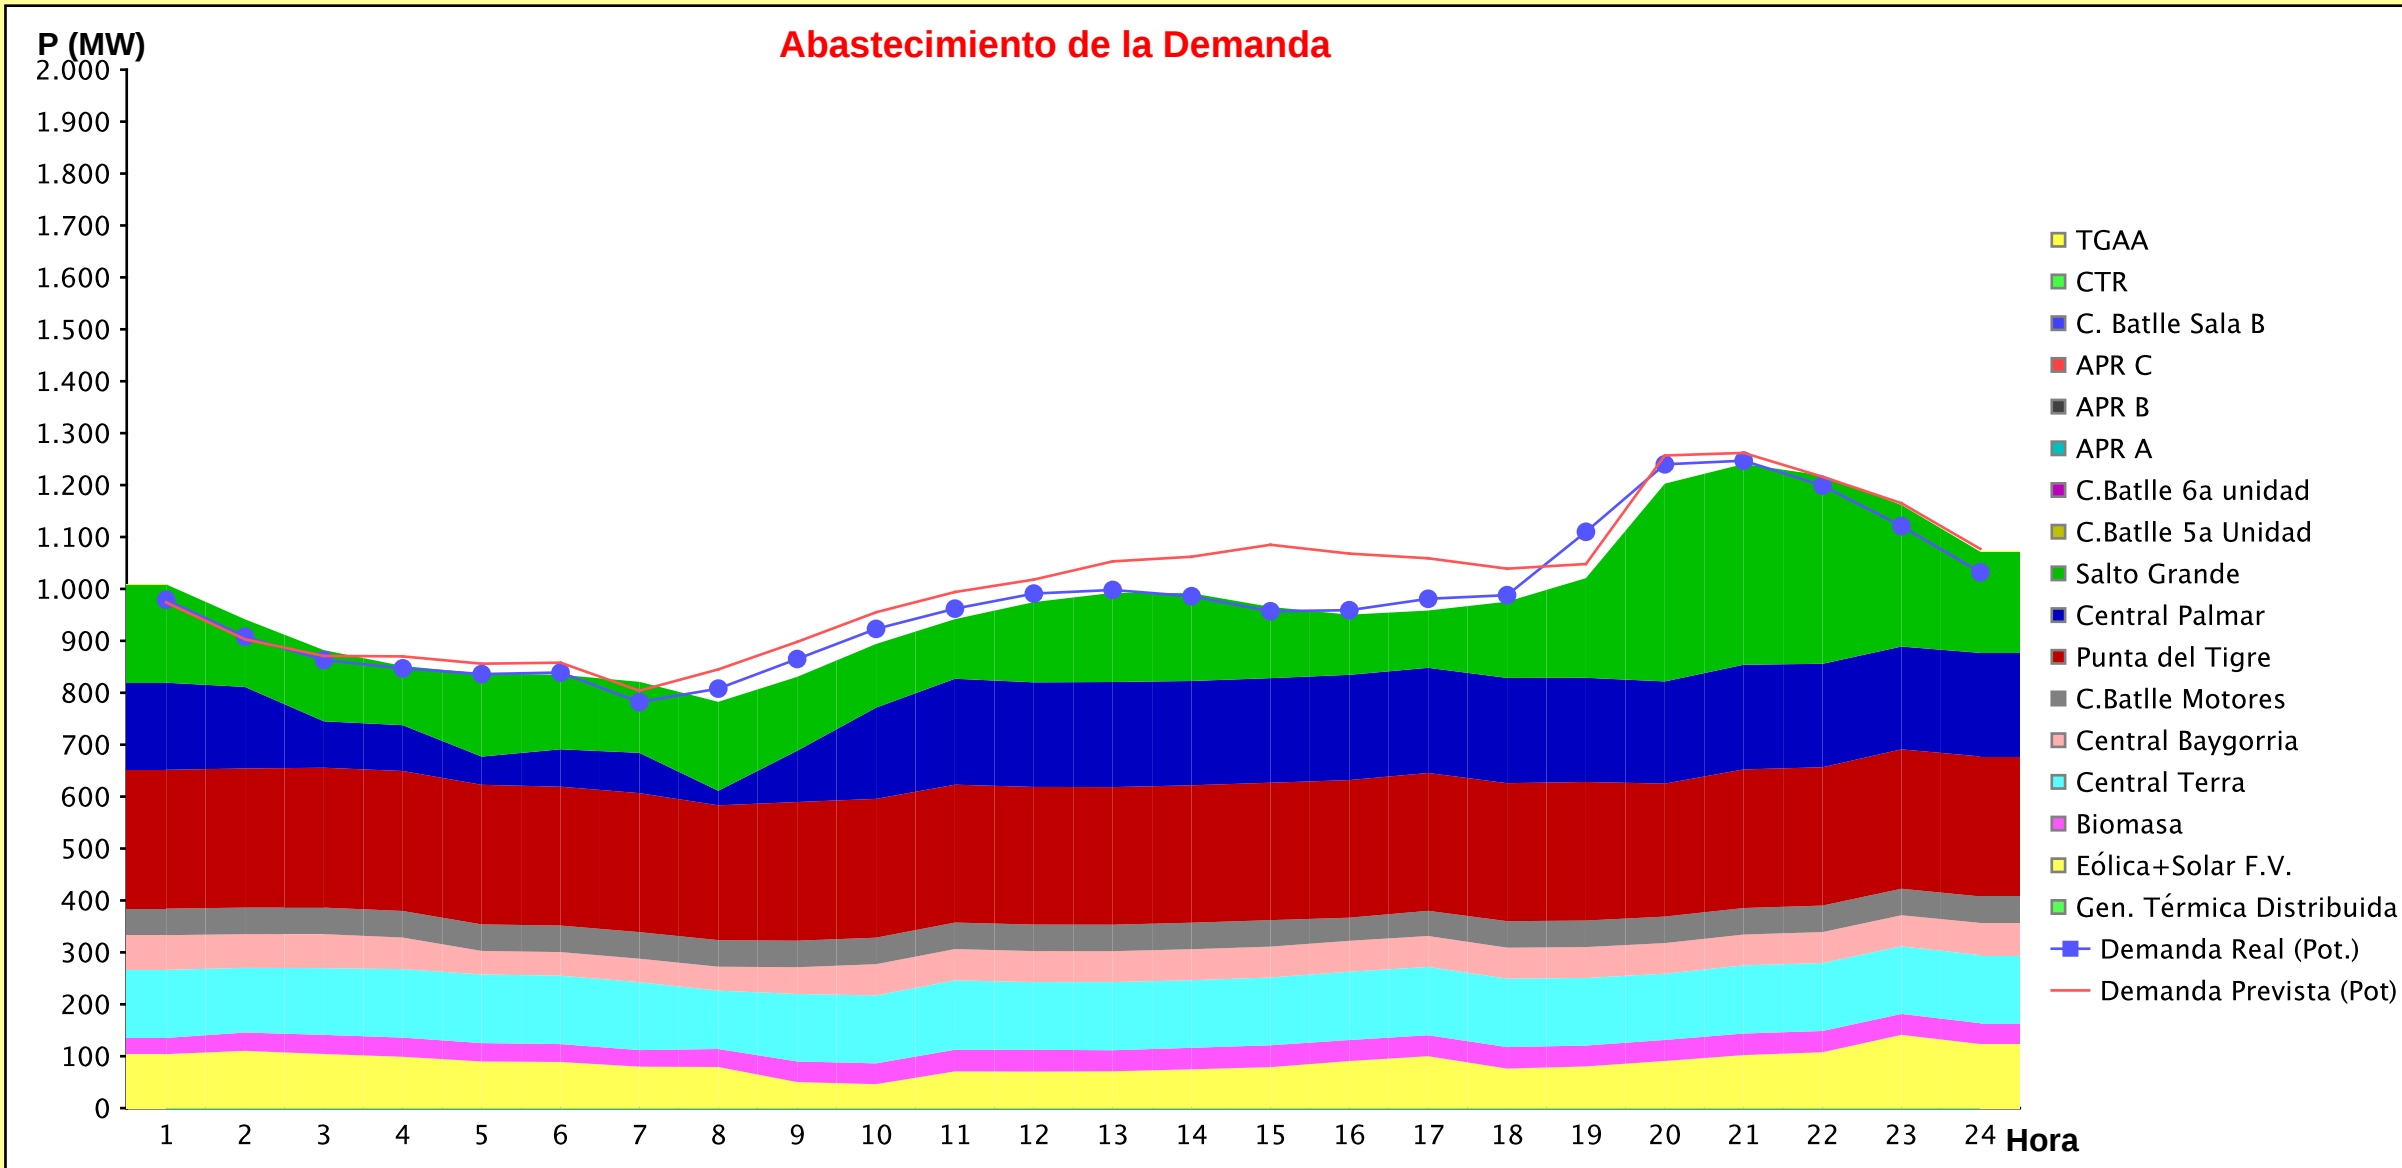

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.250
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	24.237
Diferencia (MWh)	-987
Ejecutada - Programada	-4,07 %

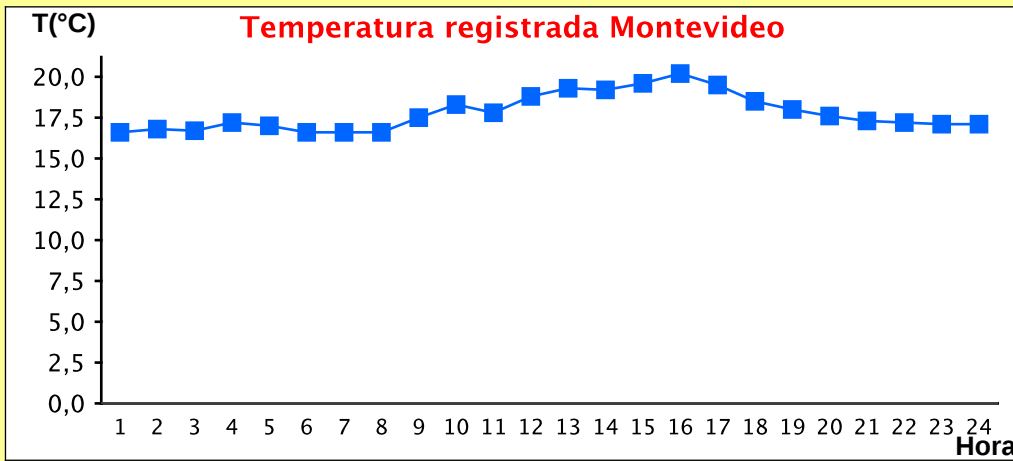

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1002 Hora 12:53
Potencia mínima:	728,23 Hora 07:15
Pico noche:	1253,39 Hora 20:21



Generación Media (MW)	
Eólica	89,1
Biomasa	39,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

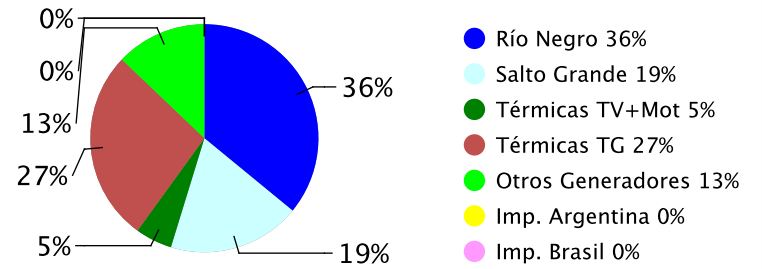



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

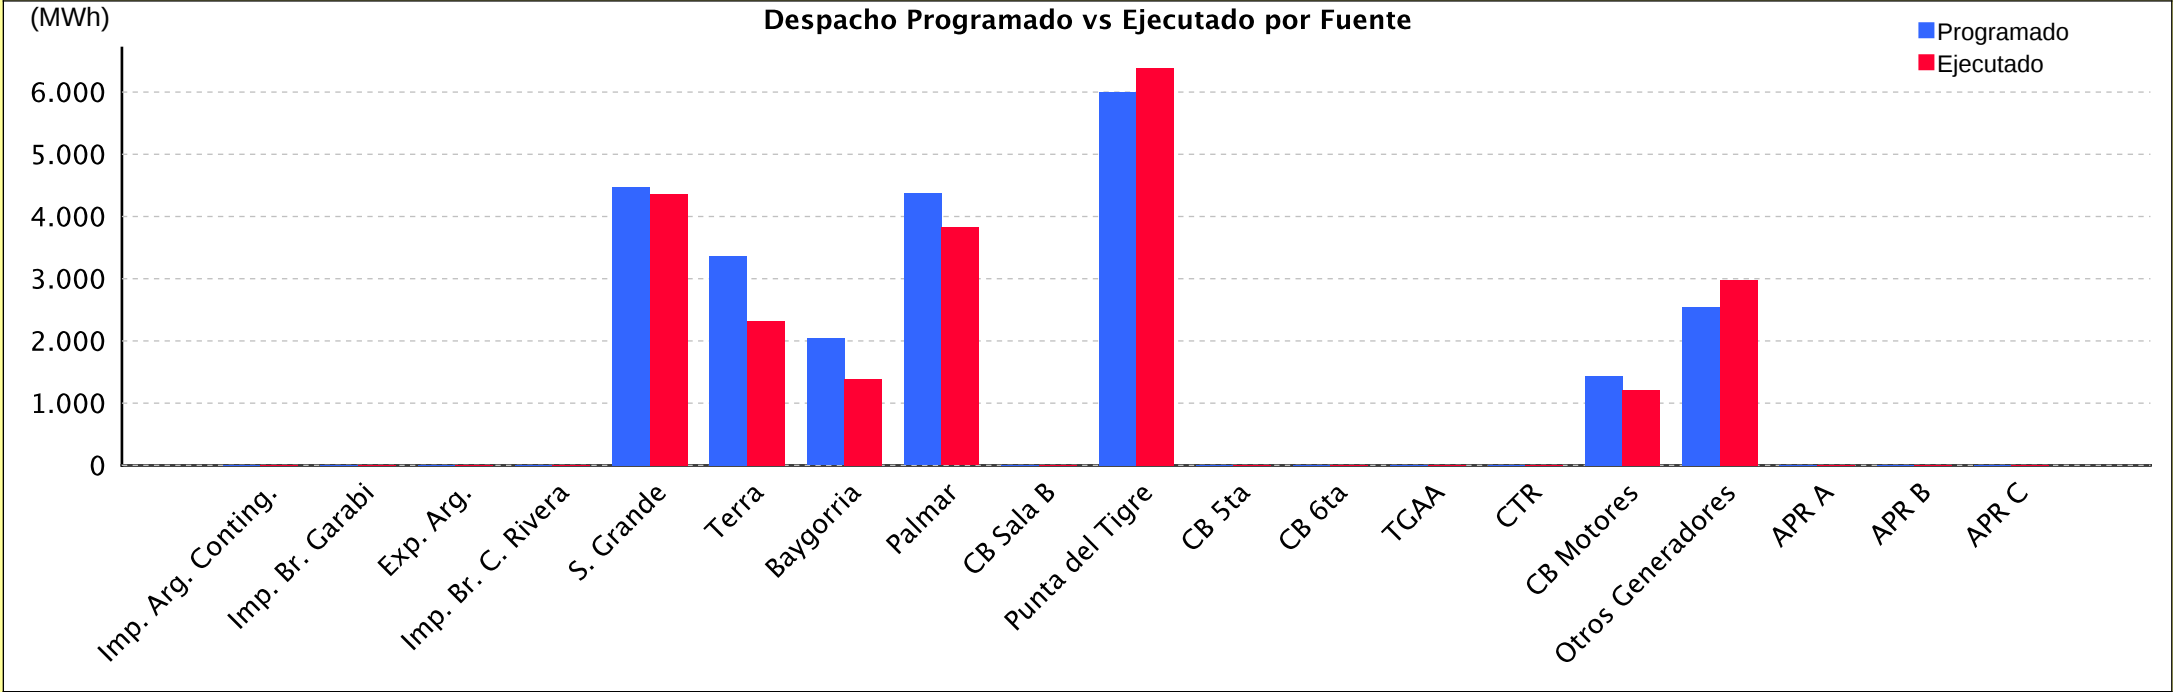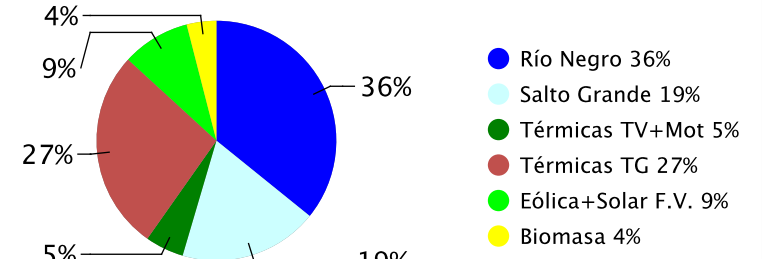



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

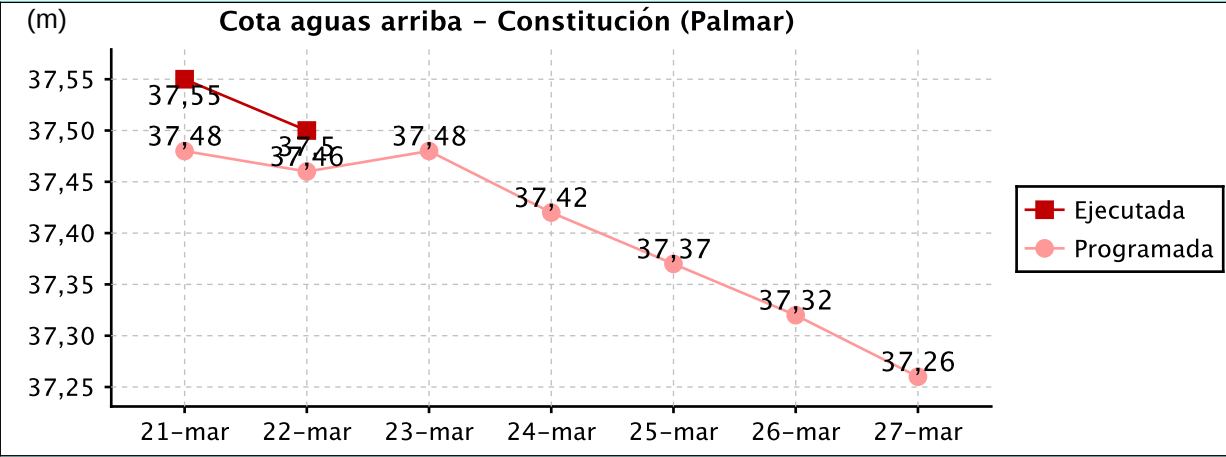
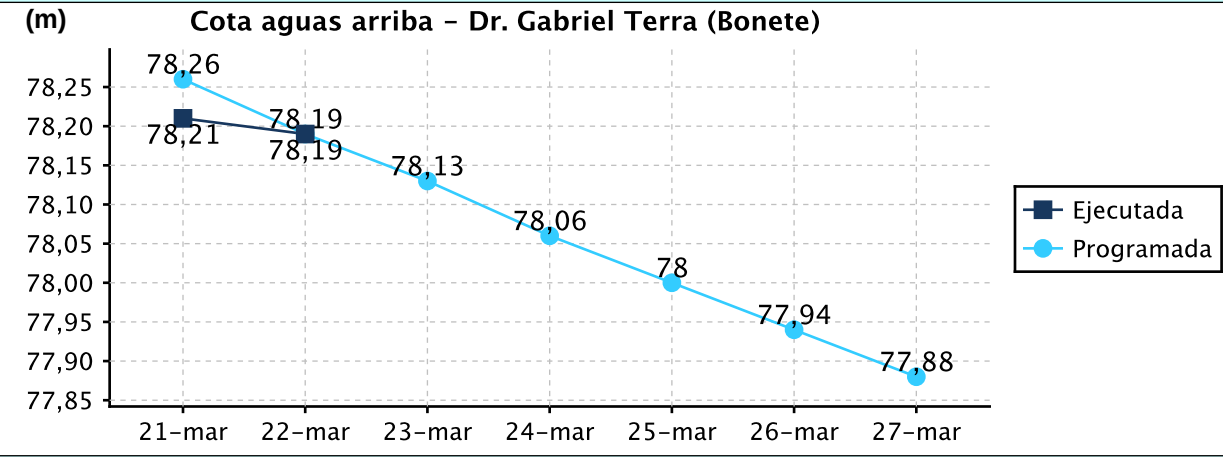


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,19	78,19
Baygorria	53,83	54,05
Palmar	37,46	37,5
SGU	34,16	34,23

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

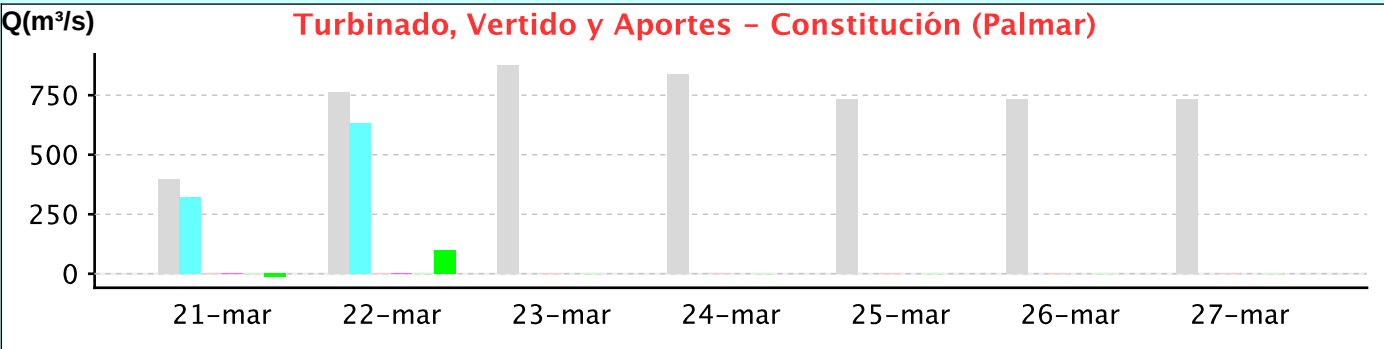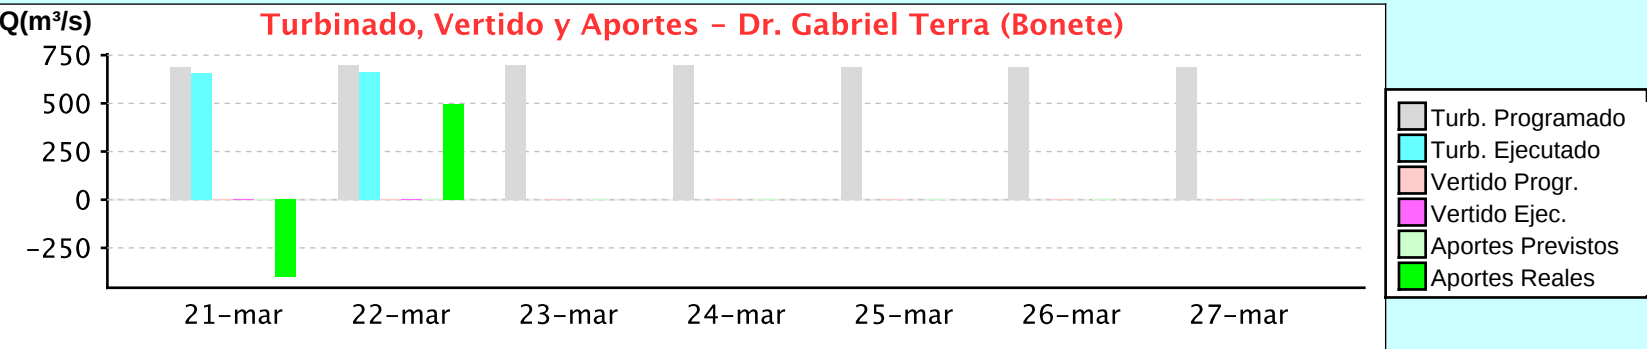

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

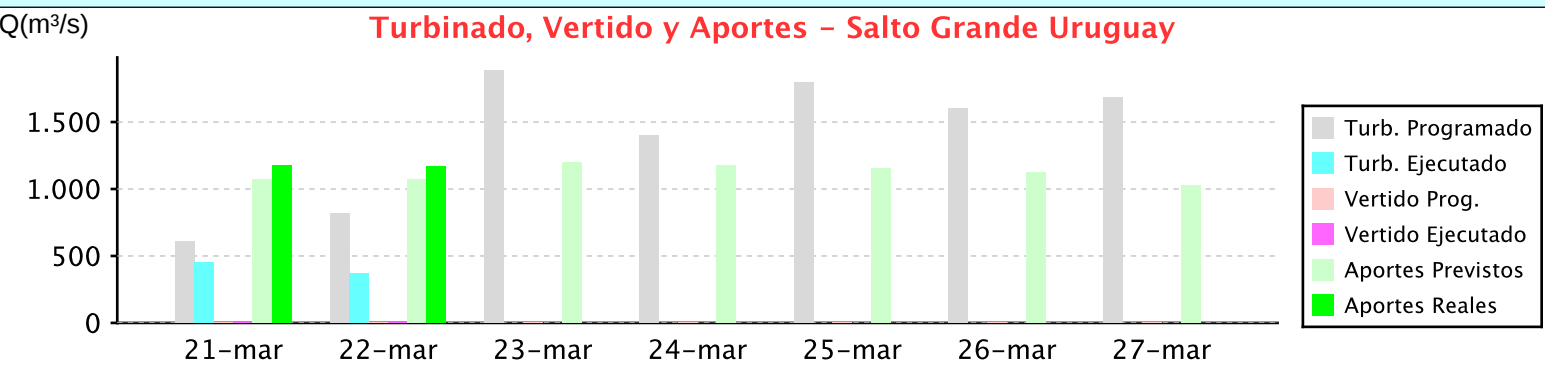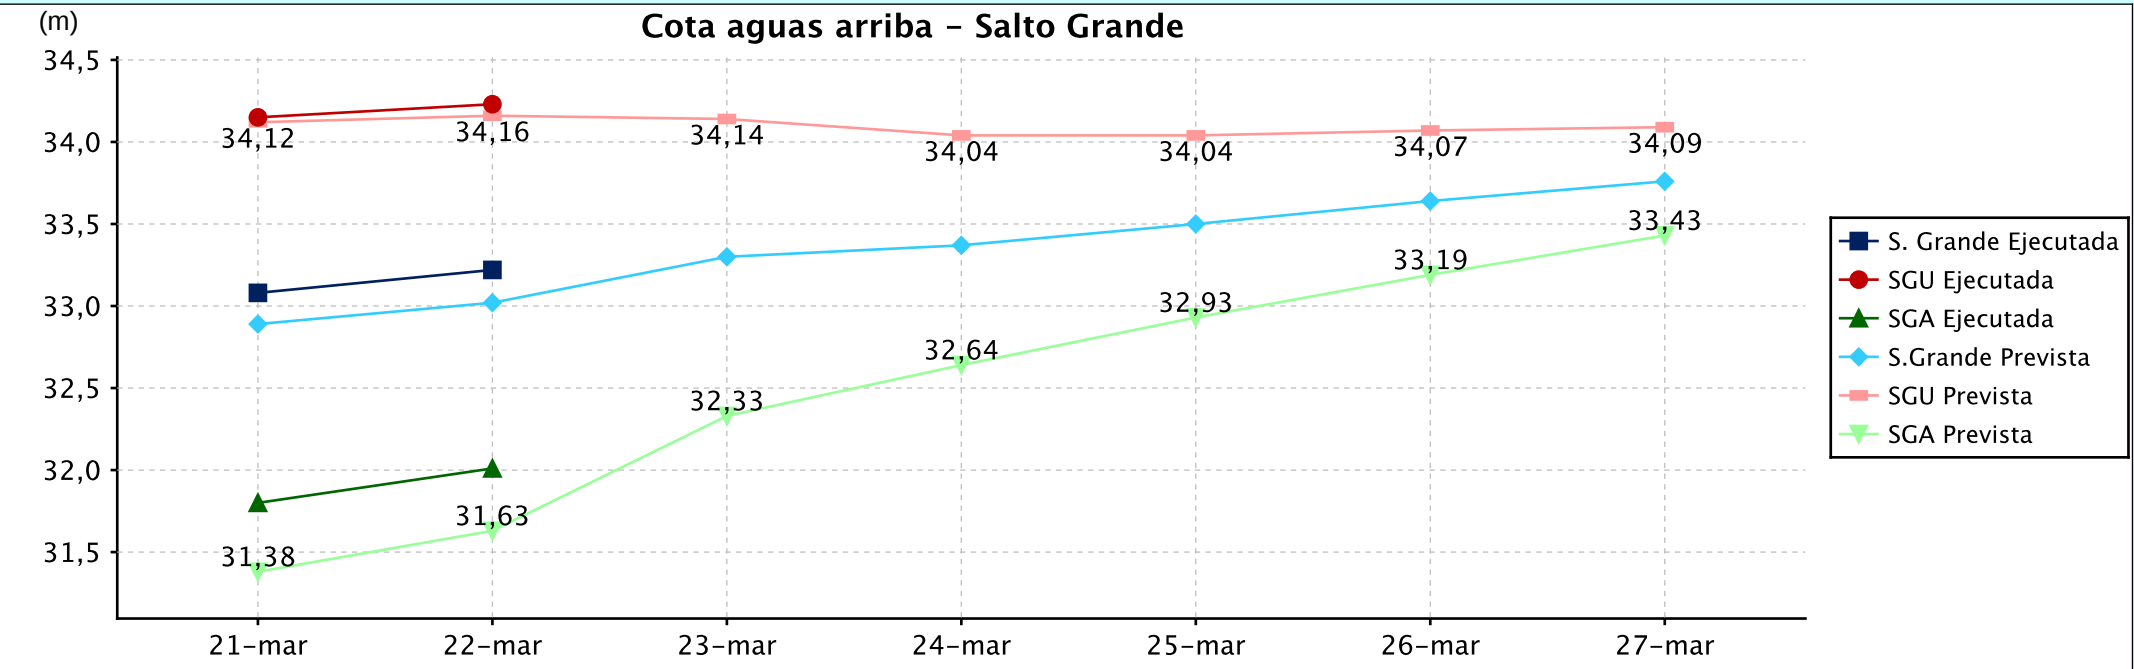

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,23
Cota Vista Arg	32,01
Cota real	33,22
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
40.478	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	699	664
Baygorria	655	414
Palmar	761	631
SGU	821	368

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	495
Baygorria	0	27
Palmar	0	99
SGU	1.075	1.169

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
