




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 23 de marzo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.206
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	-3
Motores	1.212
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	6.360
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.084
C. Baygorria	1.884
C. Palmar	4.508
C. Salto Grande	7.365
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.553
TOTAL Generación	26.873

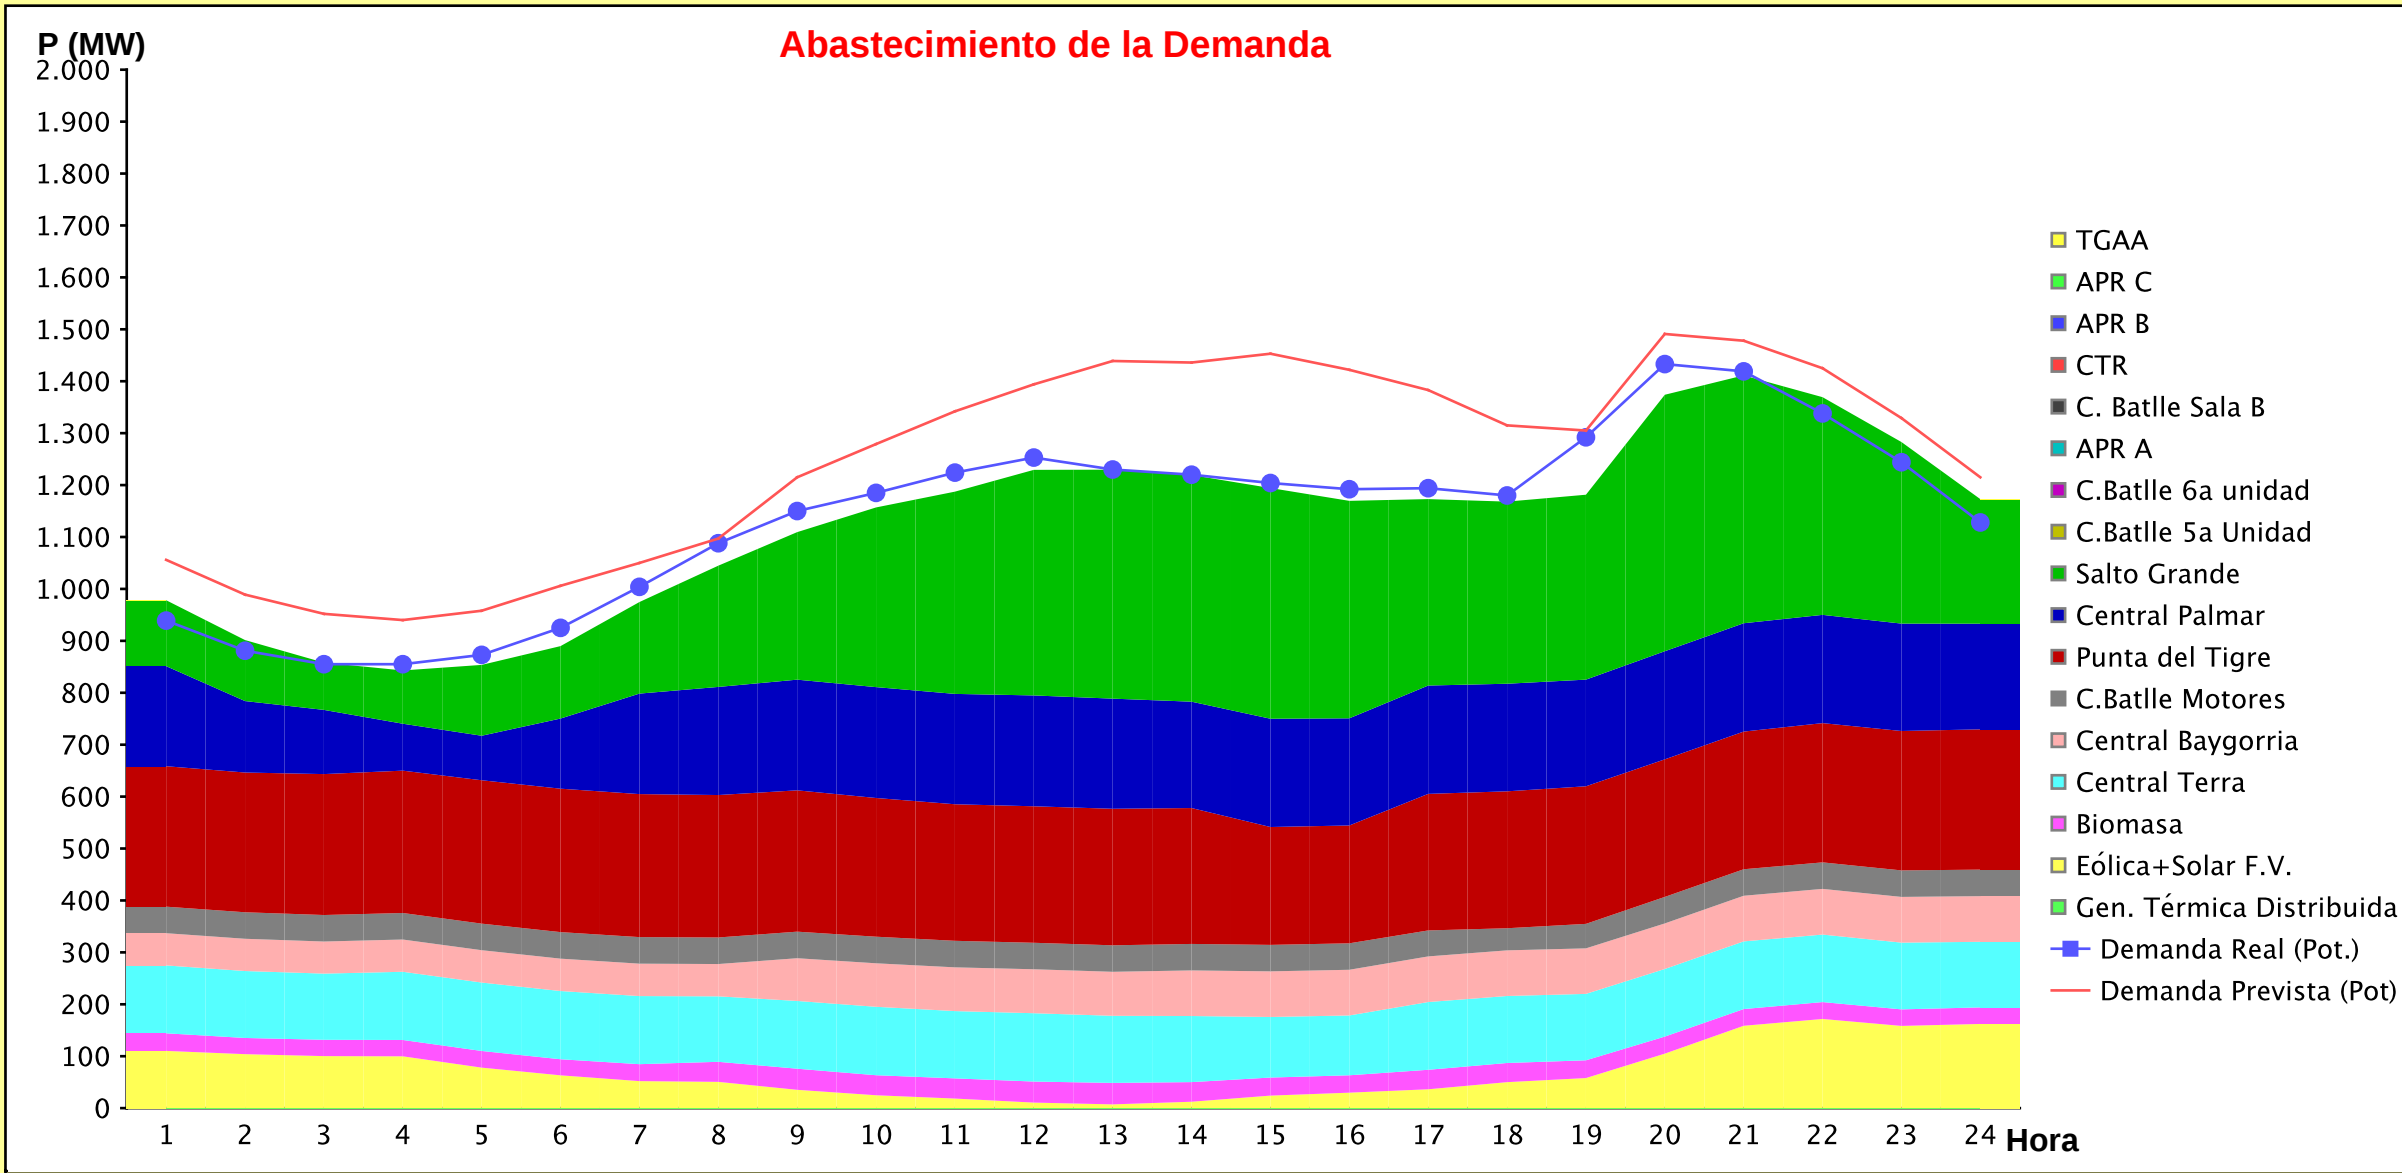

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.873
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.969
Diferencia (MWh)	-3.096
Ejecutada - Programada	-10,33 %

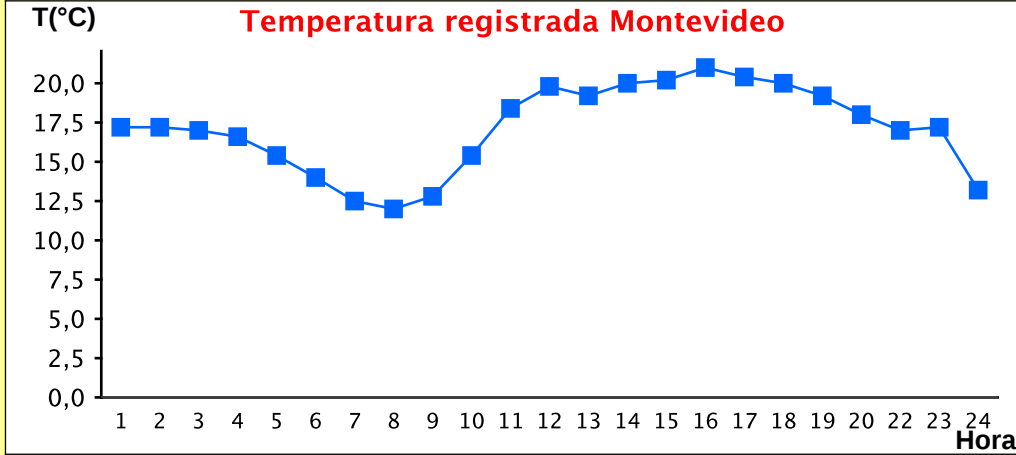



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1258,48 Hora 11:44
Potencia mínima:	839 Hora 03:47
Pico noche:	1429,16 Hora 20:08

Generación Media (MW)	
Eólica	73,1
Biomasa	38,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

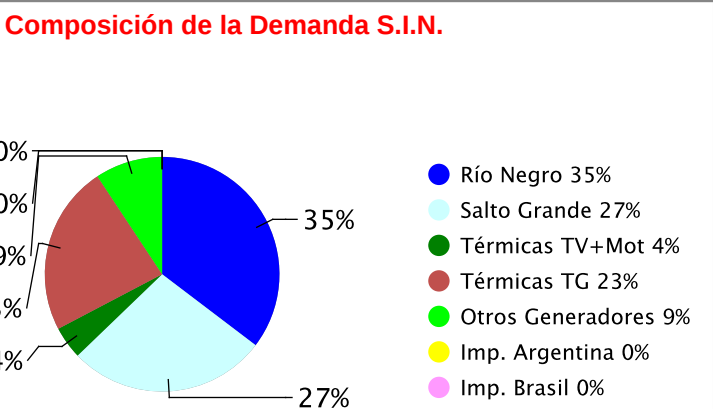



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

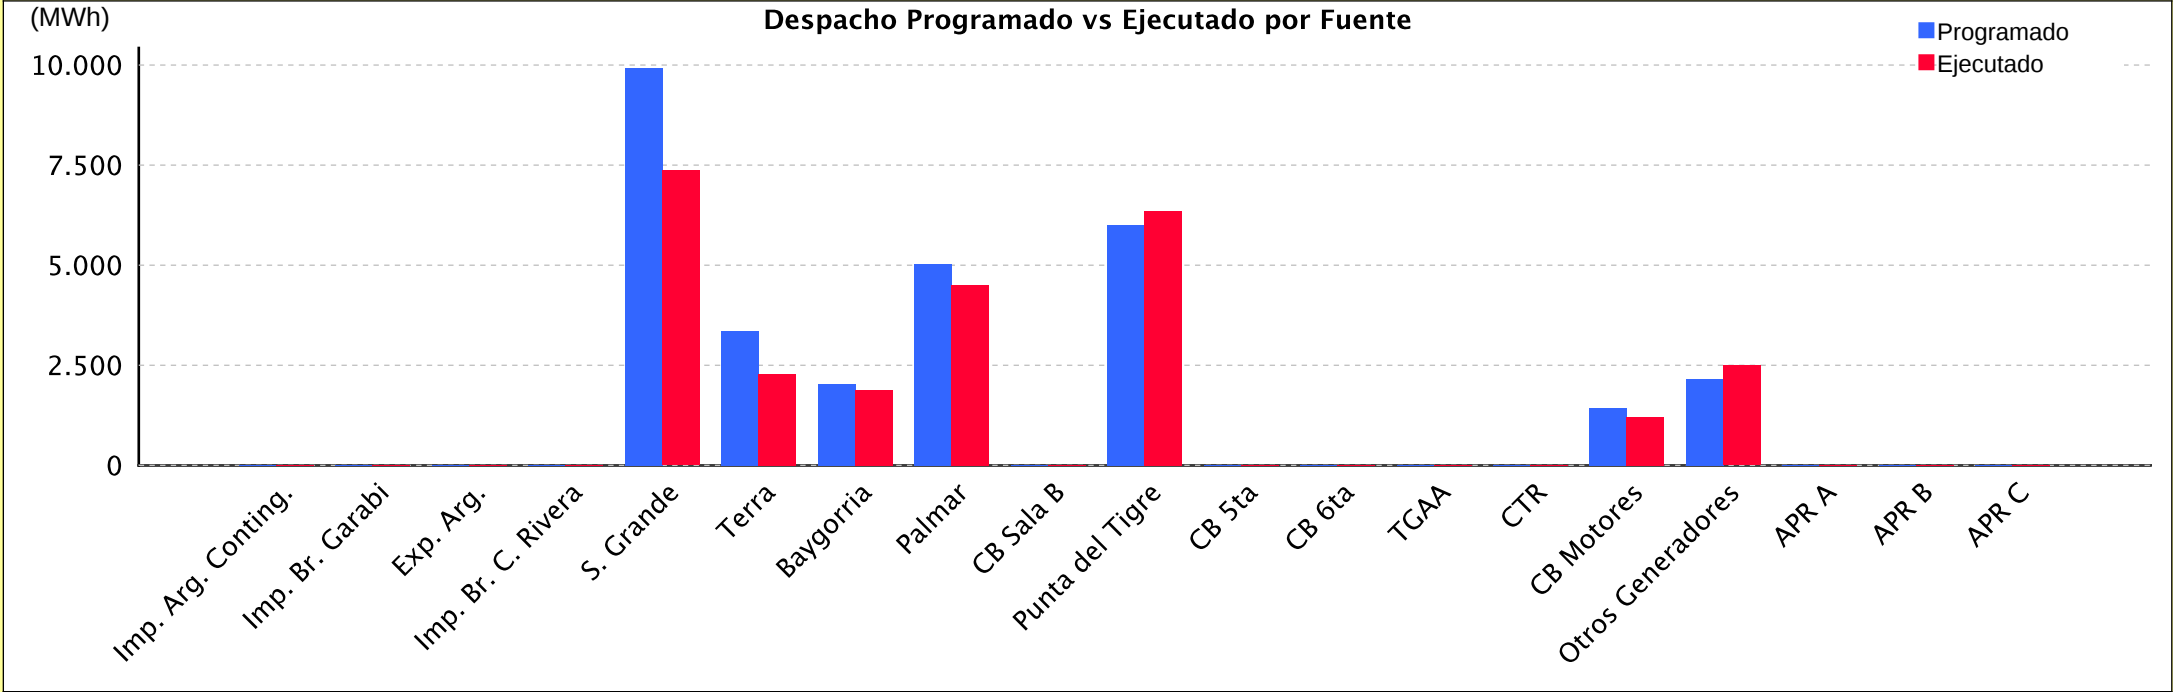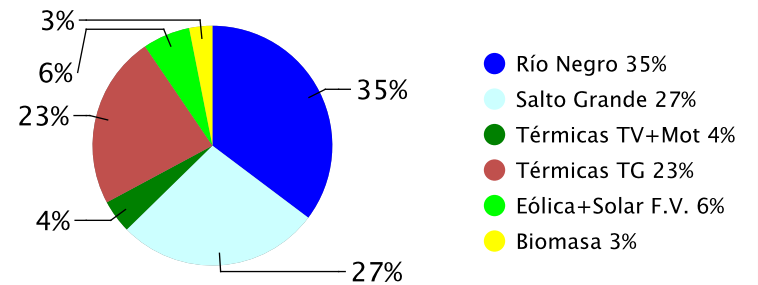



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

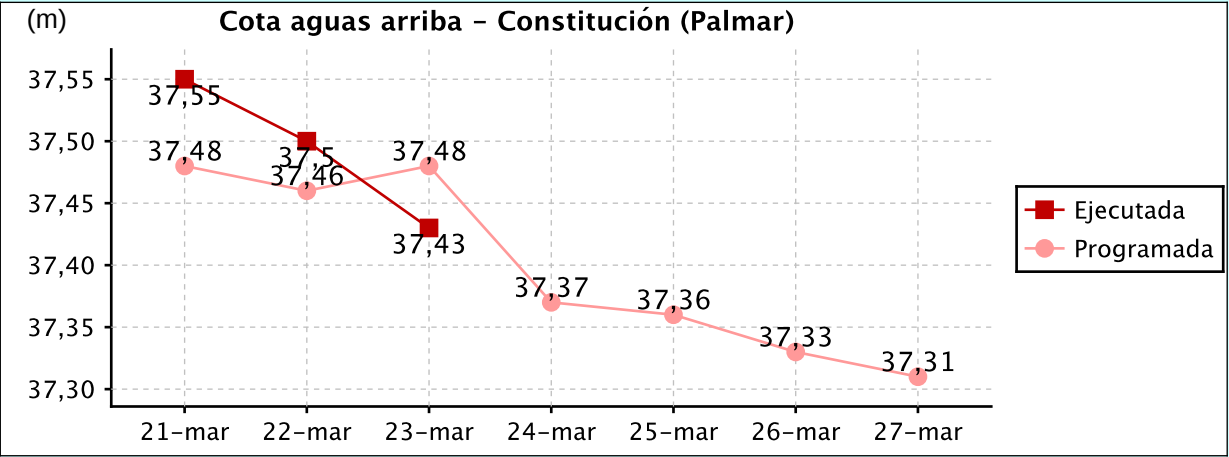
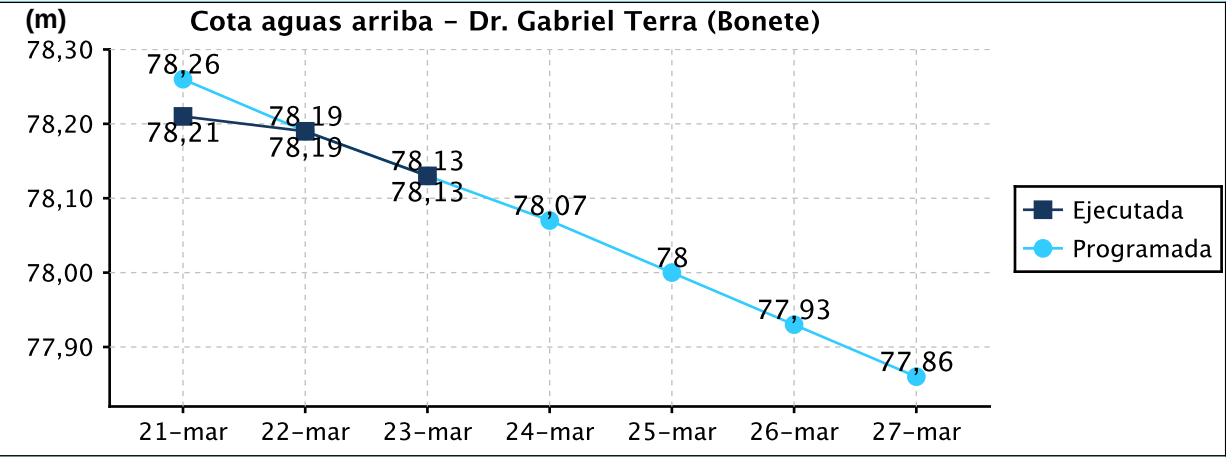


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,13	78,13
Baygorria	54,07	54,12
Palmar	37,48	37,43
SGU	34,14	34,24

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

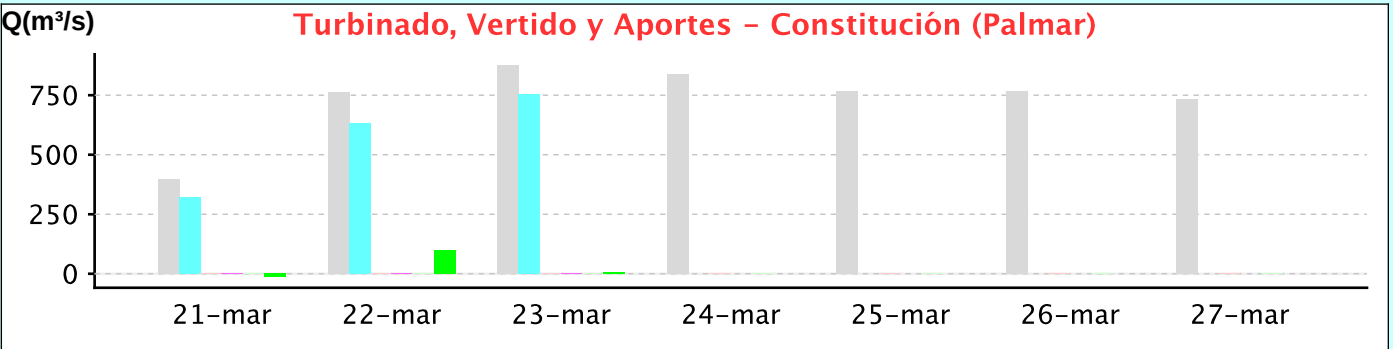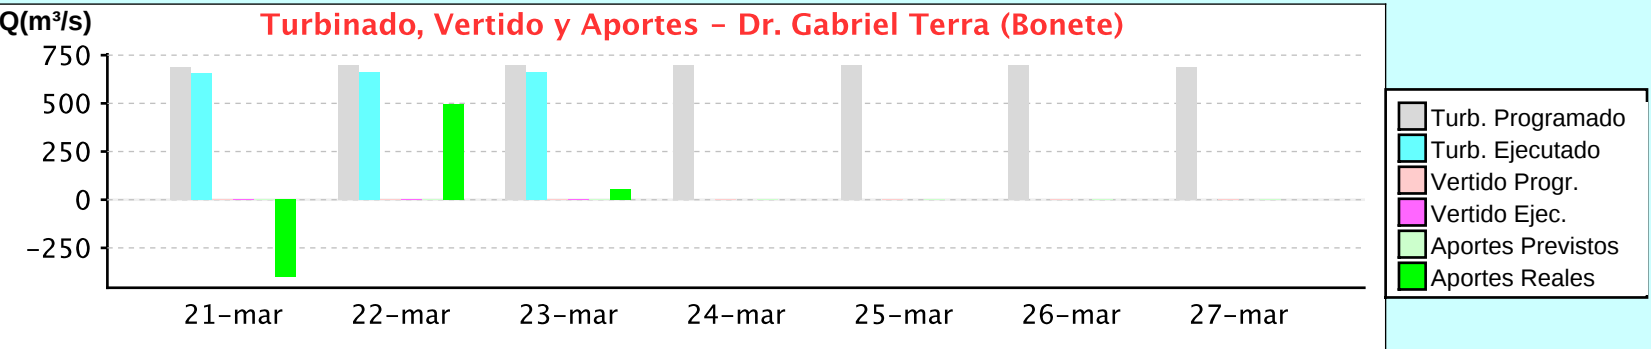

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

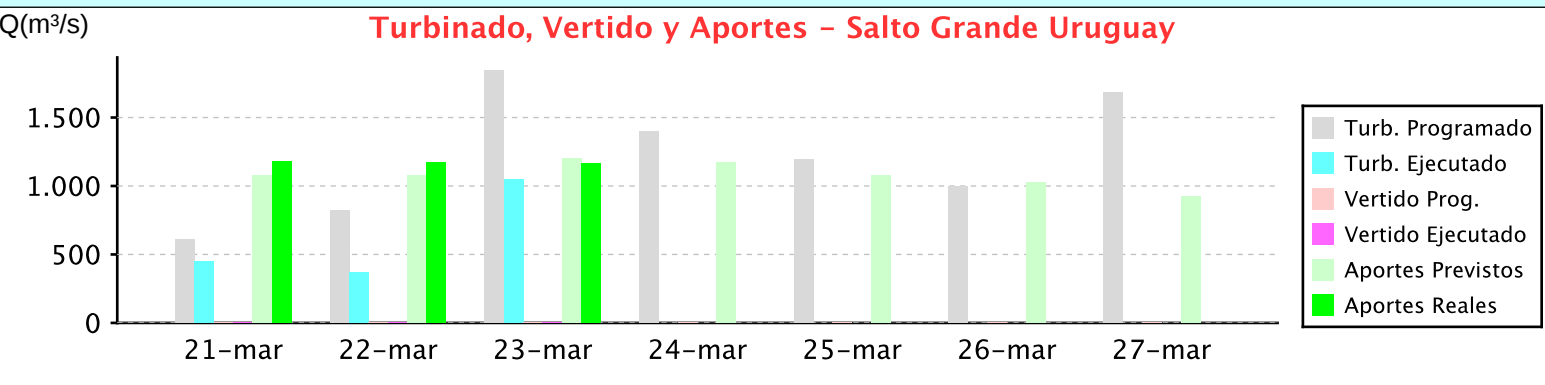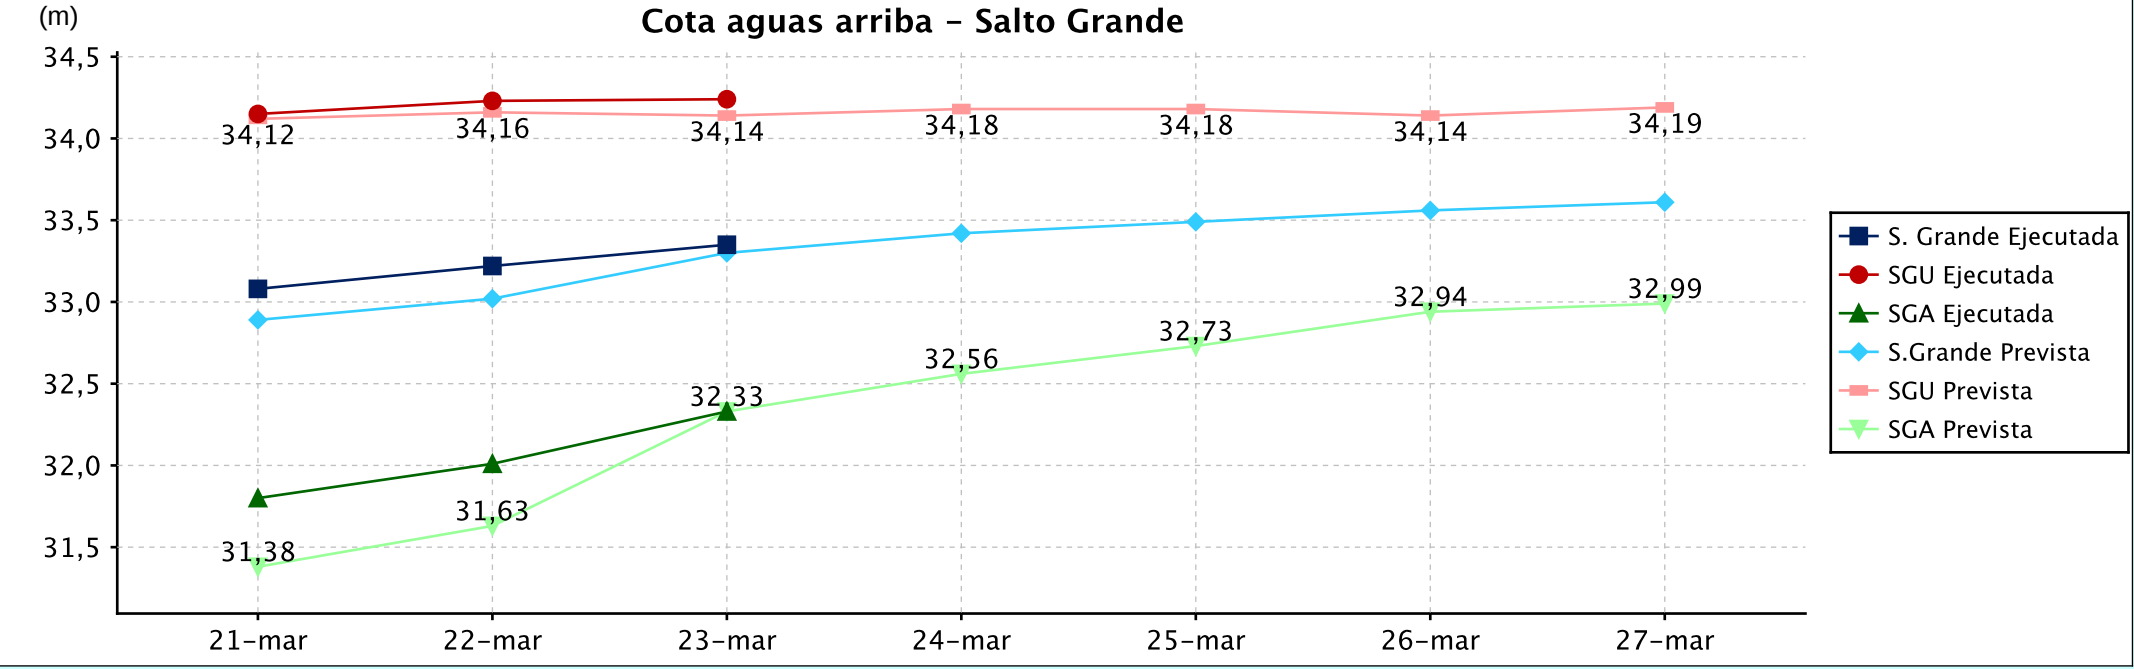

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,24
Cota Vista Arg	32,33
Cota real	33,35
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
35.652	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	699	663
Baygorria	655	559
Palmar	877	754
SGU	1.846	1.047

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	55
Baygorria	0	-1
Palmar	0	8
SGU	1.200	1.164

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
