




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 24 de marzo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.209
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.213
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	6.395
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.093
C. Baygorria	2.041
C. Palmar	4.621
C. Salto Grande	7.617
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.608
TOTAL Generación	27.498

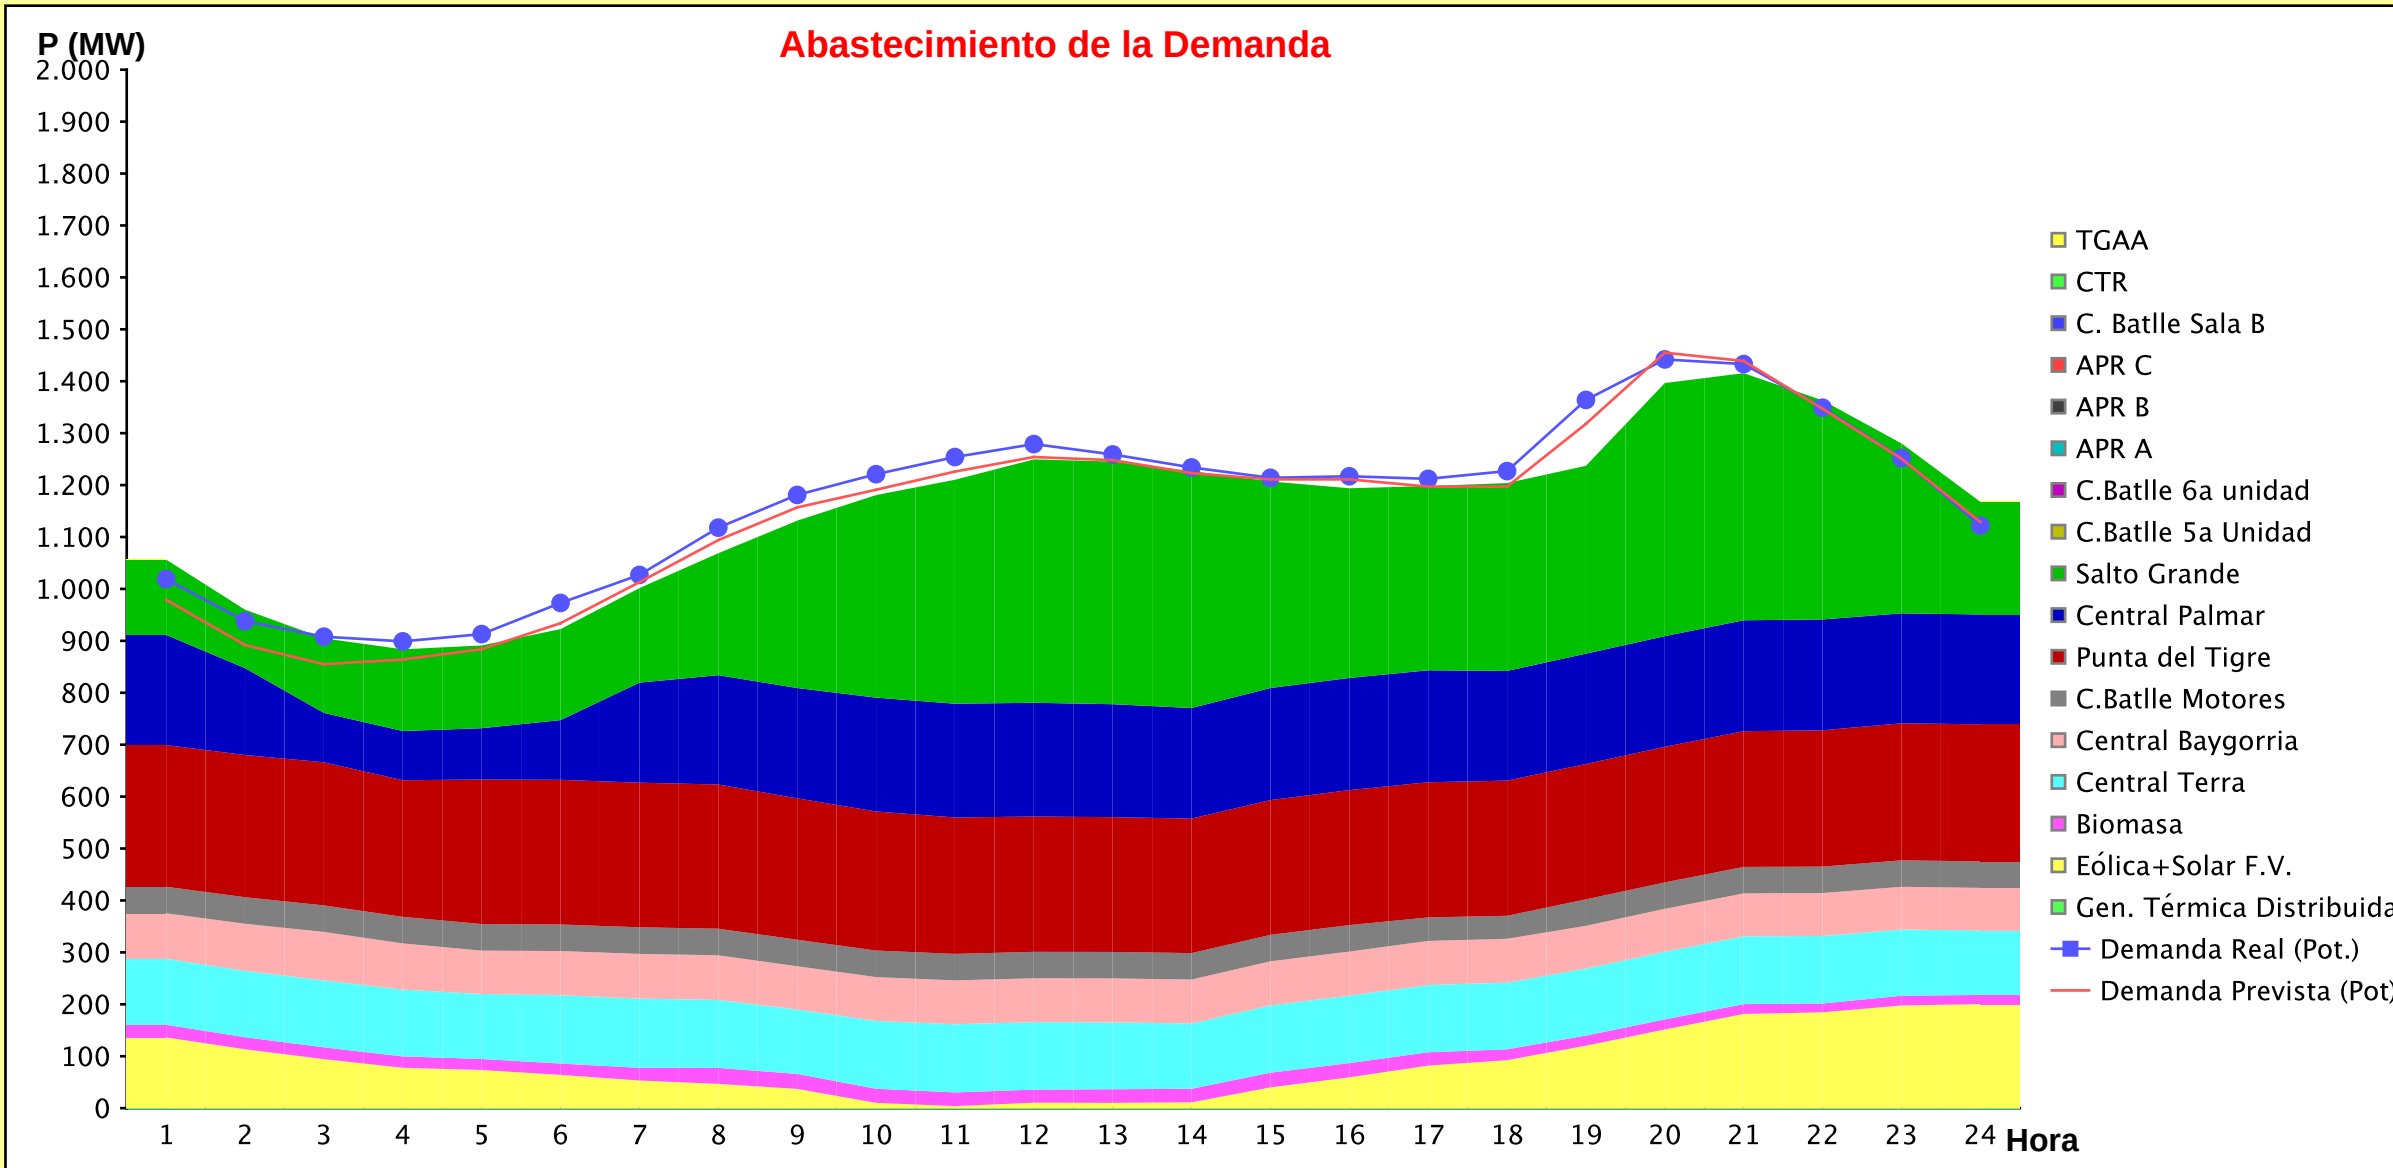

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.498
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	27.569
Diferencia (MWh)	-71
Ejecutada - Programada	-0,26 %

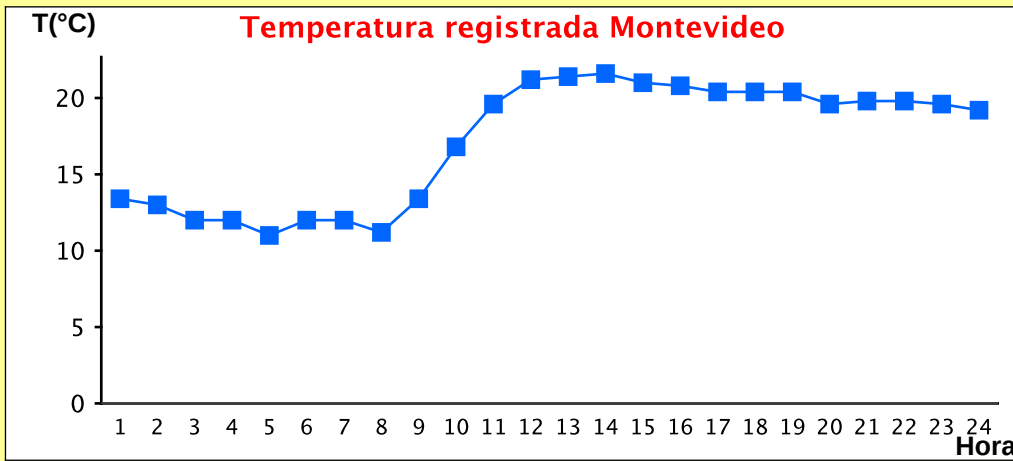

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1284,9 Hora 11:44
Potencia mínima:	888,07 Hora 03:43
Pico noche:	1444,75 Hora 20:14



Generación Media (MW)	
Eólica	87,0
Biomasa	34,4
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

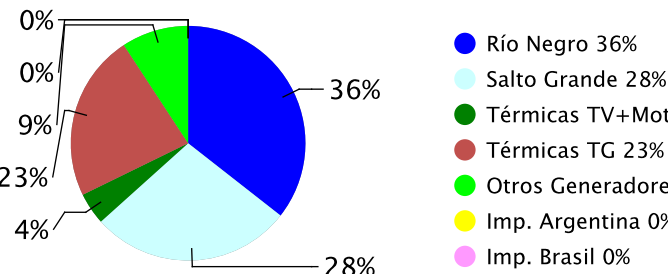



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

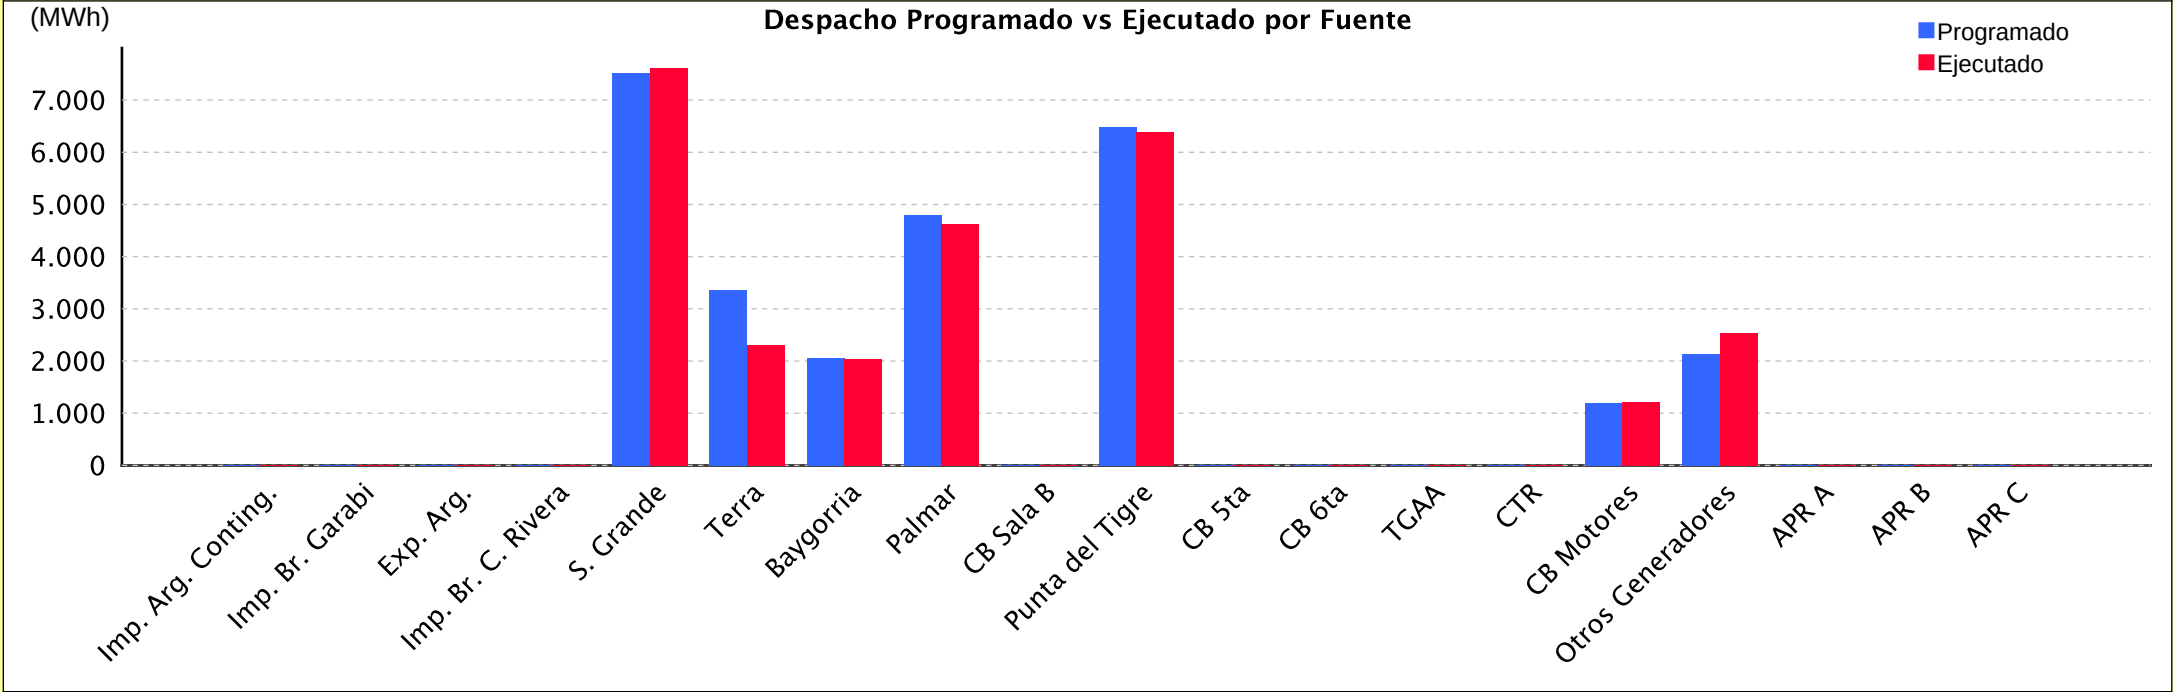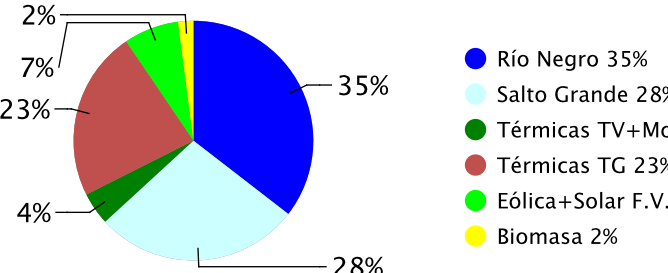



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

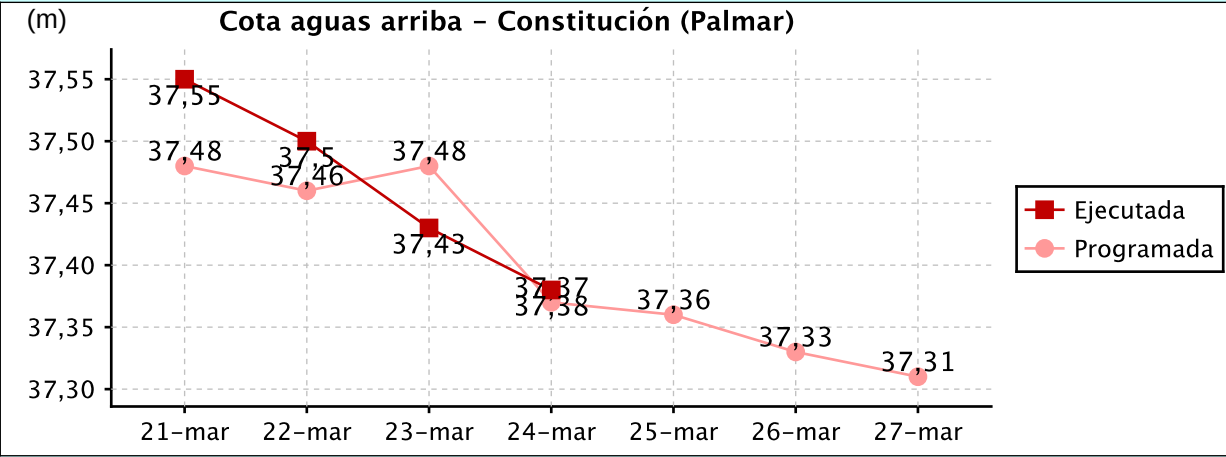
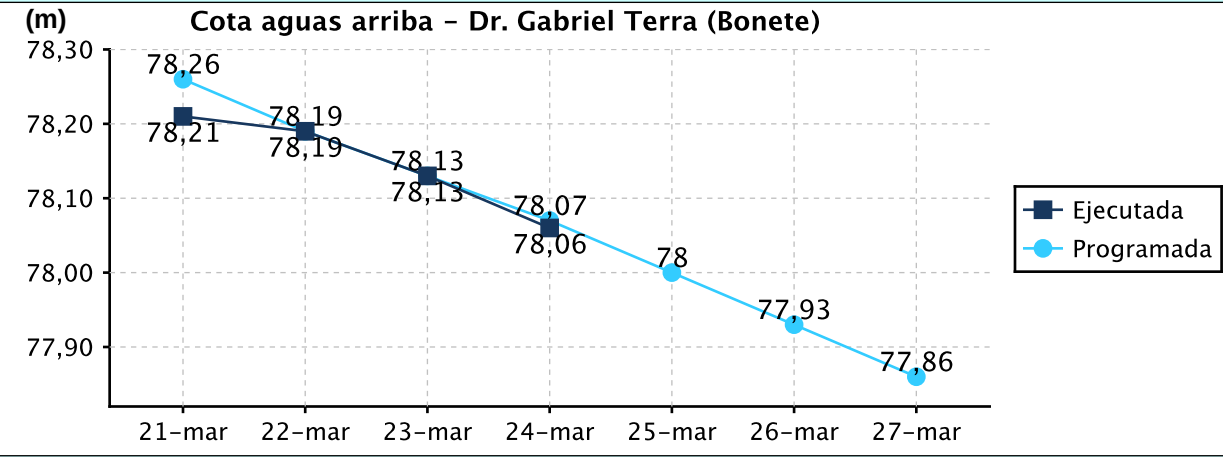


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,07	78,06
Baygorria	54,14	54,13
Palmar	37,37	37,38
SGU	34,18	34,17

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

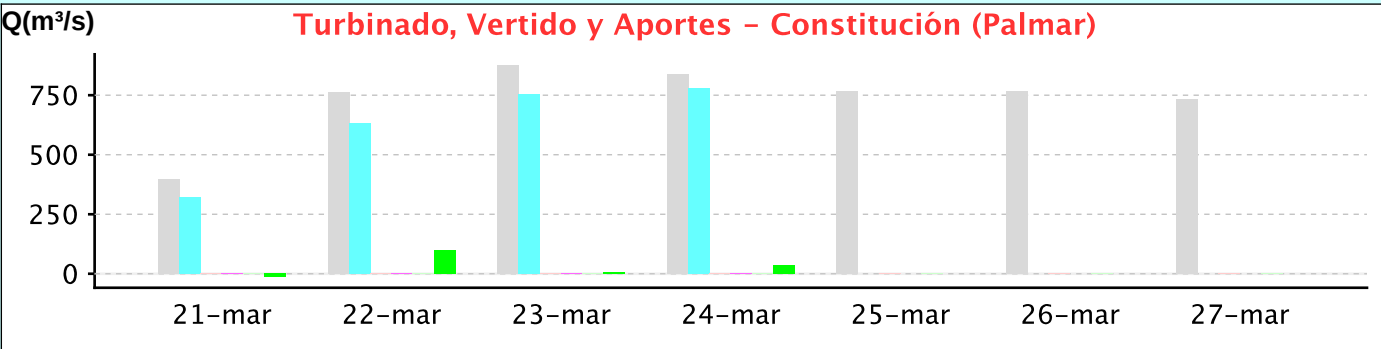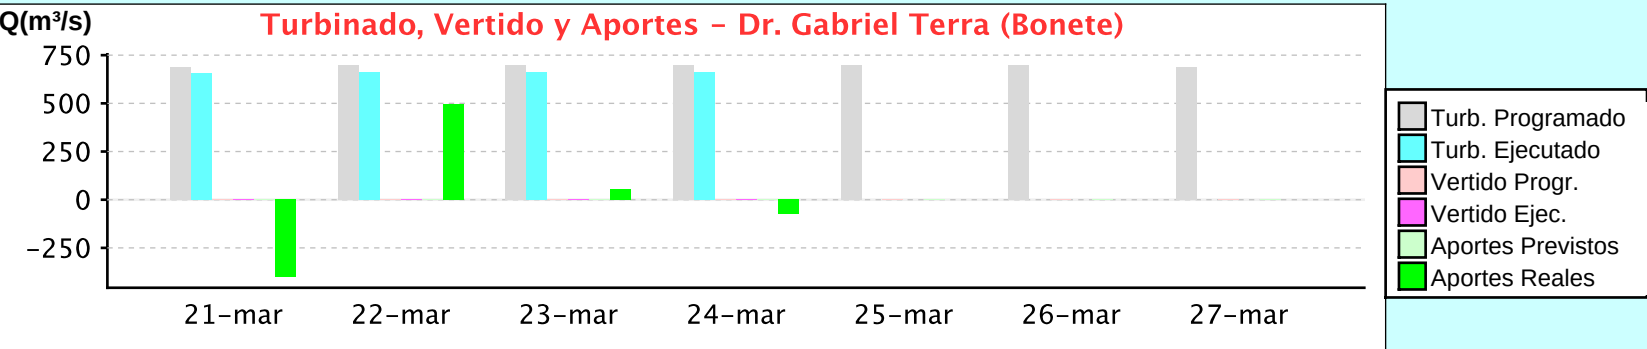

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

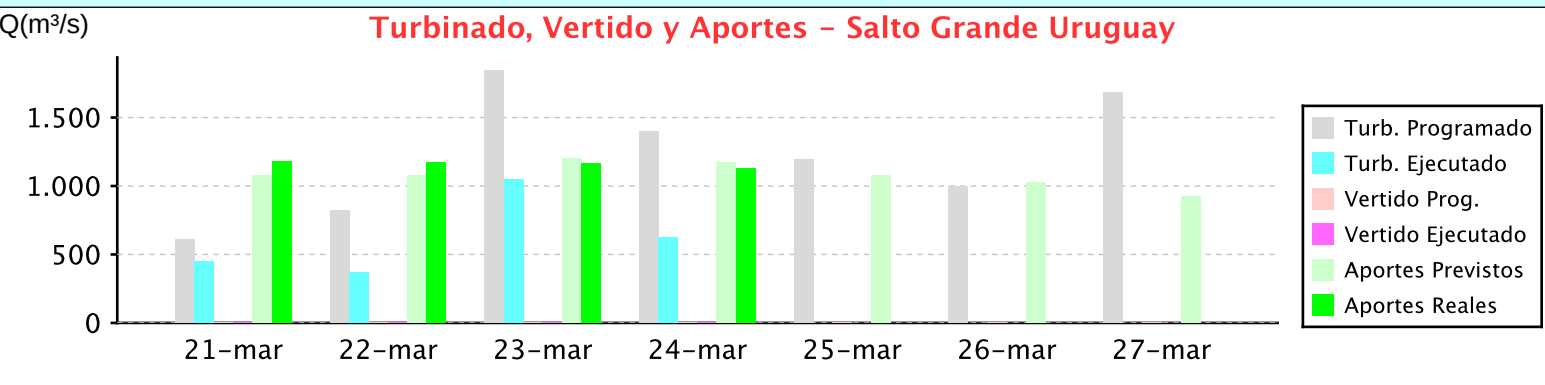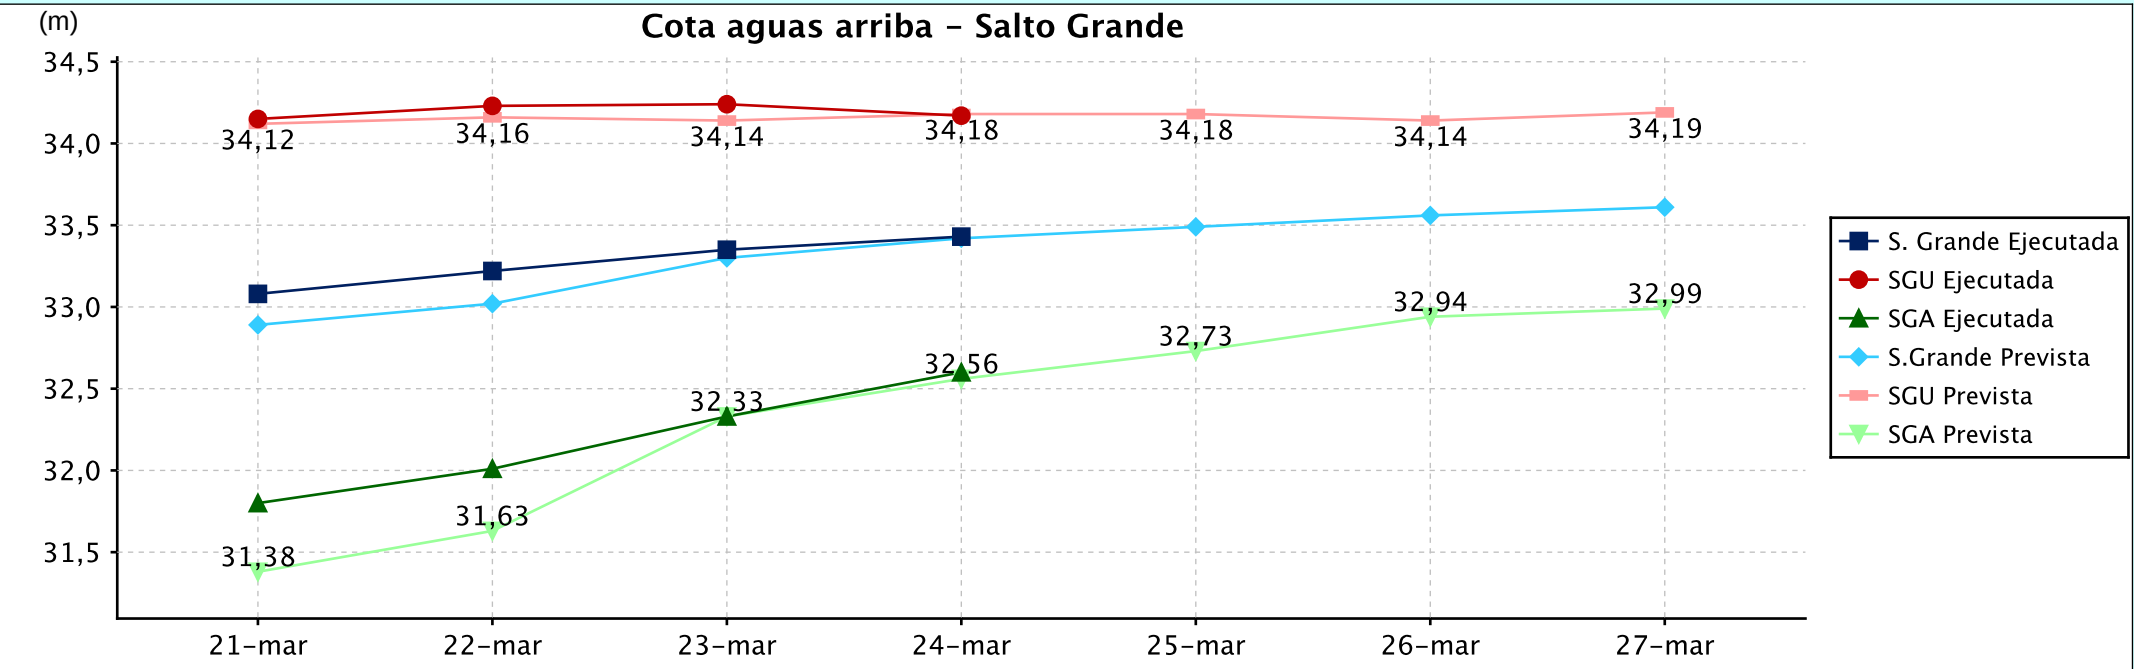

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,17
Cota Vista Arg	32,60
Cota real	33,43
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
29.851	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	699	663
Baygorria	663	609
Palmar	836	777
SGU	1.399	628

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-74
Baygorria	0	-31
Palmar	0	38
SGU	1.175	1.128

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
