




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 25 de marzo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.217
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	-0
Motores	1.221
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	5.903
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.078
C. Baygorria	2.234
C. Palmar	4.296
C. Salto Grande	7.650
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.548
TOTAL Generación	27.839

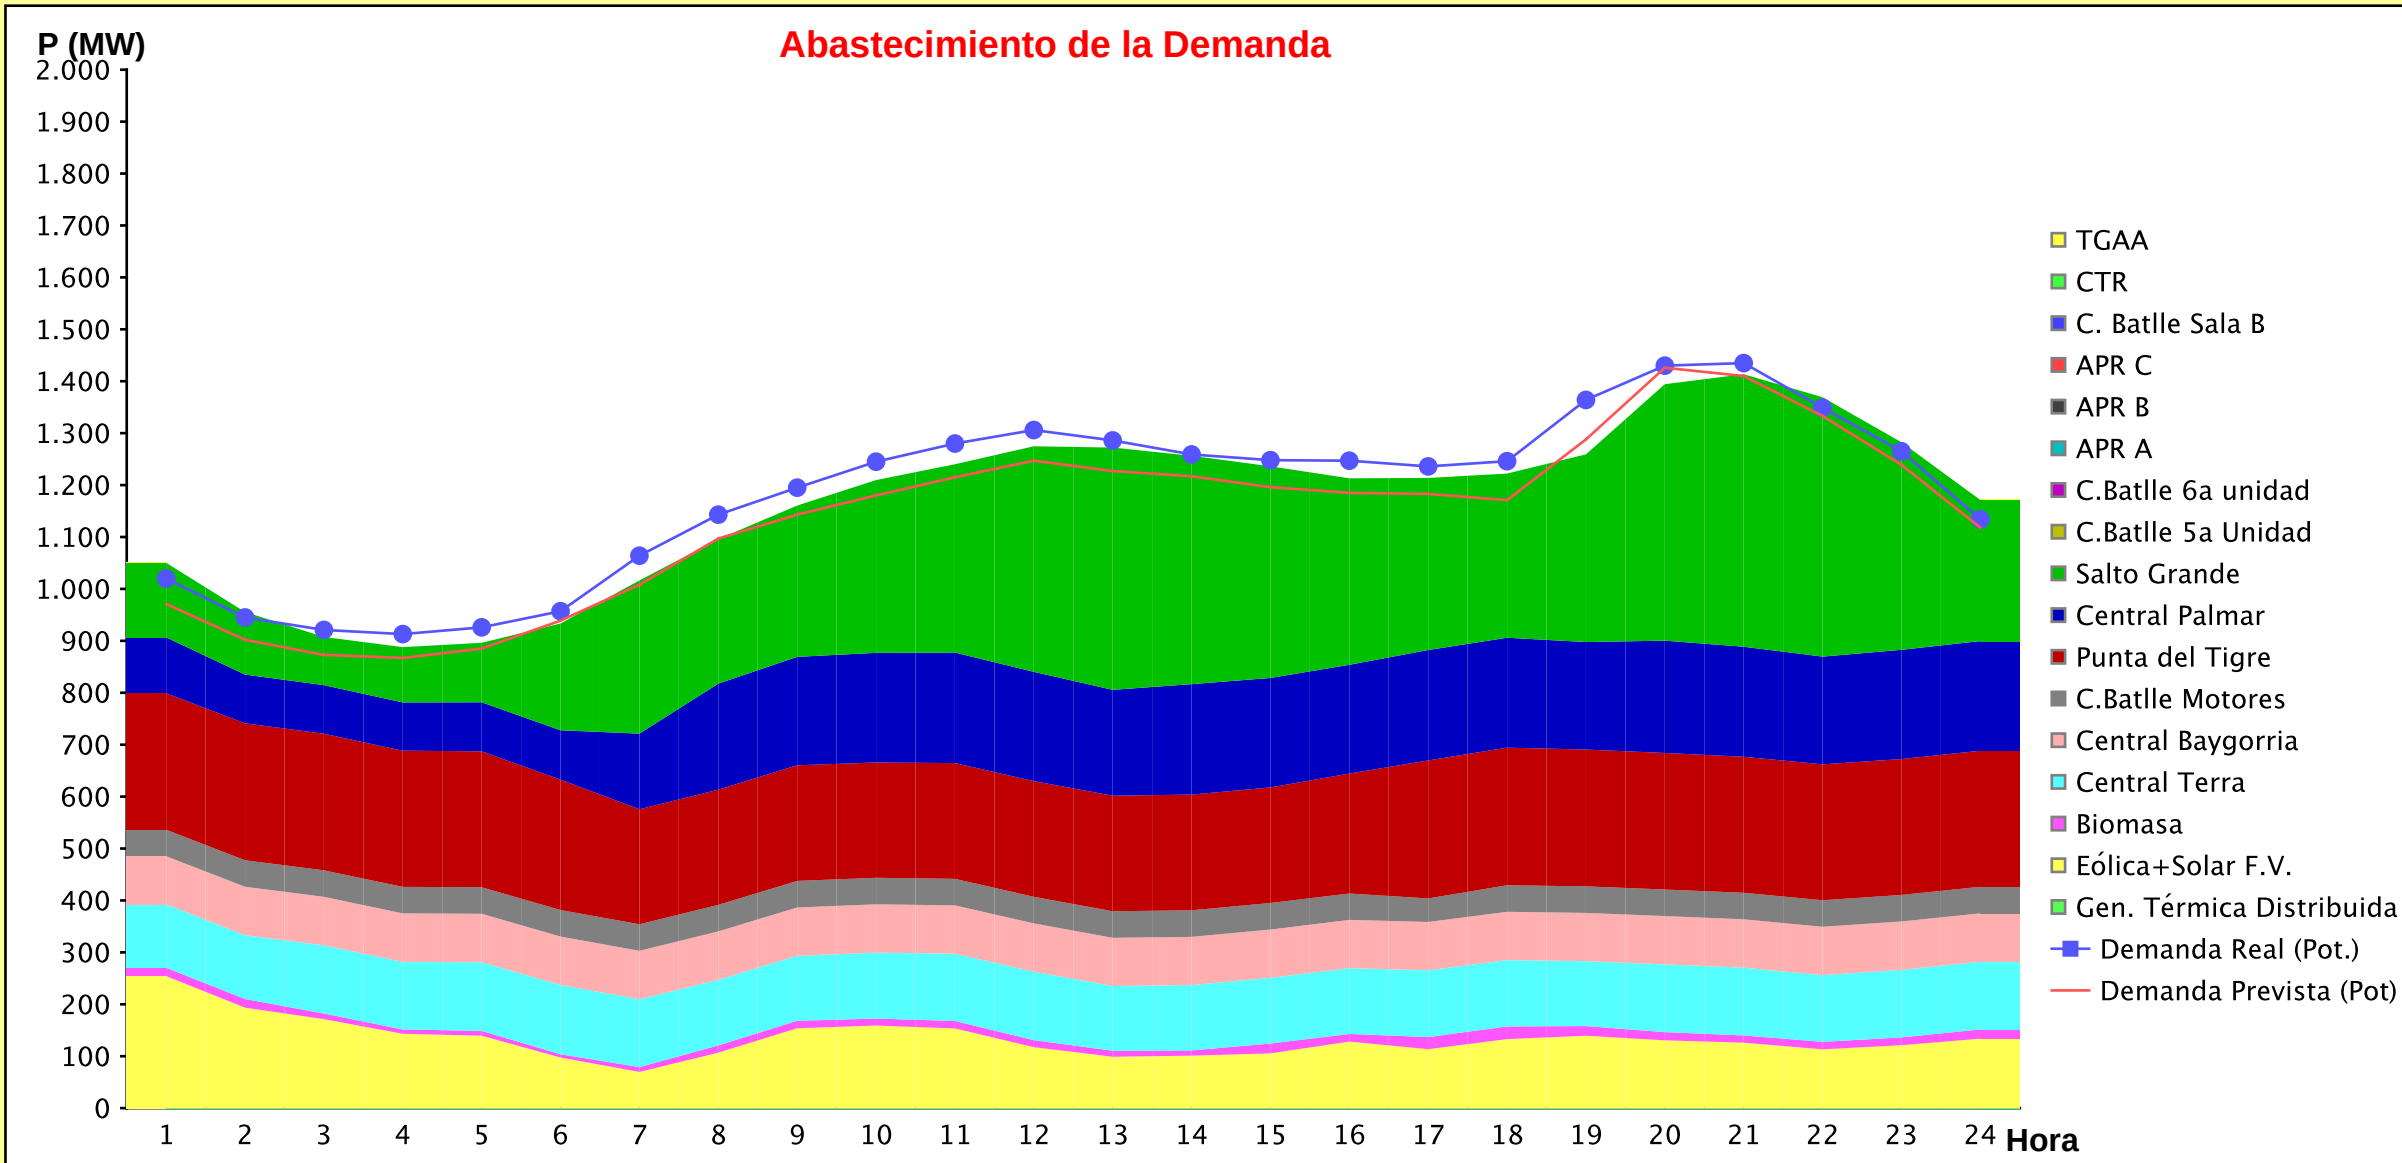

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.839
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.320
Diferencia (MWh)	519
Ejecutada - Programada	1,90 %

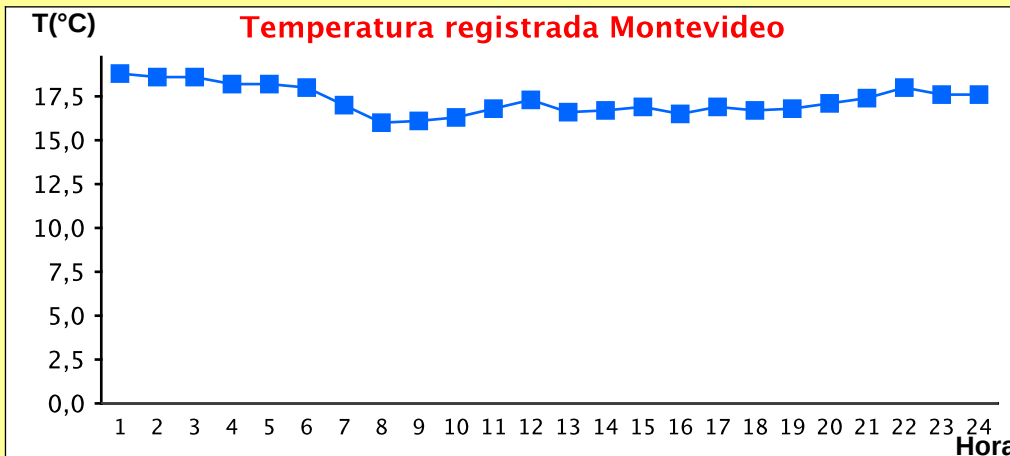



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1317,72 Hora 11:45
Potencia mínima:	899,97 Hora 03:50
Pico noche:	1440,36 Hora 20:36

Generación Media (MW)	
Eólica	134,4
Biomasa	29,4
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

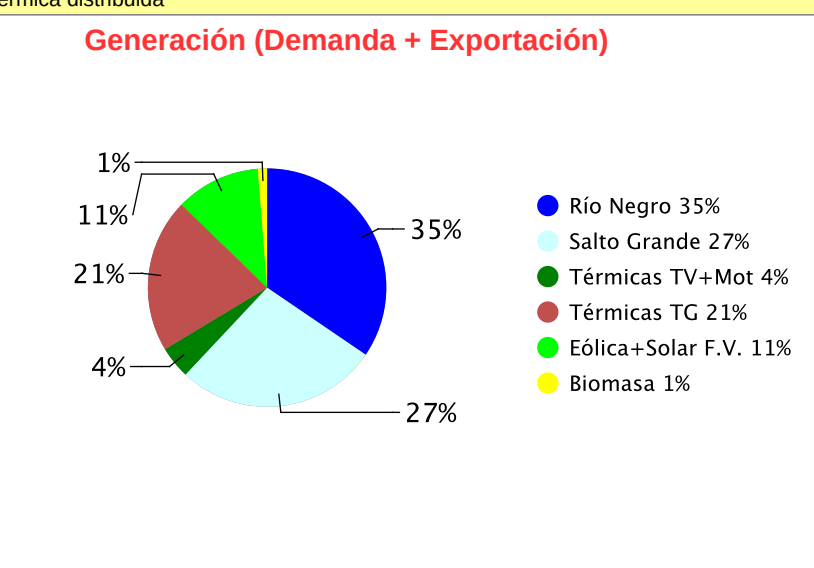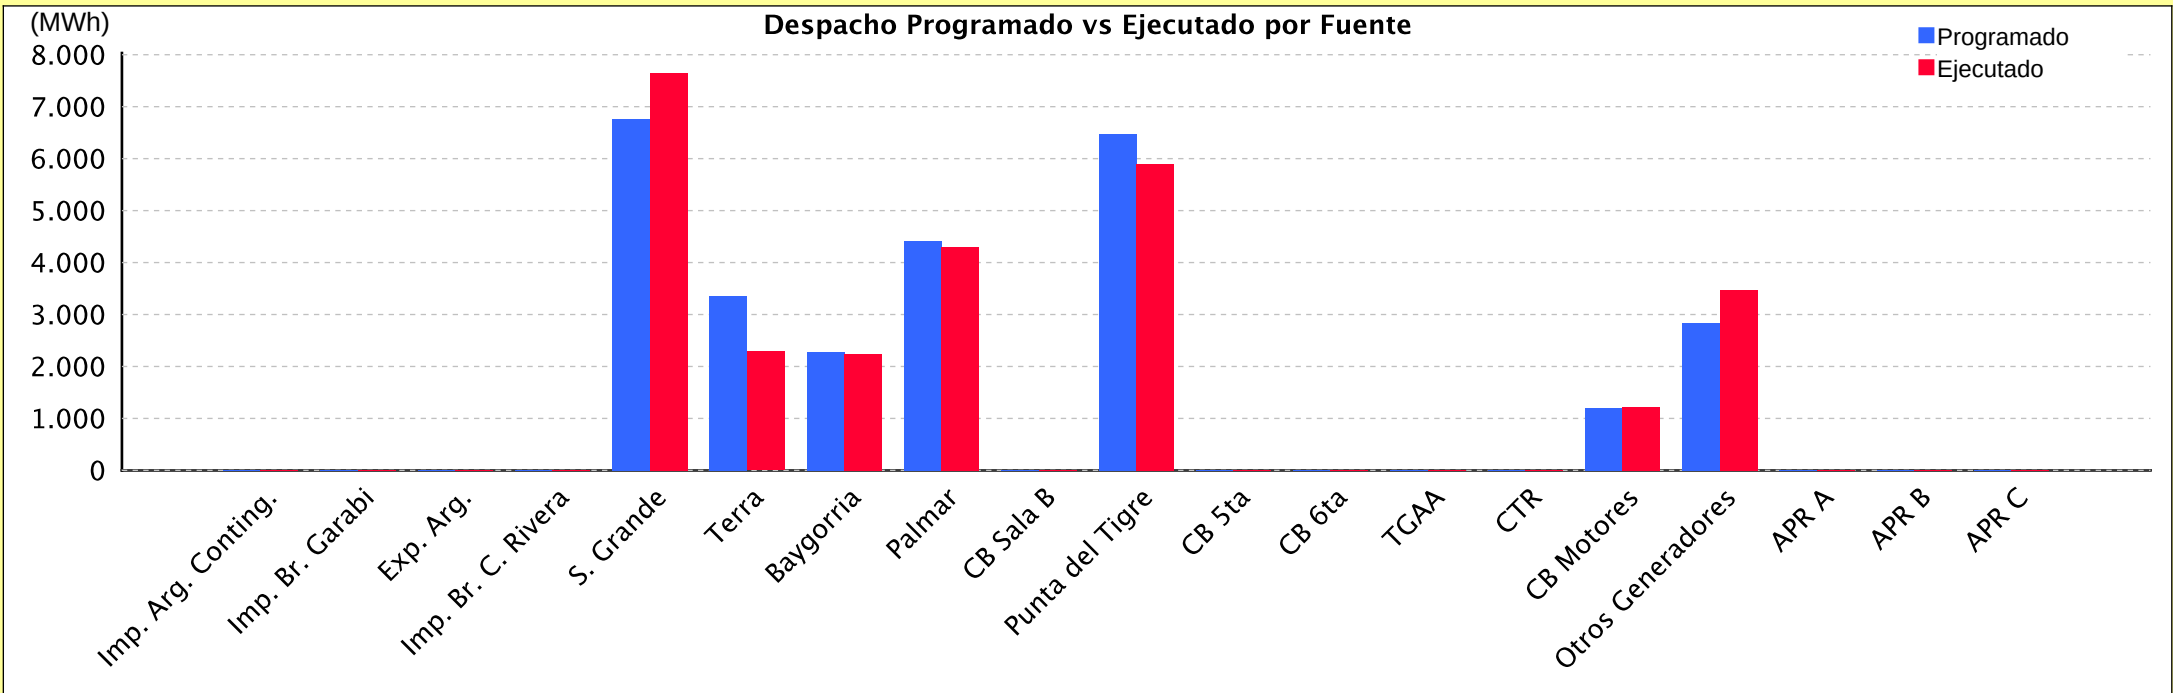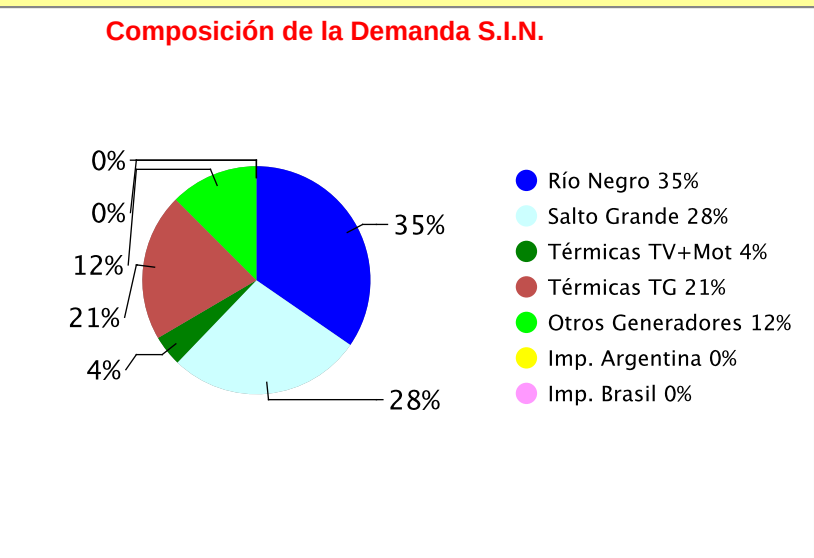



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

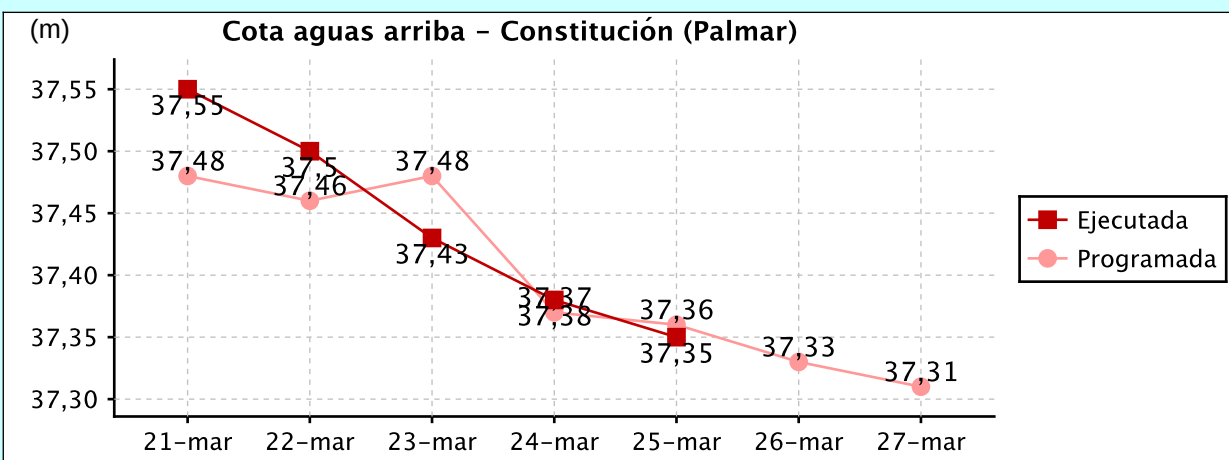
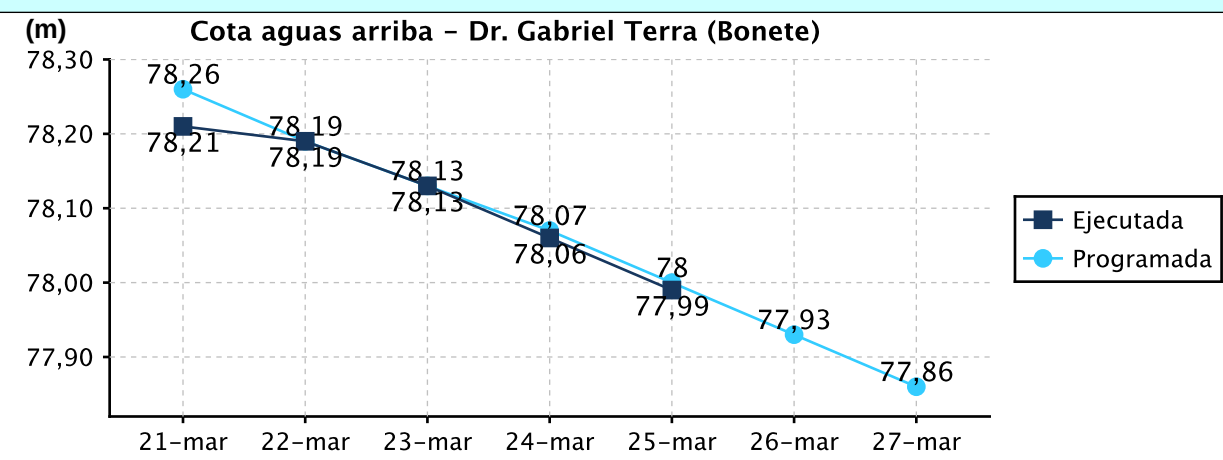


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,00	77,99
Baygorria	54,10	54,13
Palmar	37,36	37,35
SGU	34,18	34,07

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

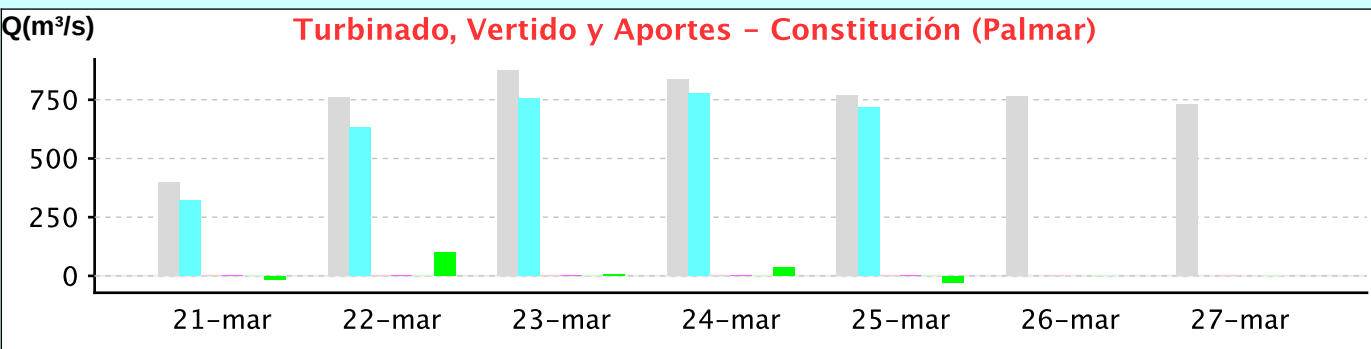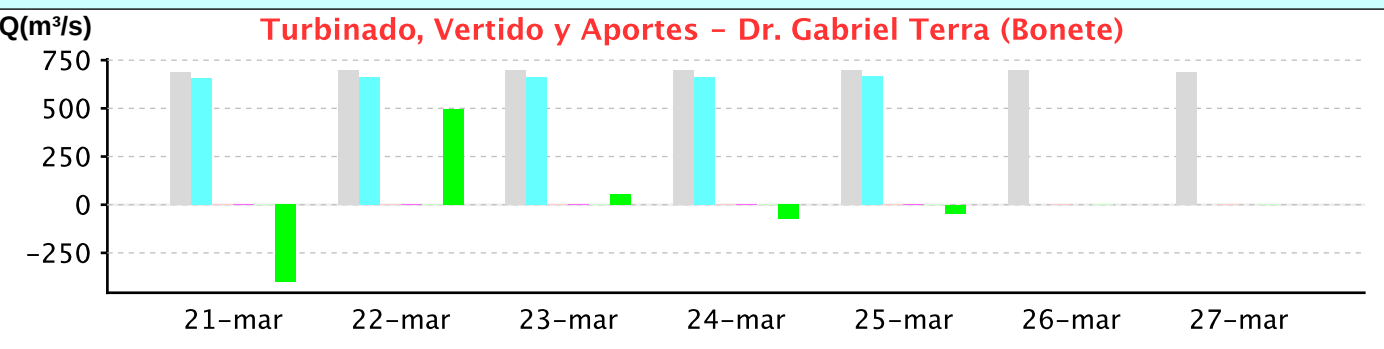

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

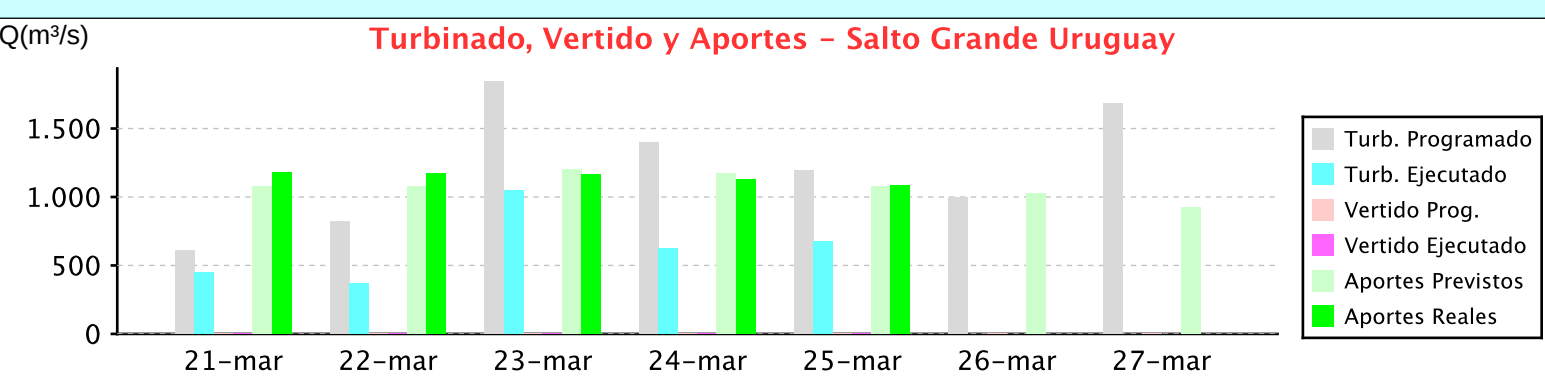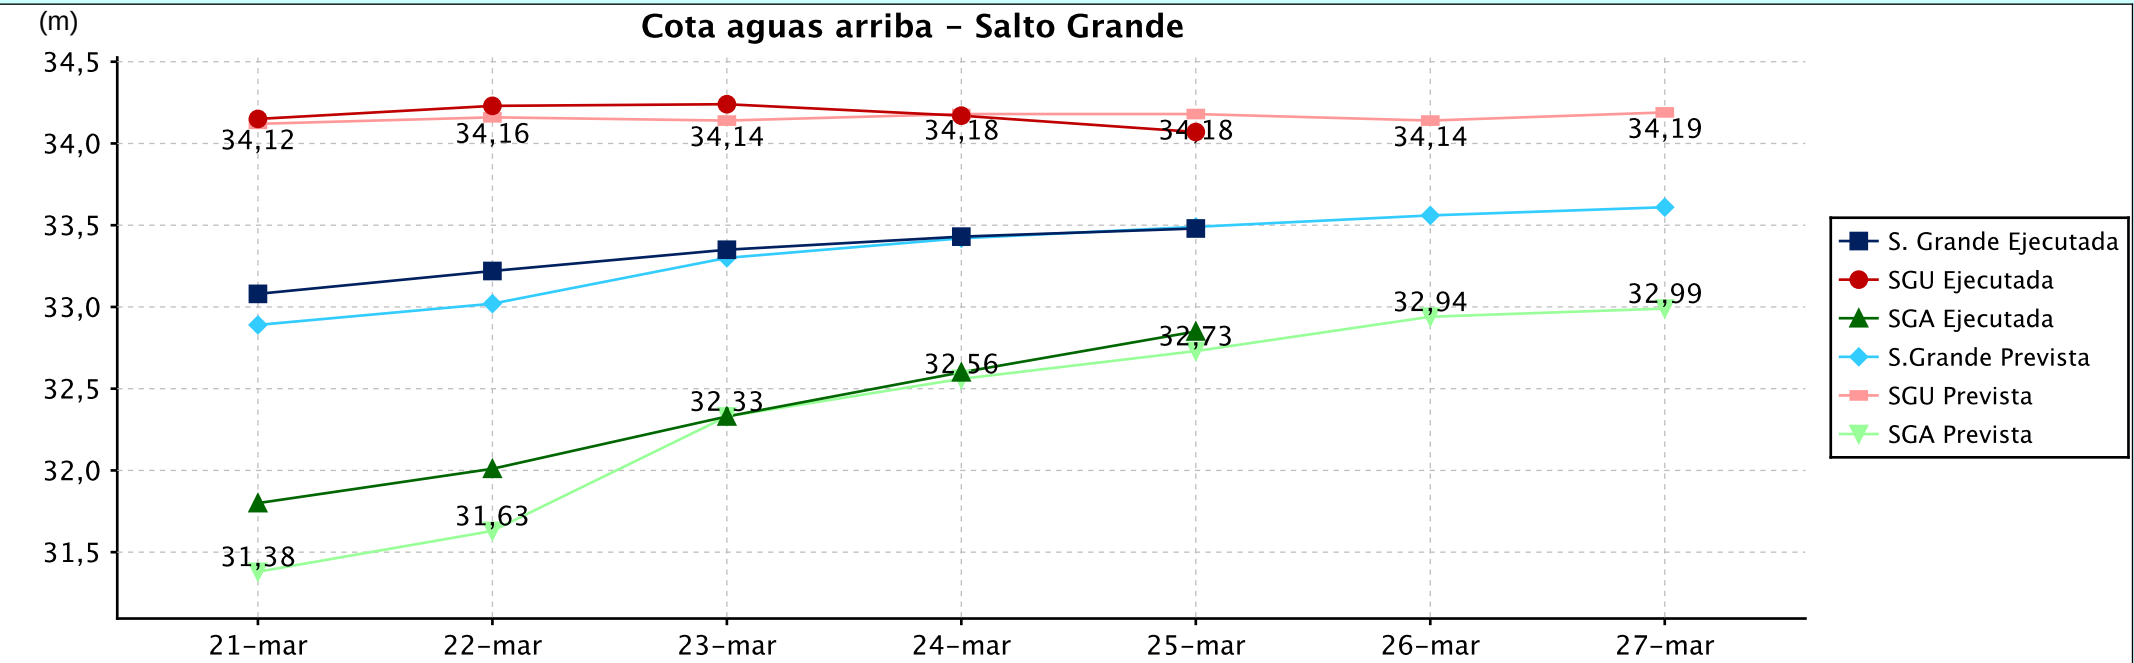

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,07
Cota Vista Arg	32,85
Cota real	33,48

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	23.352
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	699	667
Baygorria	732	672
Palmar	768	717
SGU	1.192	674

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-47
Baygorria	0	15
Palmar	0	-27
SGU	1.075	1.088

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
