




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 28 de marzo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	986
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	990
Central La Tablada	-98
Central P. del Tigre	6.366
APR A	35
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.042
C. Baygorria	2.243
C. Palmar	4.291
C. Salto Grande	6.197
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.286
TOTAL Generación	25.346

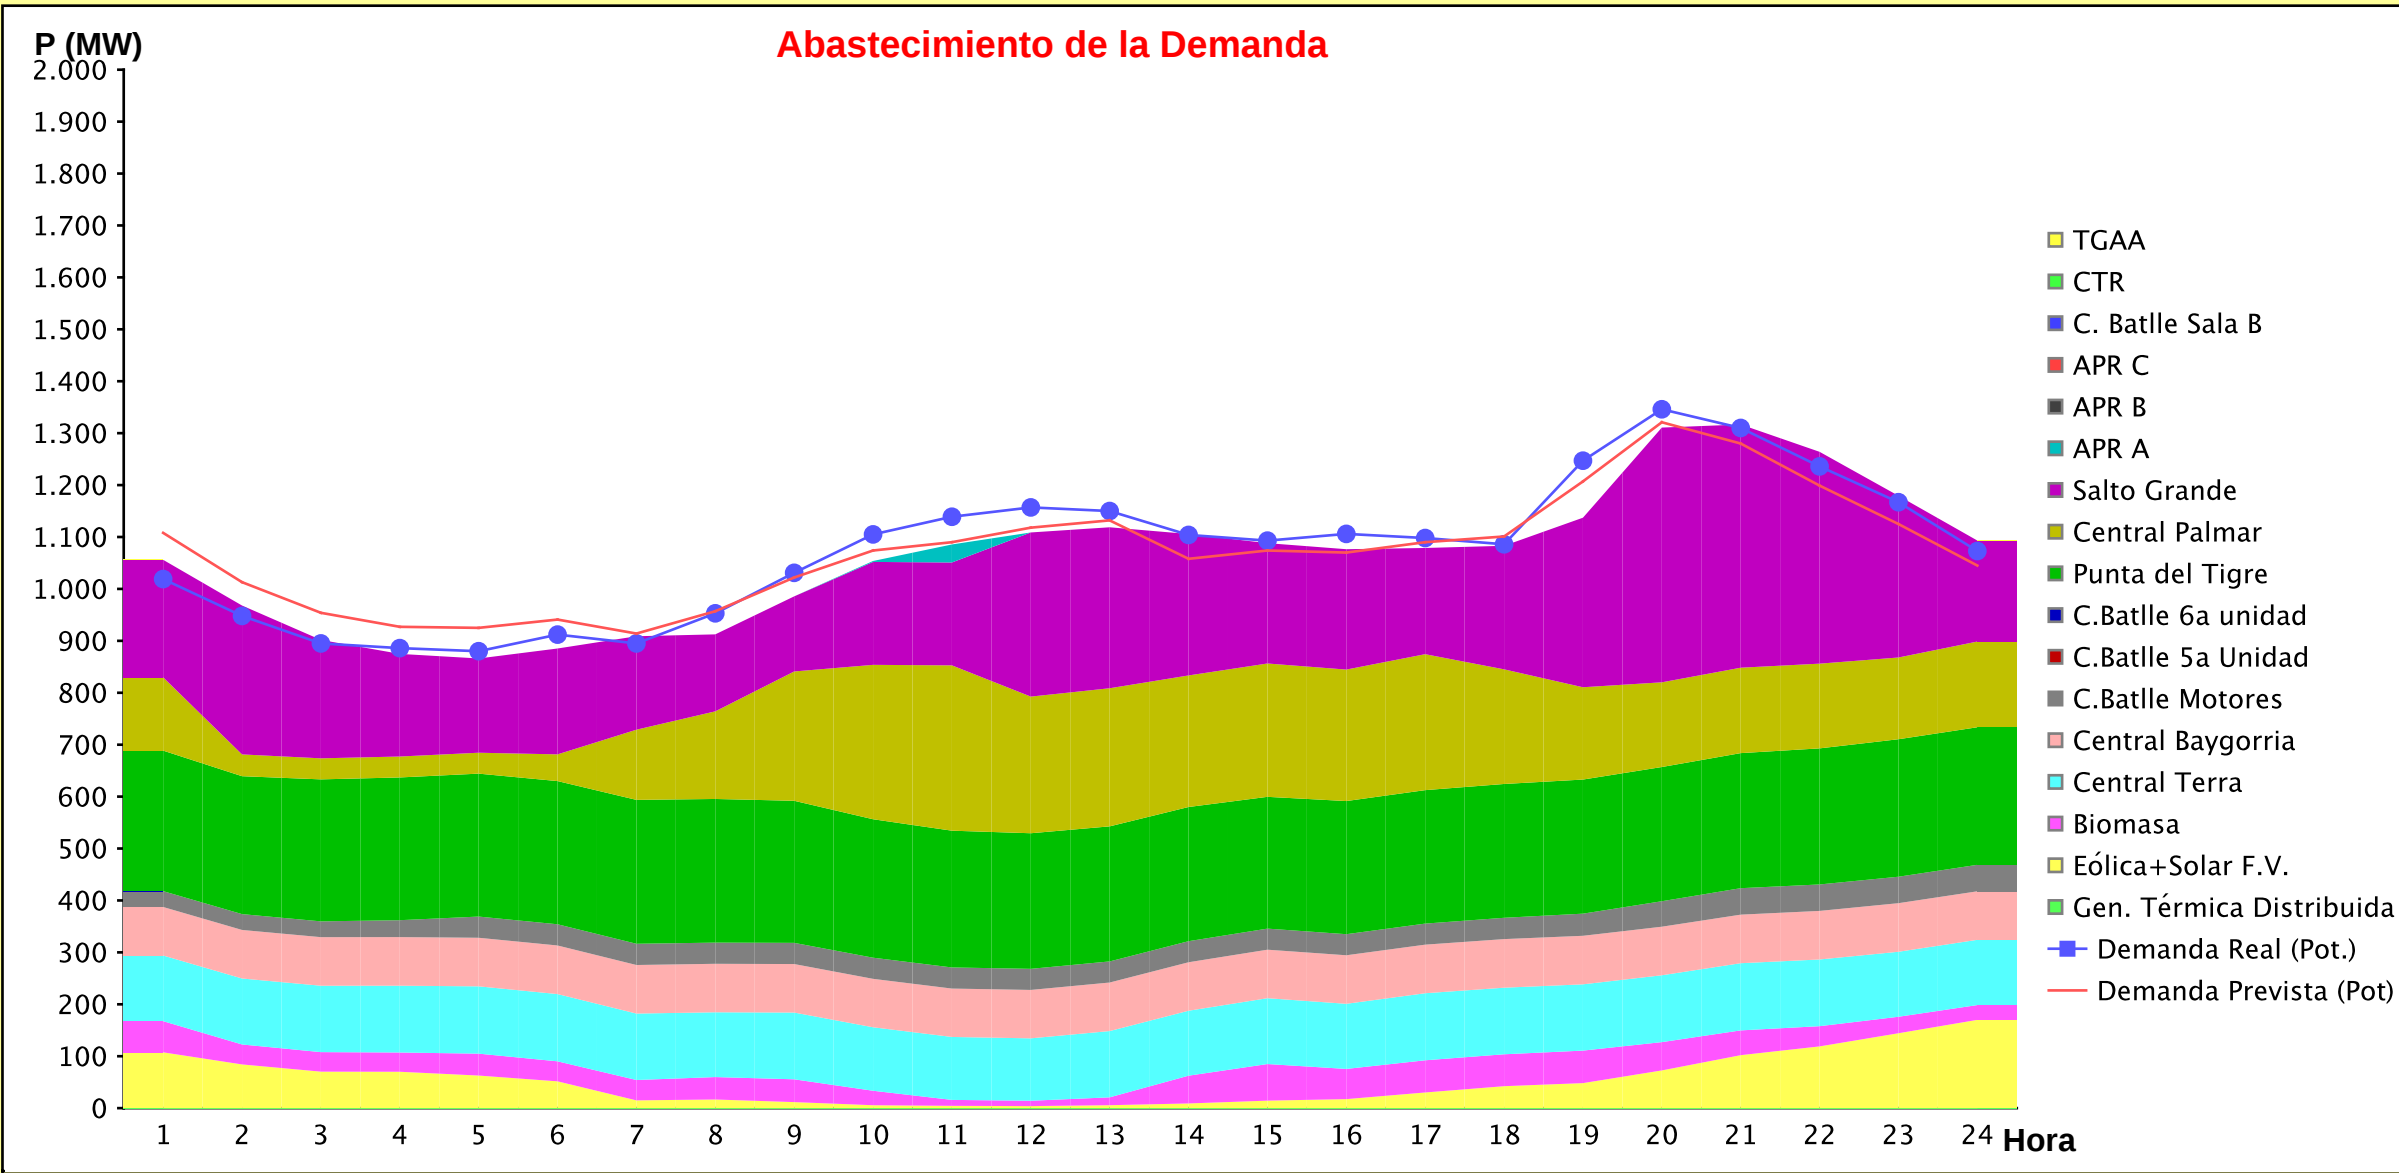

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.346
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.745
Diferencia (MWh)	-399
Ejecutada - Programada	-1,55 %

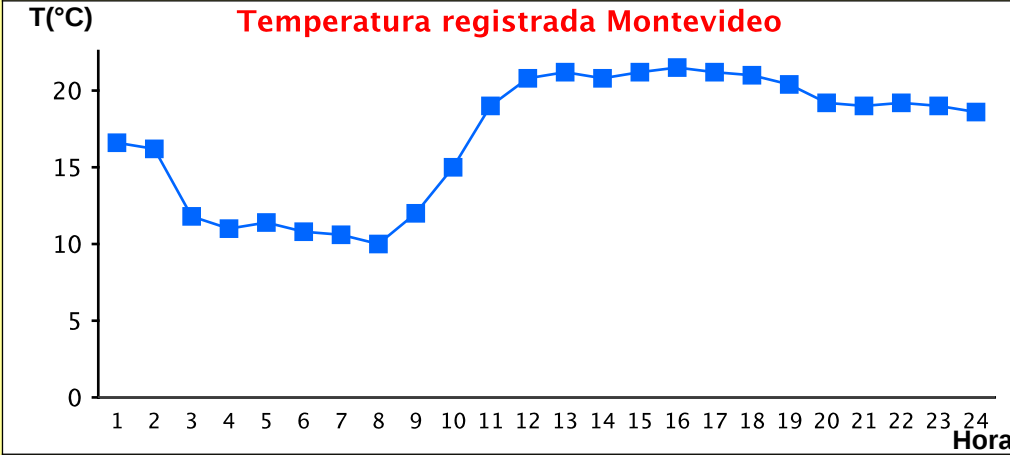


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1162,17 Hora 12:52
Potencia mínima:	866,39 Hora 04:52
Pico noche:	1341,38 Hora 19:54

Generación Media (MW)	
Eólica	54,4
Biomasa	48,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

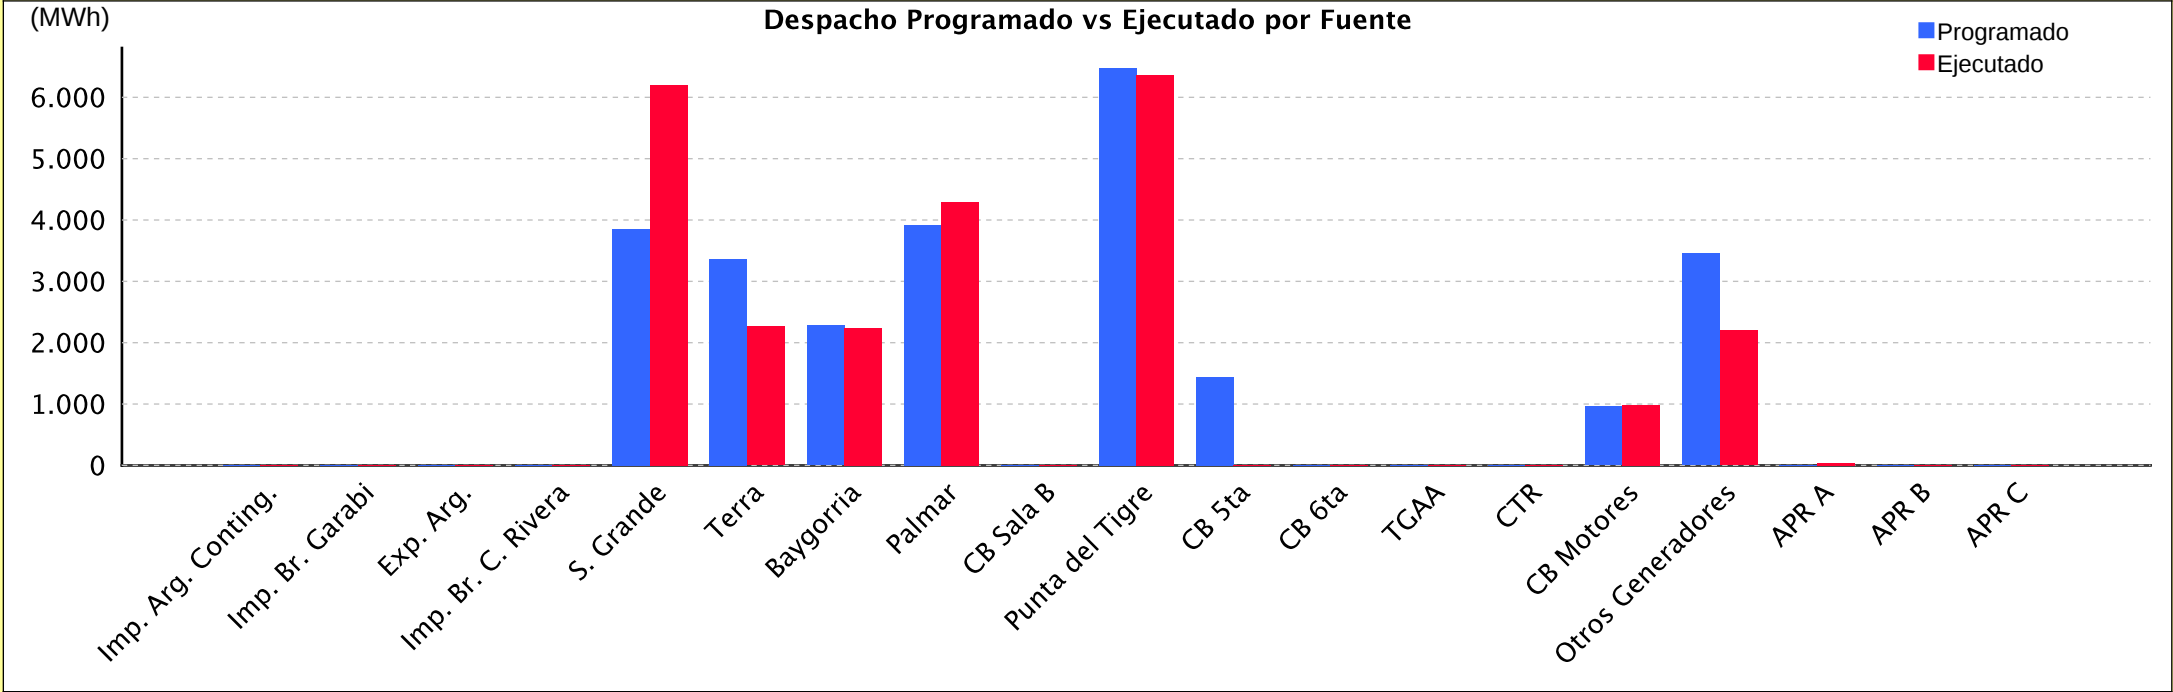
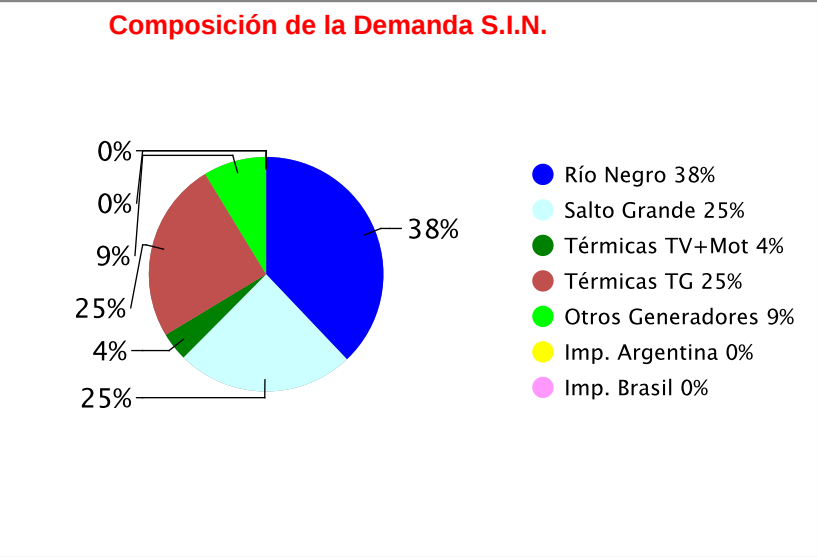


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

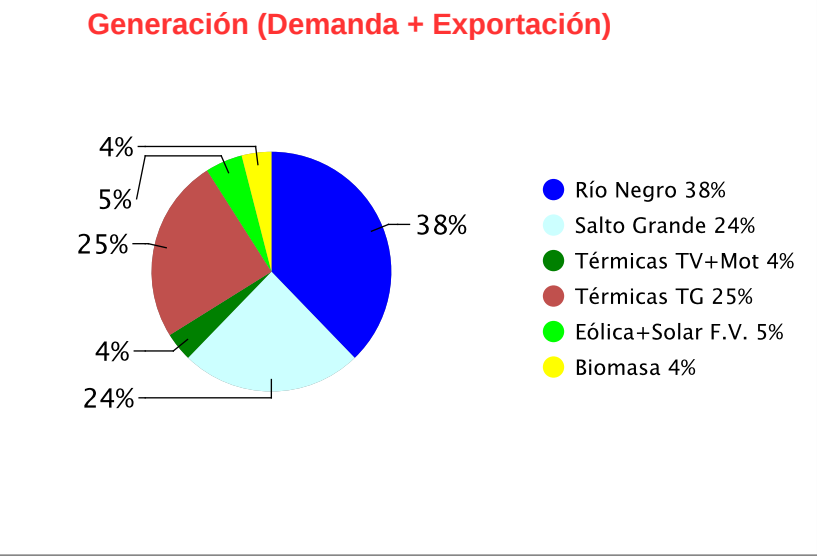



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

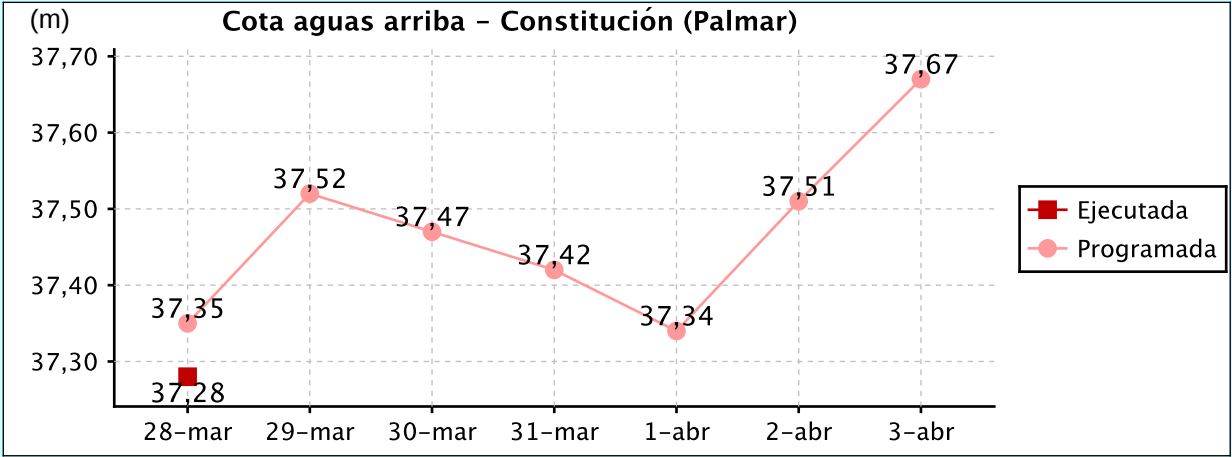
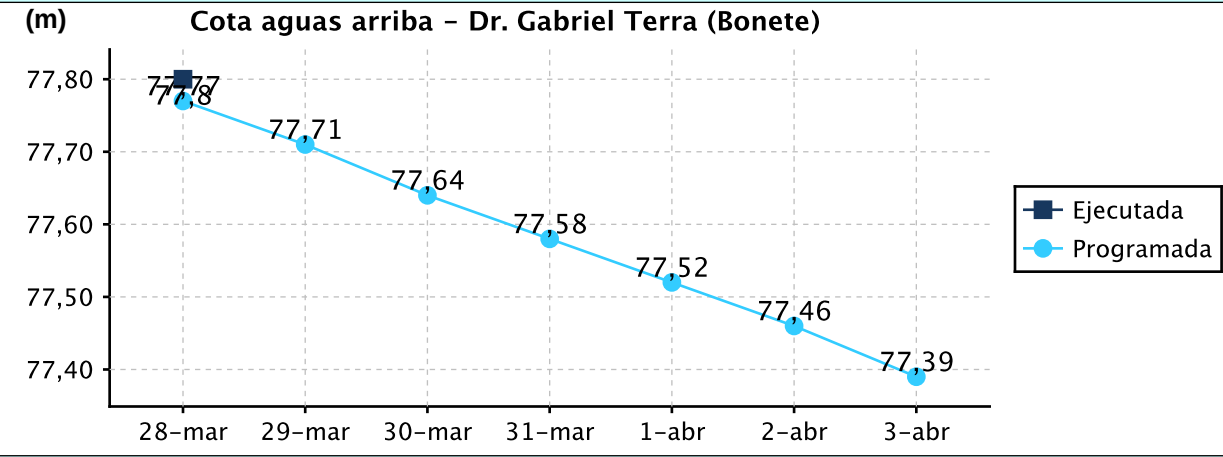


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,77	77,8
Baygorria	54,11	54,11
Palmar	37,35	37,28
SGU	34,25	34,06

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

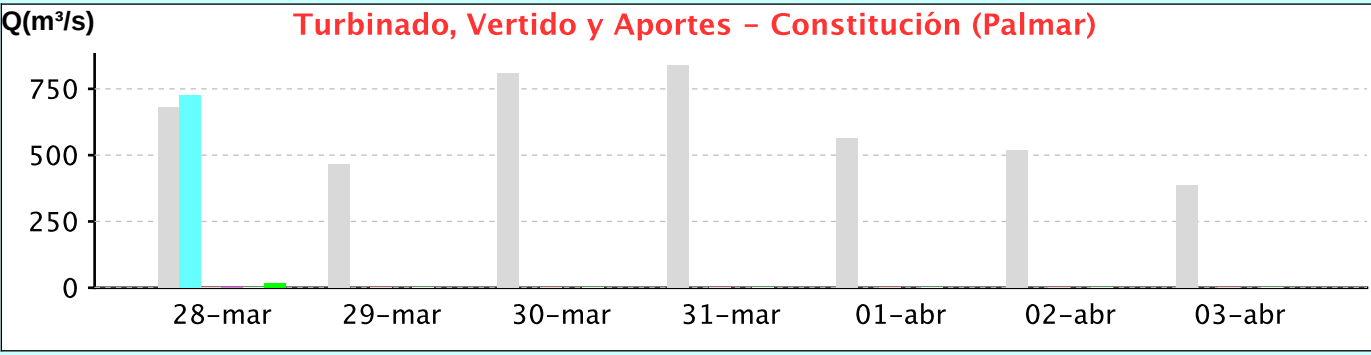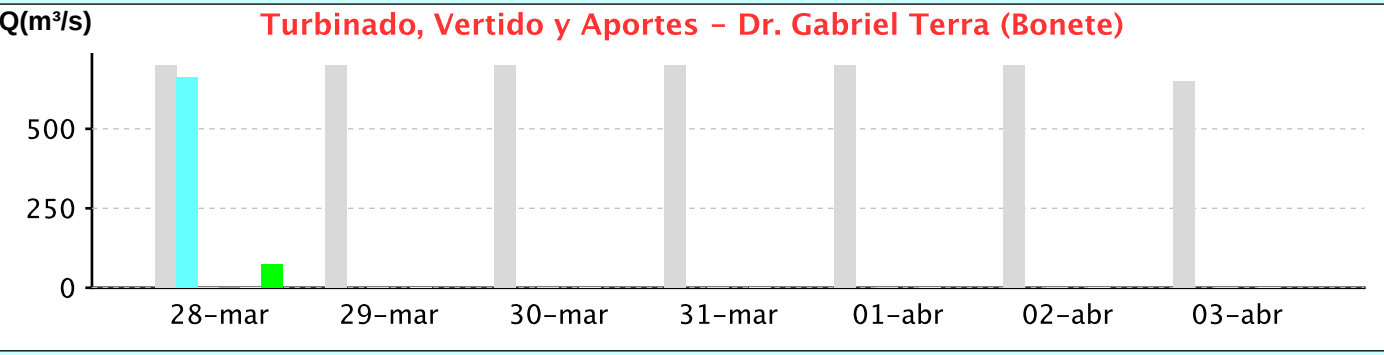

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

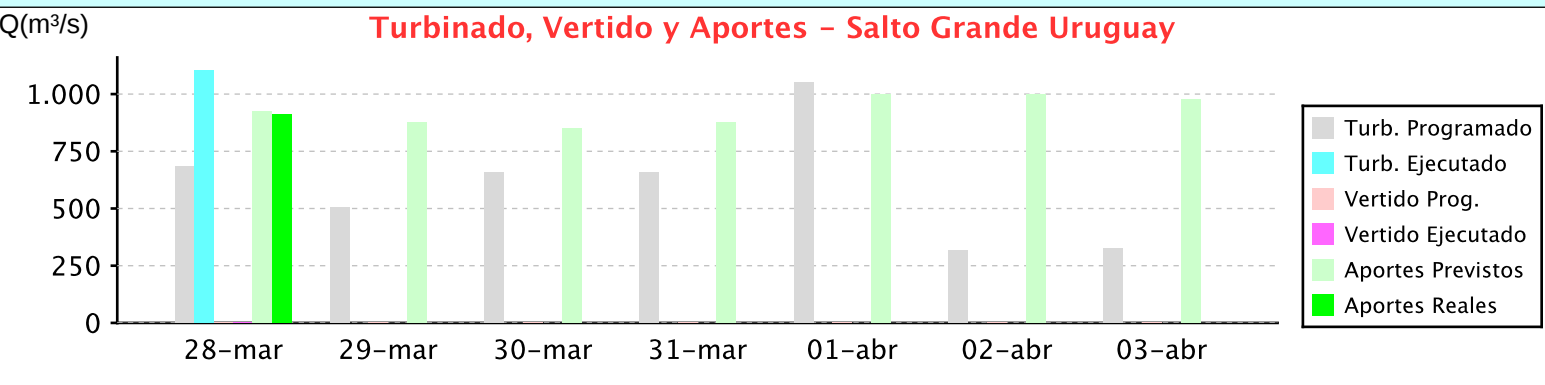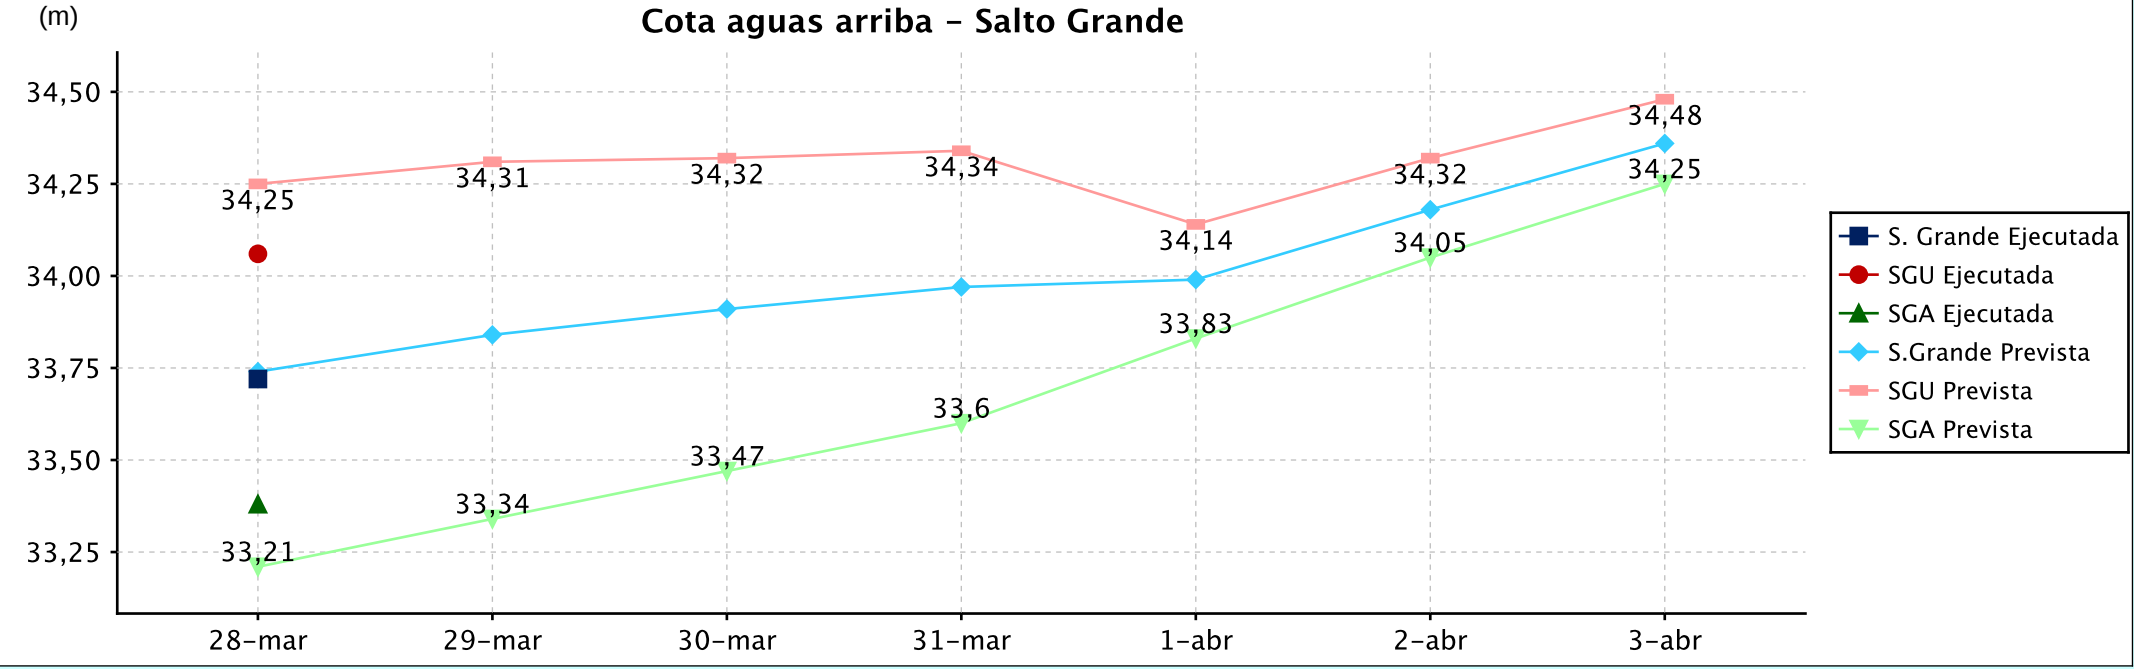

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,06
Cota Vista Arg	33,38
Cota real	33,72

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	13.380
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	699	661
Baygorria	732	670
Palmar	682	726
SGU	682	1.105

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	73
Baygorria	0	-3
Palmar	0	17
SGU	925	910

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
