




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 02 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.278
Sala B	-4
5ta.	157
6ta.	194
Motores	931
Central La Tablada	-93
Central P. del Tigre	5.054
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.115
C. Baygorria	2.105
C. Palmar	3.481
C. Salto Grande	3.922
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.378
TOTAL Generación	25.236

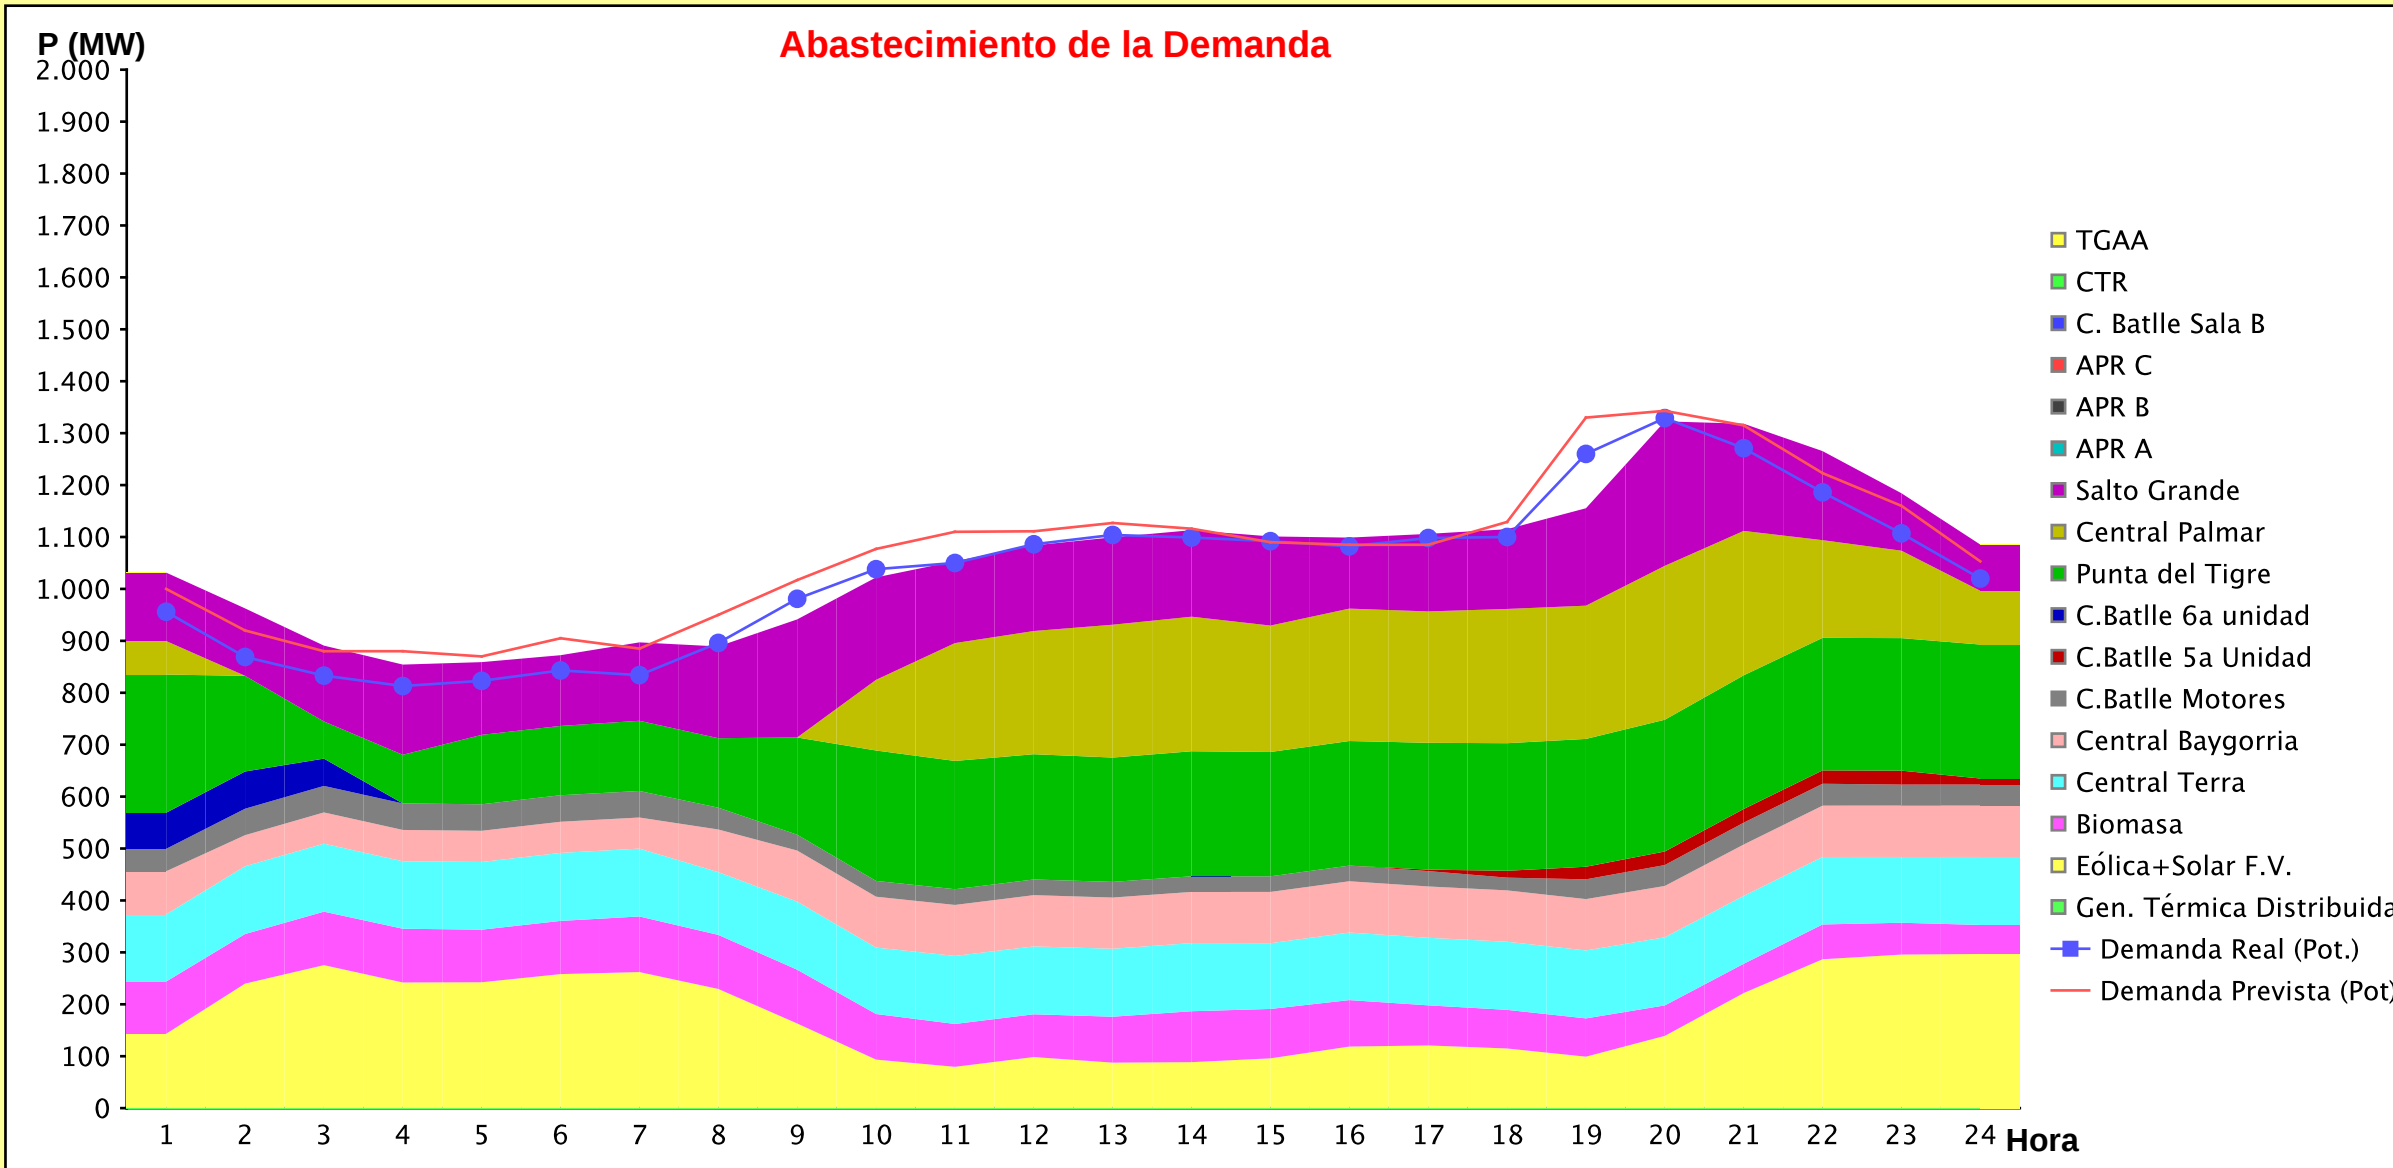

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.236
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.661
Diferencia (MWh)	-425
Ejecutada - Programada	-1,66 %


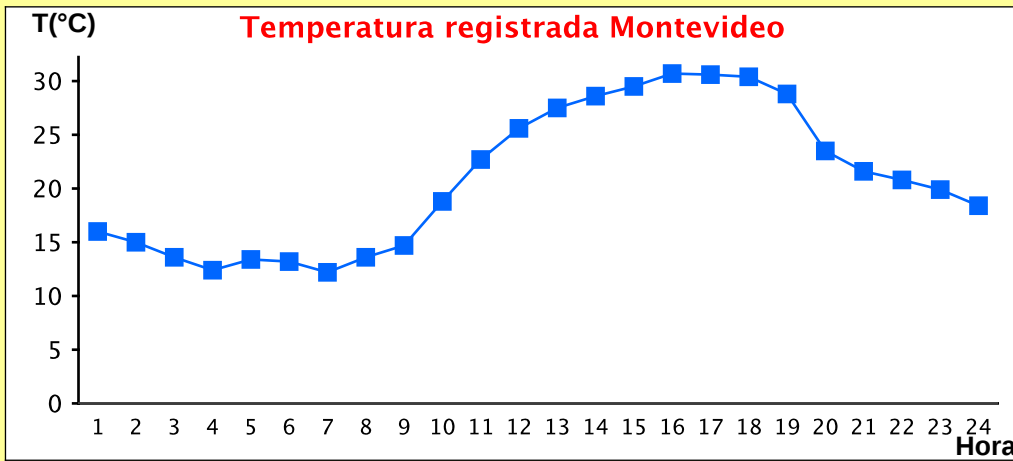


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1111,51 Hora 13:18
Potencia mínima:	796,51 Hora 04:05
Pico noche:	1333,63 Hora 19:39

Generación Media (MW)	
Eólica	179,2
Biomasa	86,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


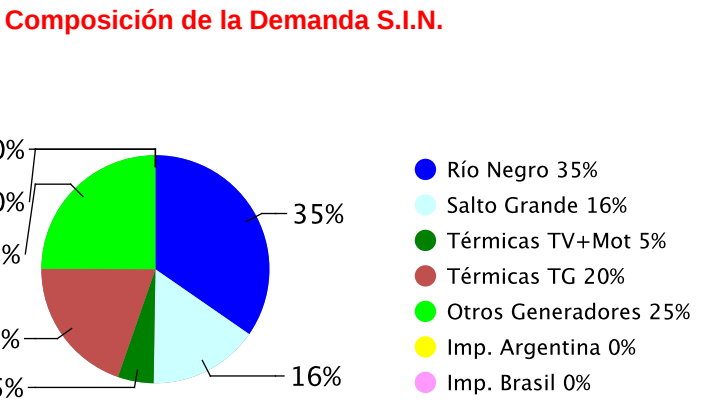


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

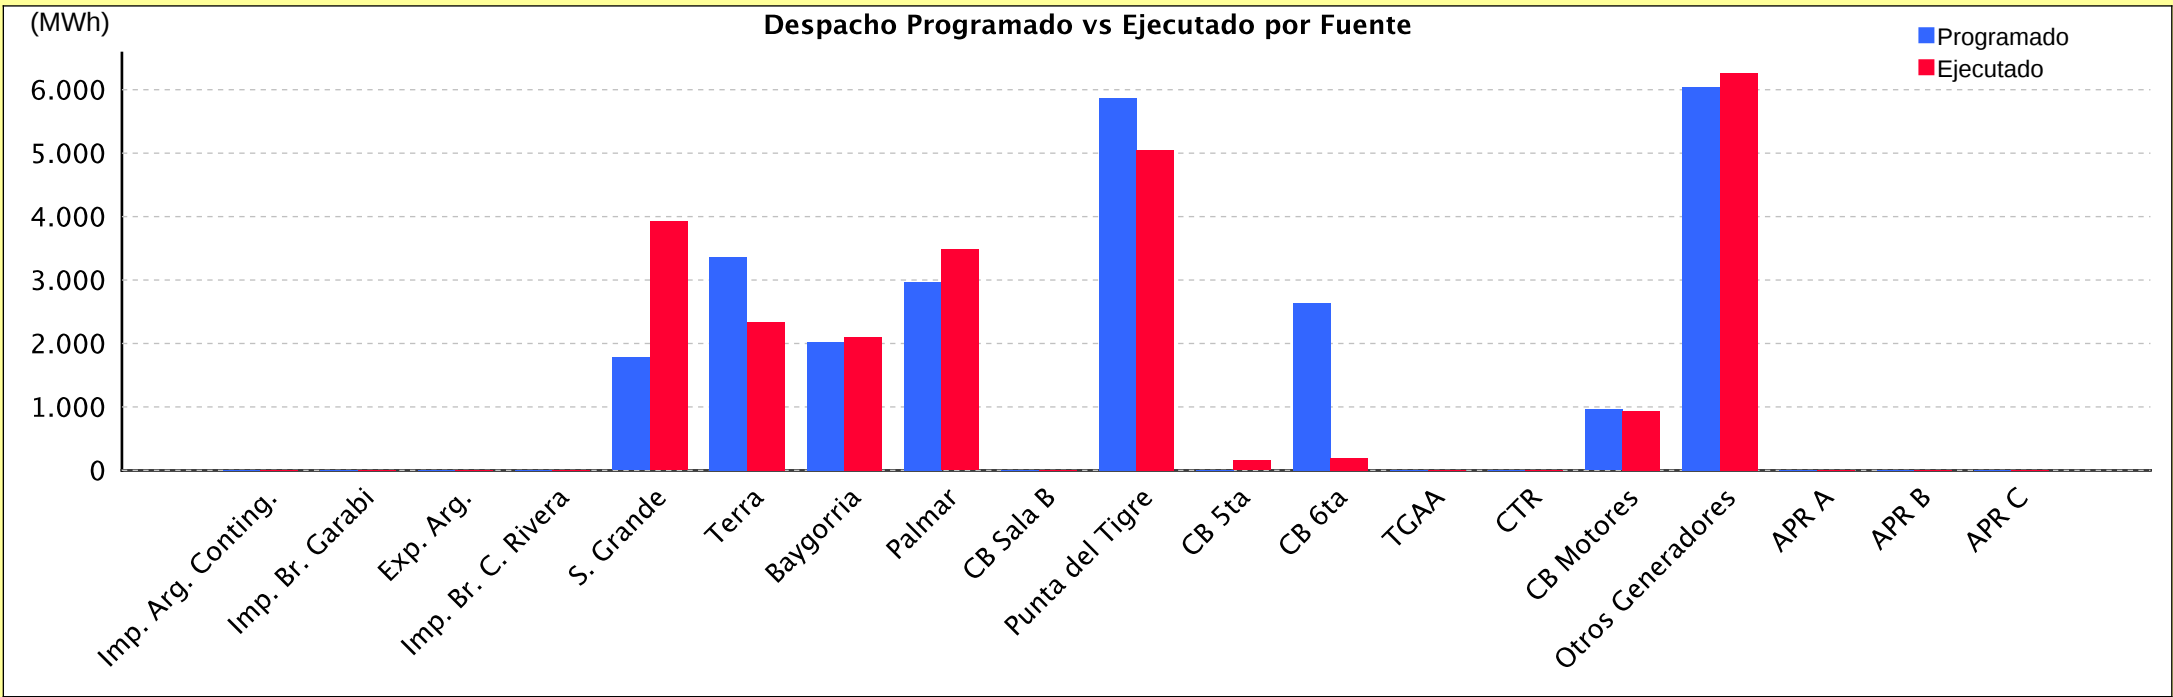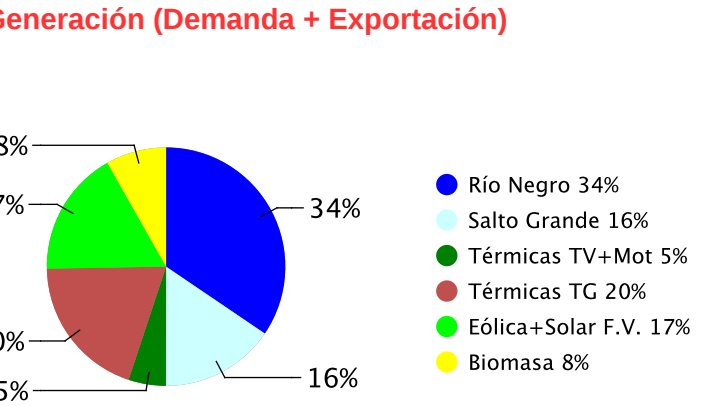



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

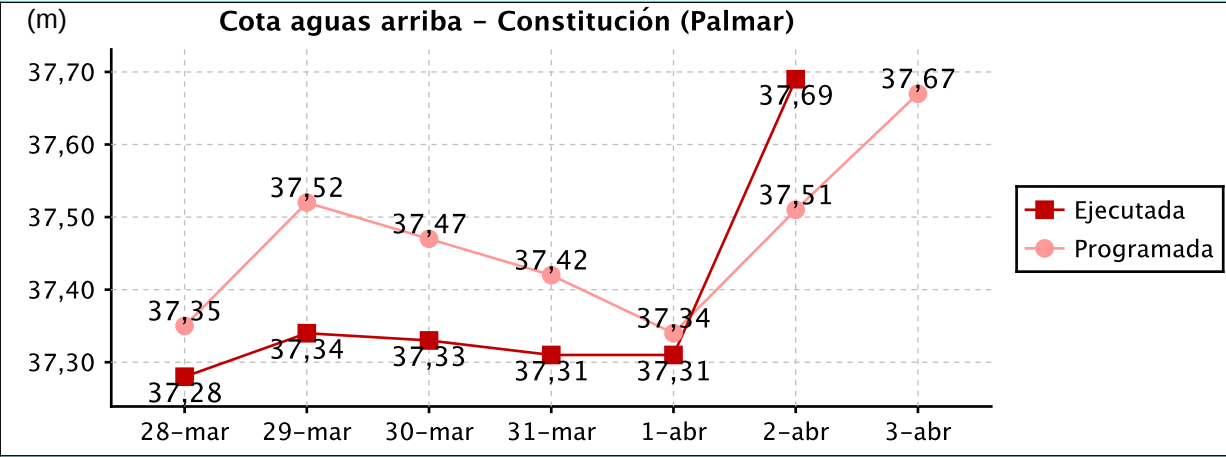
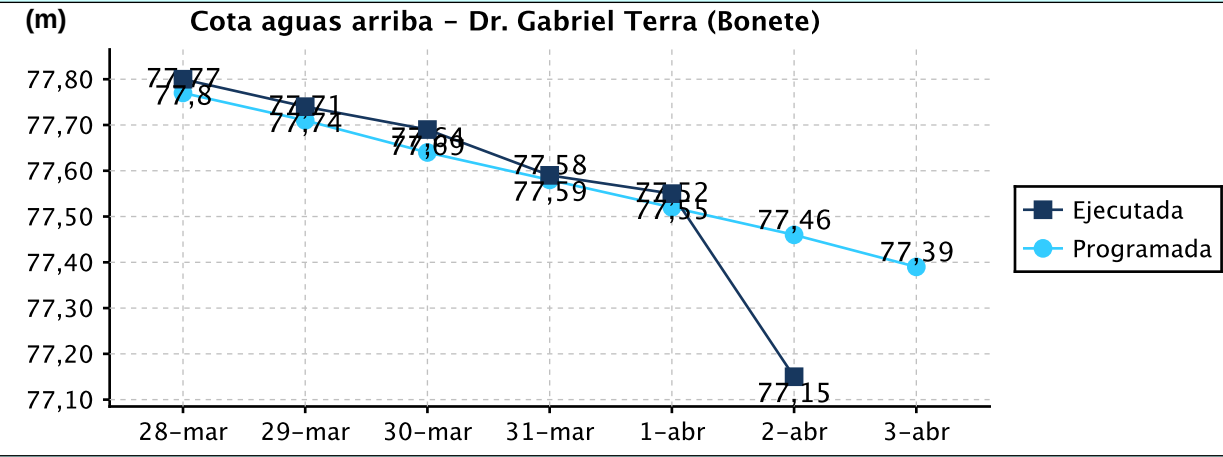


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,46	77,15
Baygorria	54,17	54,29
Palmar	37,51	37,69
SGU	34,32	34,32

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

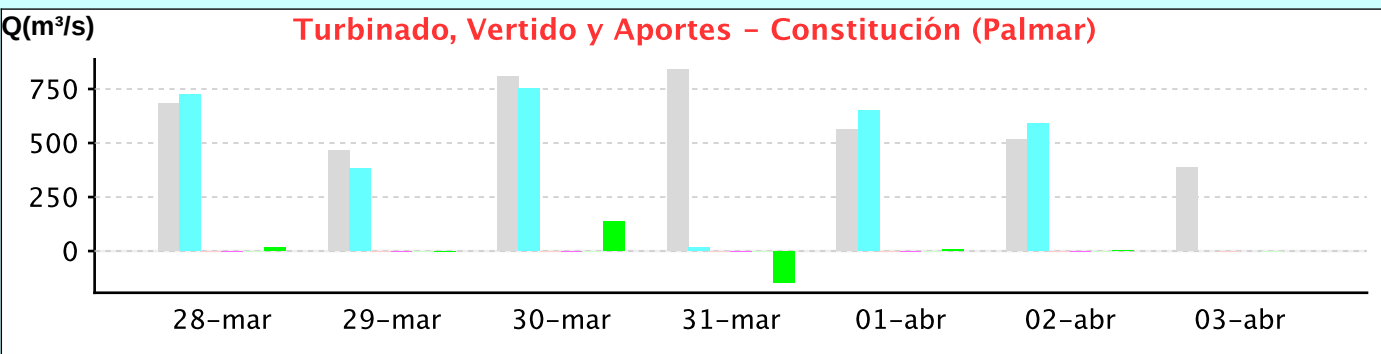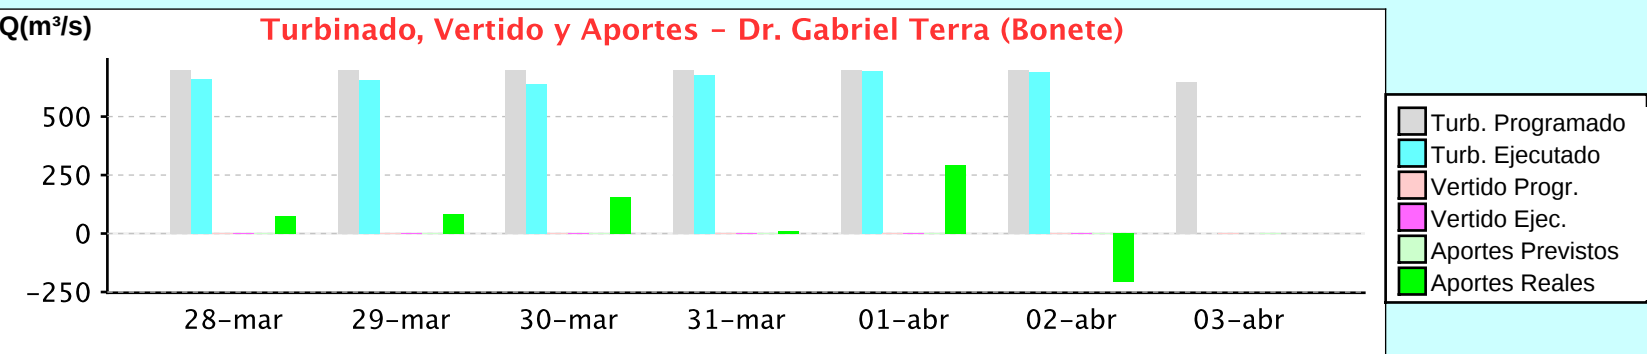

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

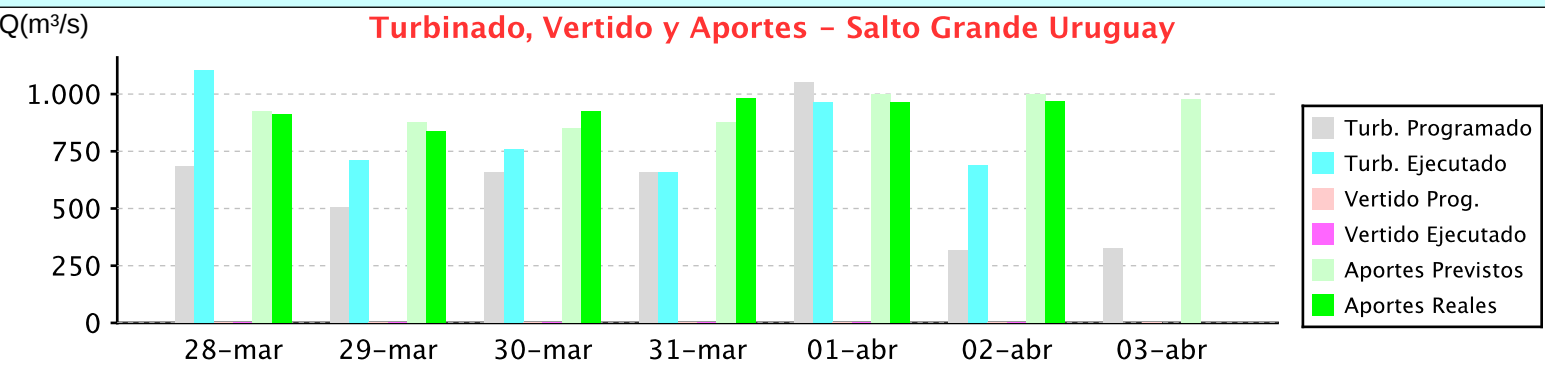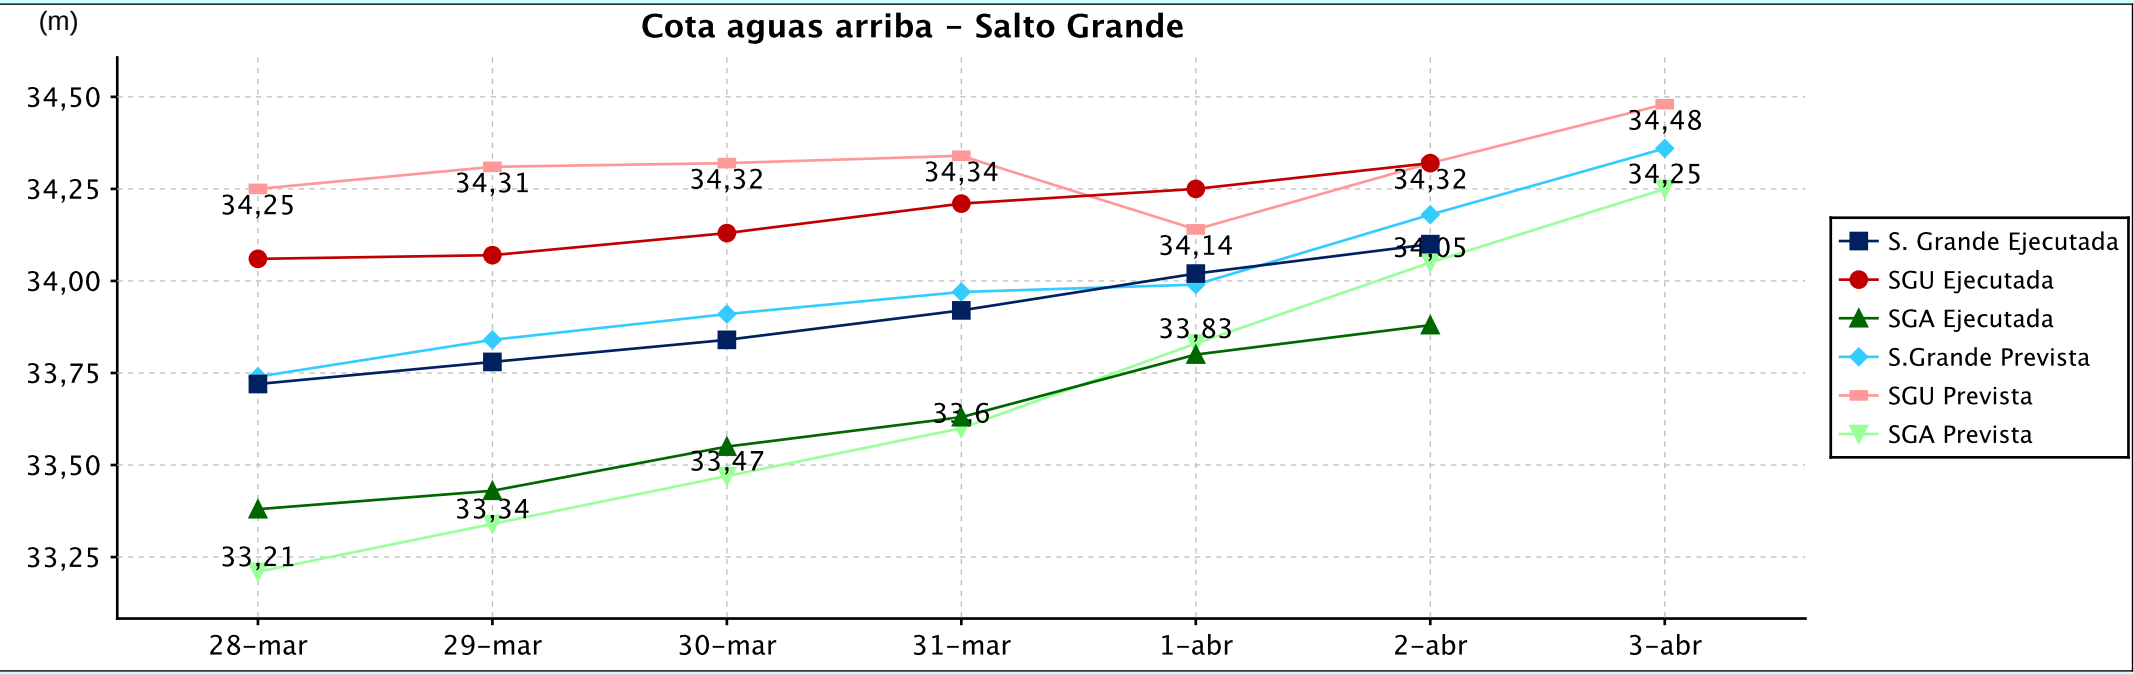

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,32
Cota Vista Arg	33,88
Cota real	34,10
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
9.300	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	699	690
Baygorria	651	625
Palmar	518	589
SGU	318	690

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-208
Baygorria	0	2
Palmar	0	1
SGU	1.000	966

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
