




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 03 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.594
Sala B	-4
5ta.	425
6ta.	0
Motores	1.173
Central La Tablada	-96
Central P. del Tigre	4.173
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.738
C. Baygorria	2.364
C. Palmar	2.284
C. Salto Grande	4.430
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.433
TOTAL Generación	23.914

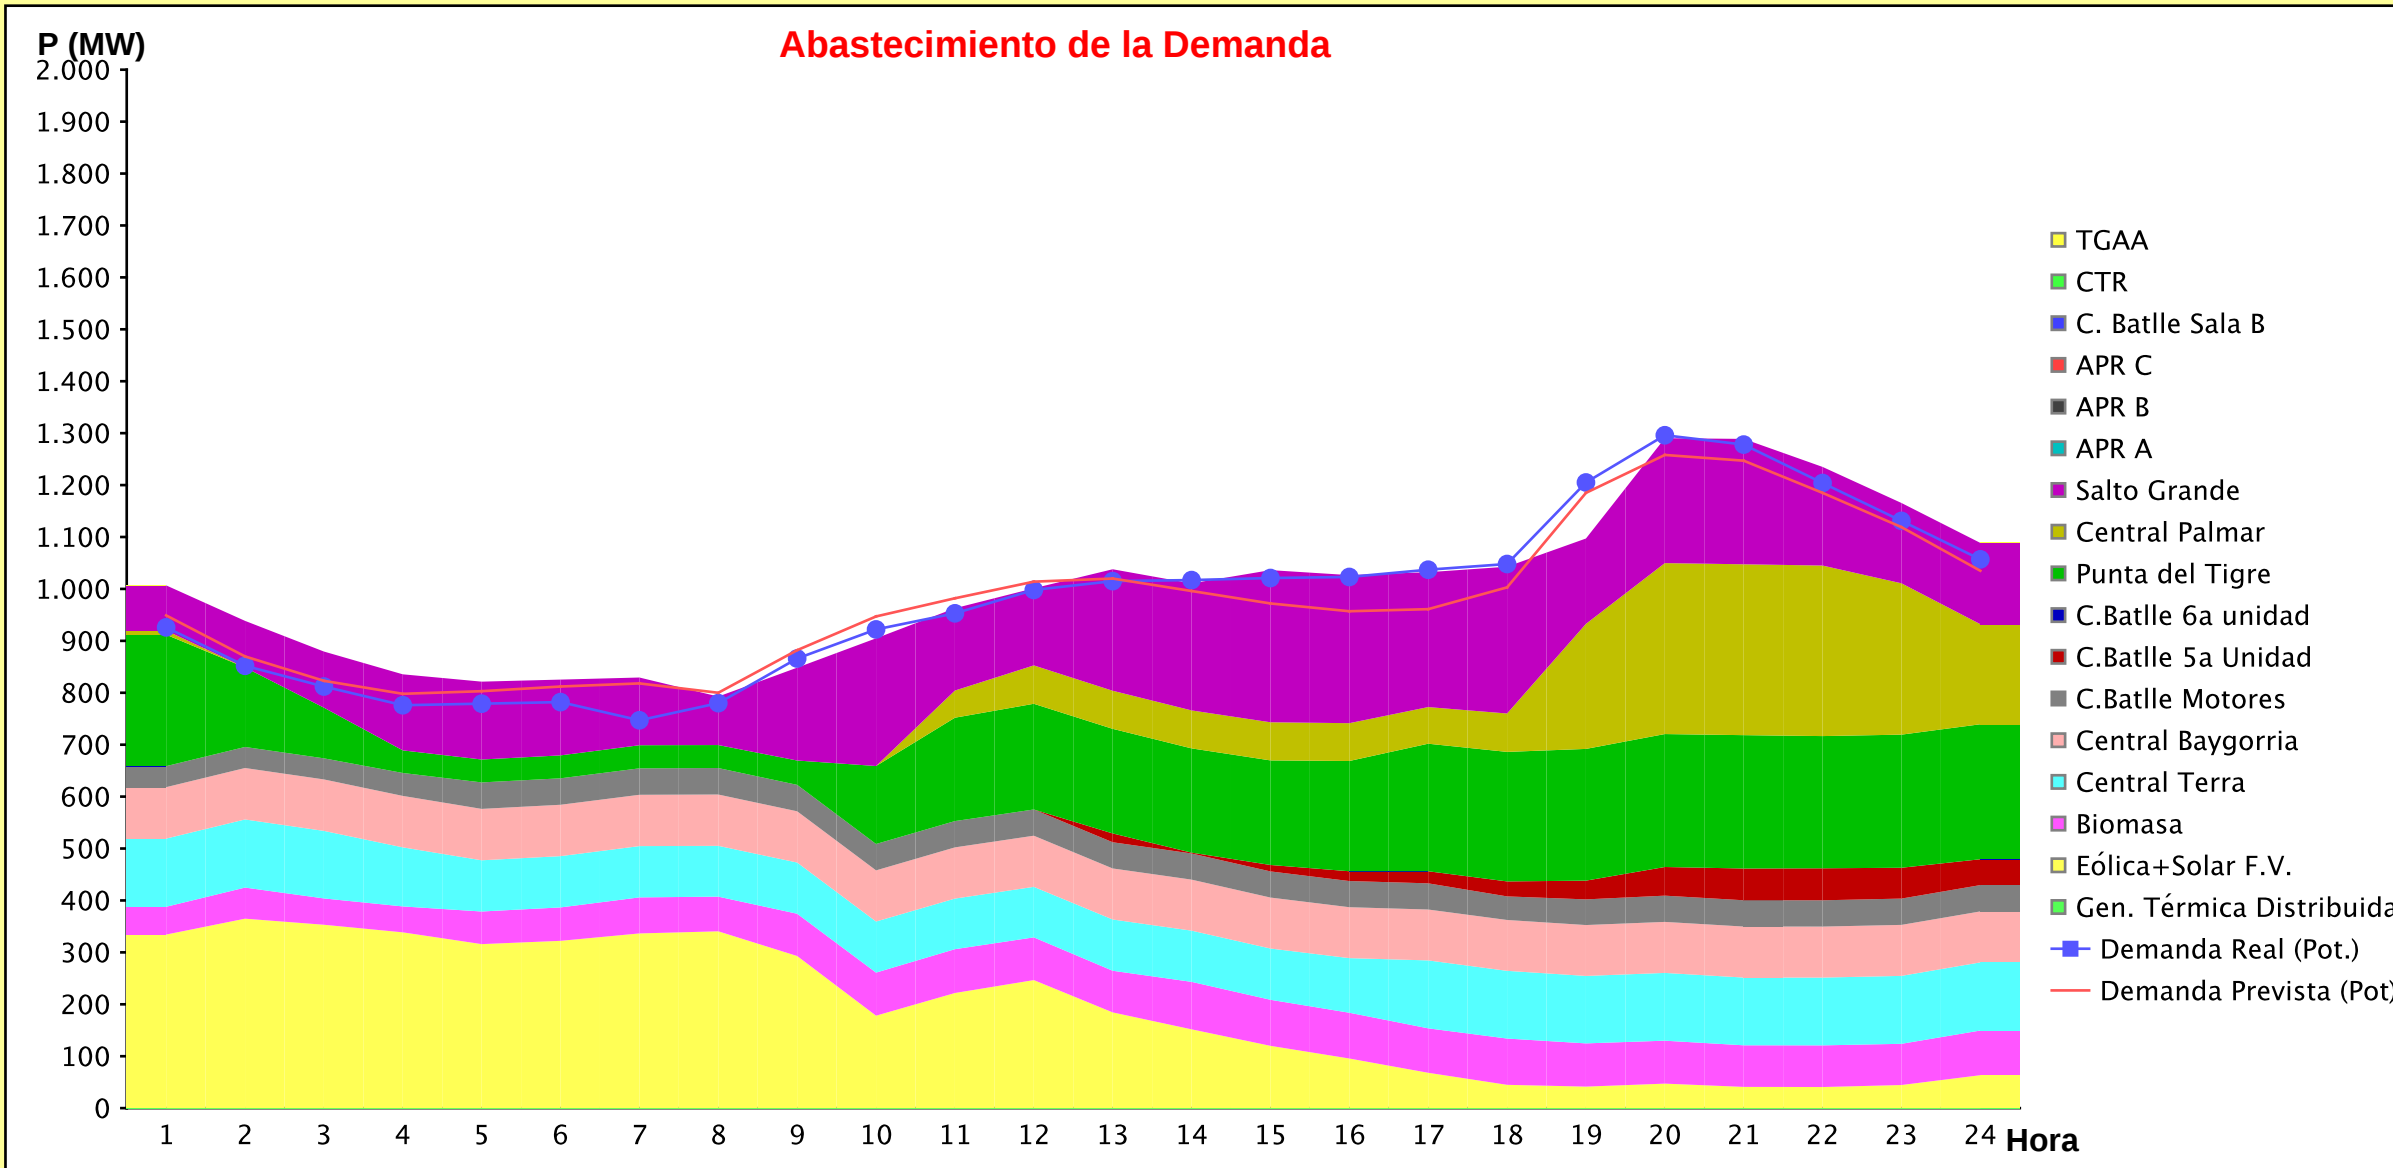

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.914
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	23.436
Diferencia (MWh)	478
Ejecutada - Programada	2,04 %

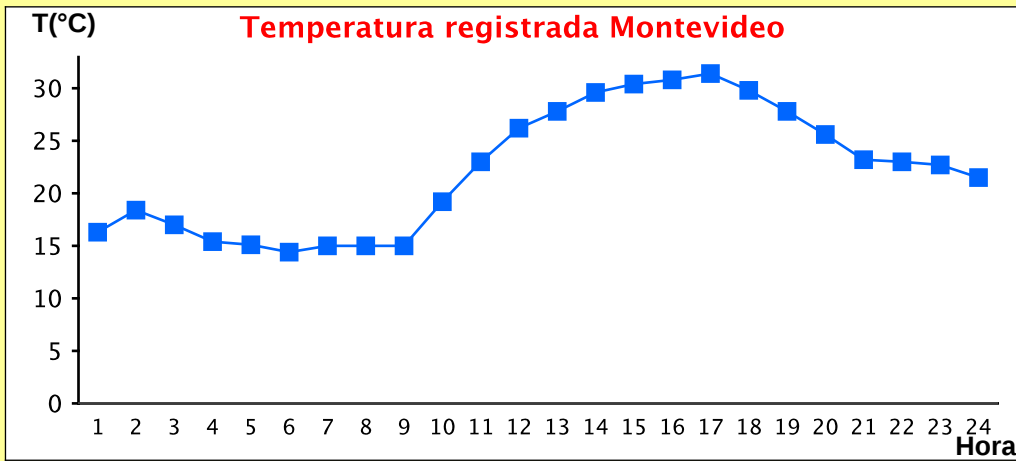


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1033,8 Hora 16:55
Potencia mínima:	726,67 Hora 07:04
Pico noche:	1302,69 Hora 20:11

Generación Media (MW)	
Eólica	191,4
Biomasa	76,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

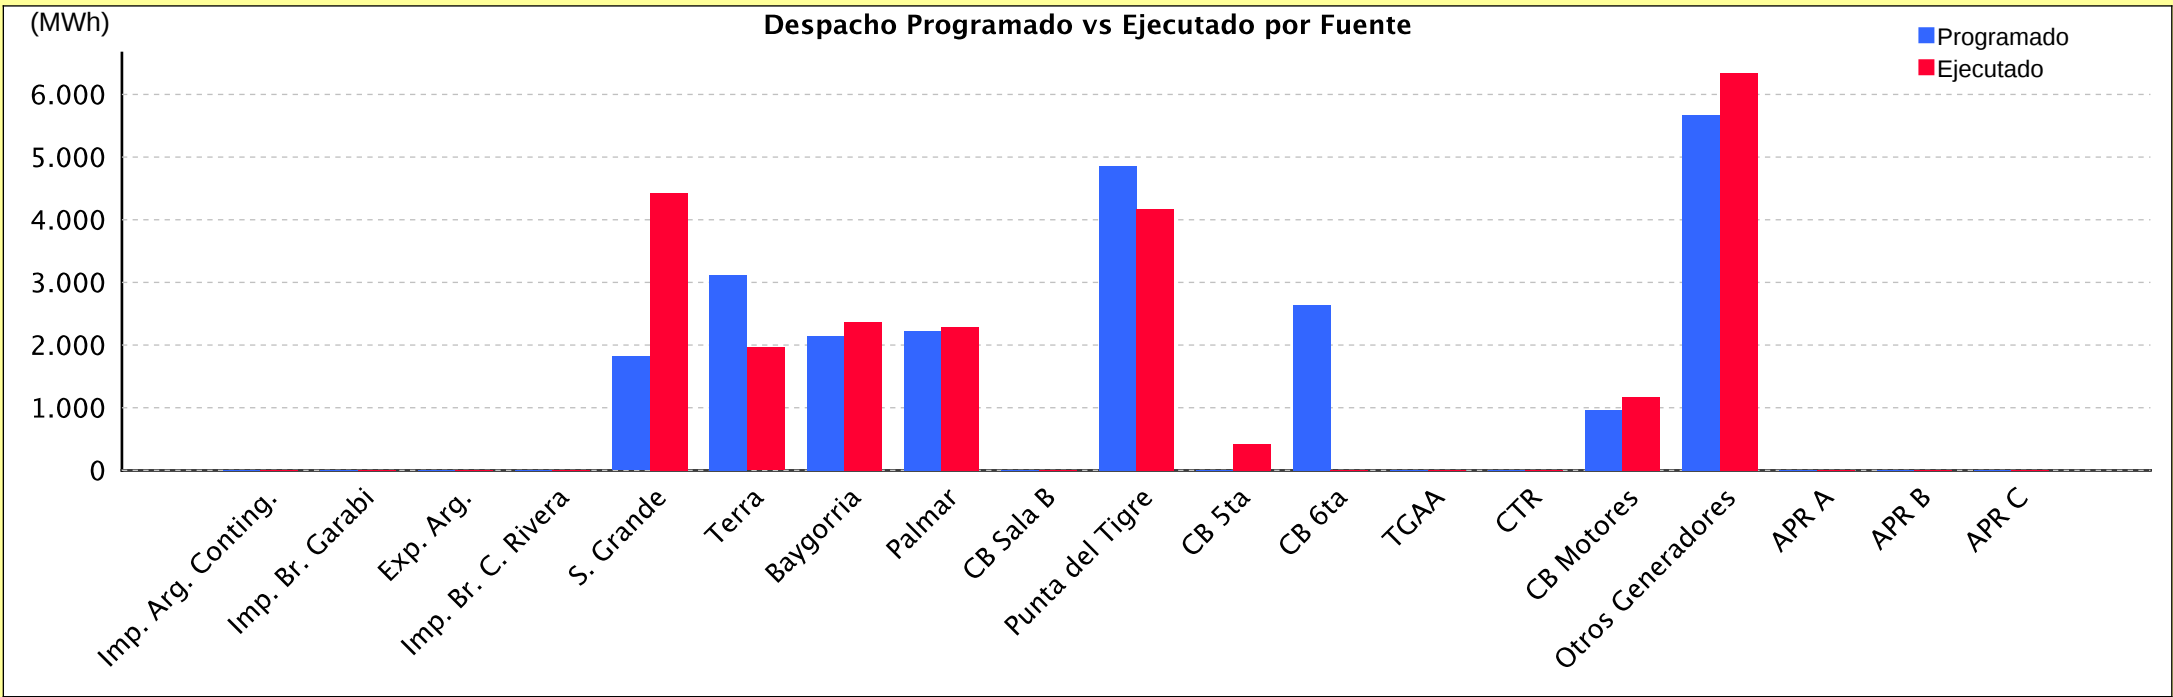
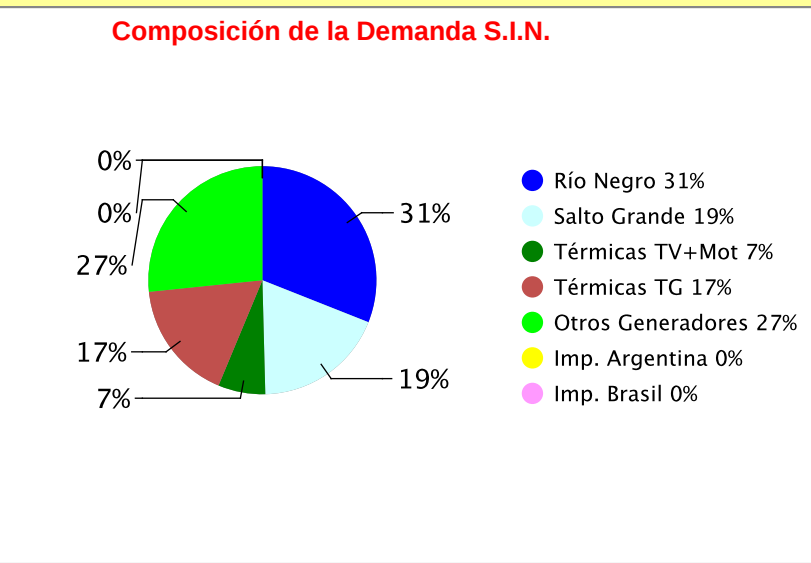


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

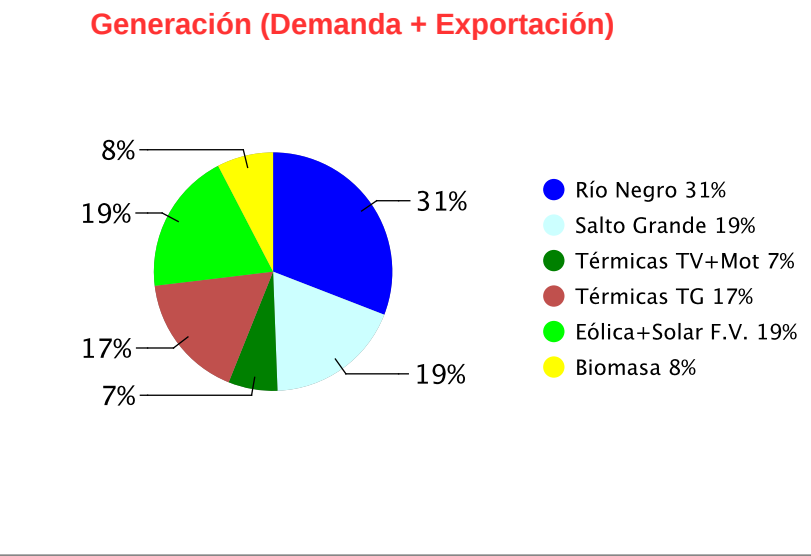



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

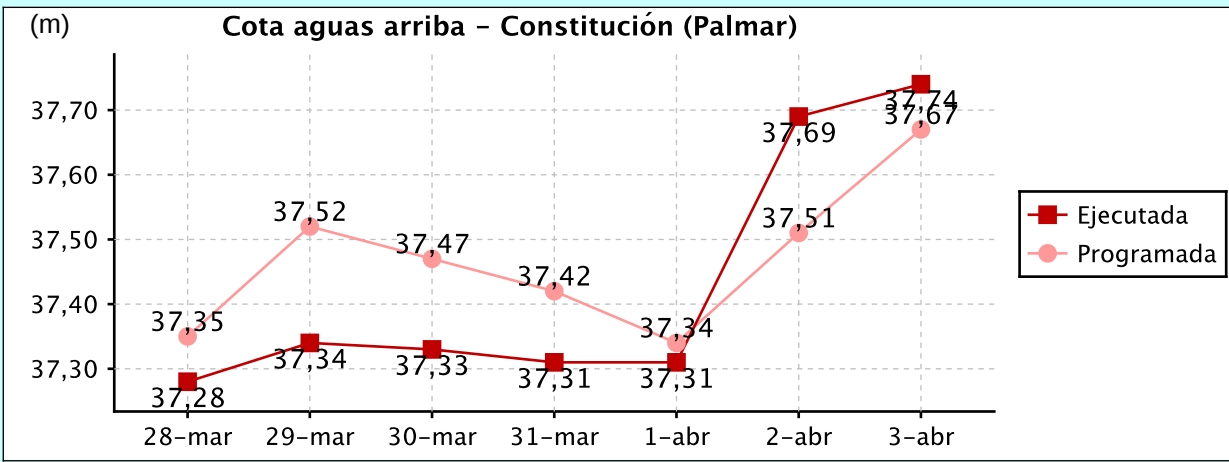
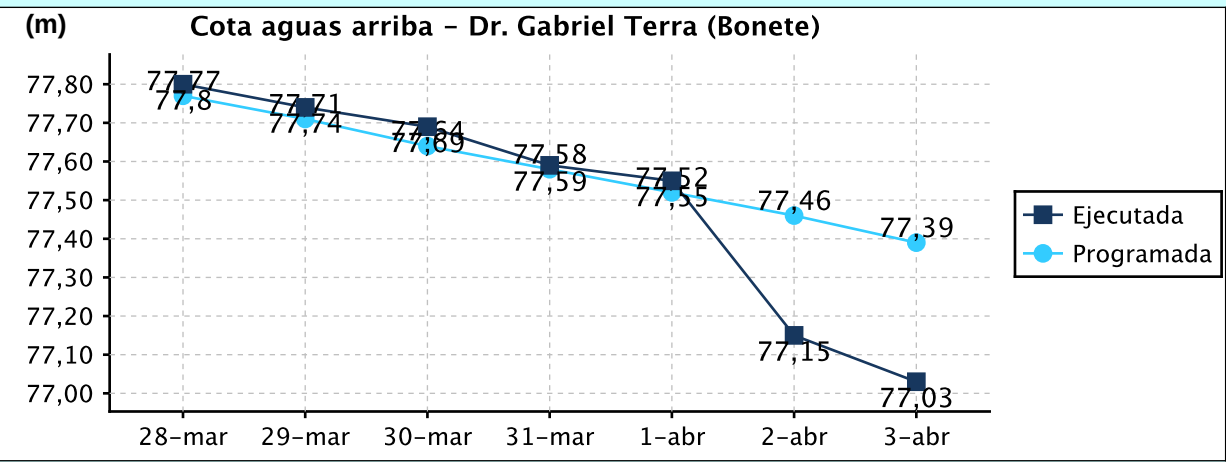


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,39	77,03
Baygorria	54,18	54,3
Palmar	37,67	37,74
SGU	34,48	34,36

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

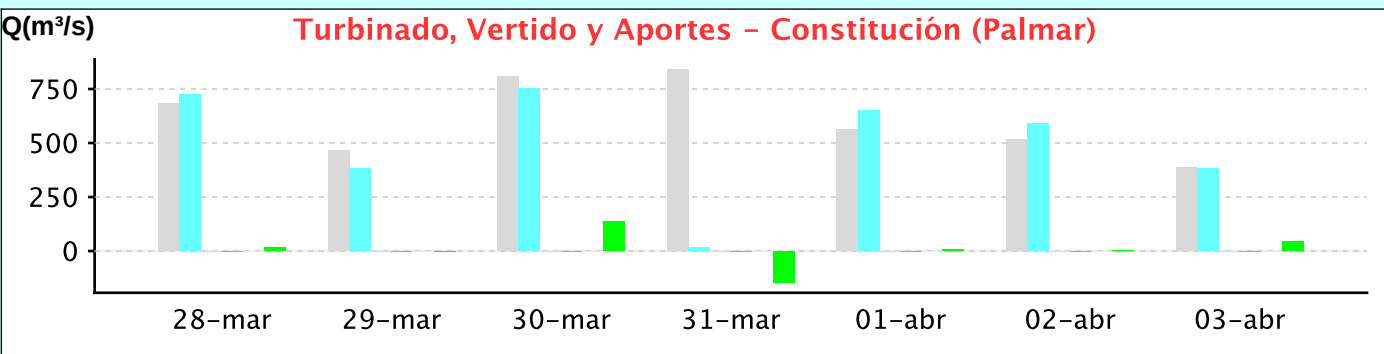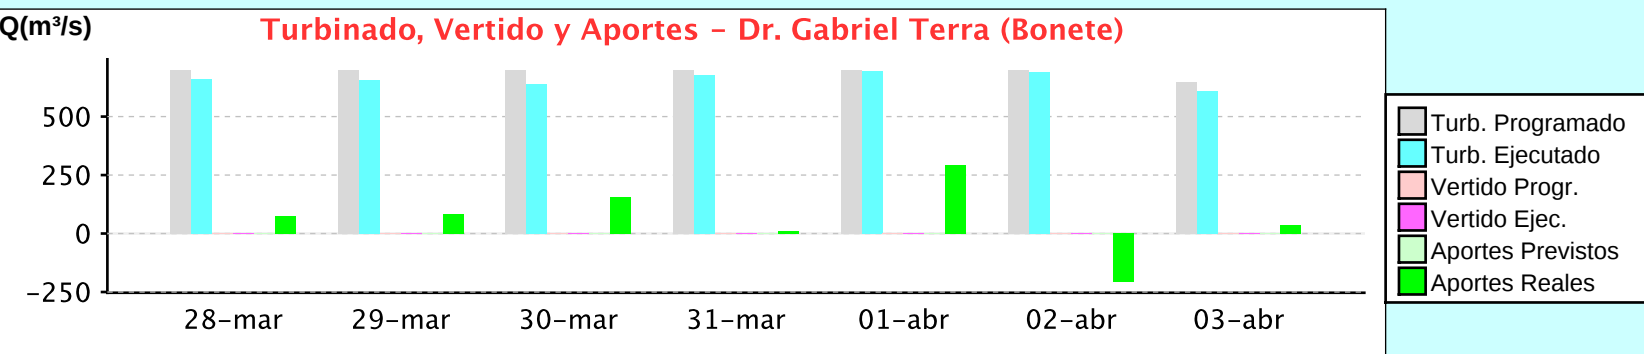

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

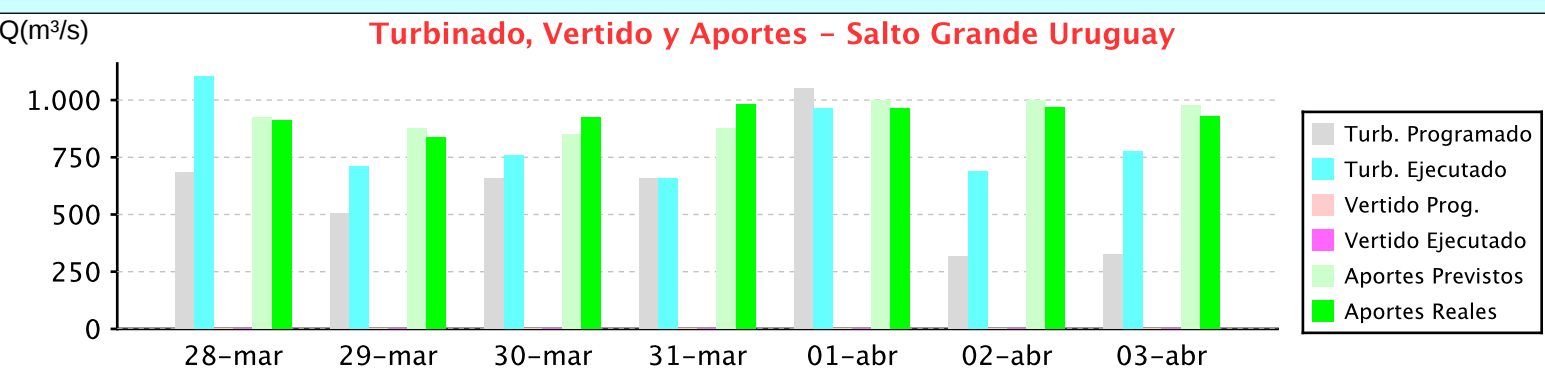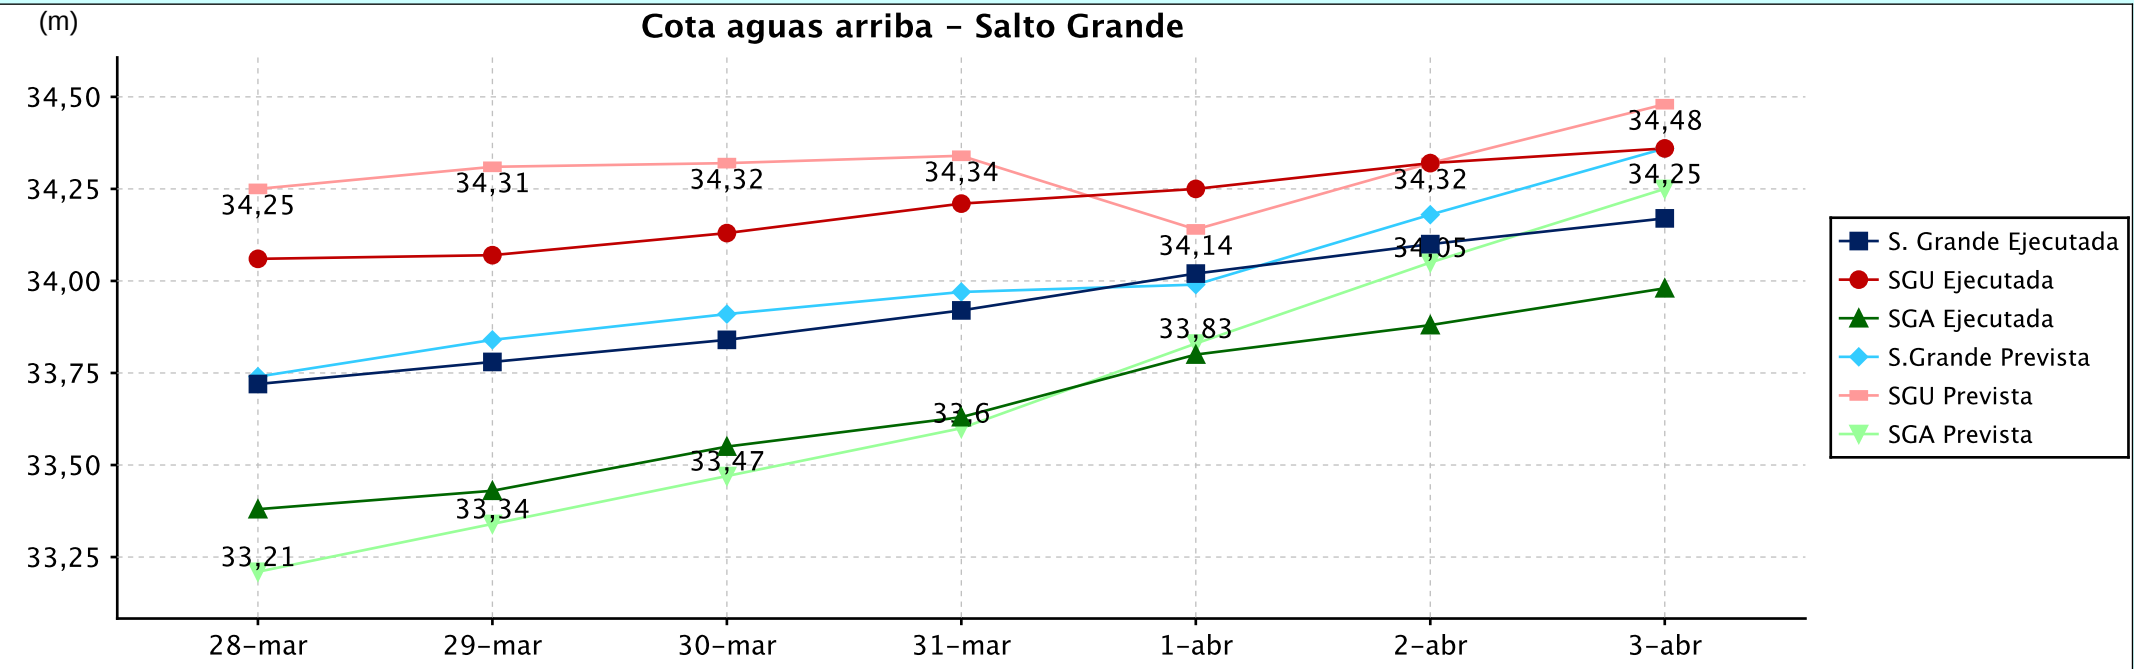

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,36
Cota Vista Arg	33,98
Cota real	34,17
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
8.235	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	649	608
Baygorria	688	710
Palmar	387	383
SGU	325	777

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	34
Baygorria	0	-5
Palmar	0	46
SGU	975	926

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
