




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 04 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.392
Sala B	-4
5ta.	198
6ta.	0
Motores	1.198
Central La Tablada	-99
Central P. del Tigre	6.131
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.066
C. Baygorria	2.355
C. Palmar	3.153
C. Salto Grande	4.096
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.255
TOTAL Generación	24.344

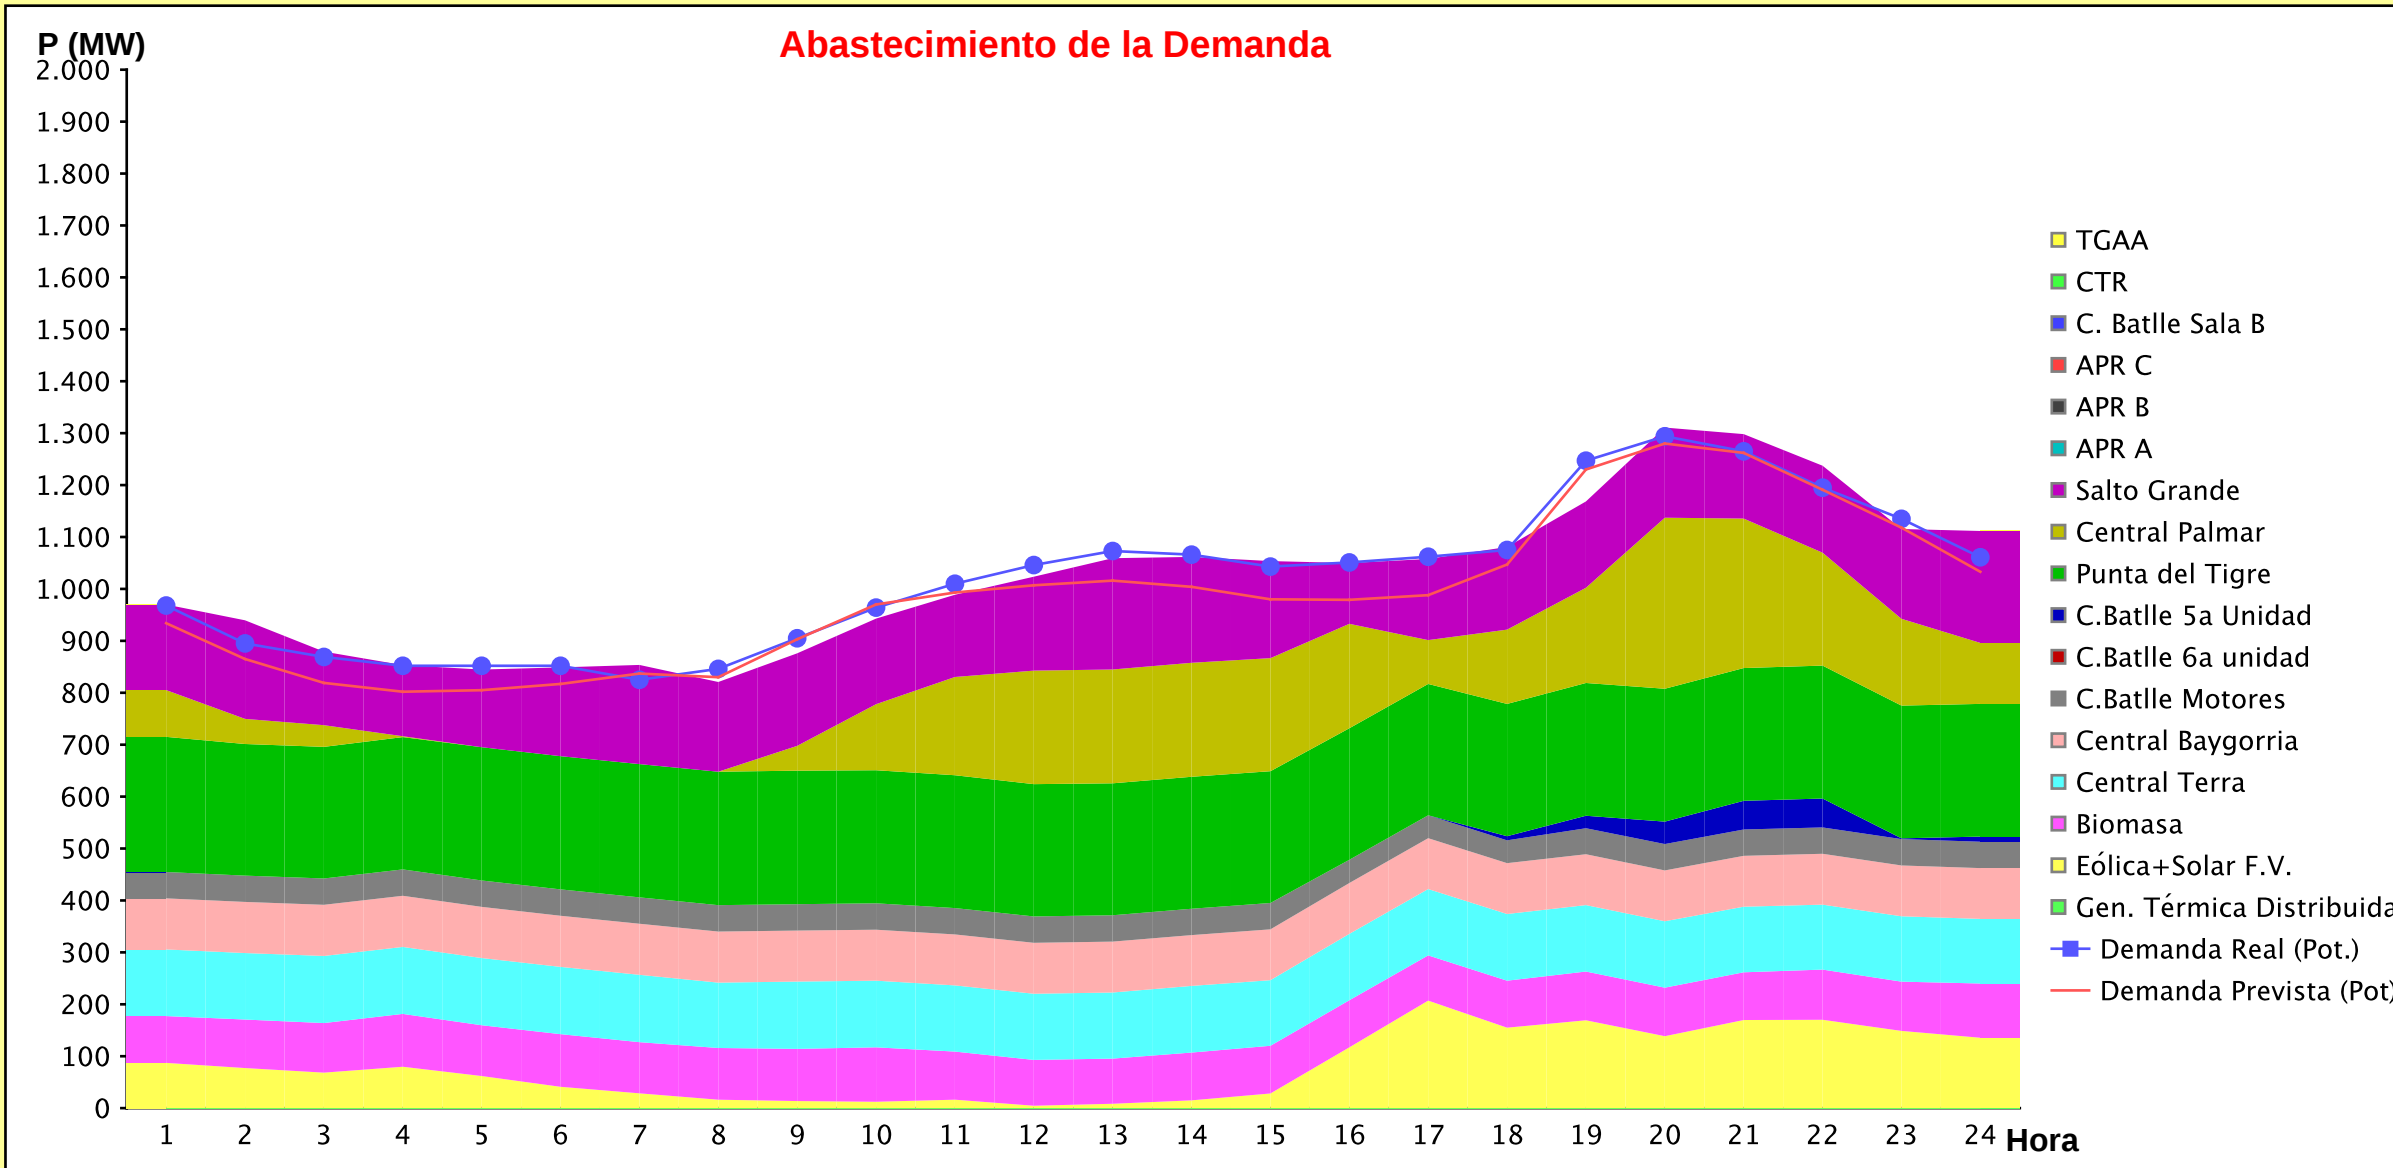

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.344
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	23.710
Diferencia (MWh)	634
Ejecutada - Programada	2,67 %

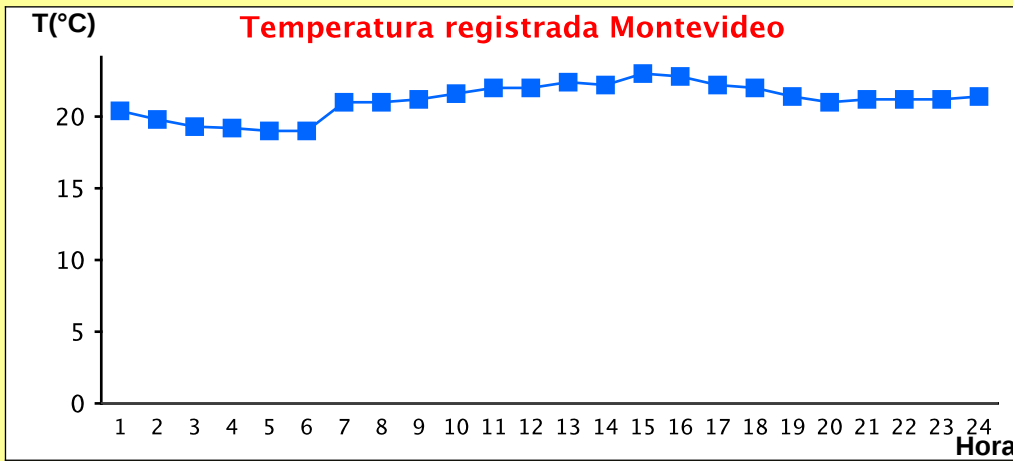

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1075,42 Hora 13:02
Potencia mínima:	808,55 Hora 07:21
Pico noche:	1301,38 Hora 19:43



Generación Media (MW)	
Eólica	82,6
Biomasa	95,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

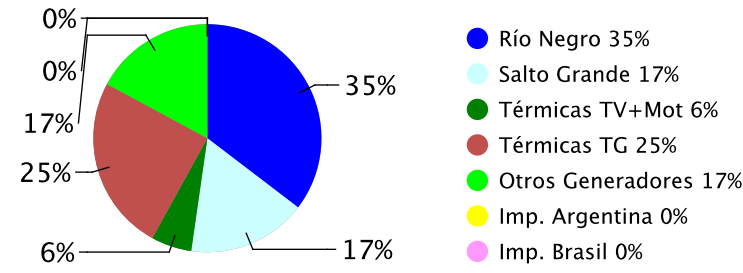



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

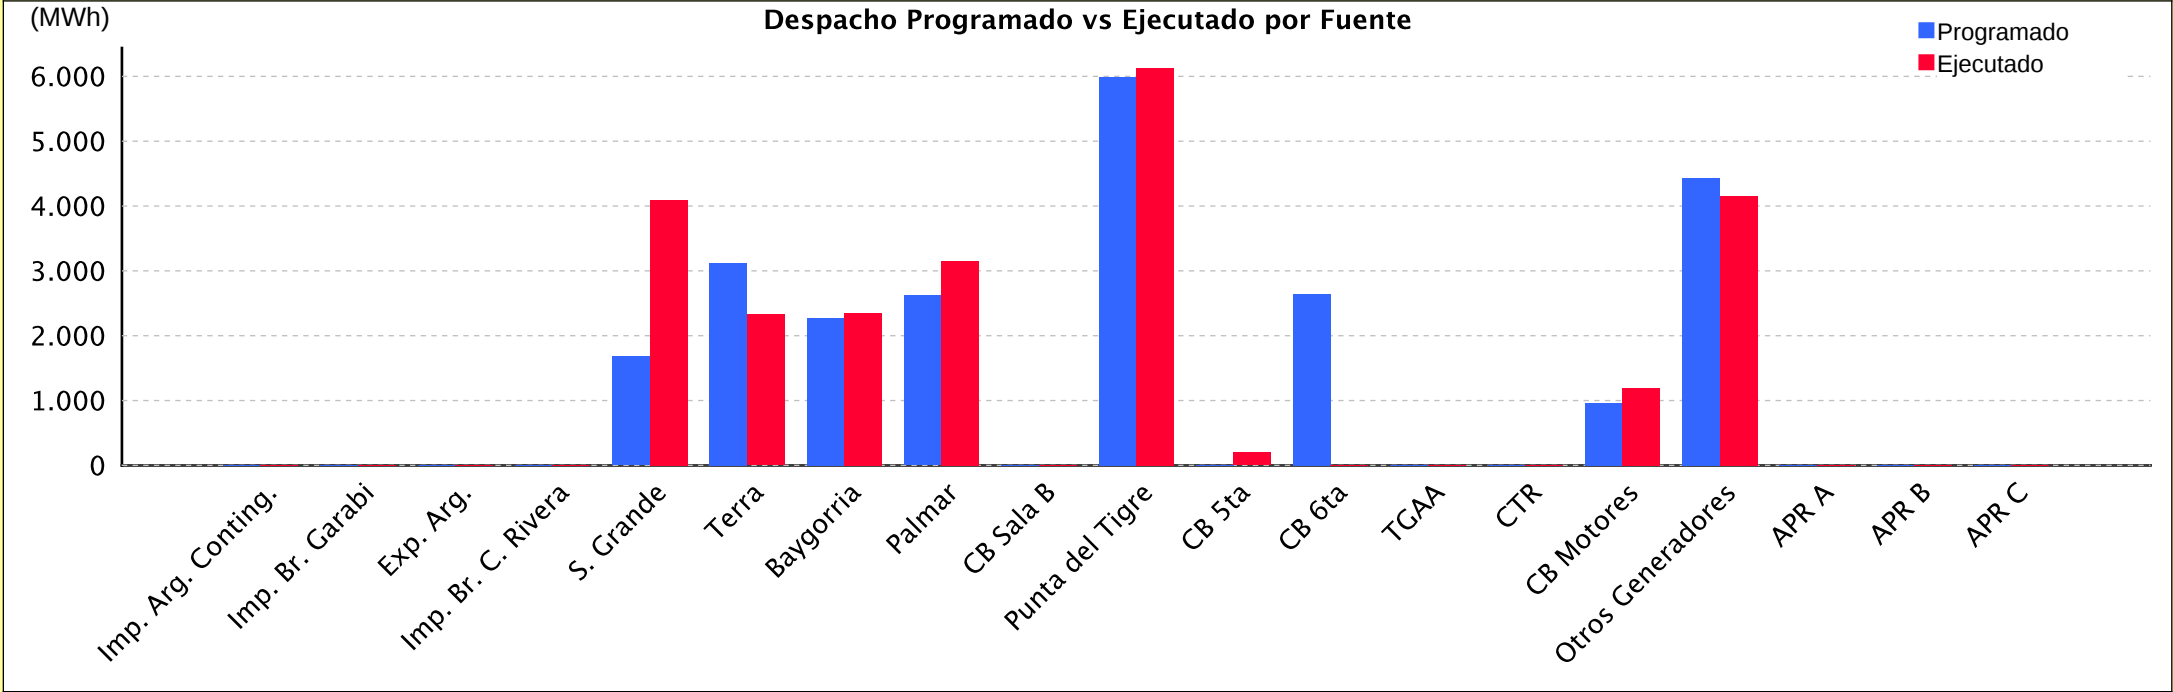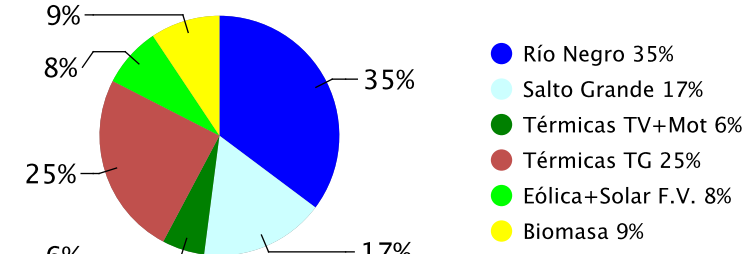



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

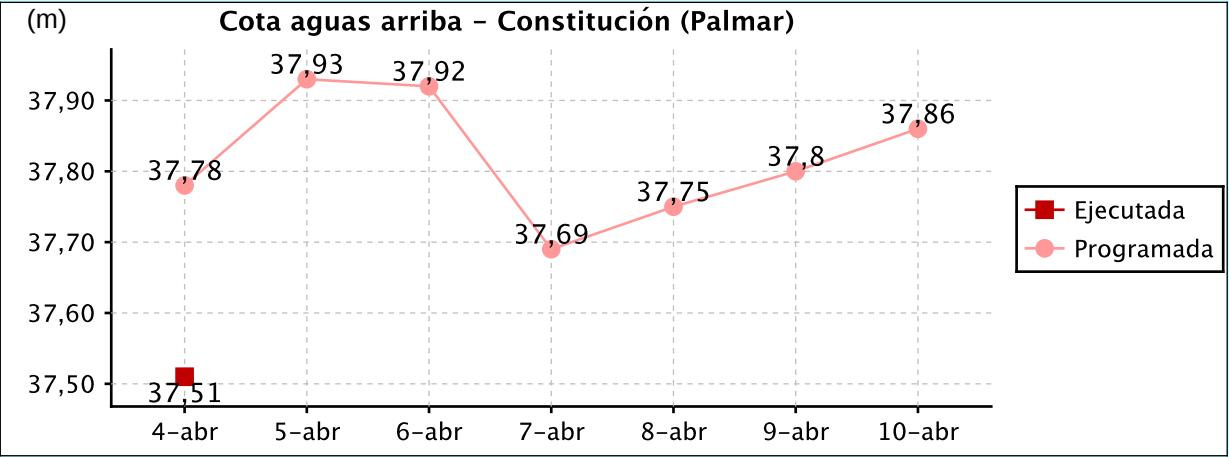
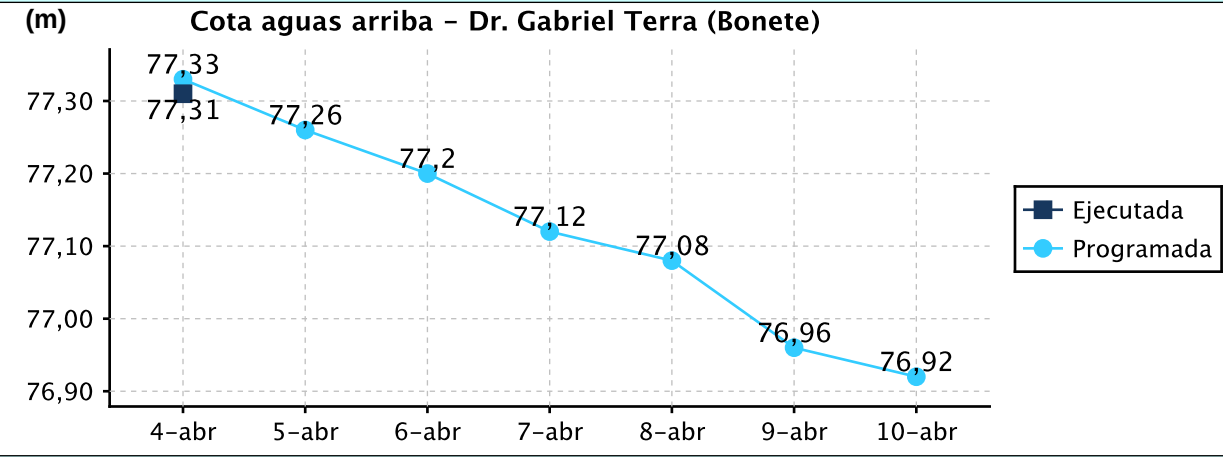


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,33	77,31
Baygorria	54,14	54,1
Palmar	37,78	37,51
SGU	34,63	34,42

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

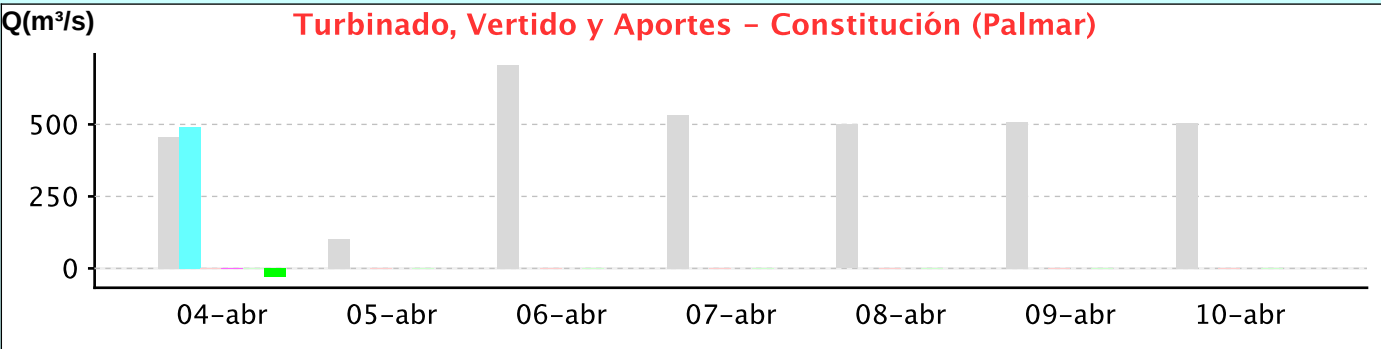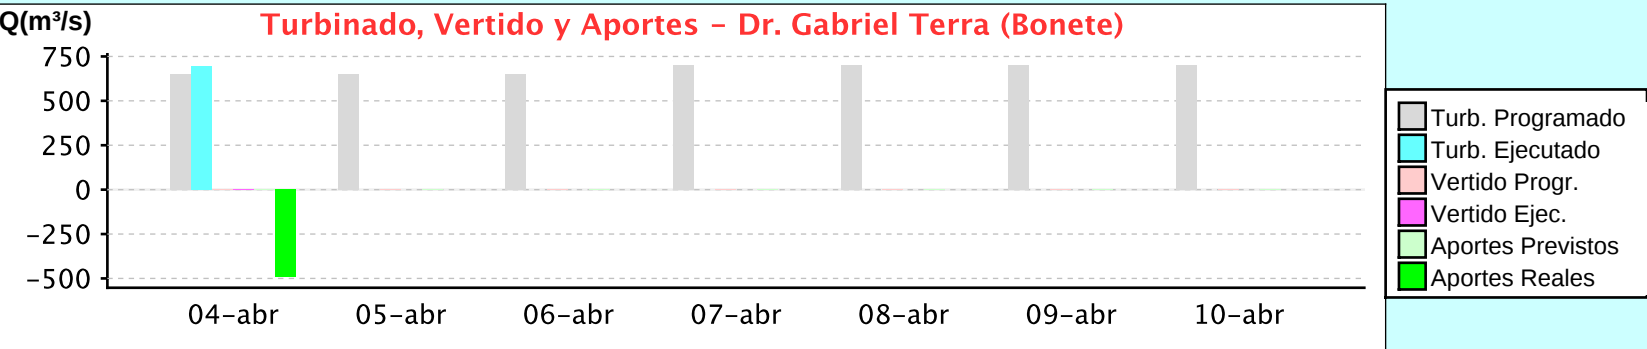

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

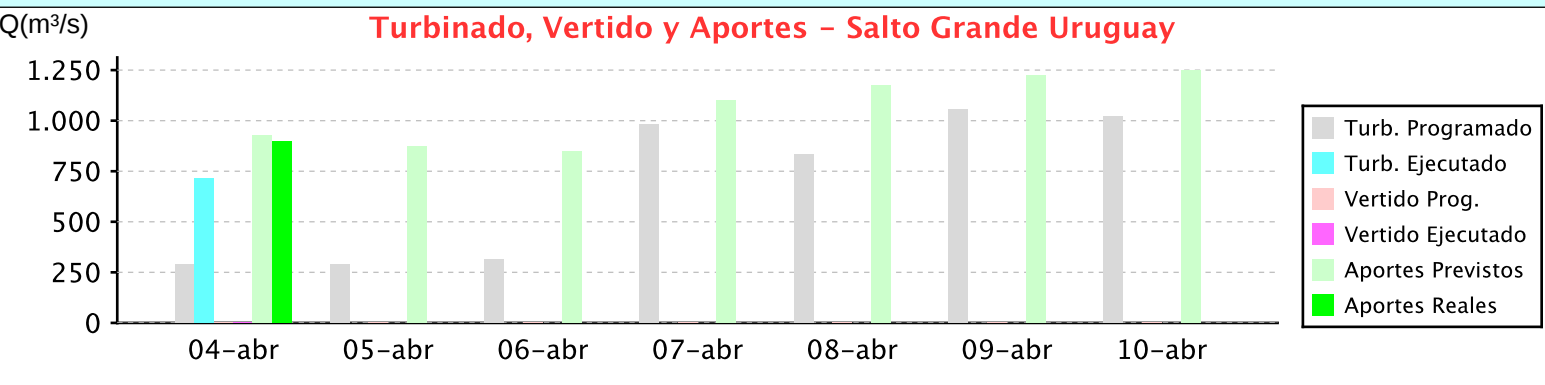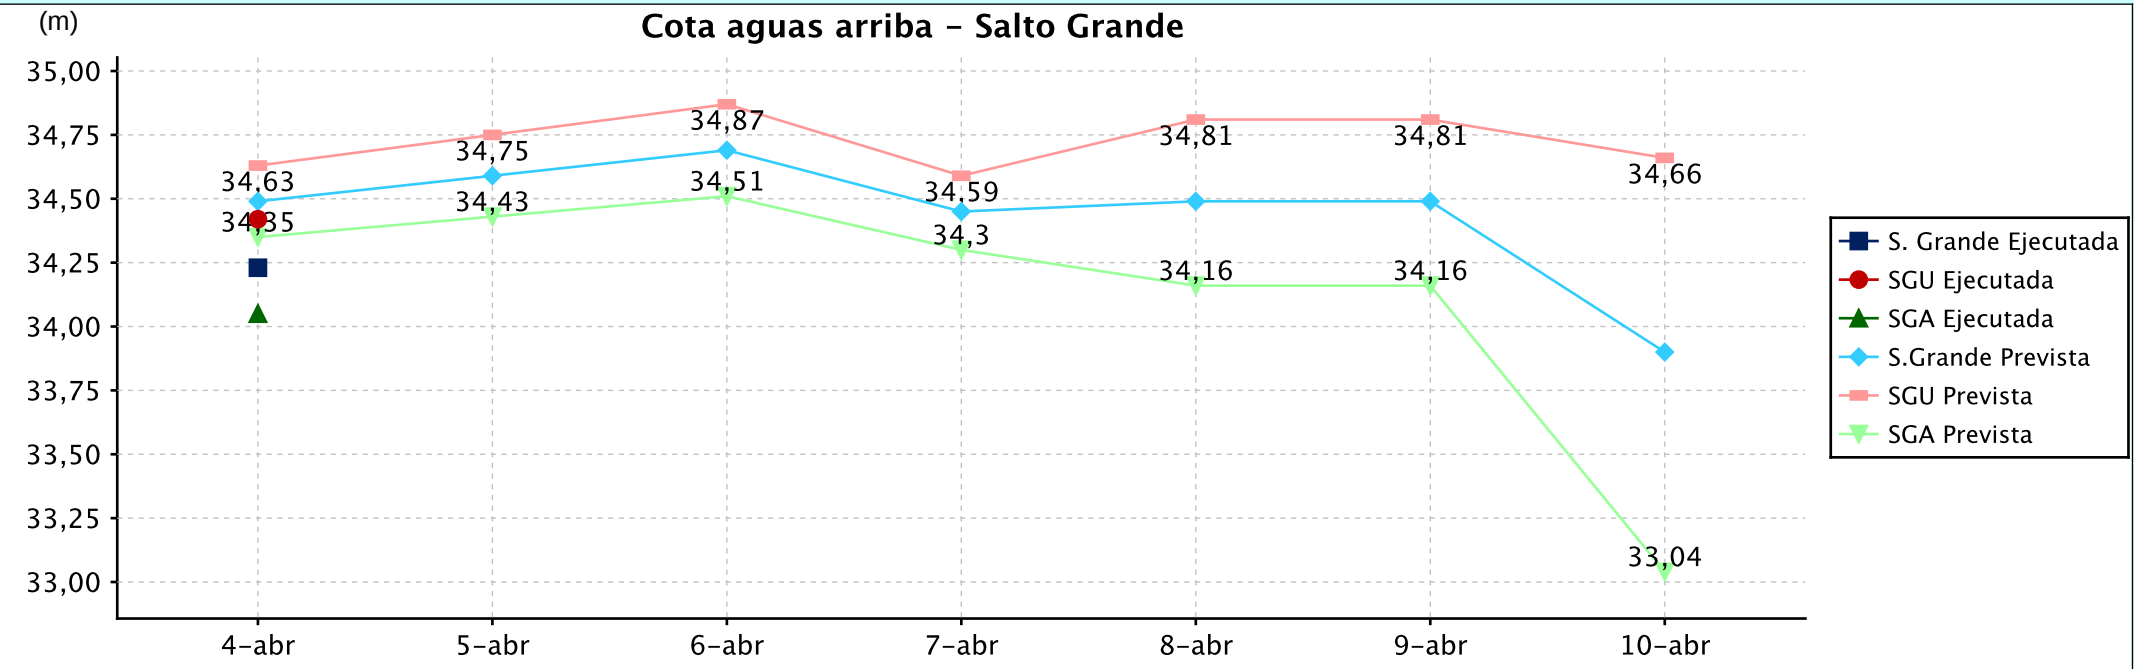

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,42
Cota Vista Arg	34,05
Cota real	34,23
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
7.903	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	649	696
Baygorria	728	676
Palmar	456	491
SGU	287	715

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-493
Baygorria	0	1
Palmar	0	-30
SGU	925	898

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
