




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 05 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	2.341
Sala B	-4
5ta.	1.131
6ta.	0
Motores	1.214
Central La Tablada	-96
Central P. del Tigre	3.639
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.021
C. Baygorria	1.429
C. Palmar	105
C. Salto Grande	2.799
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	10.207
TOTAL Generación	23.441

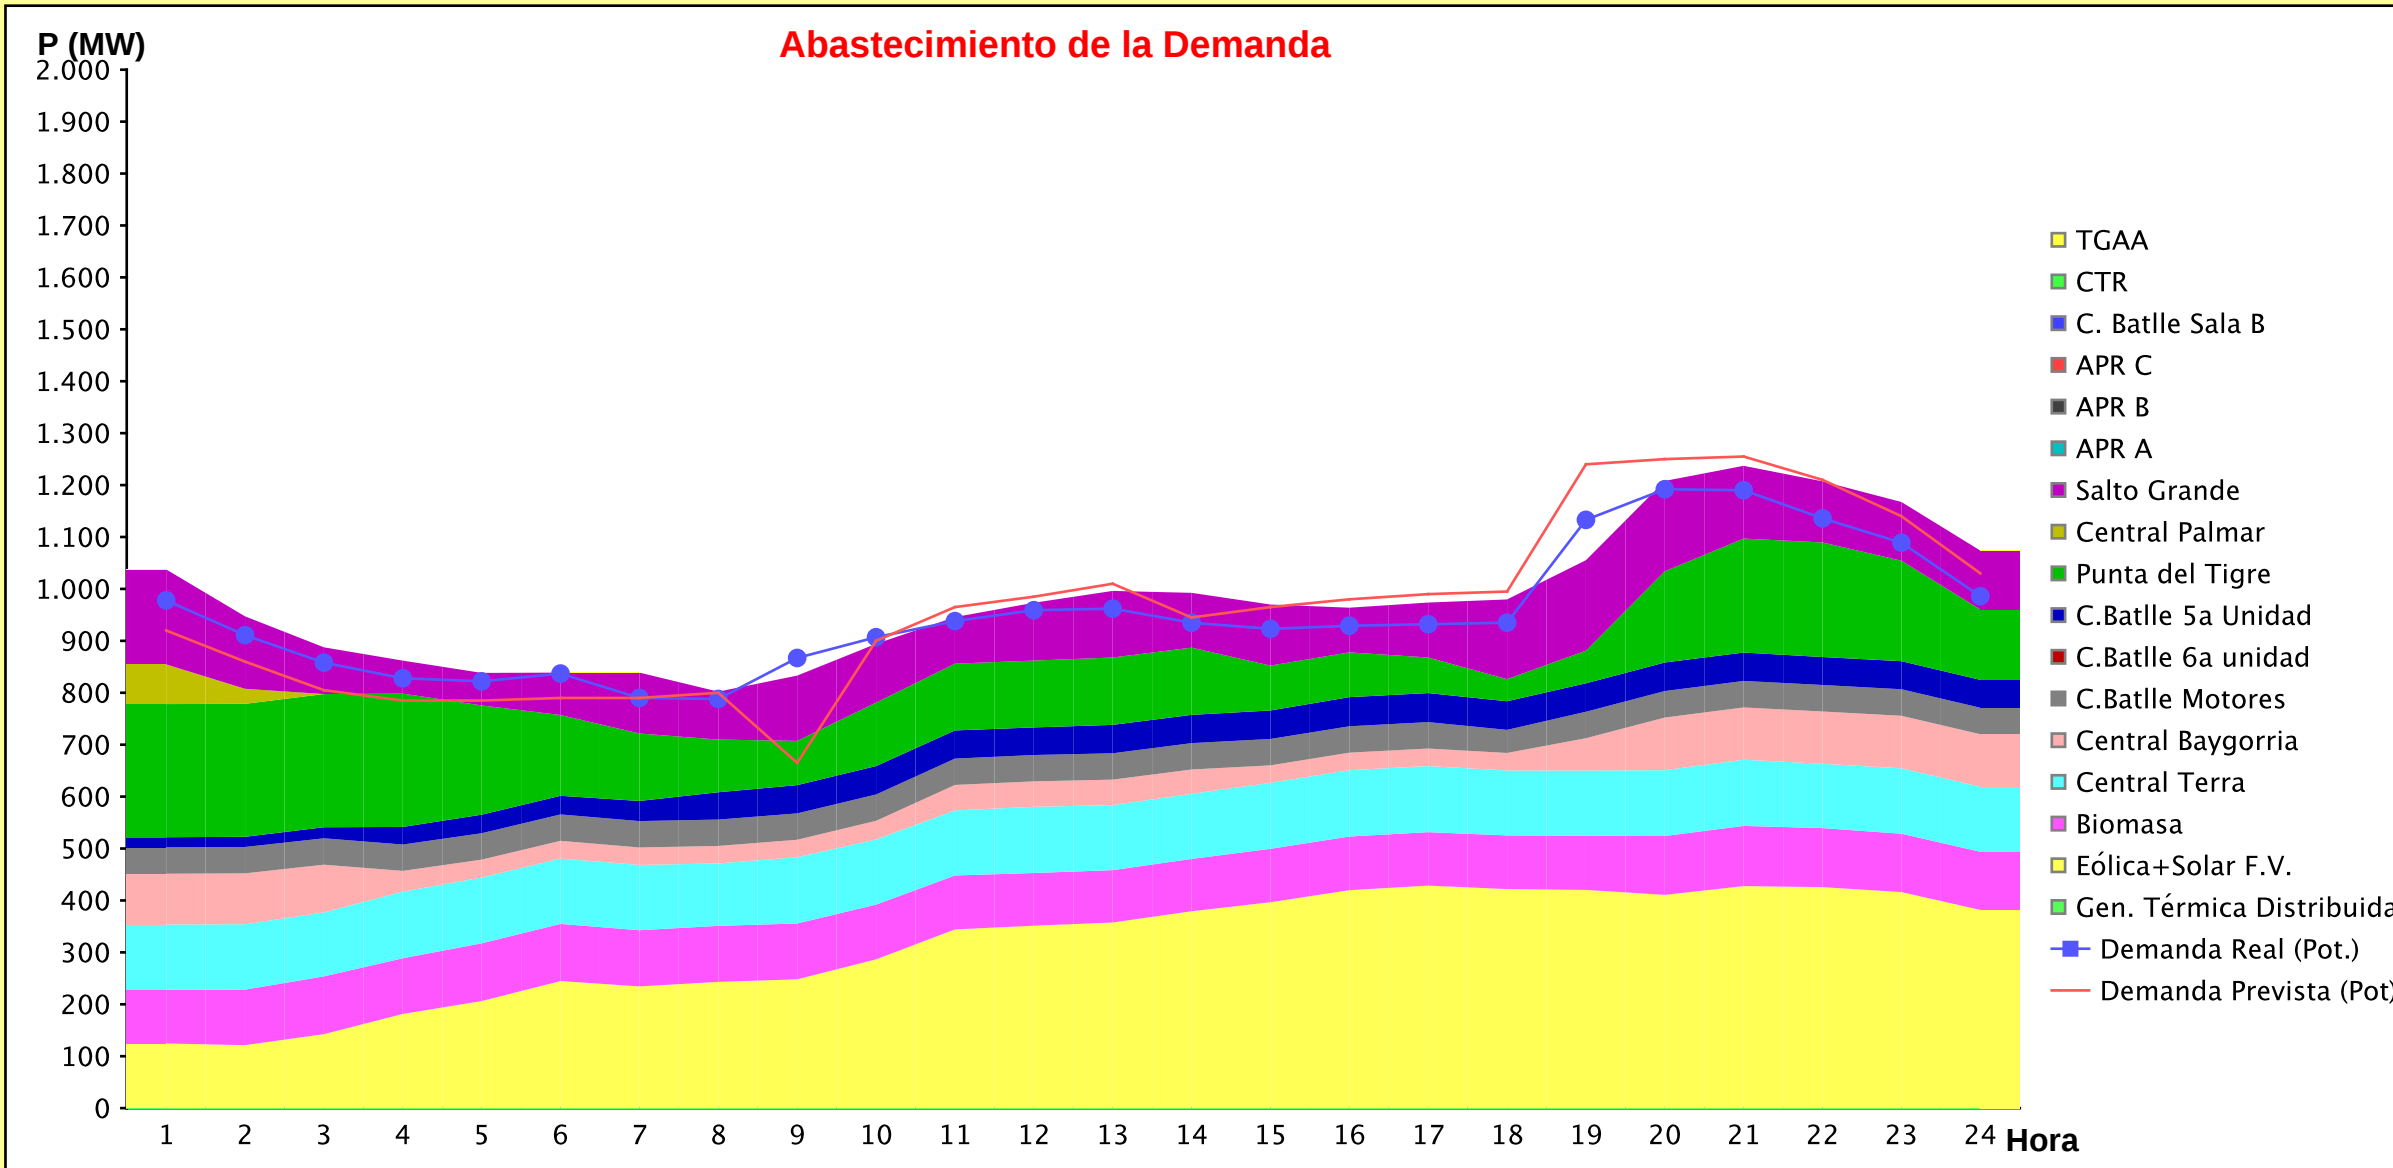

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.441
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	23.060
Diferencia (MWh)	381
Ejecutada - Programada	1,65 %

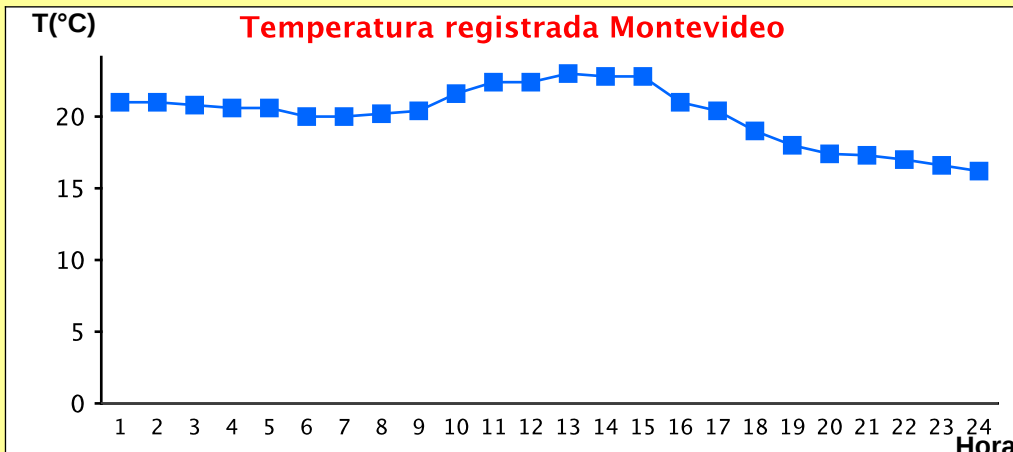



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	969,15 Hora 12:21
Potencia mínima:	745,85 Hora 07:17
Pico noche:	1195,98 Hora 20:31

Generación Media (MW)	
Eólica	317,4
Biomasa	107,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

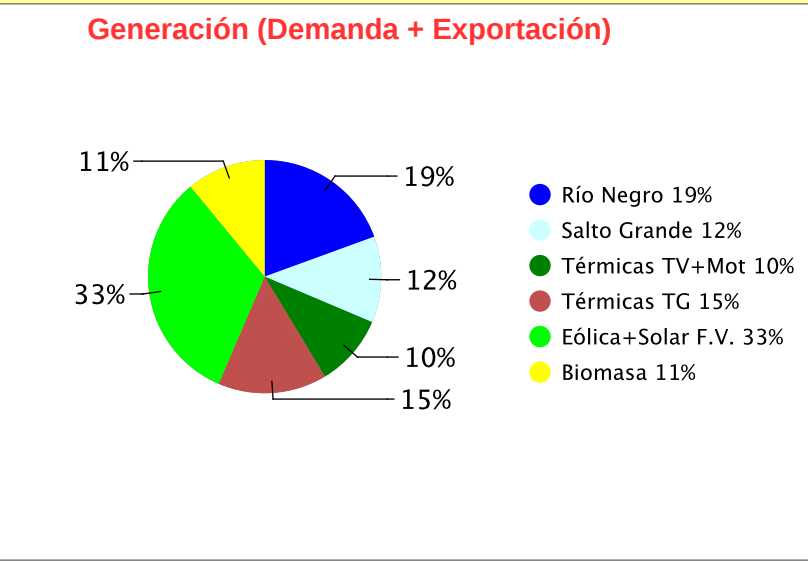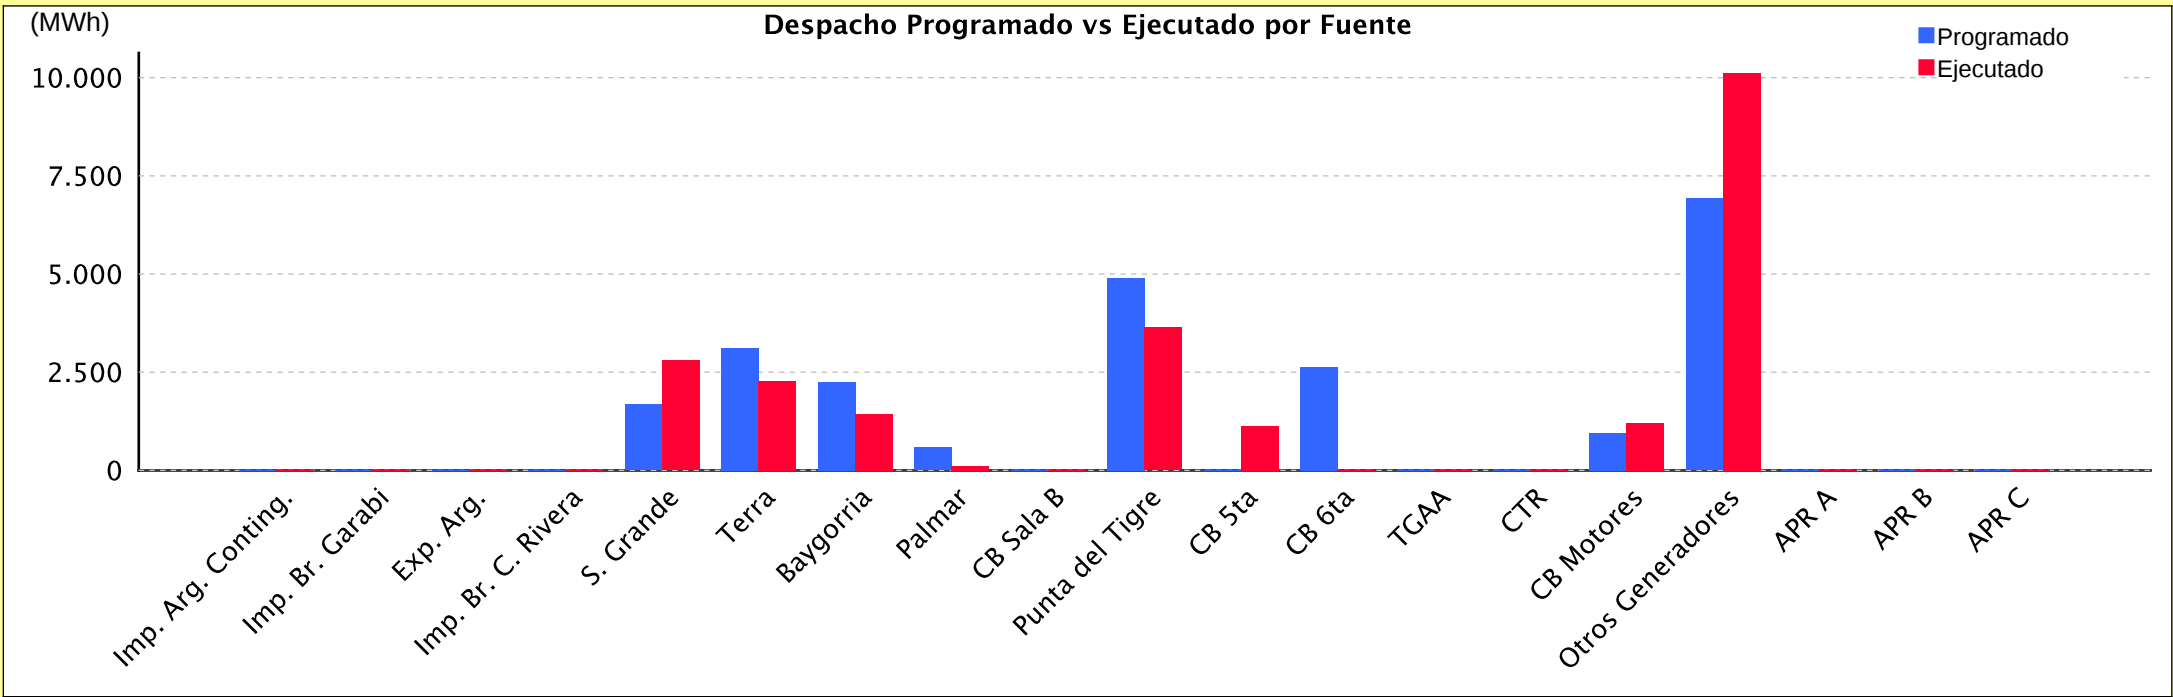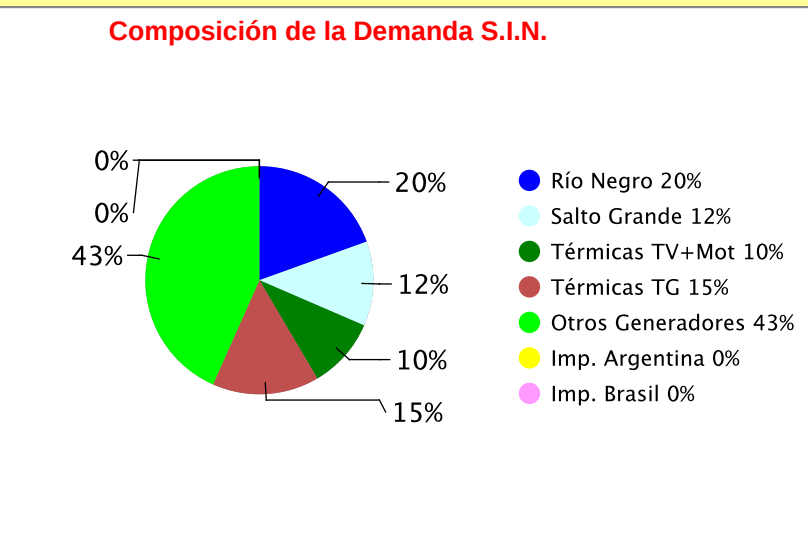



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

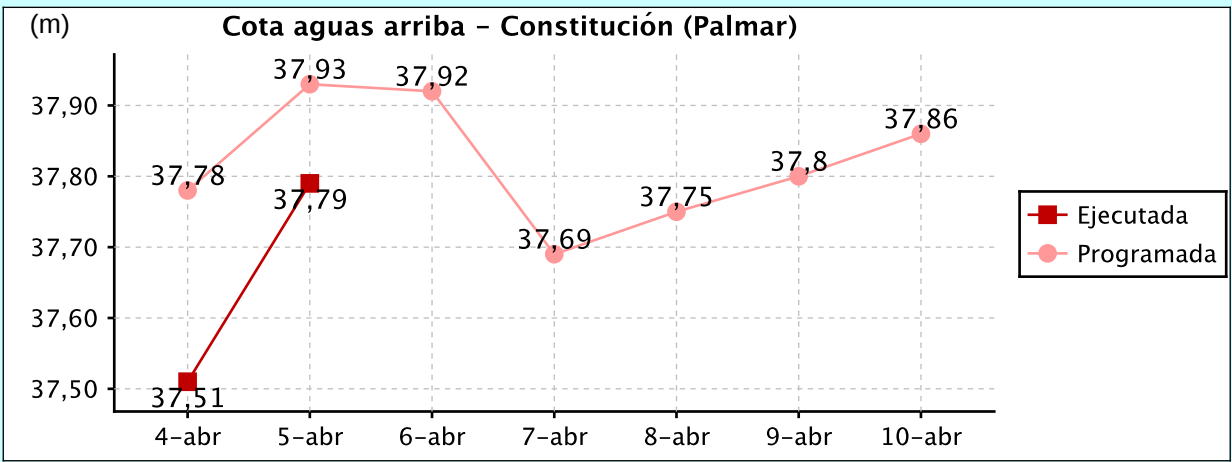
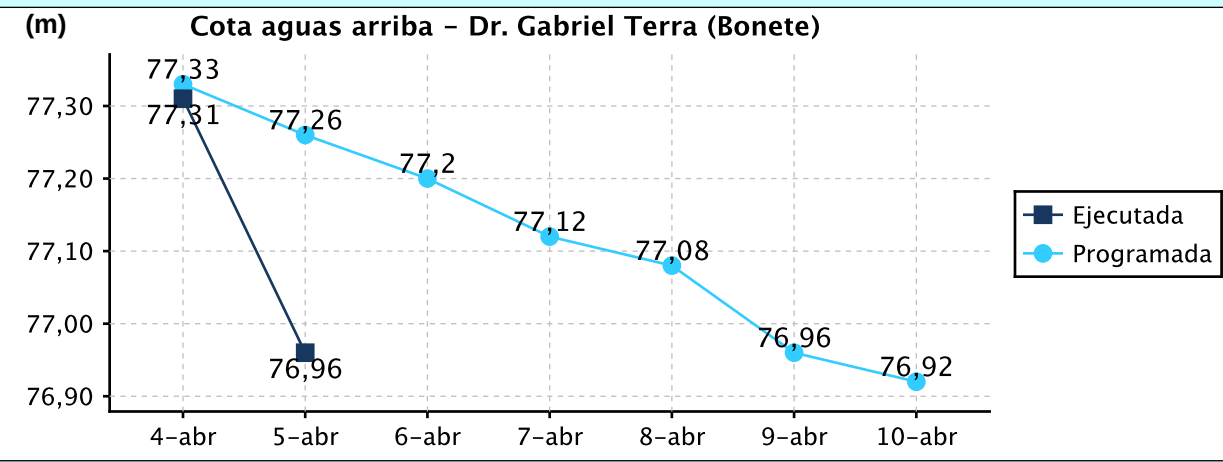


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,26	76,96
Baygorria	54,10	54,32
Palmar	37,93	37,79
SGU	34,75	34,44

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

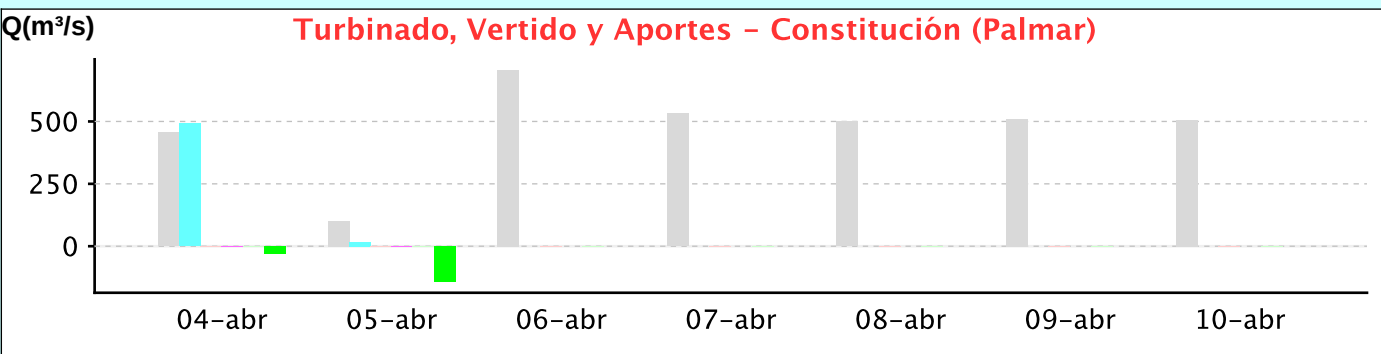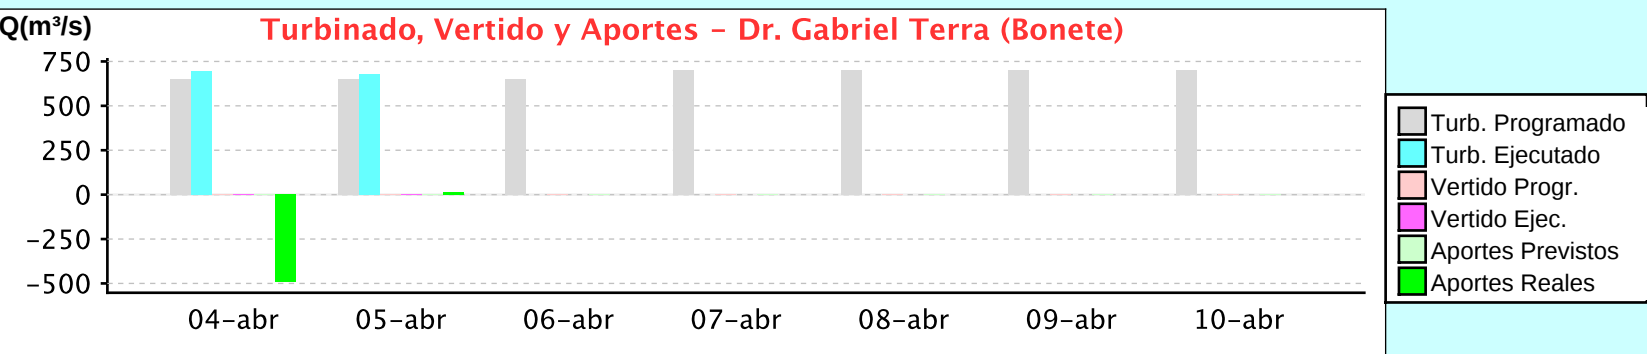

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

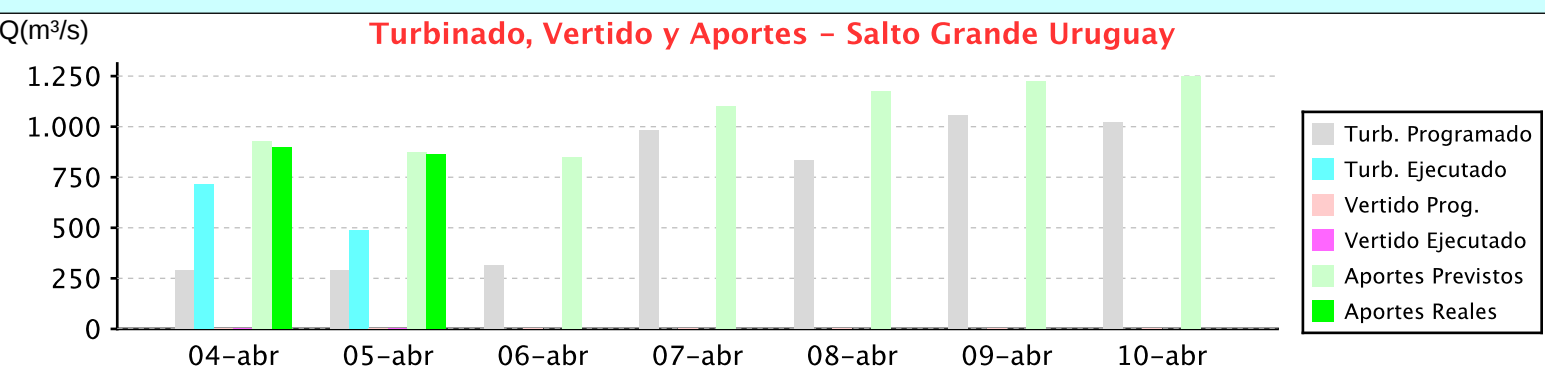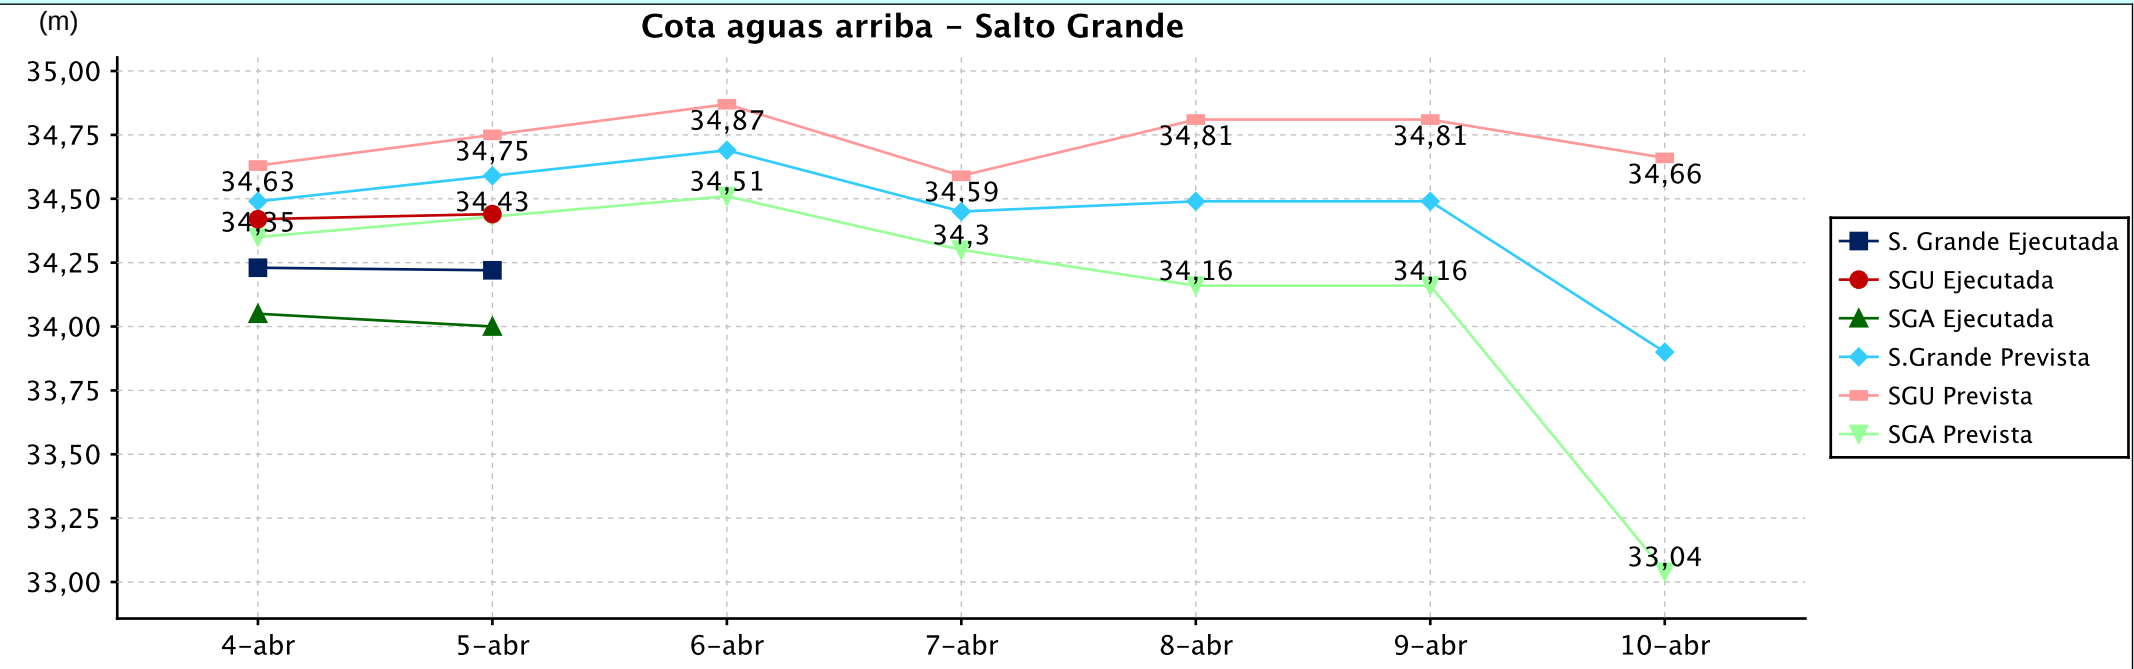

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,44
Cota Vista Arg	34,00
Cota real	34,22
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
9.361	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	649	678
Baygorria	722	431
Palmar	101	18
SGU	287	487

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	11
Baygorria	0	-53
Palmar	0	-144
SGU	875	865

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
