




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 06 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.630
Sala B	-4
5ta.	482
6ta.	0
Motores	1.152
Central La Tablada	-86
Central P. del Tigre	4.891
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.051
C. Baygorria	2.422
C. Palmar	4.157
C. Salto Grande	3.937
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.307
TOTAL Generación	26.305

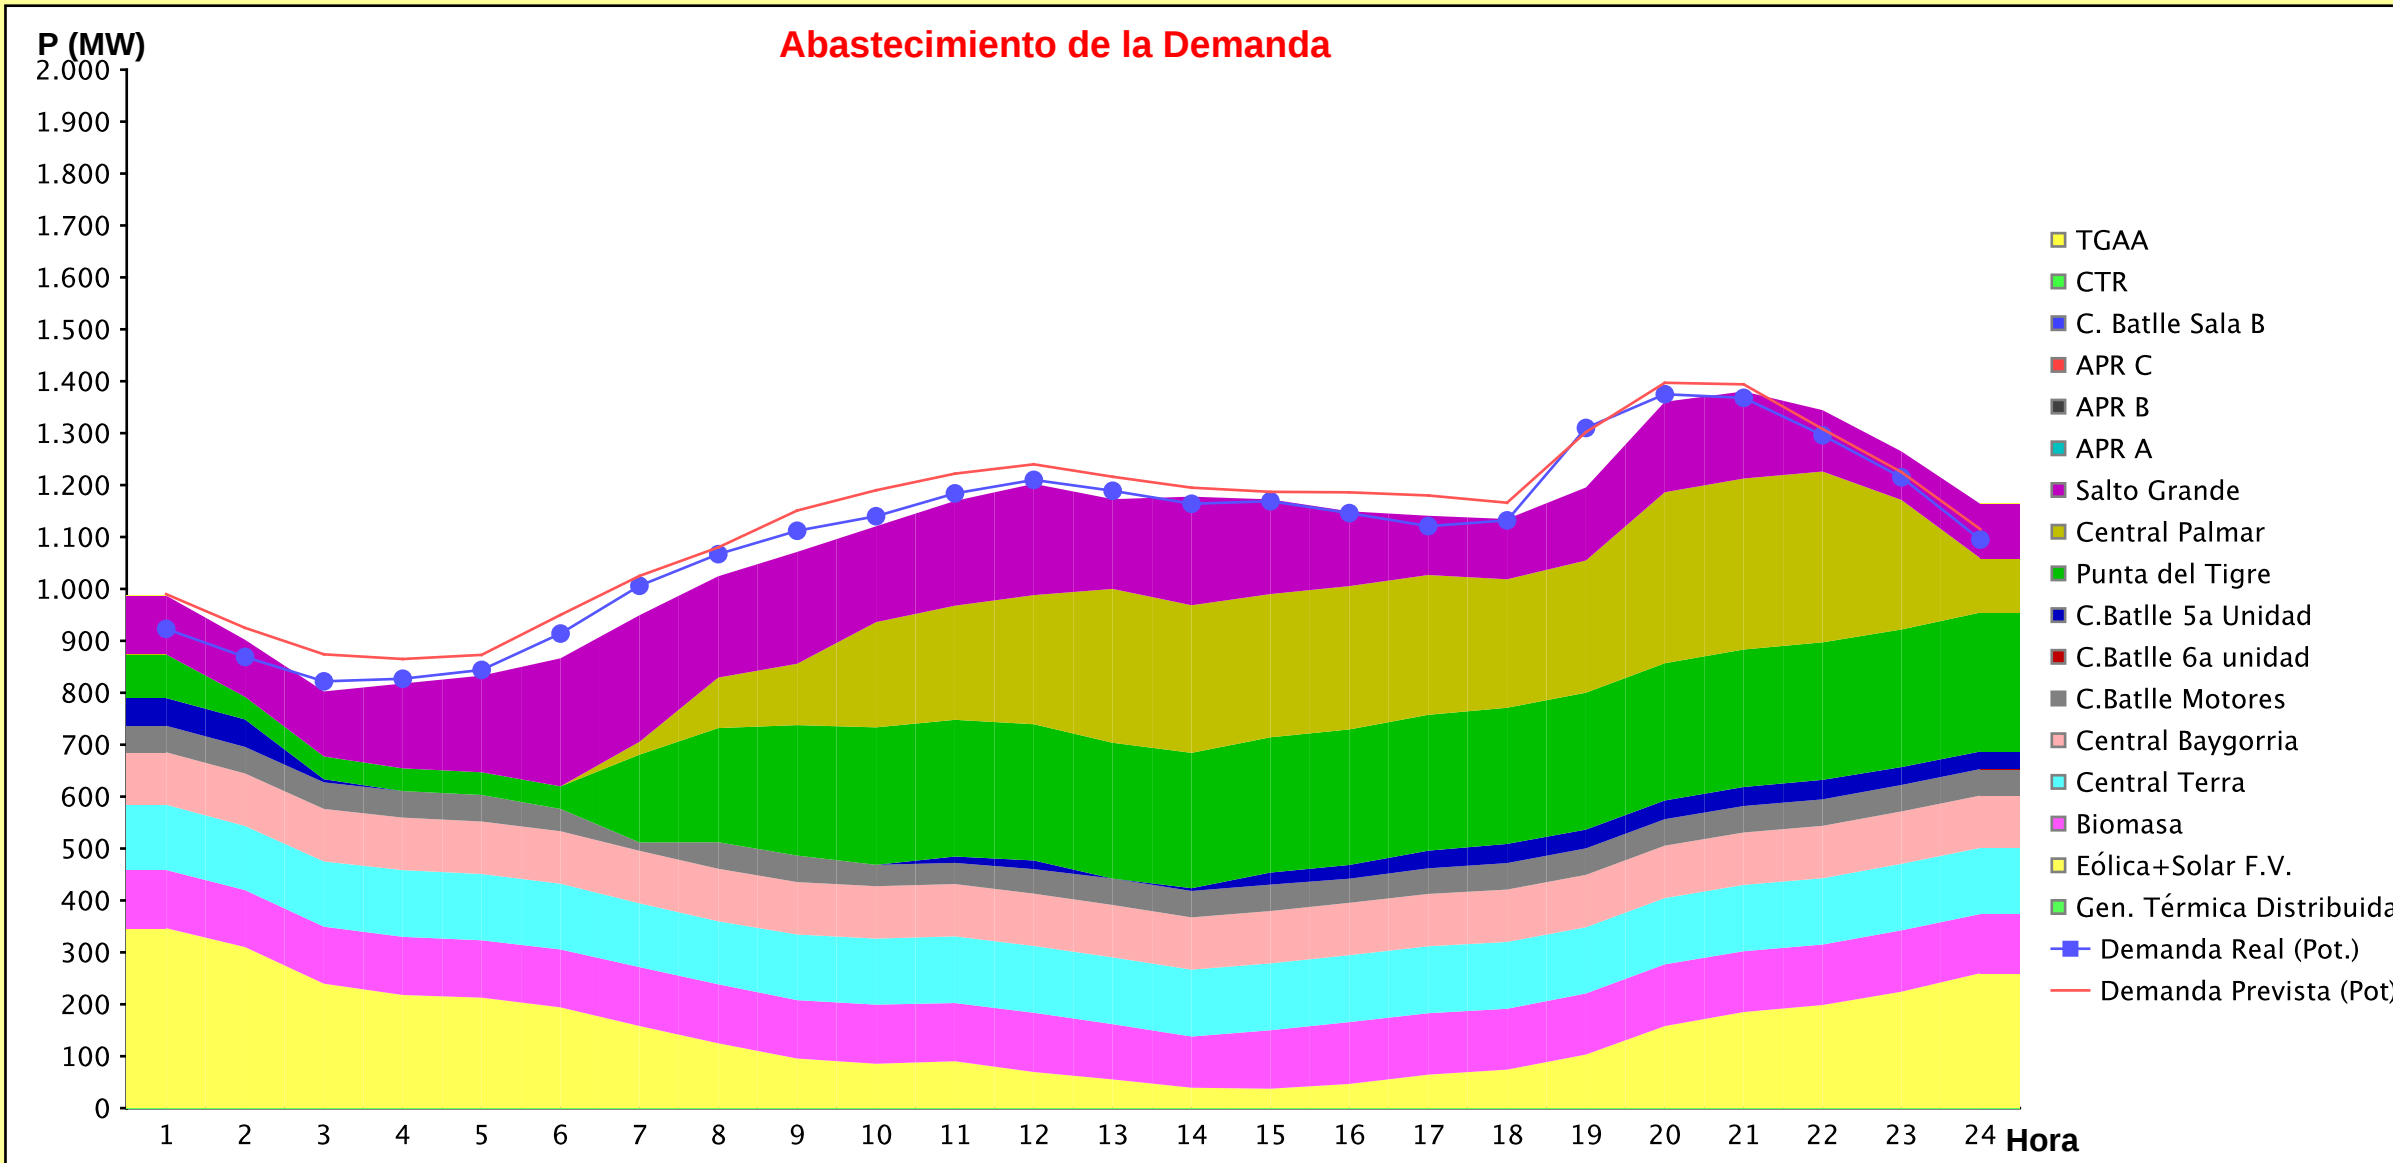

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.305
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.256
Diferencia (MWh)	-951
Ejecutada - Programada	-3,49 %


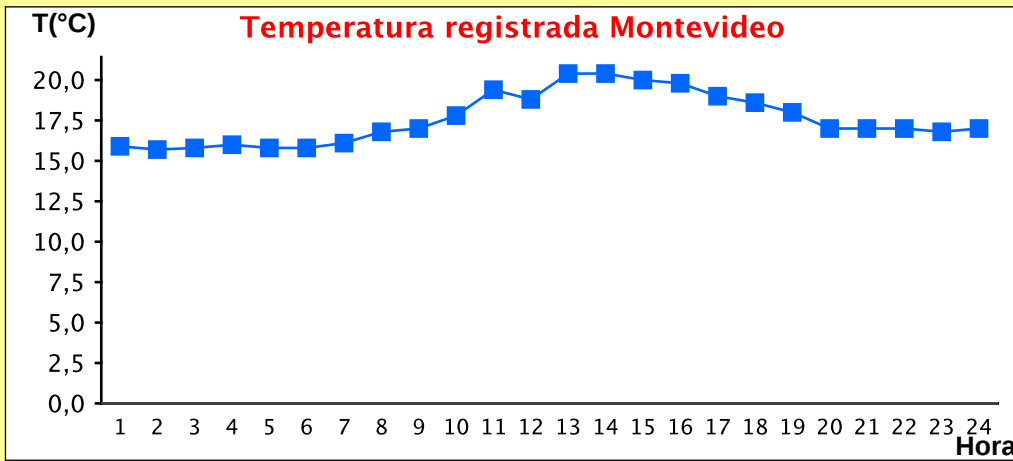


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1225,43 Hora 11:45
Potencia mínima:	785,1 Hora 03:07
Pico noche:	1385,74 Hora 20:38

Generación Media (MW)	
Eólica	150,3
Biomasa	113,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


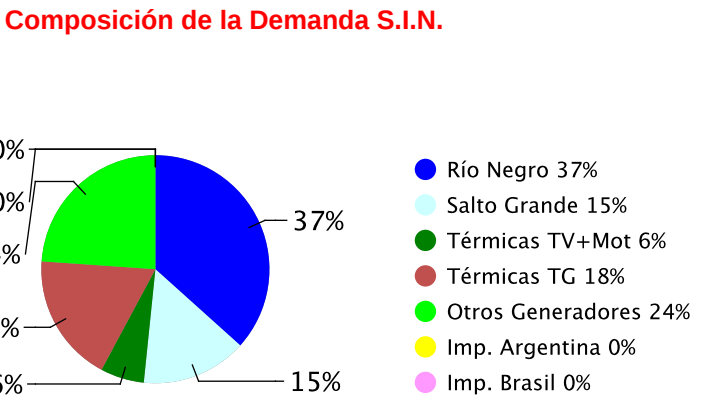


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

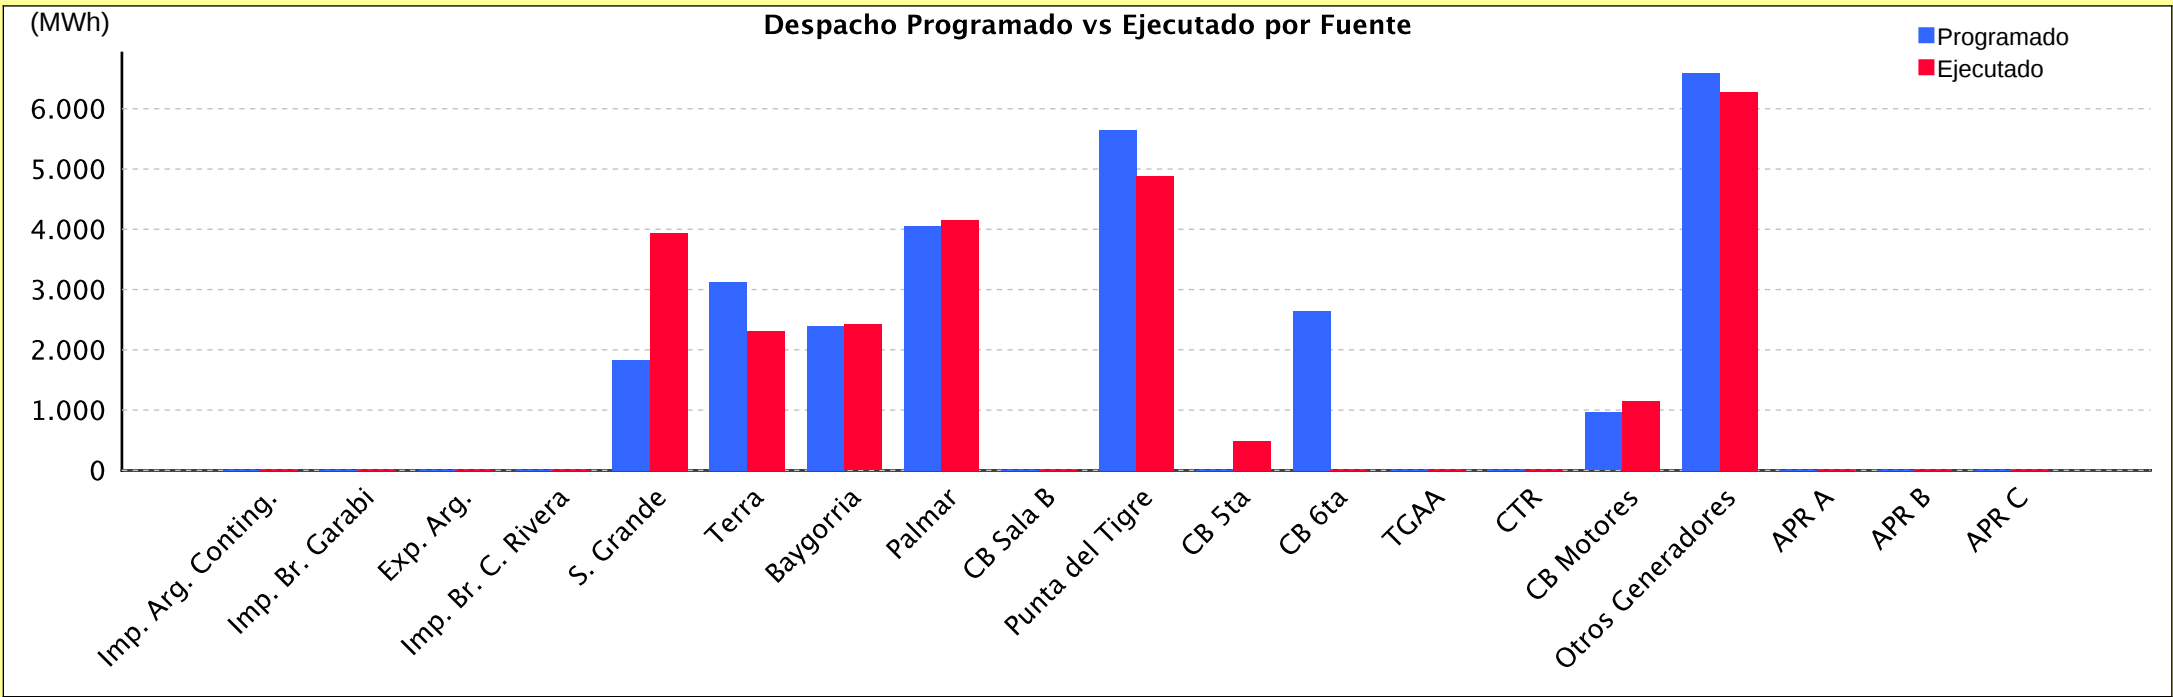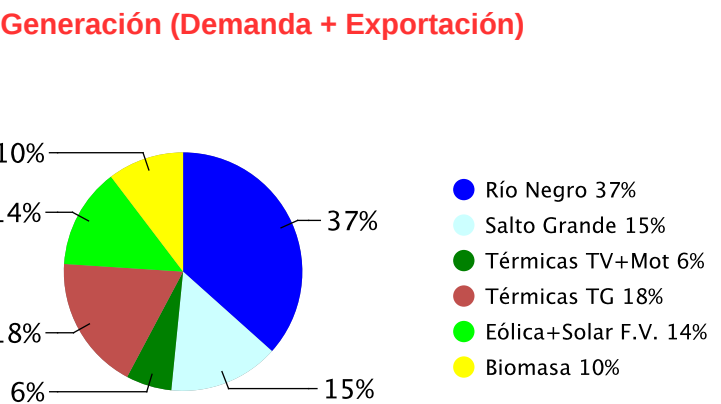



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

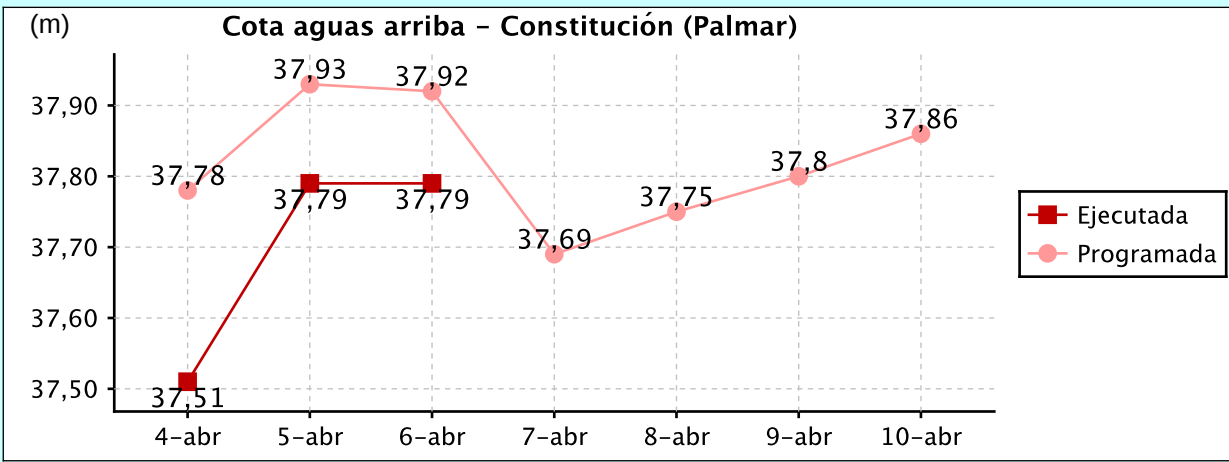
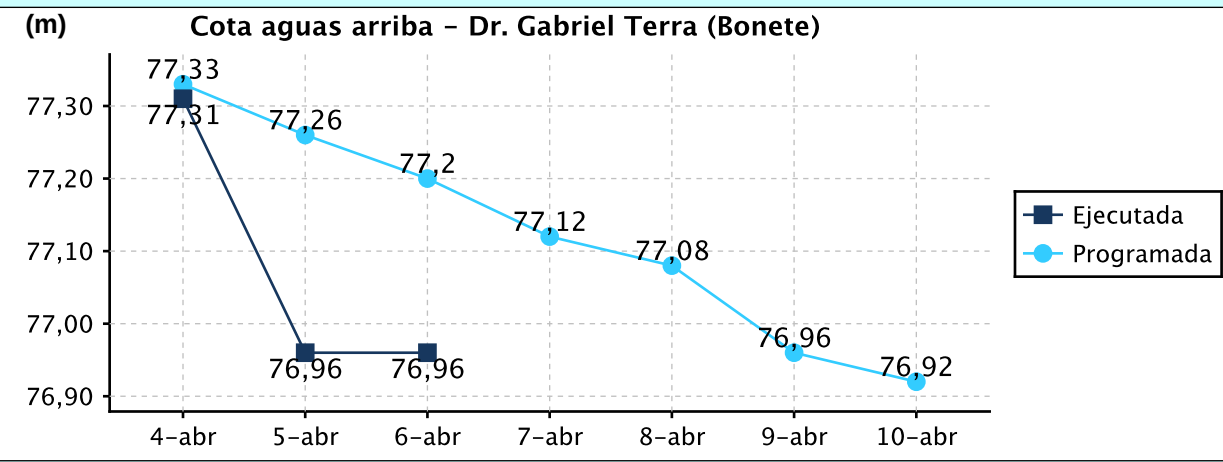


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,20	76,96
Baygorria	54,06	54,32
Palmar	37,92	37,79
SGU	34,87	34,61

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

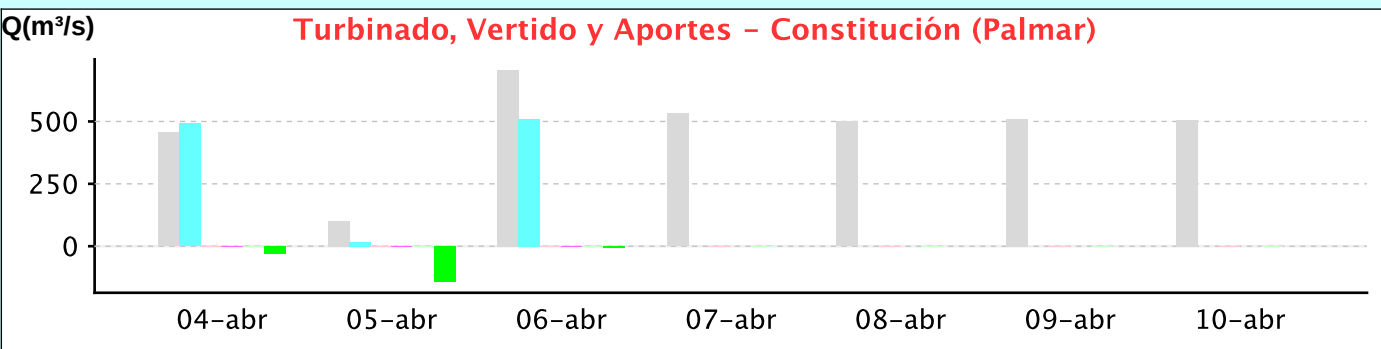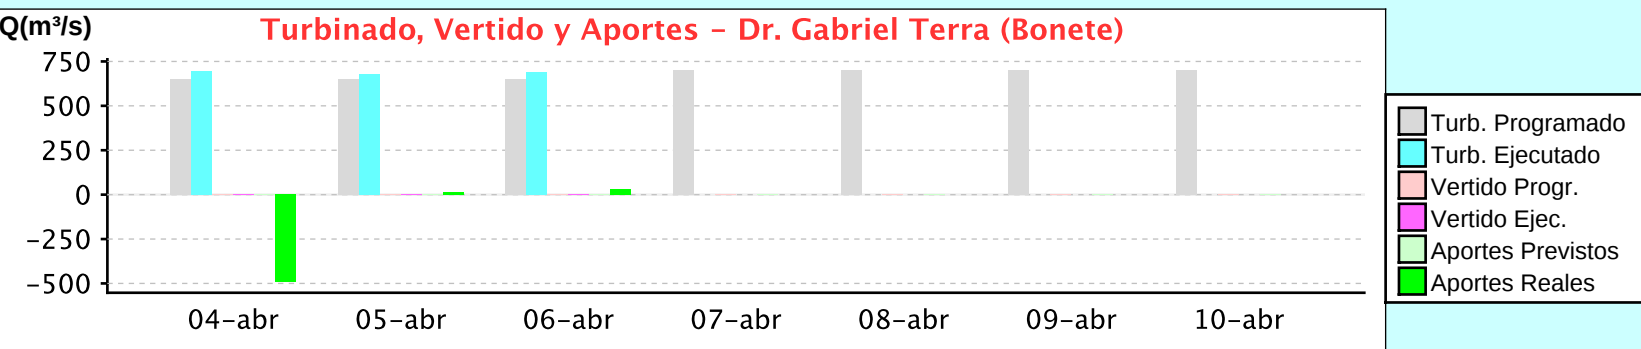

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

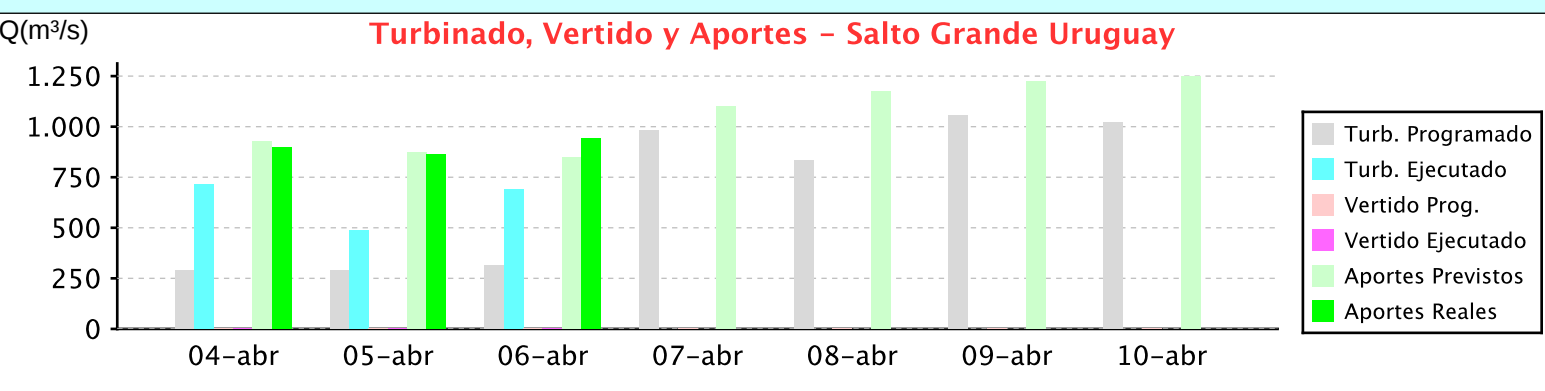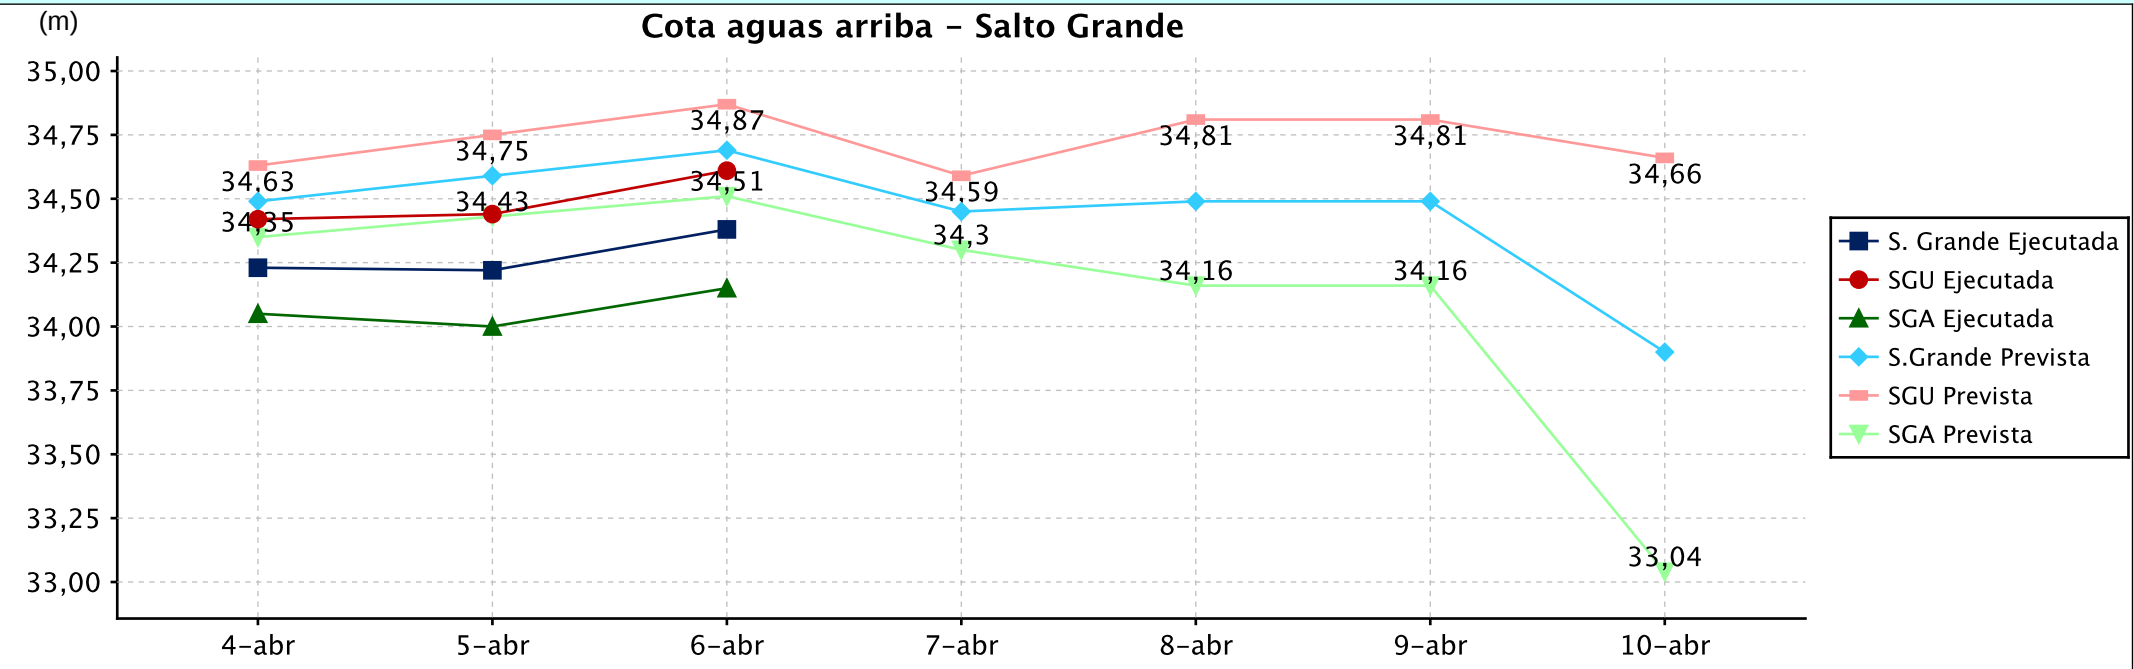

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,61
Cota Vista Arg	34,15
Cota real	34,38
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	10.031

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	649	690
Baygorria	770	672
Palmar	707	511
SGU	314	692

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	33
Baygorria	0	25
Palmar	0	-6
SGU	850	940

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
