




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 07 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	2.054
Sala B	-4
5ta.	888
6ta.	0
Motores	1.169
Central La Tablada	-83
Central P. del Tigre	5.756
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.059
C. Baygorria	2.046
C. Palmar	2.770
C. Salto Grande	4.901
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.523
TOTAL Generación	27.021

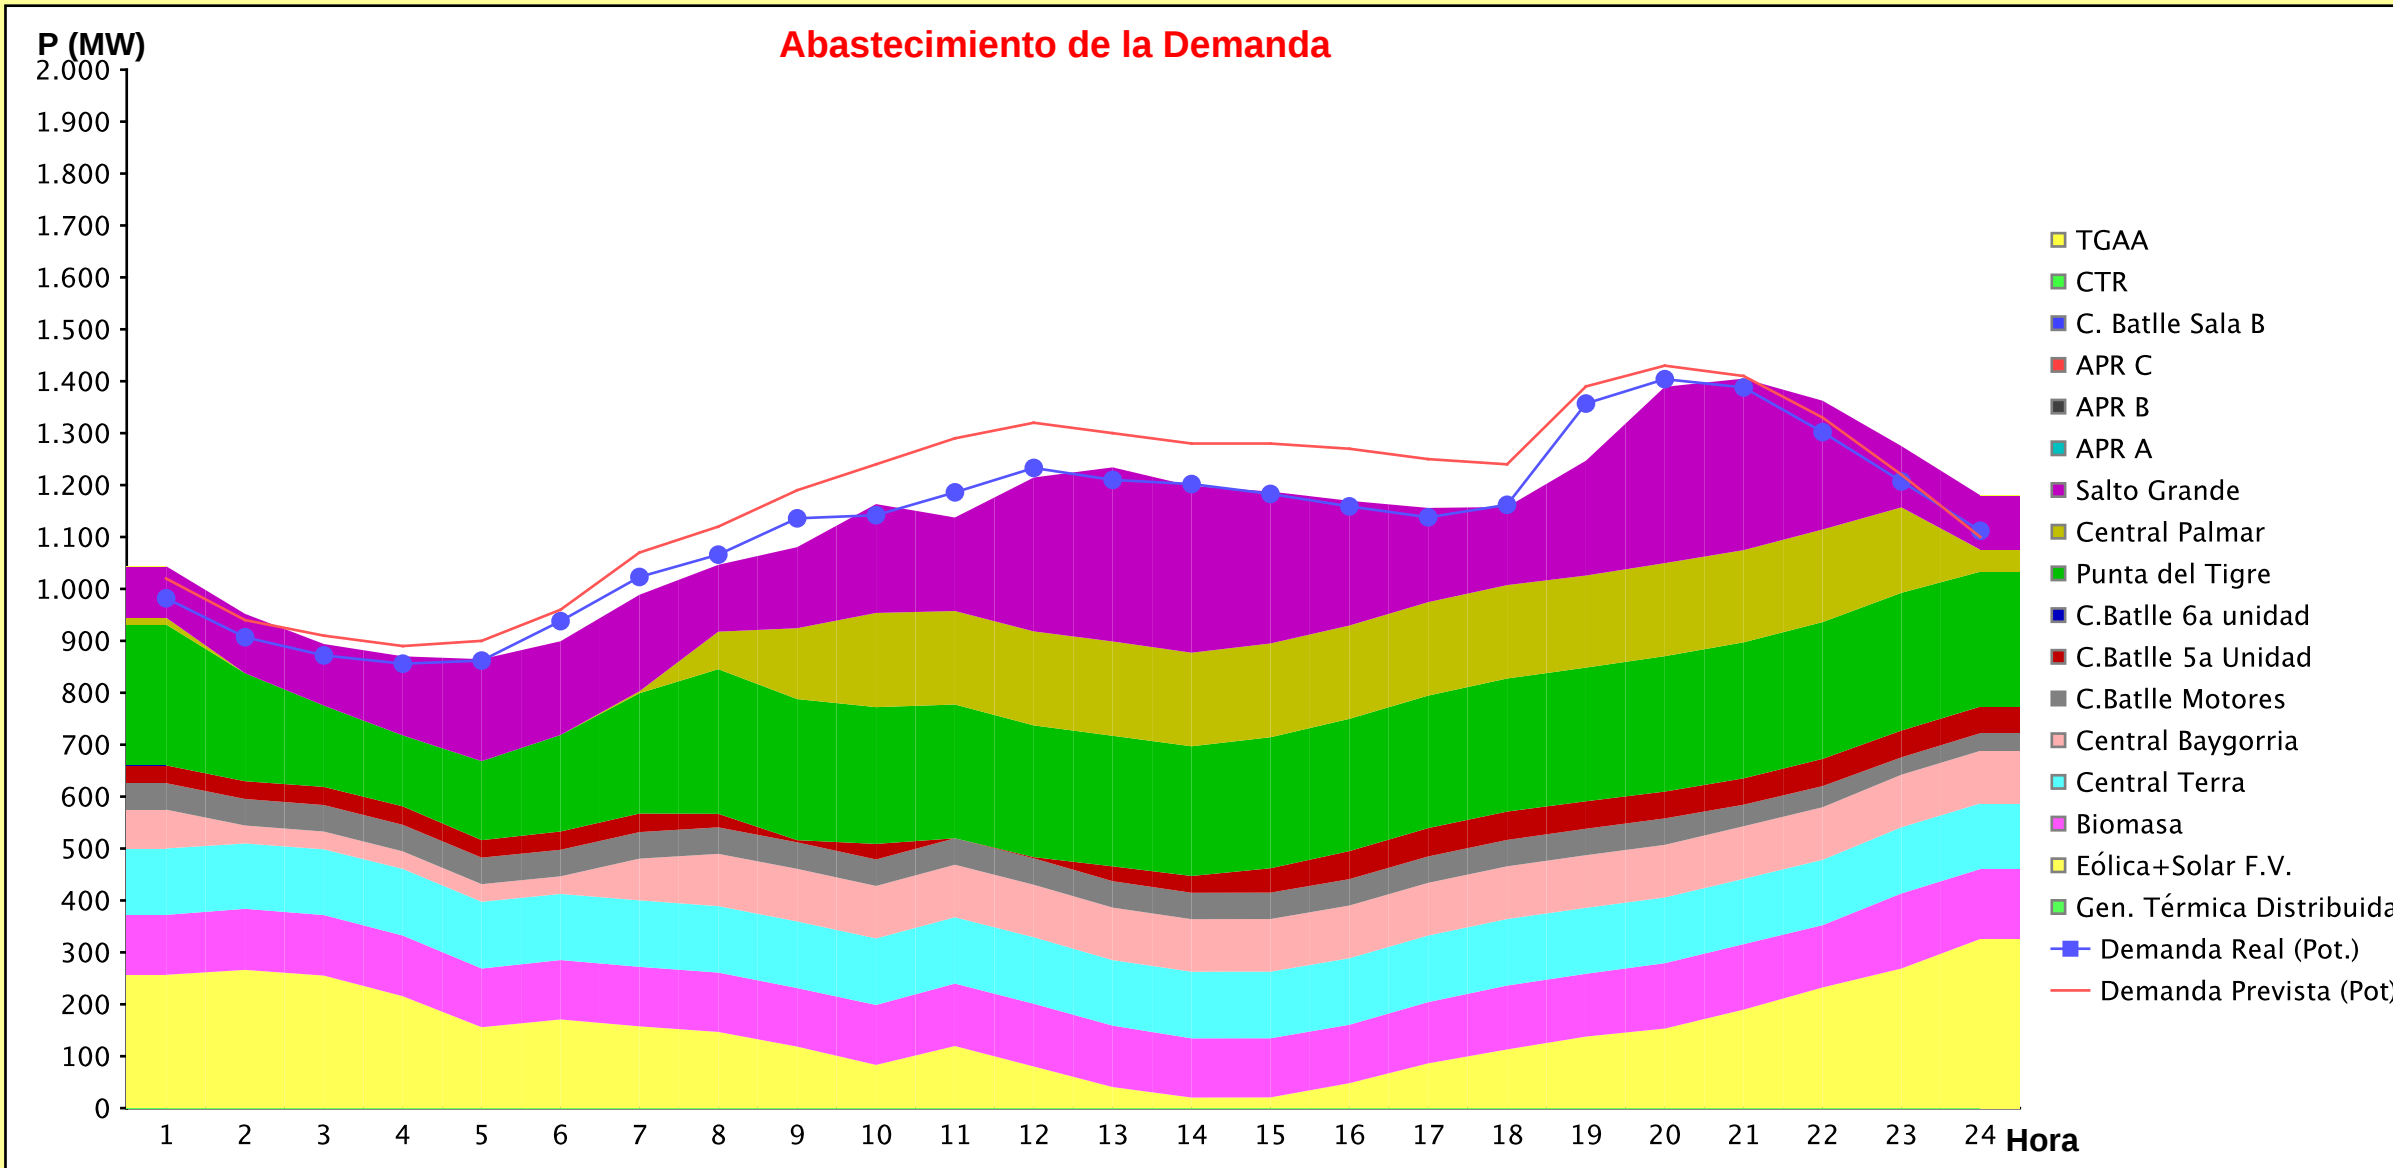

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.021
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.350
Diferencia (MWh)	-1.329
Ejecutada - Programada	-4,69 %

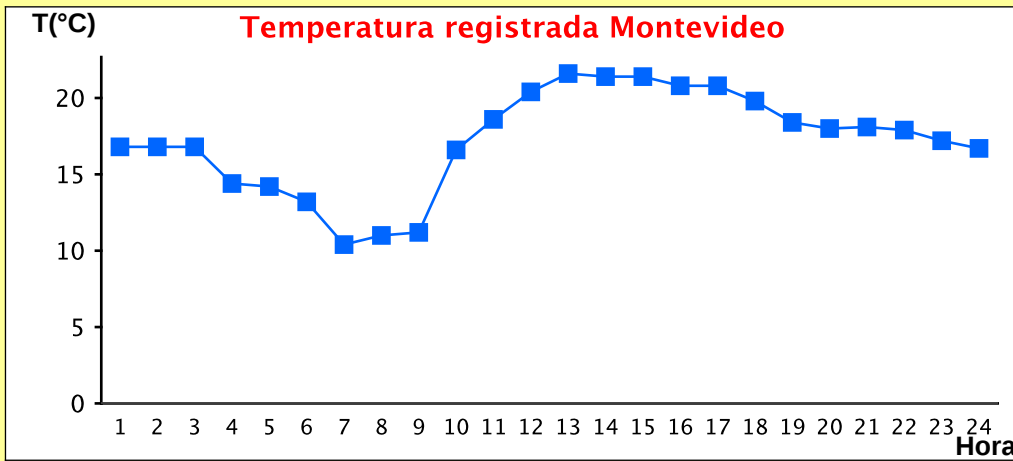


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1236,14 Hora 11:52
Potencia mínima:	830,15 Hora 03:53
Pico noche:	1399,14 Hora 20:05

Generación Media (MW)	
Eólica	153,5
Biomasa	119,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

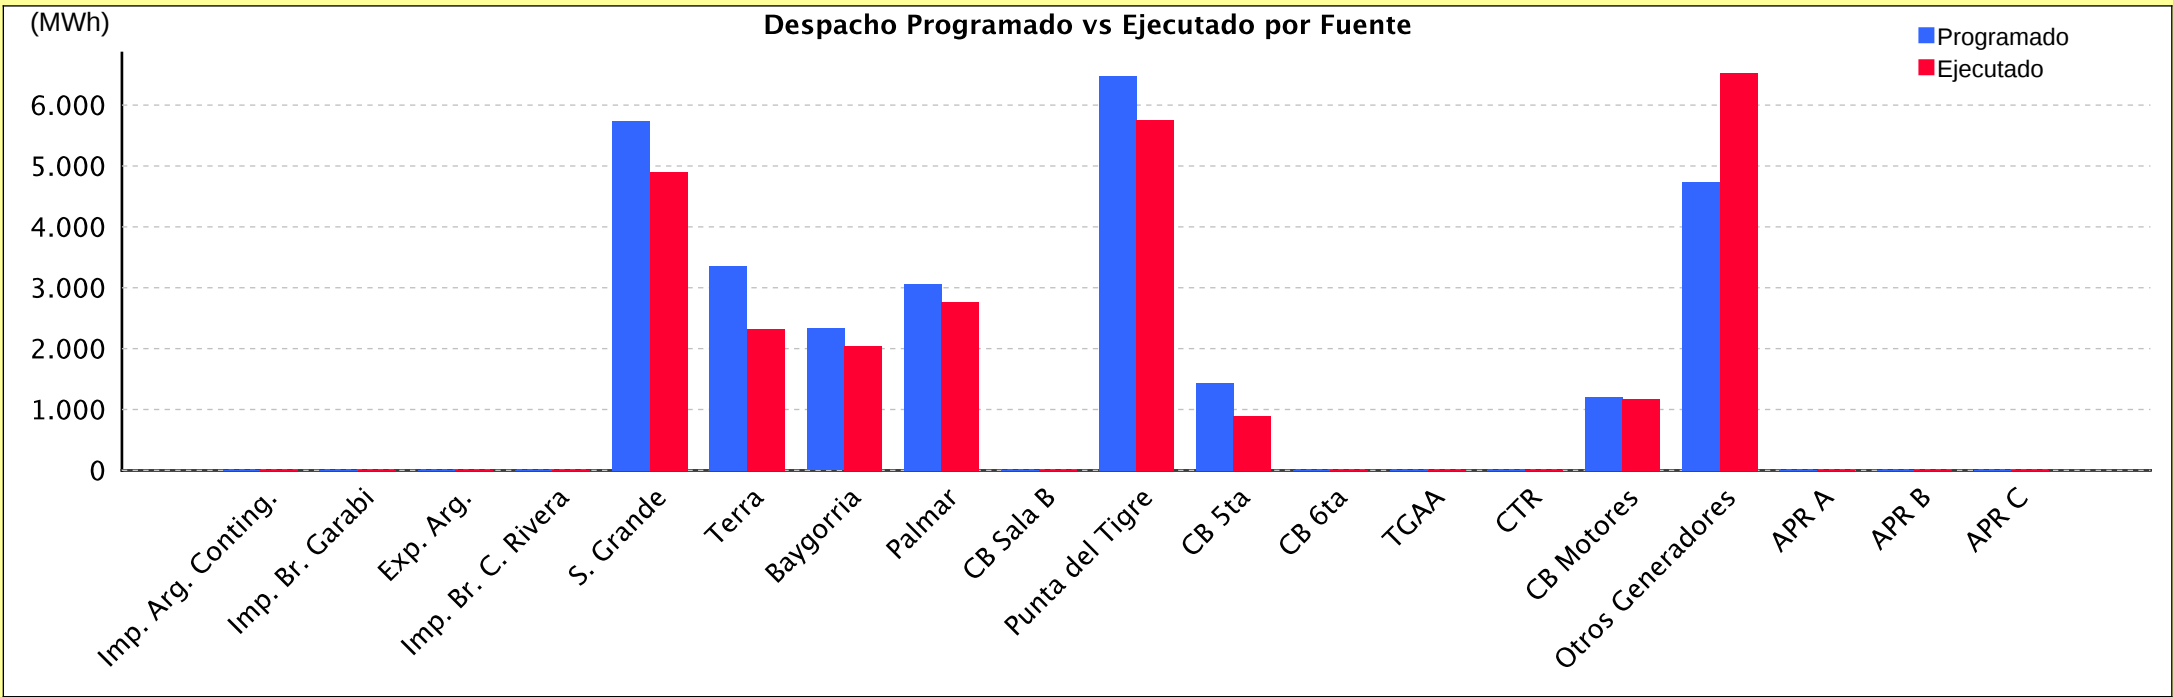
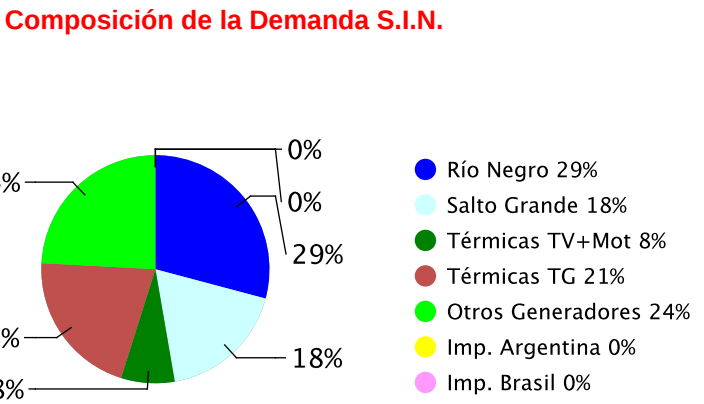


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

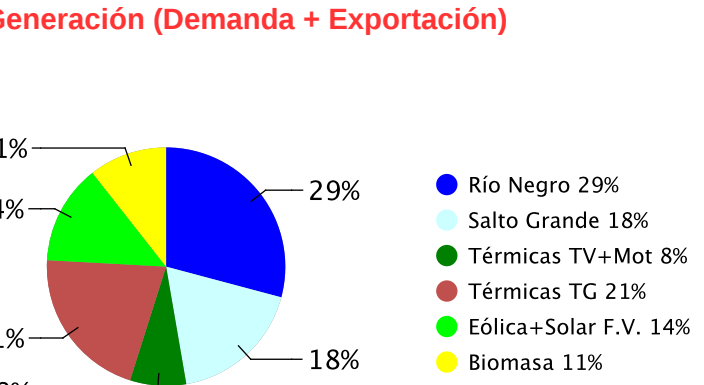



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

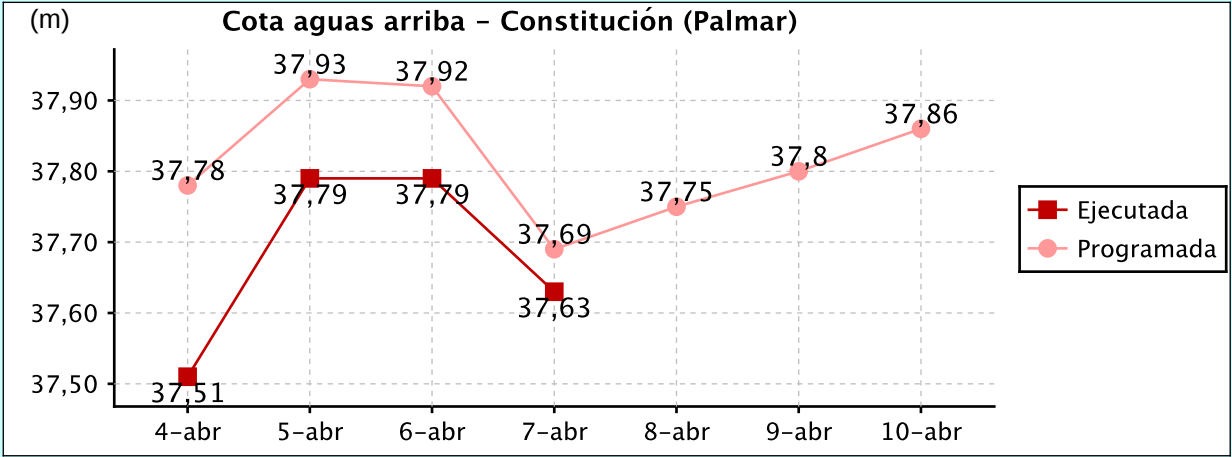
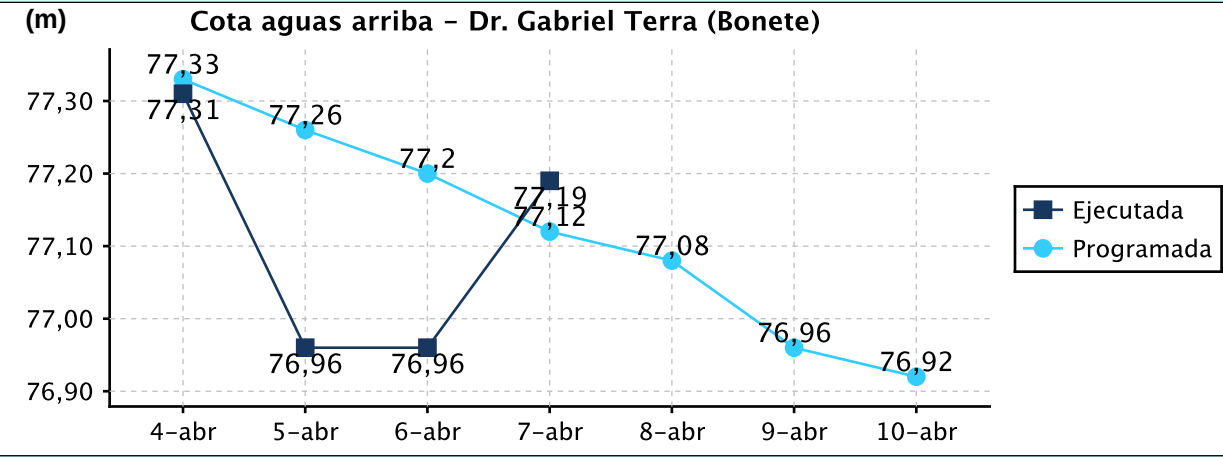


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,12	77,19
Baygorria	54,23	54,24
Palmar	37,69	37,63
SGU	34,59	34,73

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

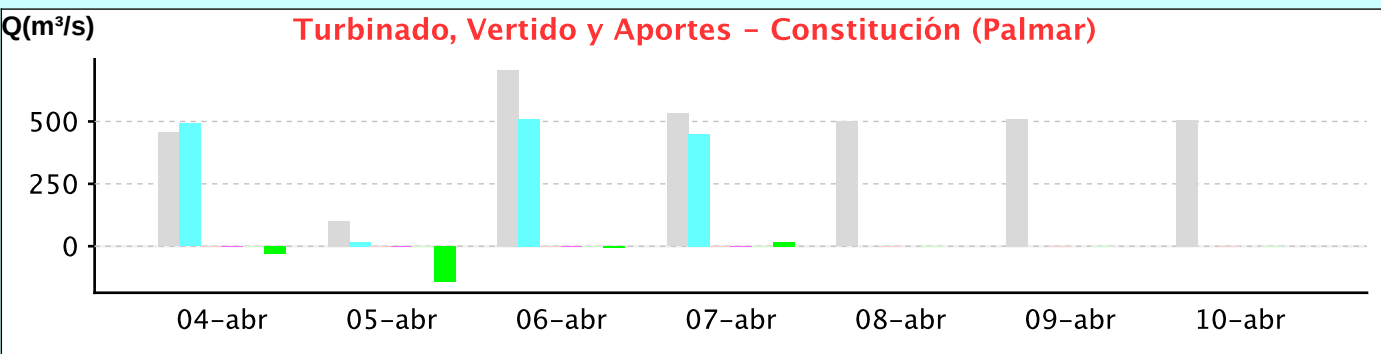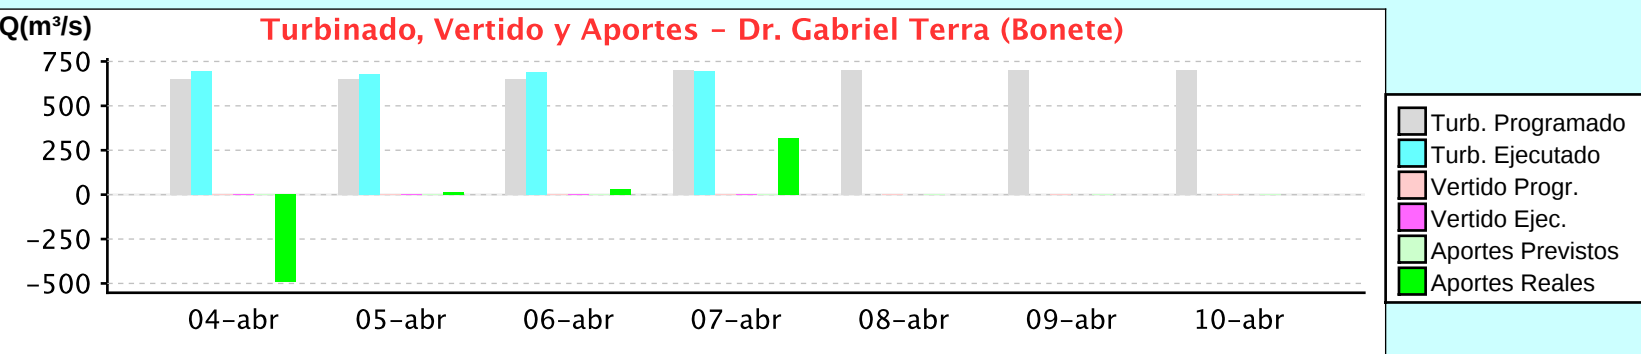

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

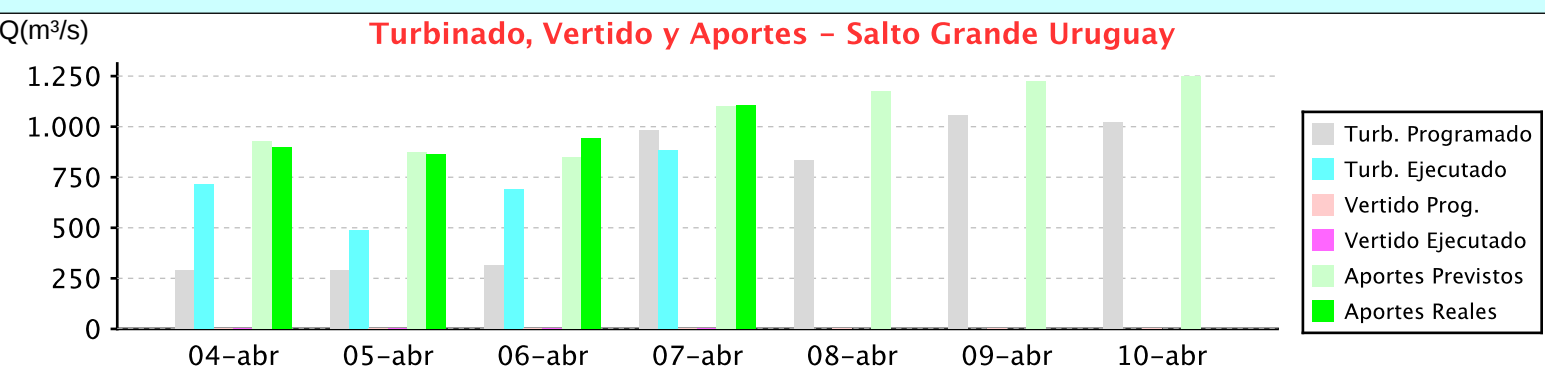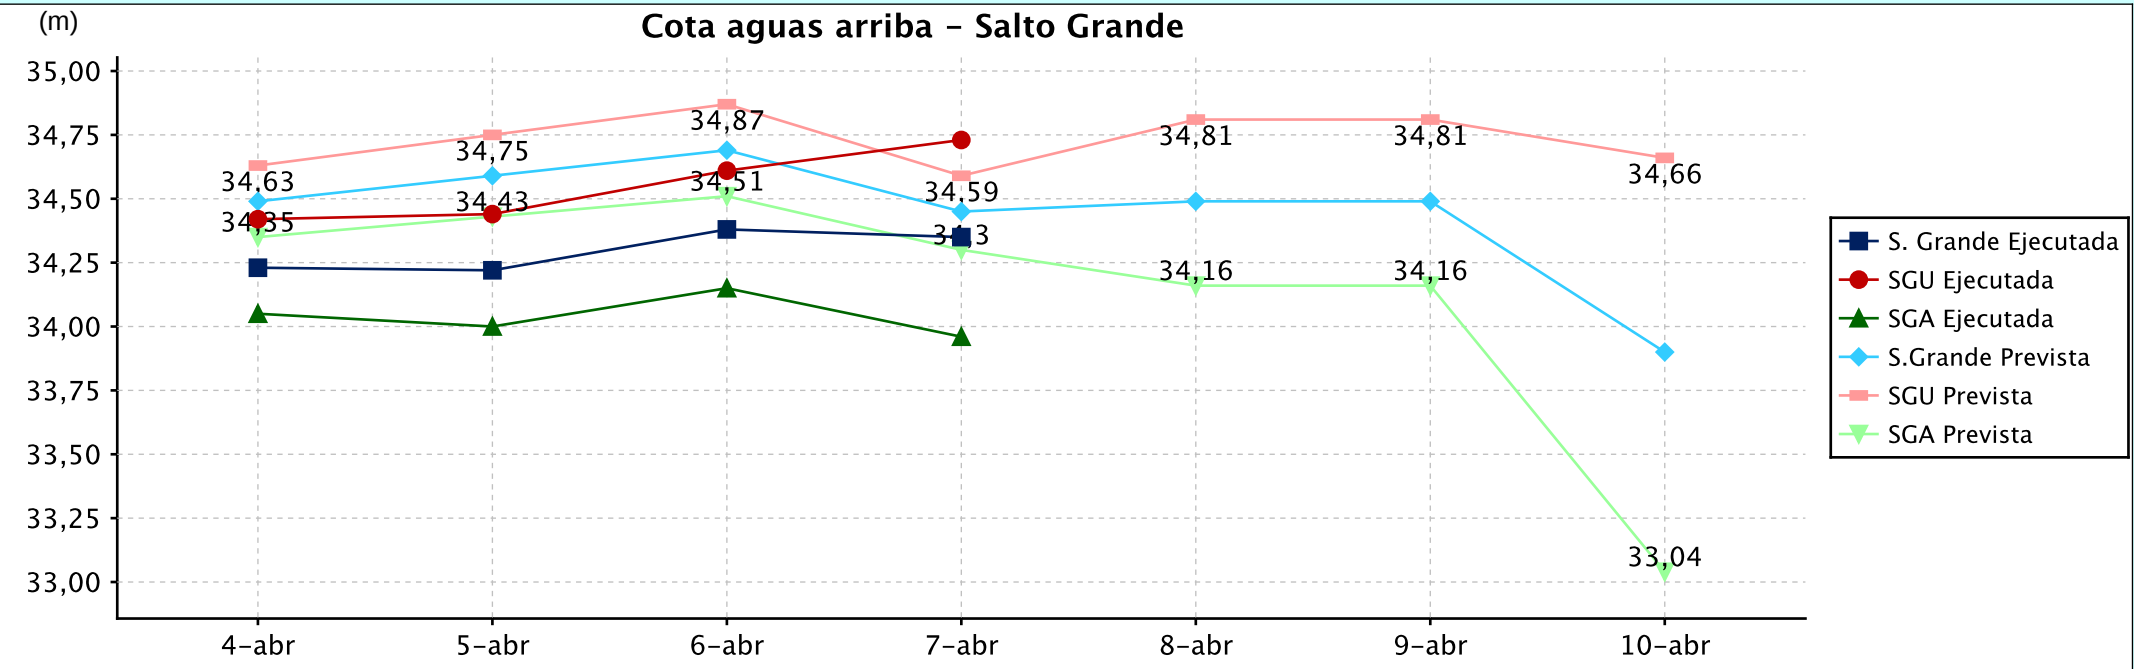

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,73
Cota Vista Arg	33,96
Cota real	34,35
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
16.864	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	699	695
Baygorria	748	622
Palmar	533	449
SGU	982	882

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	316
Baygorria	0	-6
Palmar	0	16
SGU	1.100	1.104

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
