




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 11 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Batlle	1.452
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.455
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	6.249
APR A	-2
APR B	675
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.024
C. Baygorria	2.443
C. Palmar	20
C. Salto Grande	5.852
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.333
TOTAL Generación	26.003

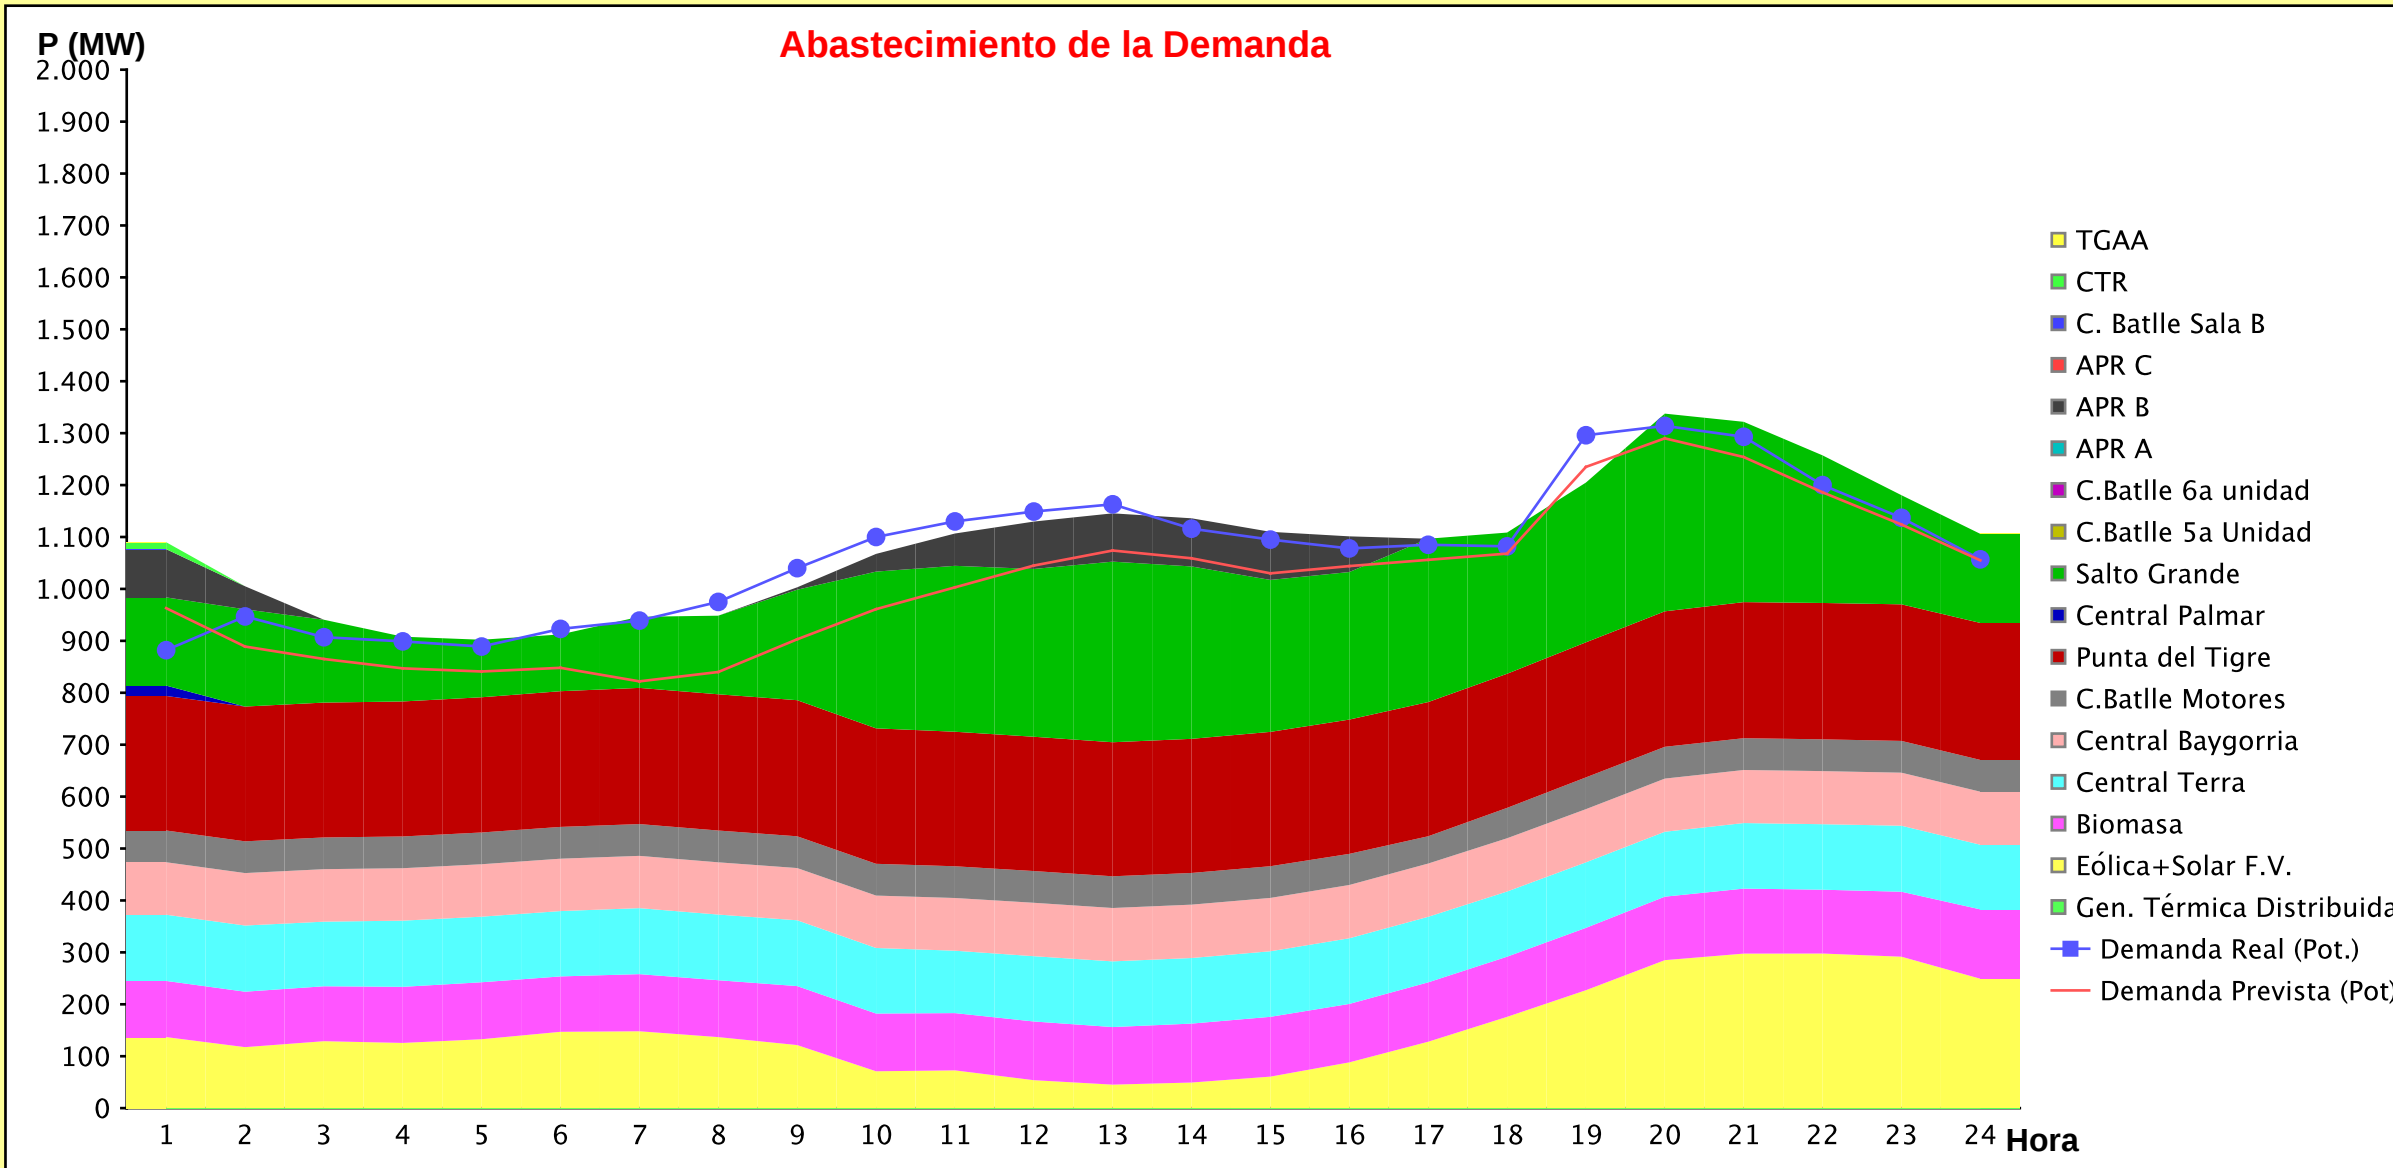

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.003
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	24.302
Diferencia (MWh)	1.701
Ejecutada - Programada	7,00 %

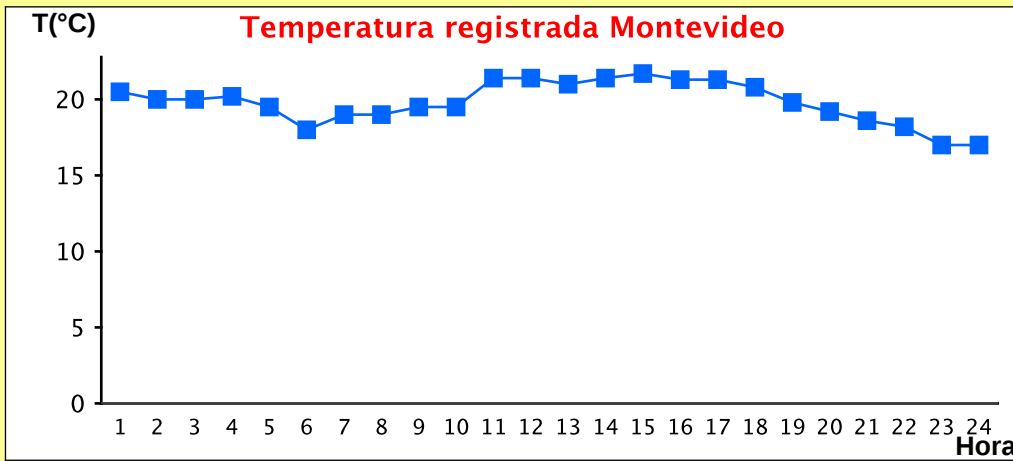

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1156,93 Hora 12:59
Potencia mínima:	906,54 Hora 05:23
Pico noche:	1358,72 Hora 19:31



Generación Media (MW)	
Eólica	150,1
Biomasa	114,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

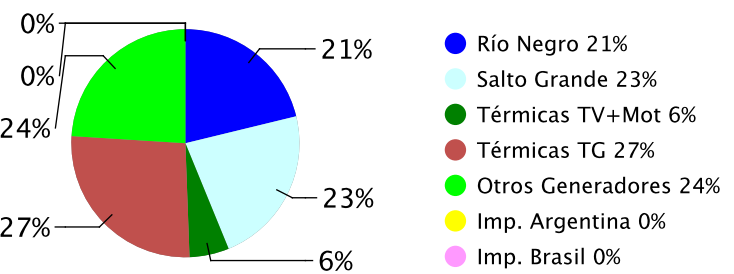



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

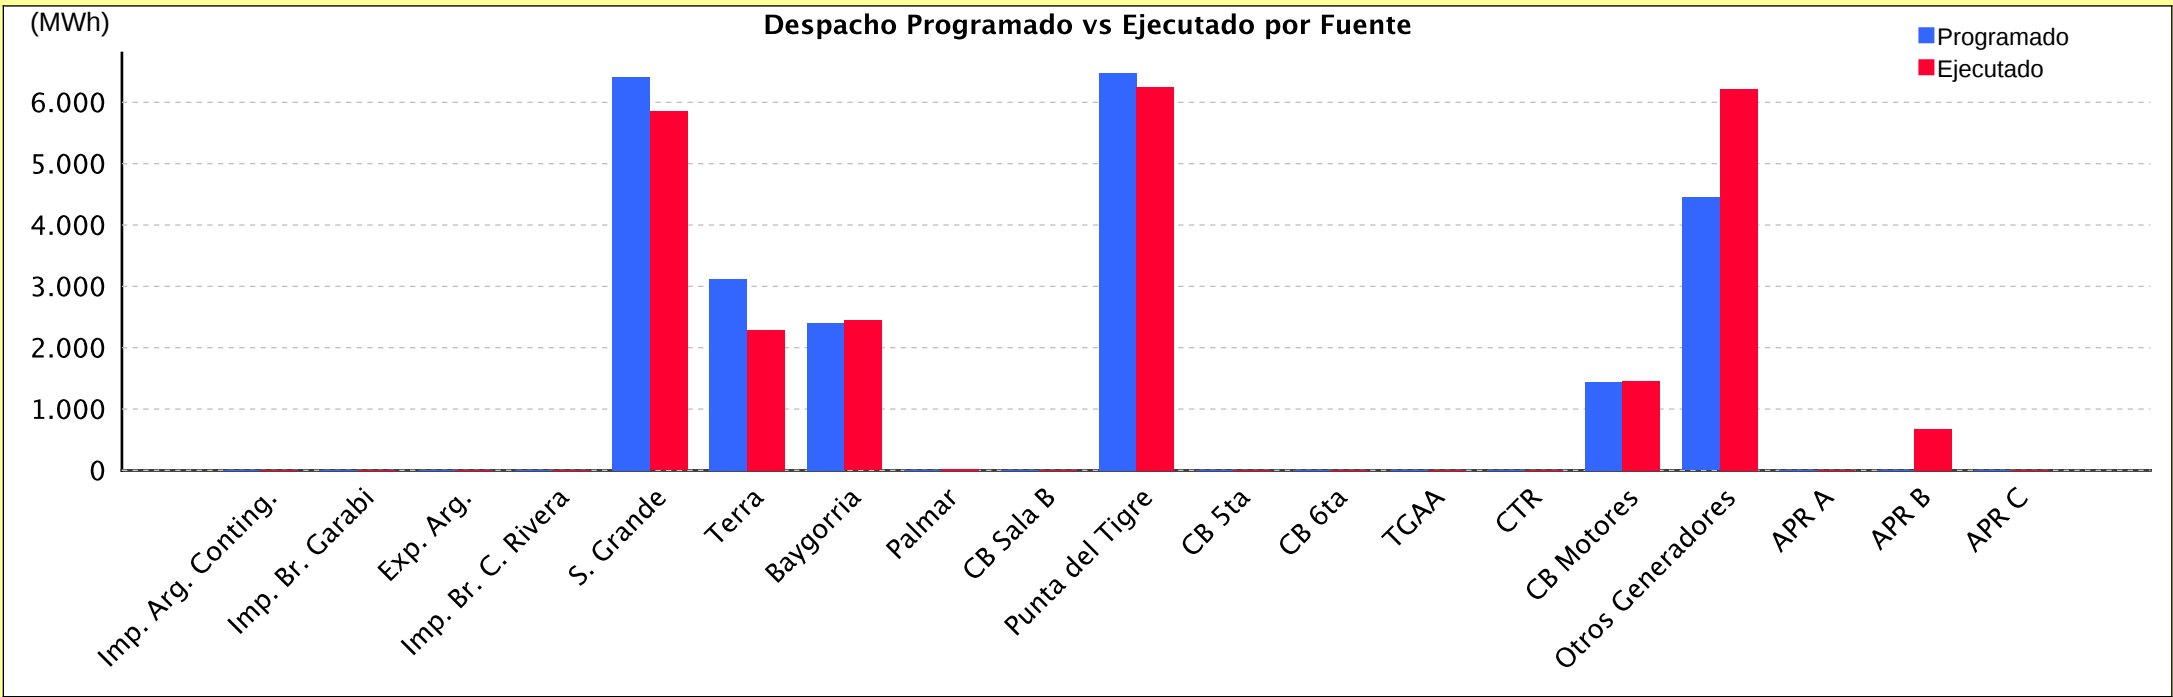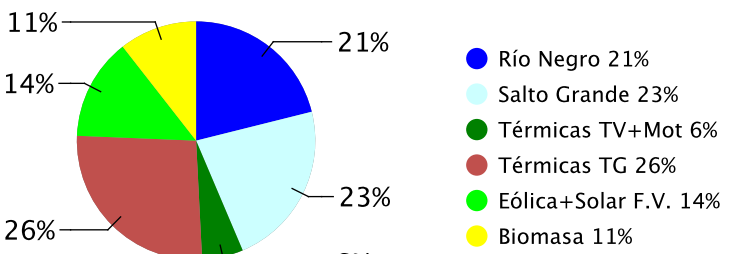



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

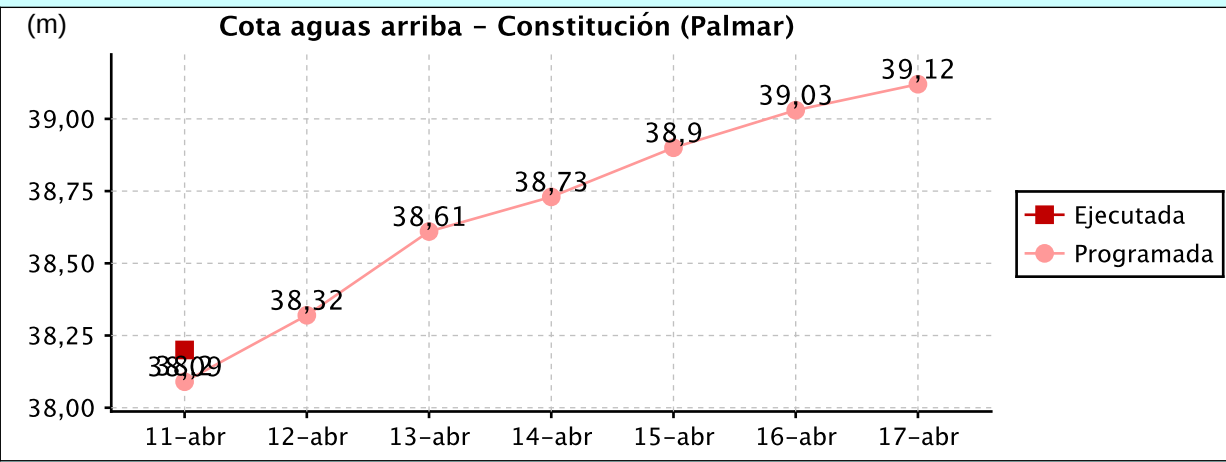
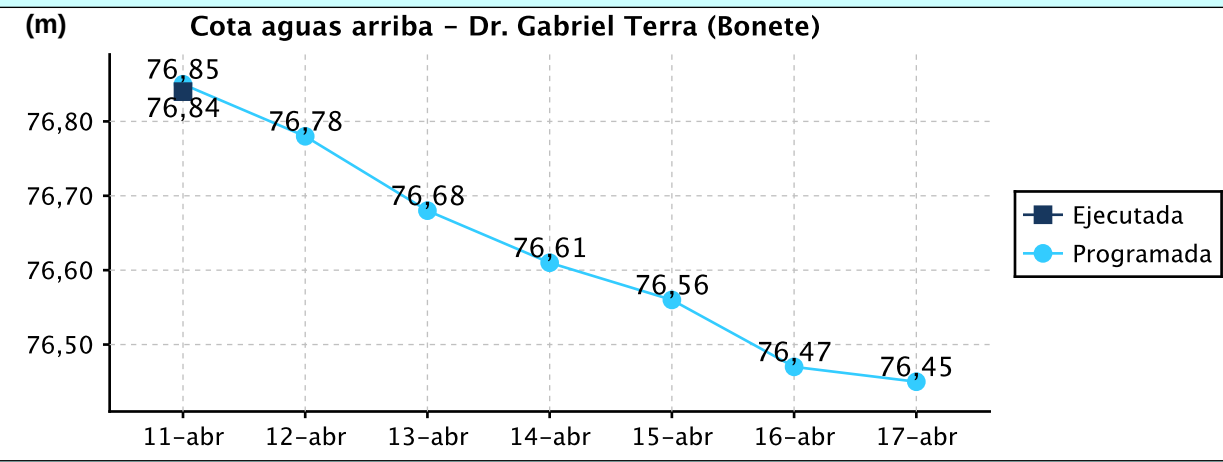


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,85	76,84
Baygorria	54,29	54,21
Palmar	38,09	38,2
SGU	34,58	34,73

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

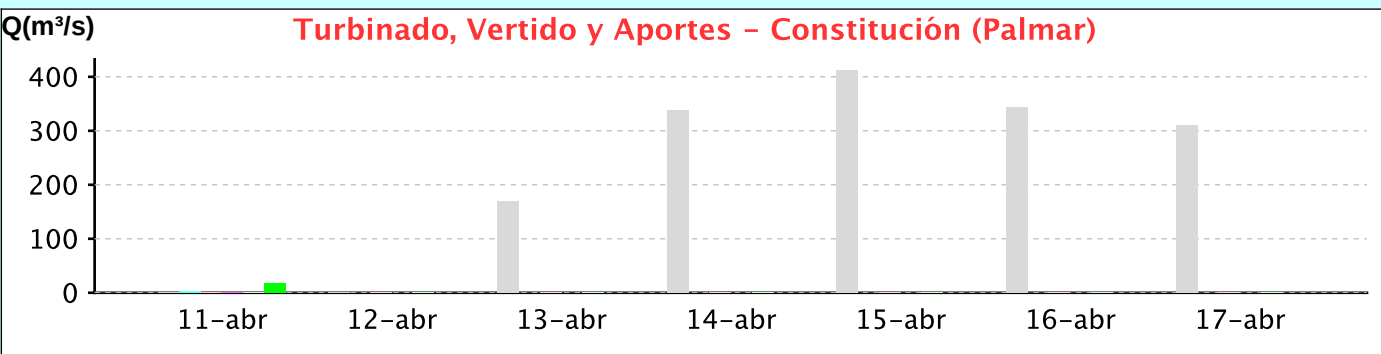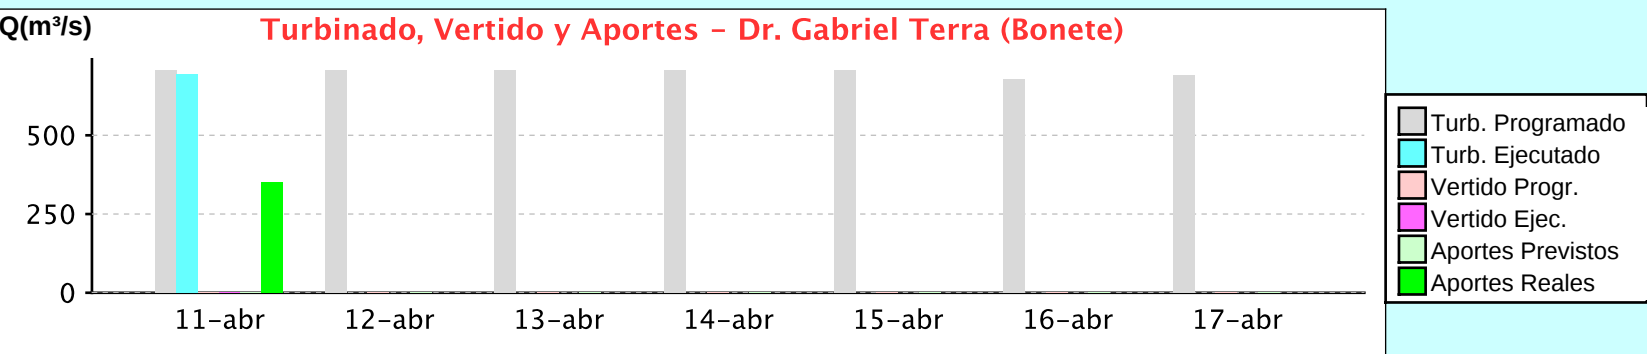

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

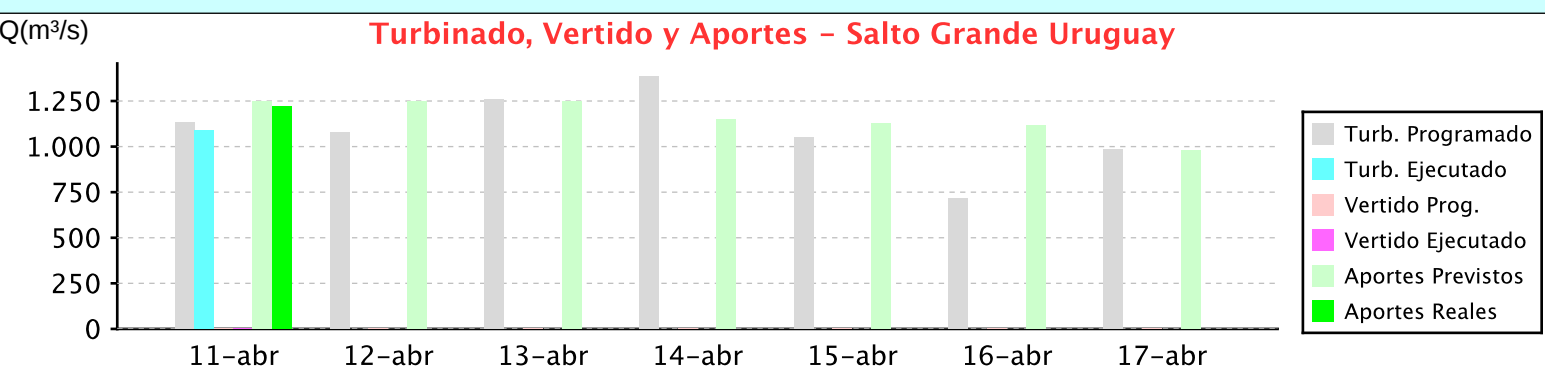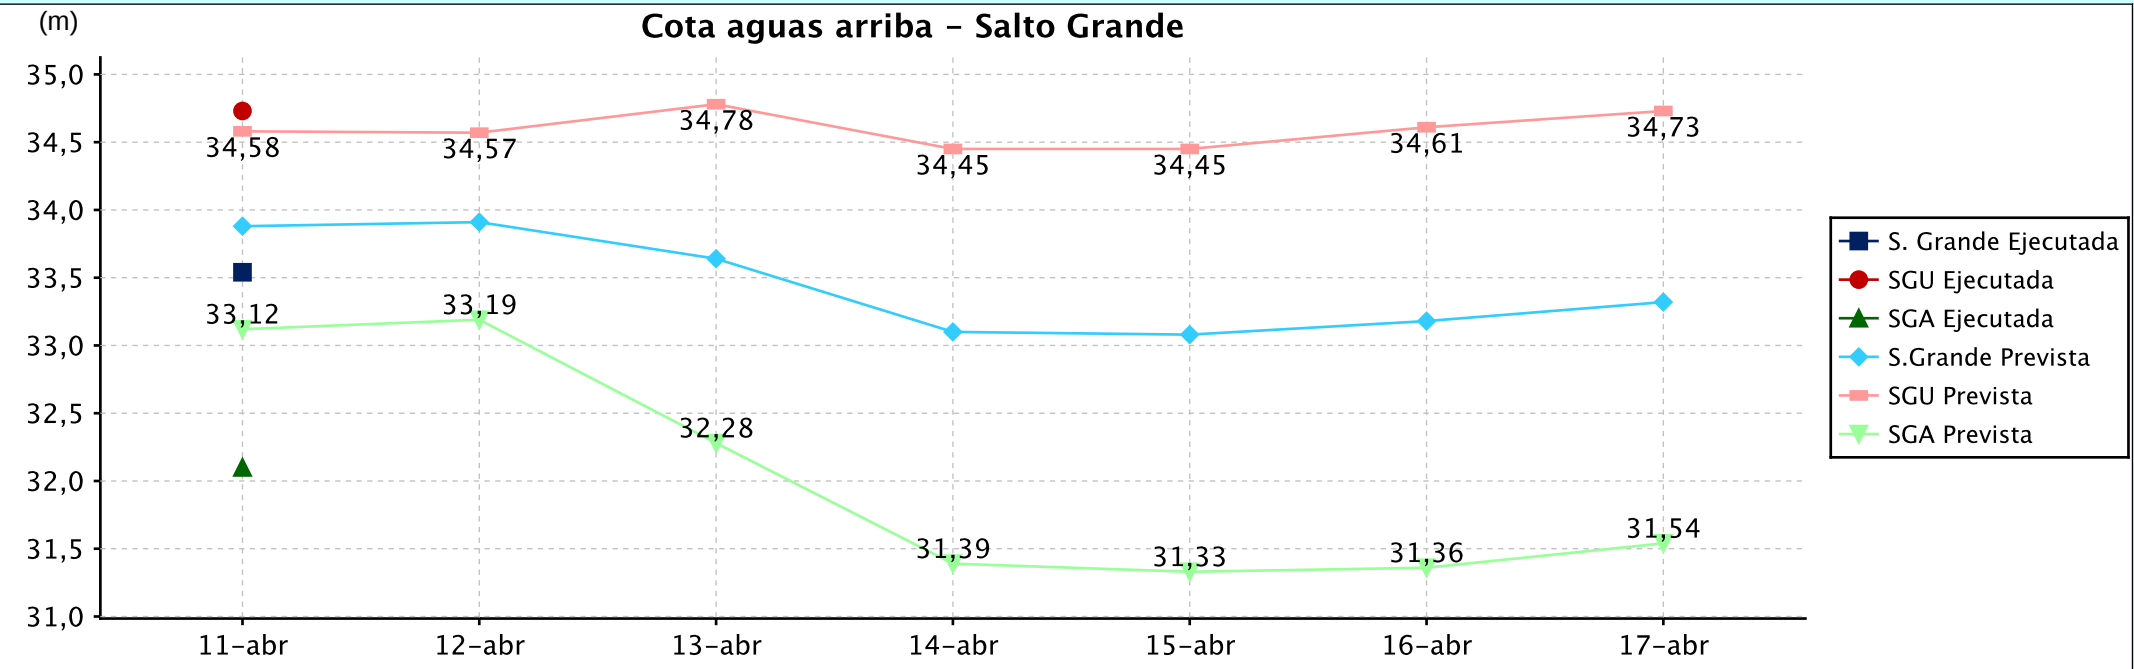

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,73
Cota Vista Arg	32,10
Cota real	33,54
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
50.007	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	706	695
Baygorria	729	765
Palmar	0	3
SGU	1.135	1.090

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	351
Baygorria	0	21
Palmar	0	18
SGU	1.250	1.218

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
