




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 12 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.307
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.311
Central La Tablada	-101
Central P. del Tigre	4.789
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.011
C. Baygorria	2.429
C. Palmar	0
C. Salto Grande	5.849
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.301
TOTAL Generación	23.579

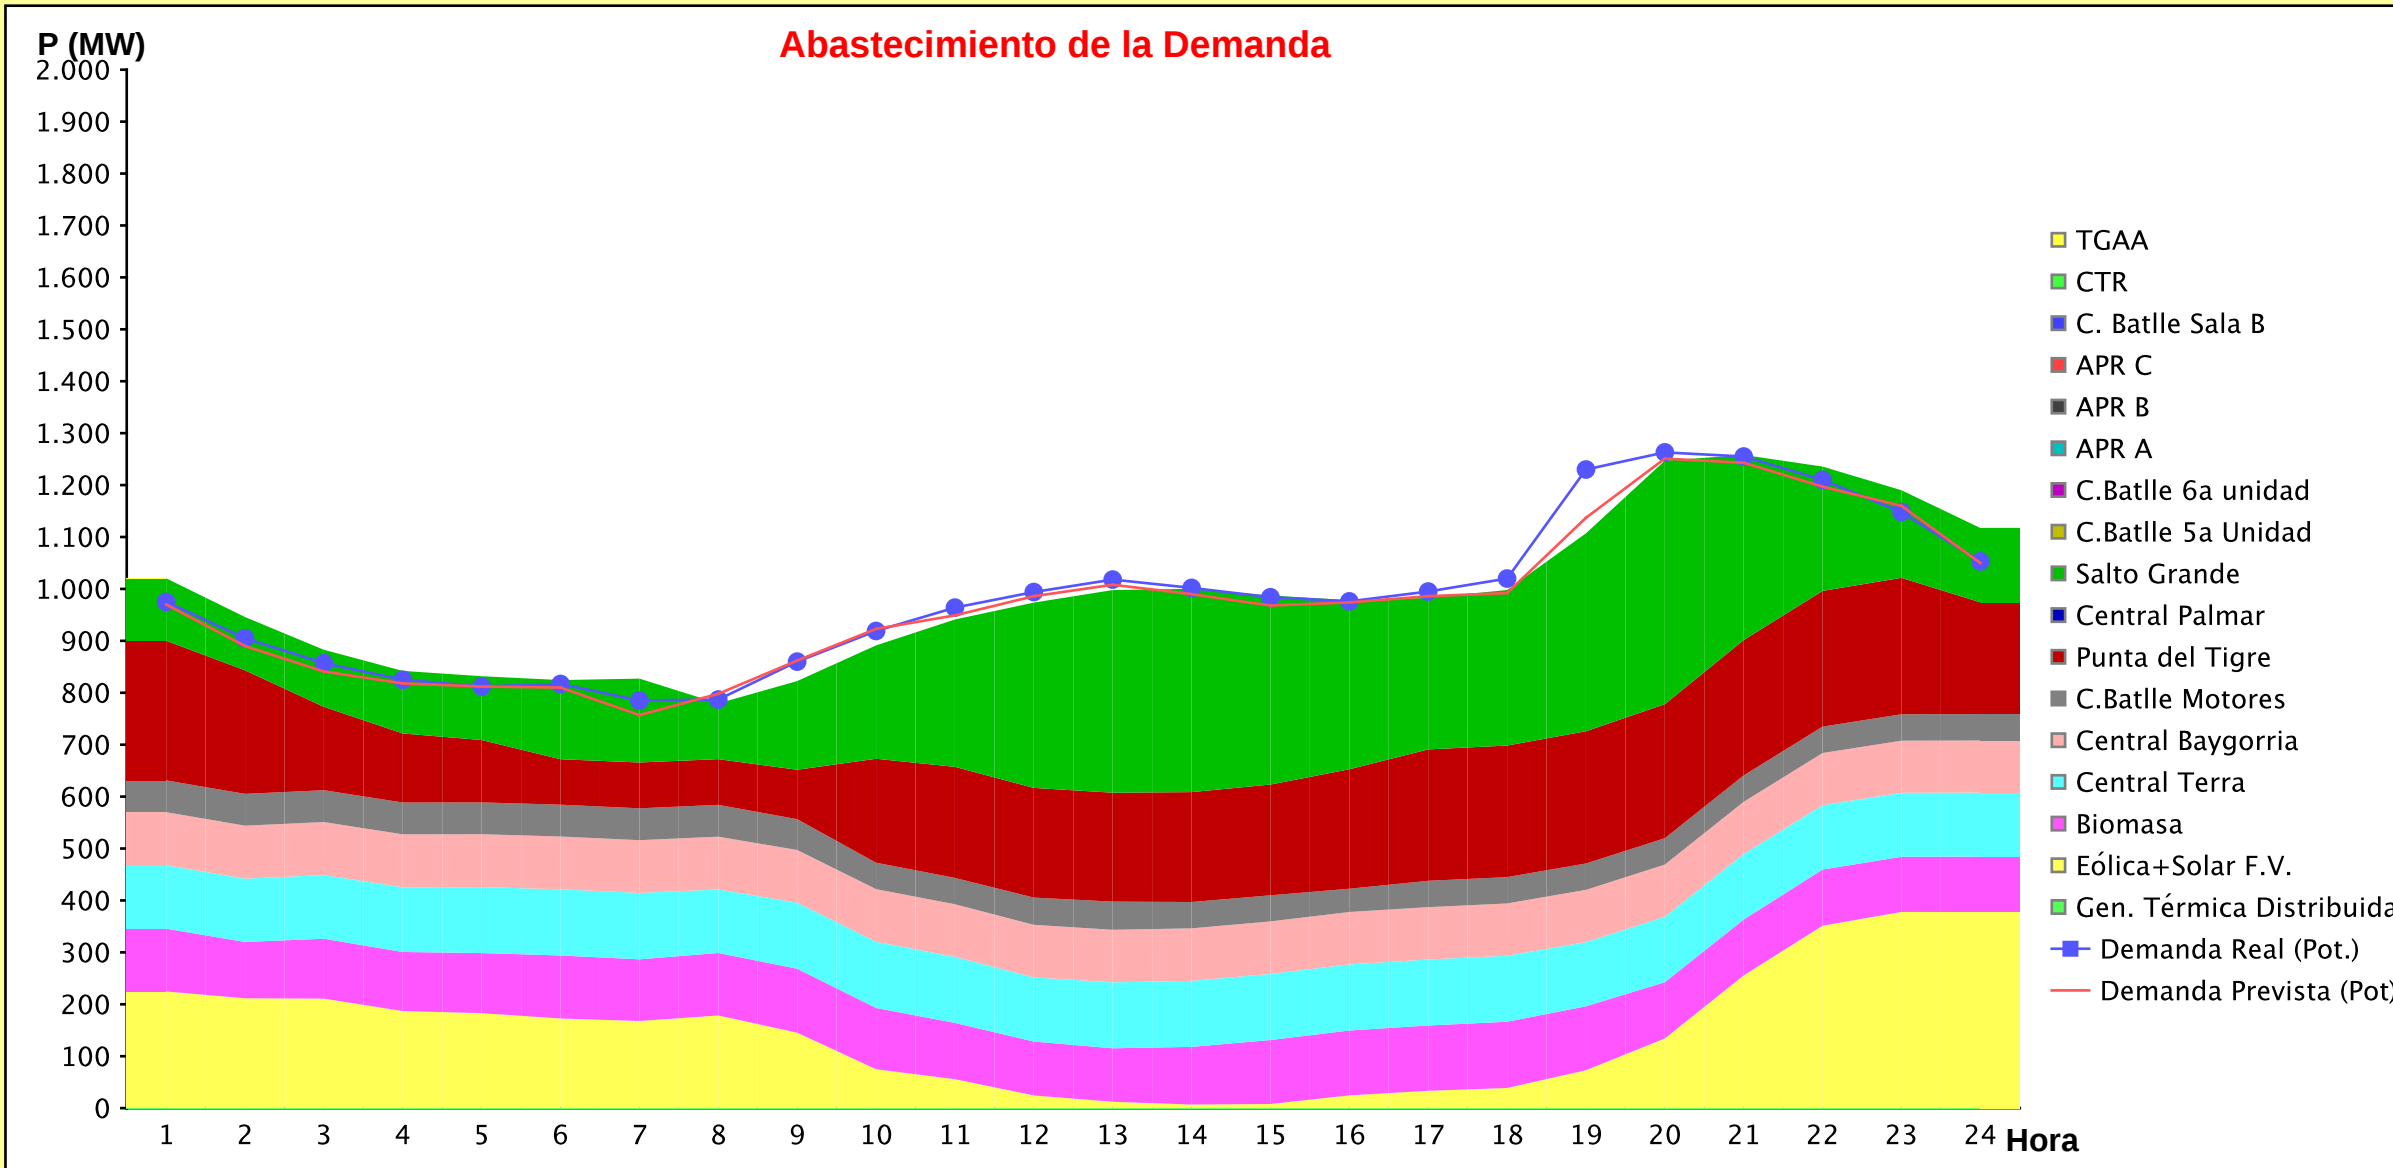

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.579
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	23.372
Diferencia (MWh)	207
Ejecutada - Programada	0,88 %

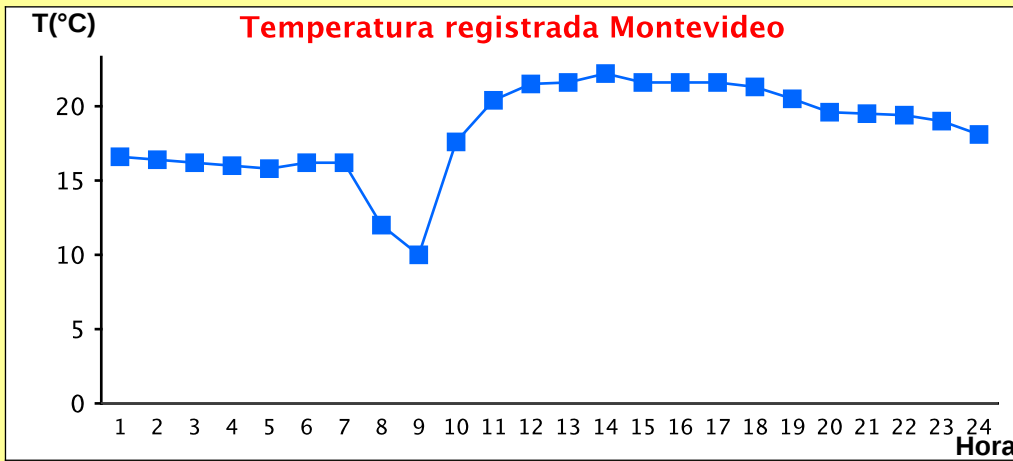


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1019,17 Hora 13:02
Potencia mínima:	765,42 Hora 07:21
Pico noche:	1260,77 Hora 20:03

Generación Media (MW)	
Eólica	147,5
Biomasa	115,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

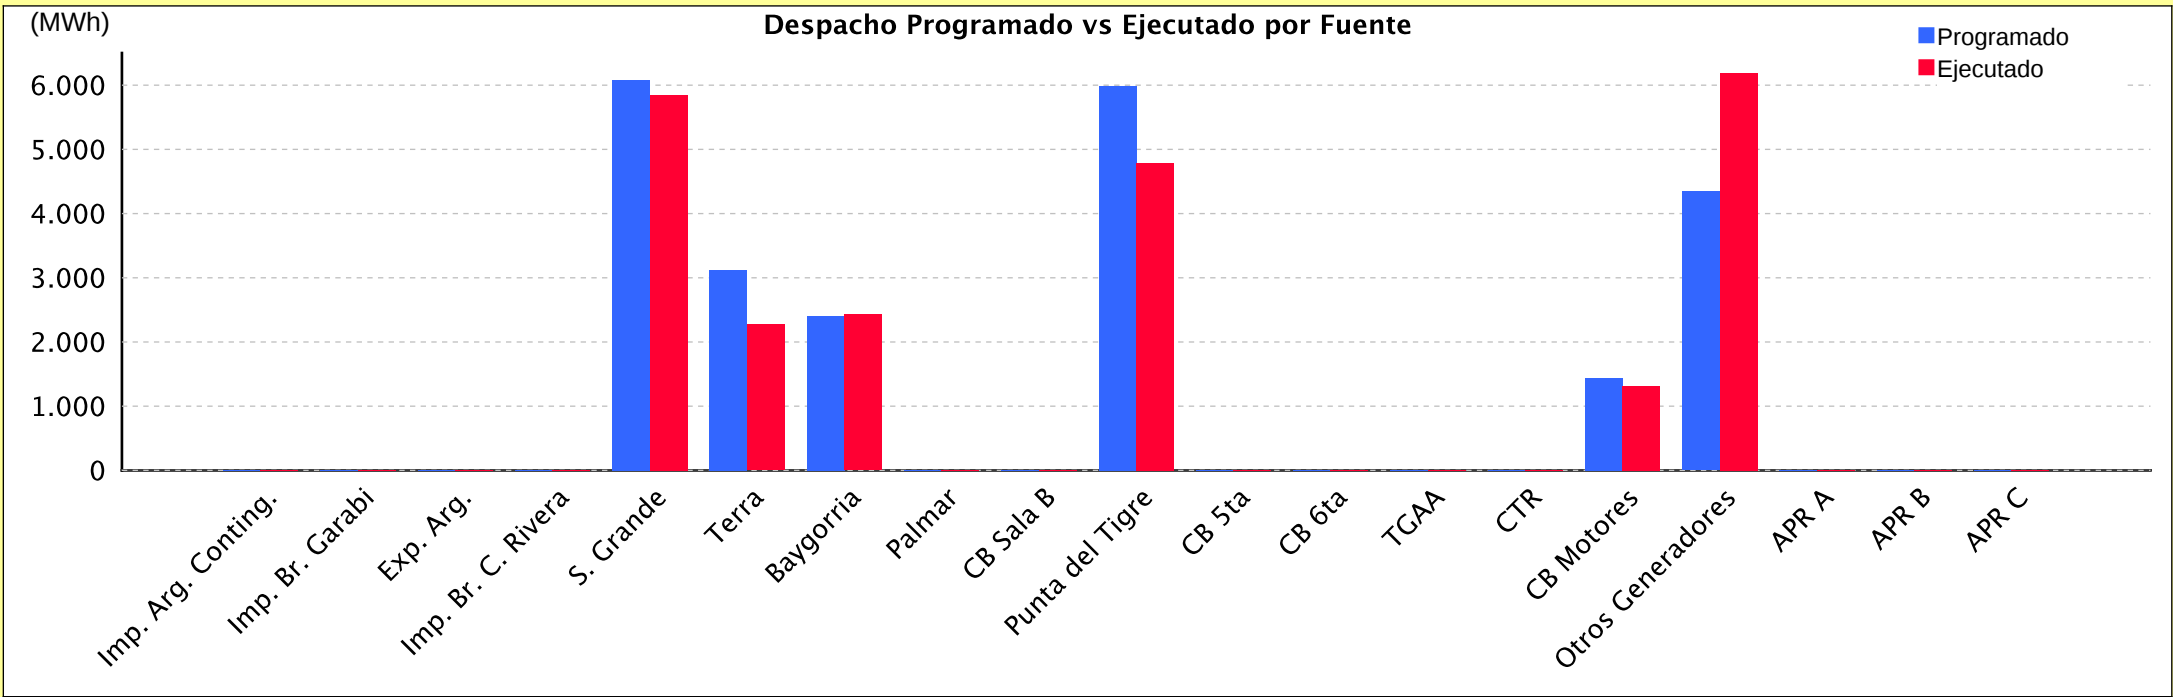
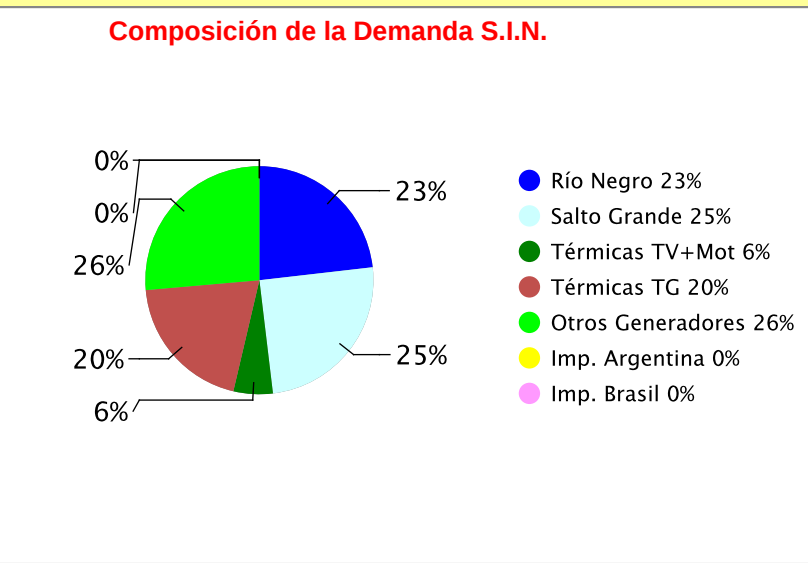


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

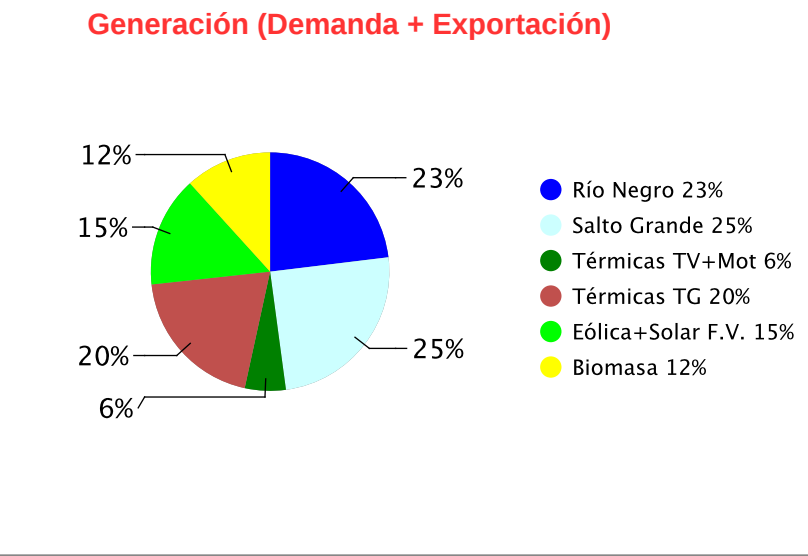



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

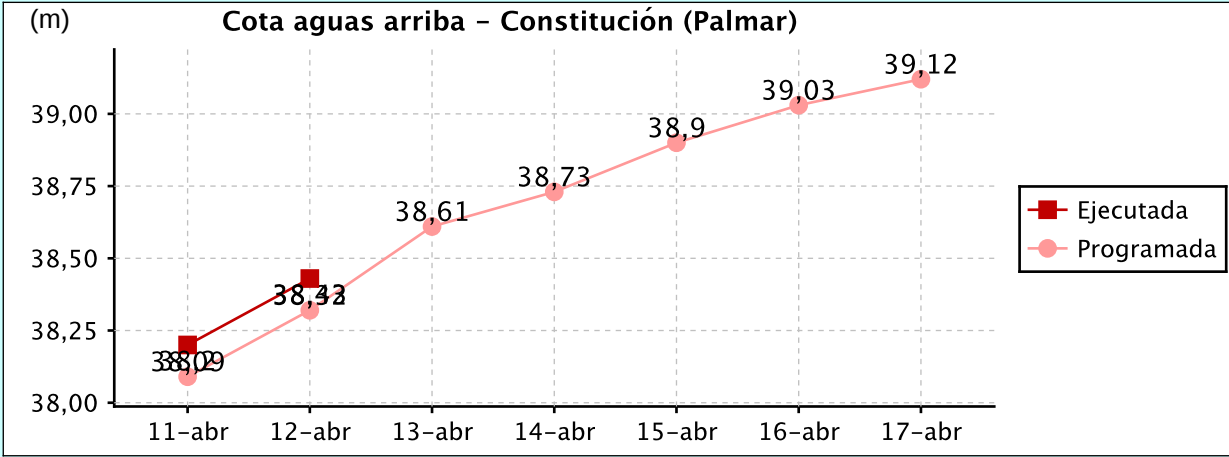
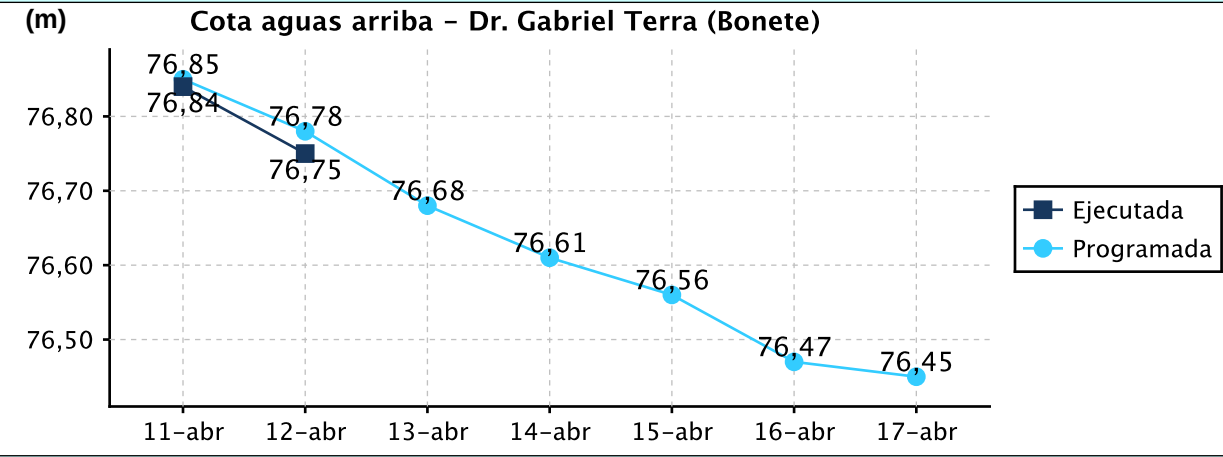


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,78	76,75
Baygorria	54,26	54,14
Palmar	38,32	38,43
SGU	34,57	34,78

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

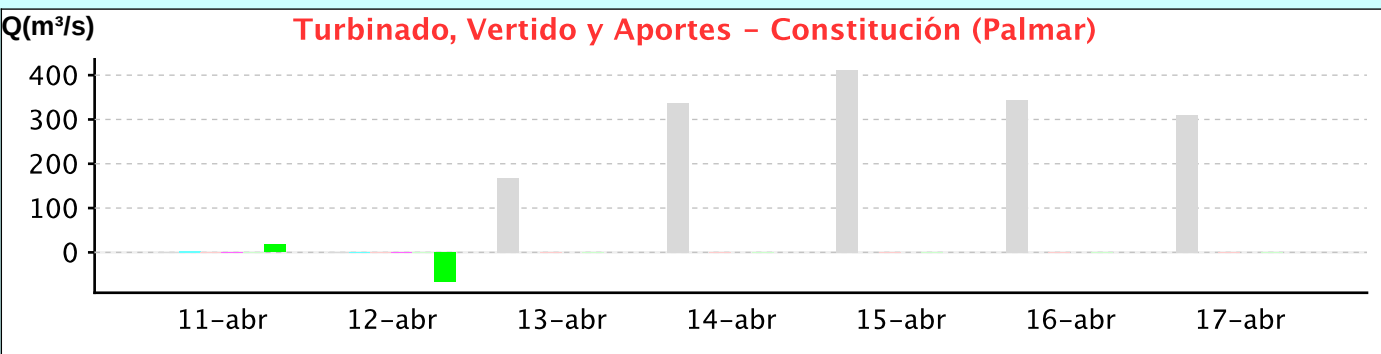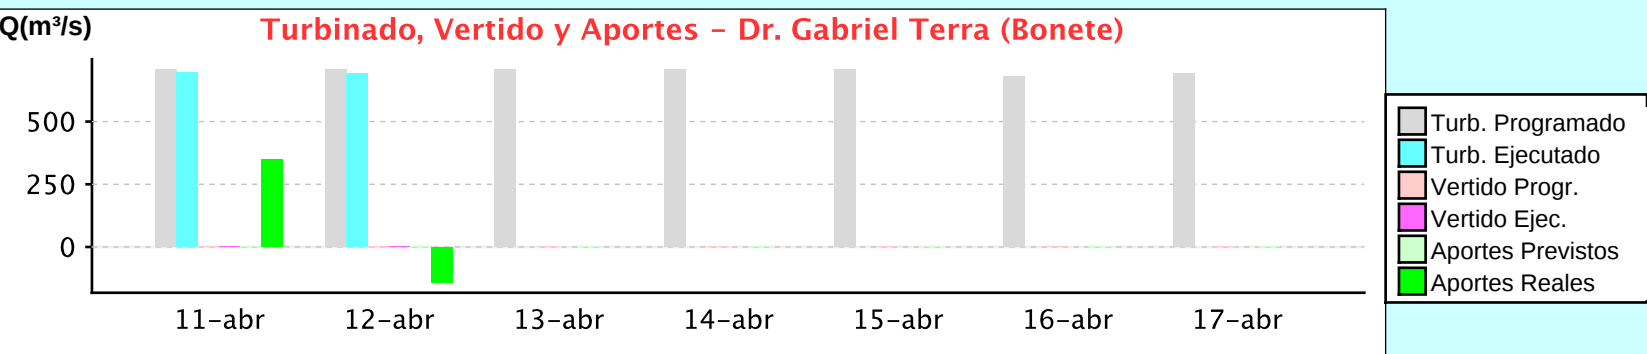

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

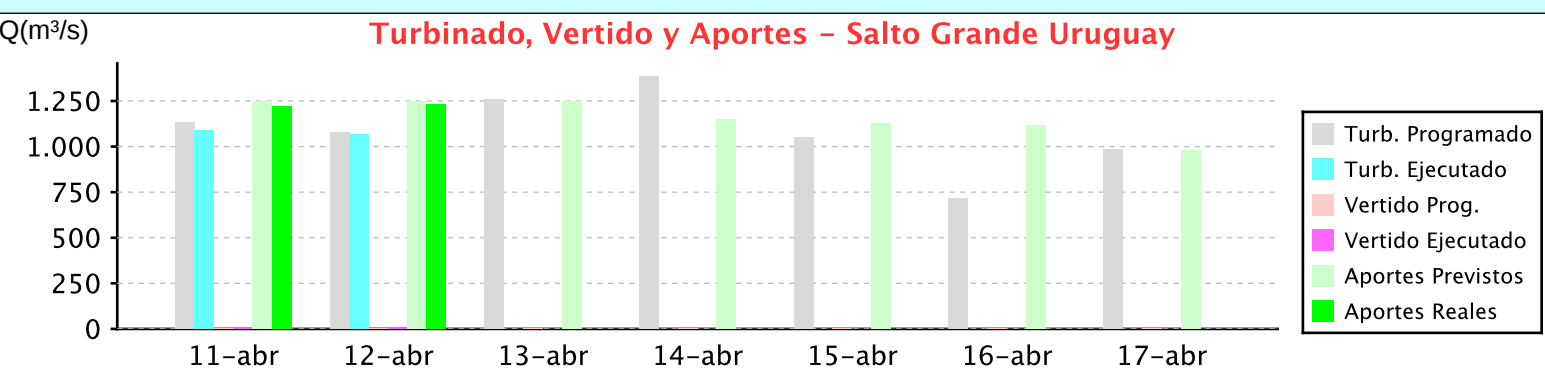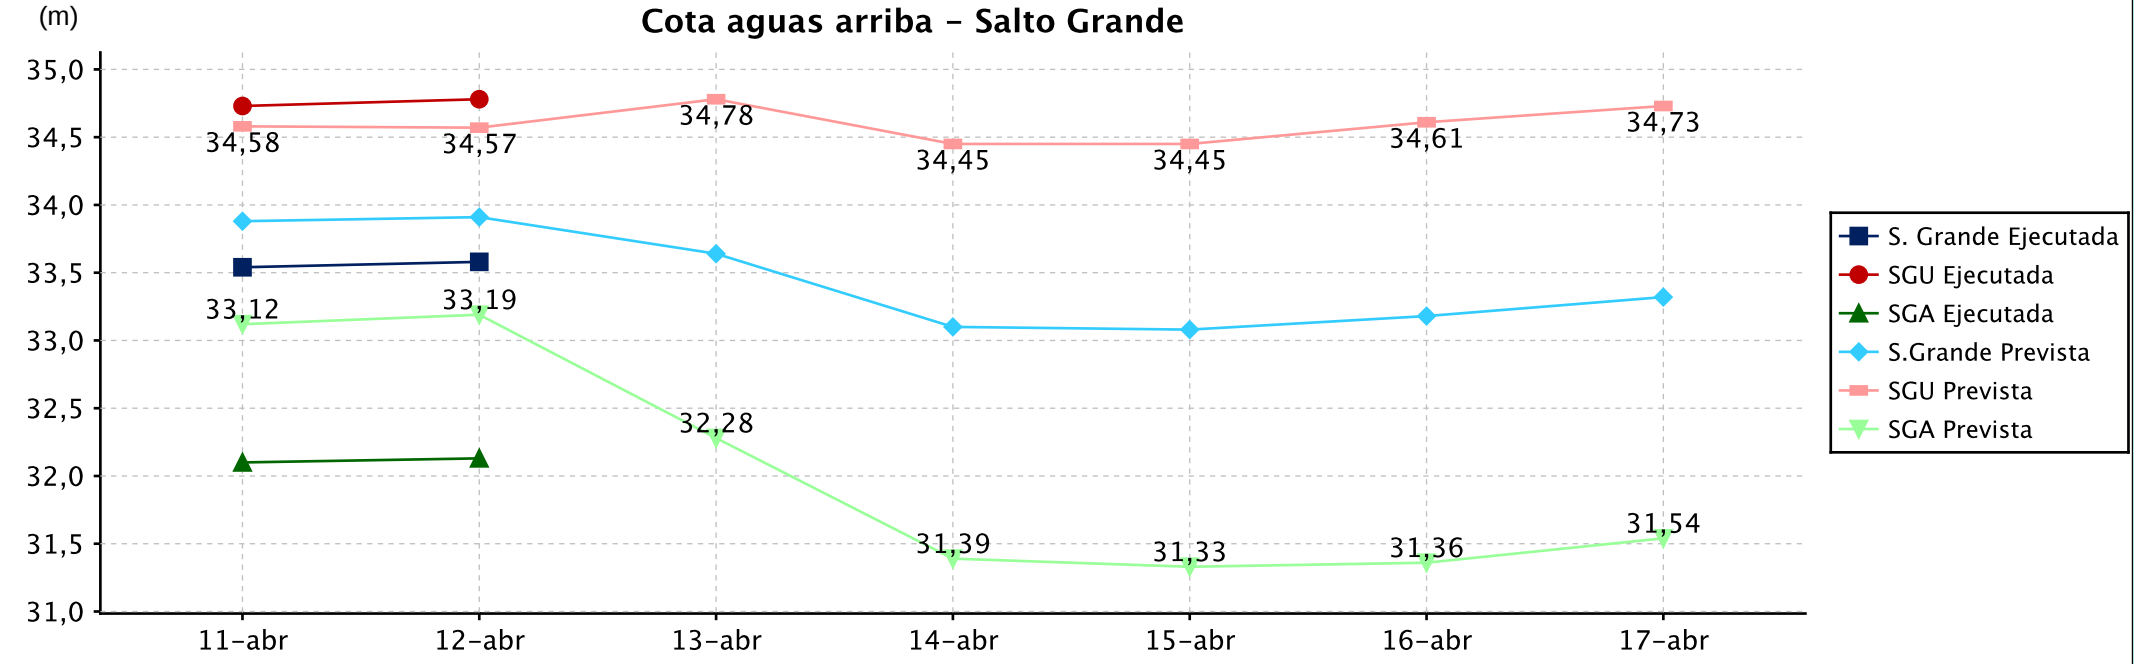

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,78
Cota Vista Arg	32,13
Cota real	33,58

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	50.713
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	706	690
Baygorria	729	778
Palmar	0	0
SGU	1.077	1.067

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-140
Baygorria	0	4
Palmar	0	-67
SGU	1.250	1.232

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
