




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 15 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.103
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.107
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	5.977
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.008
C. Baygorria	2.421
C. Palmar	2.529
C. Salto Grande	5.363
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.295
TOTAL Generación	28.609

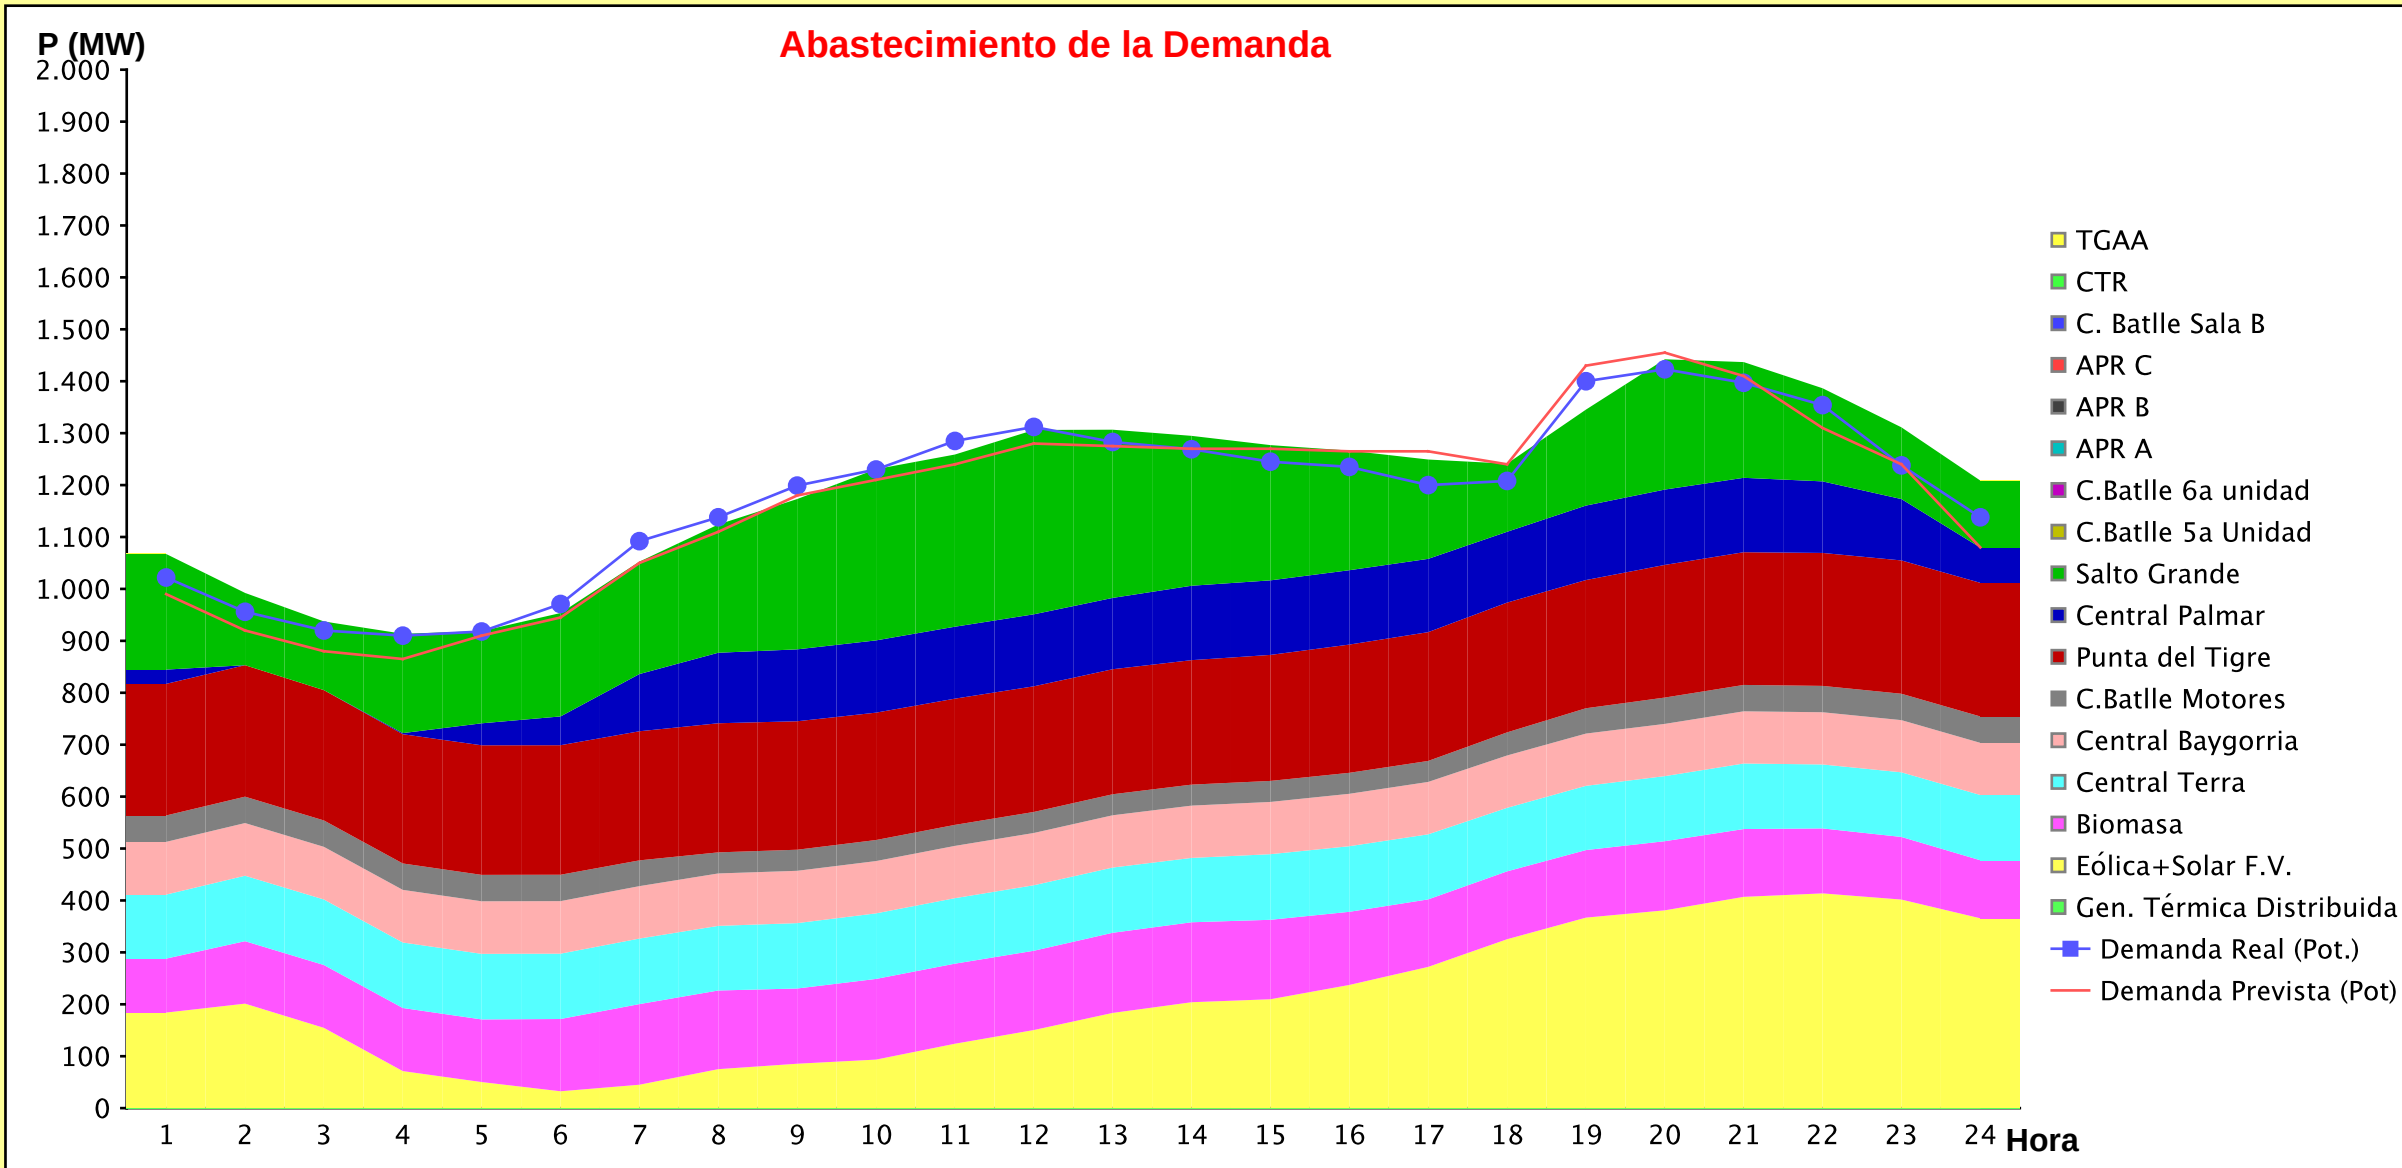

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.609
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.090
Diferencia (MWh)	519
Ejecutada - Programada	1,85 %

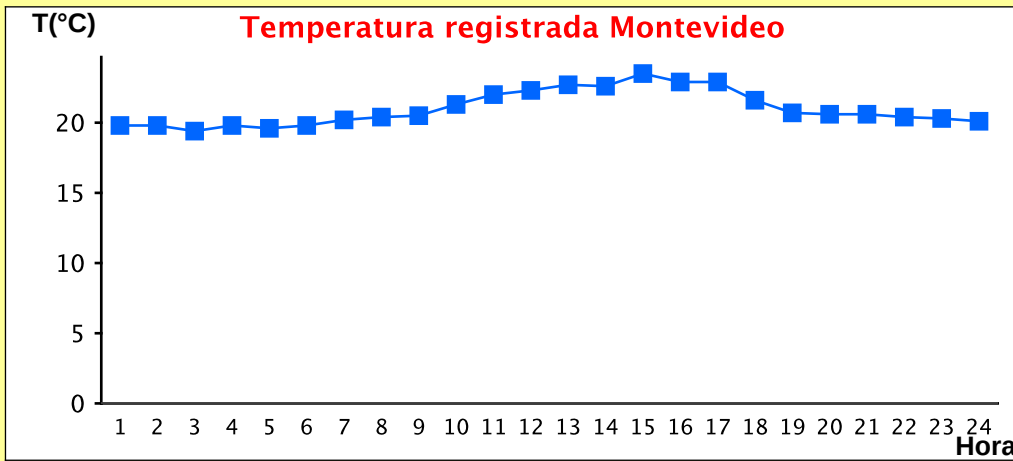



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1331,54 Hora 11:53
Potencia mínima:	899,17 Hora 04:15
Pico noche:	1456,61 Hora 19:14

Generación Media (MW)	
Eólica	210,3
Biomasa	136,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

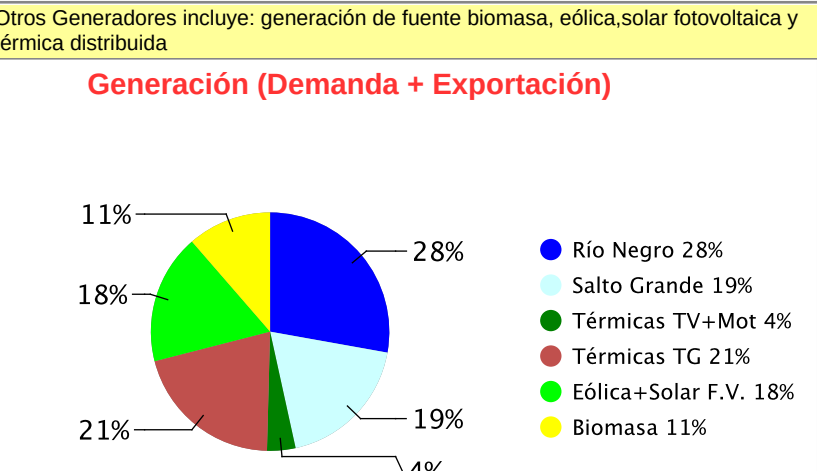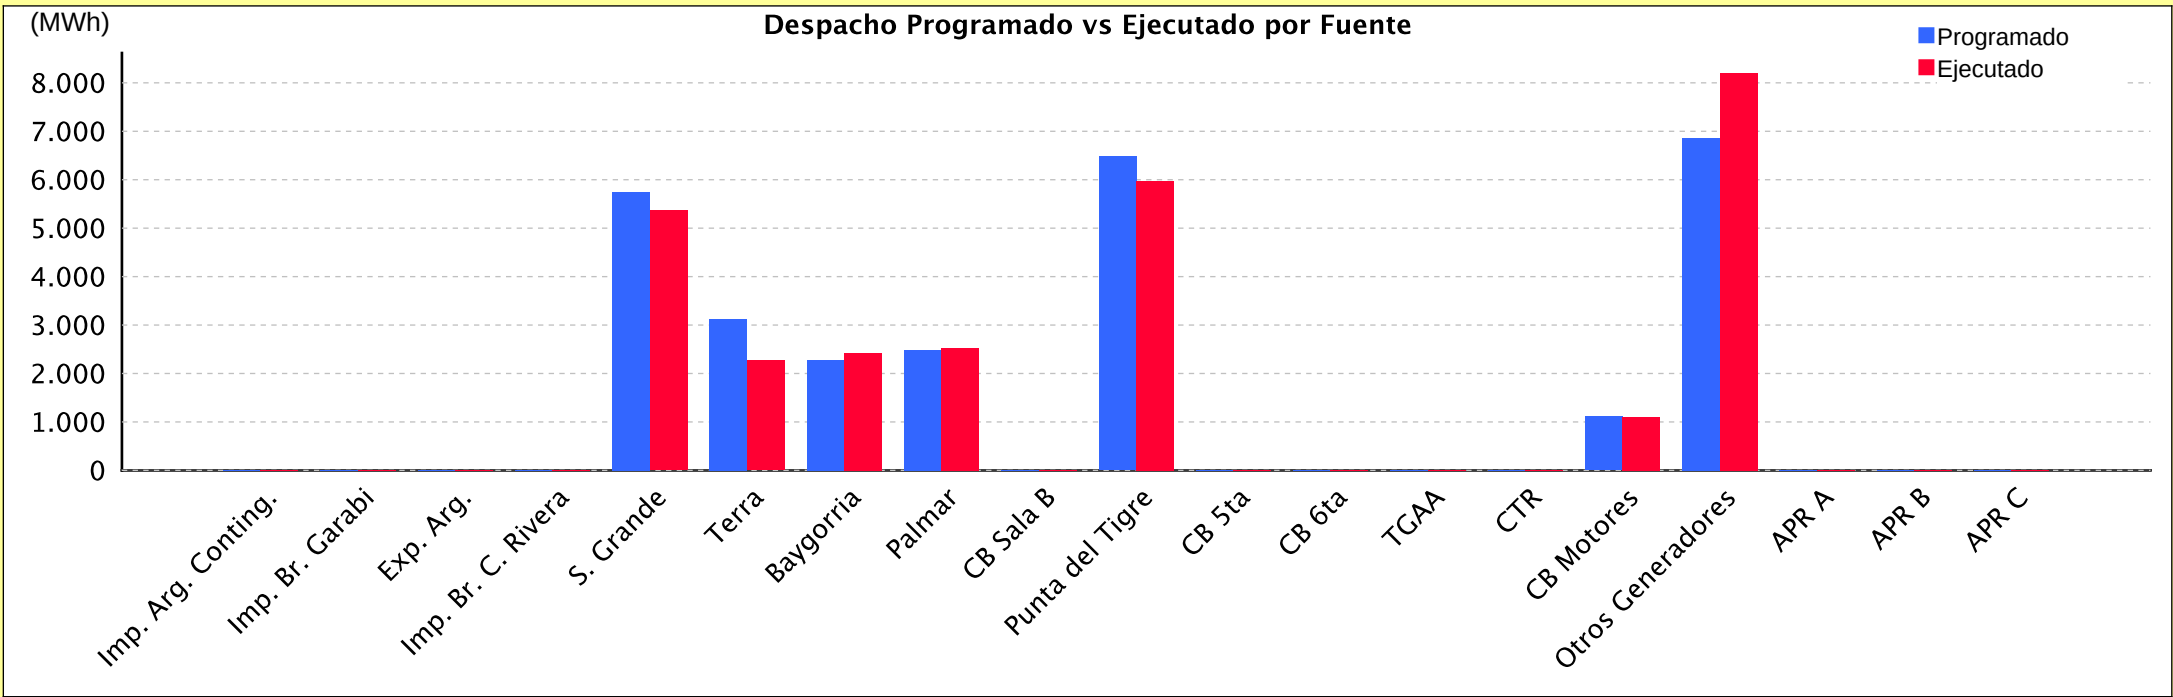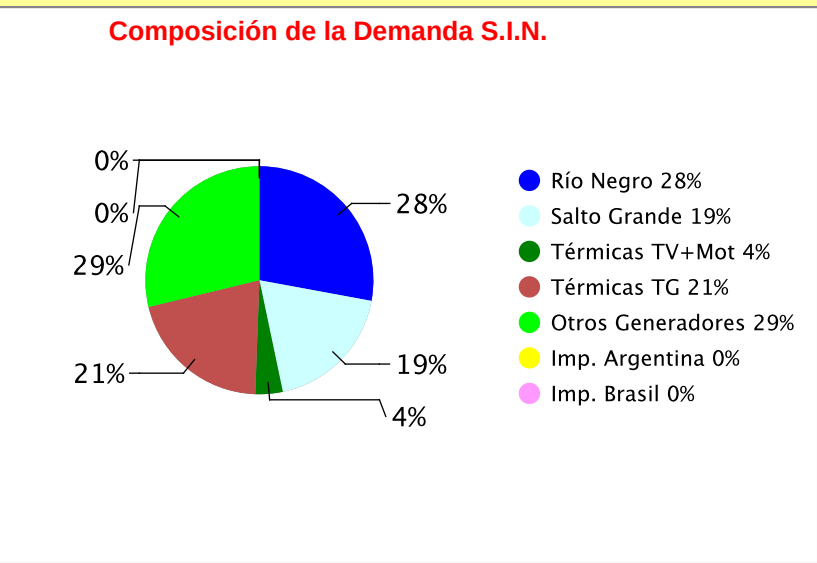



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

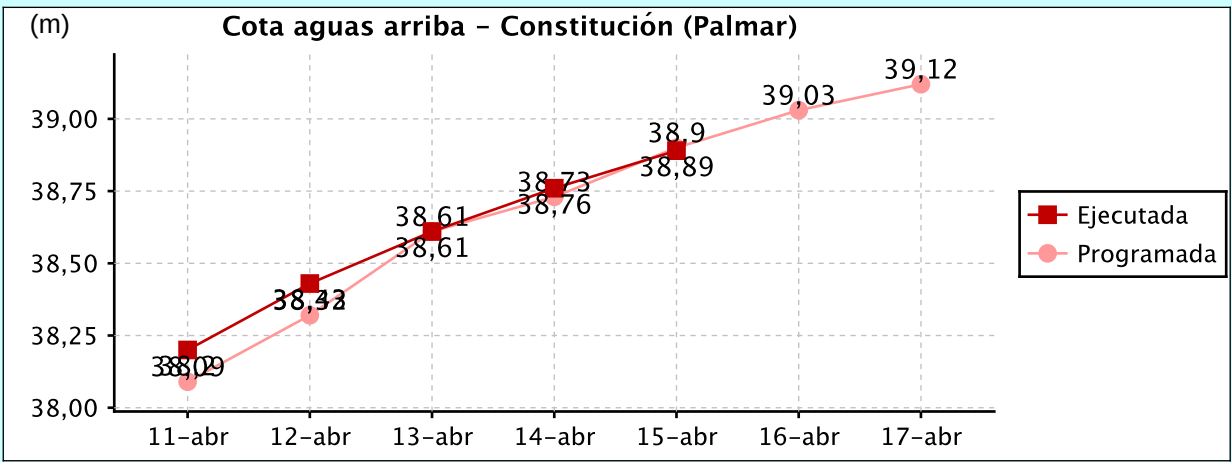
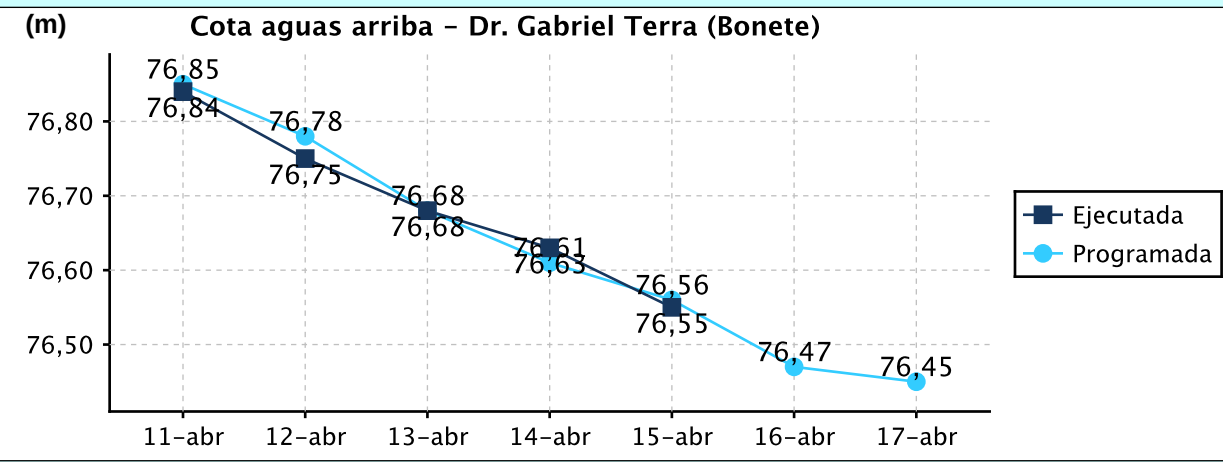


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,56	76,55
Baygorria	53,97	53,92
Palmar	38,90	38,89
SGU	34,45	34,49

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

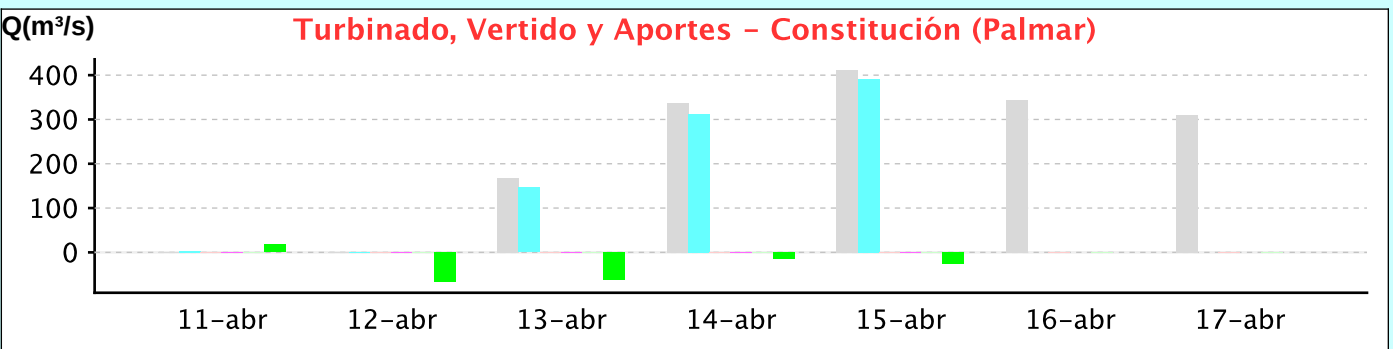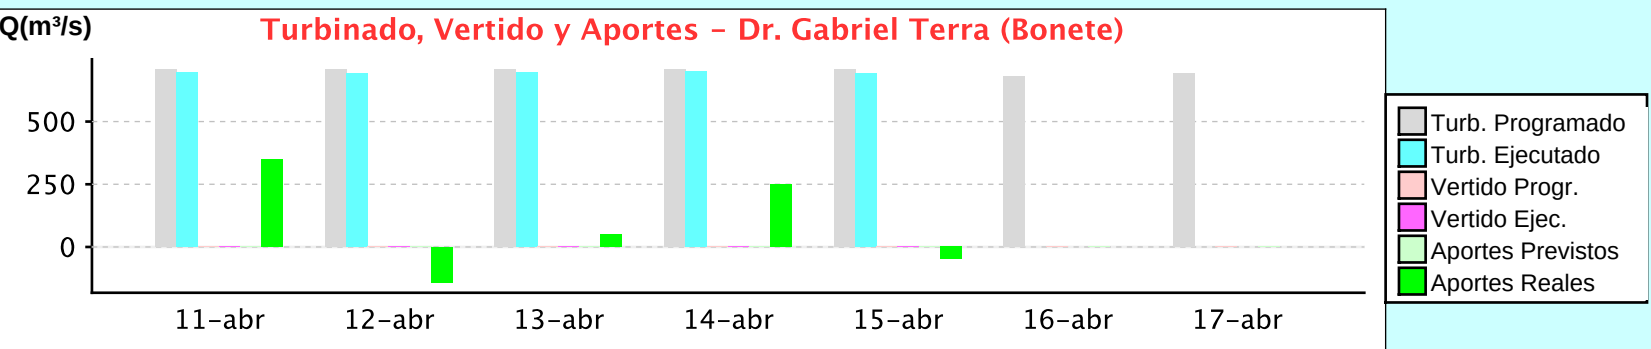

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

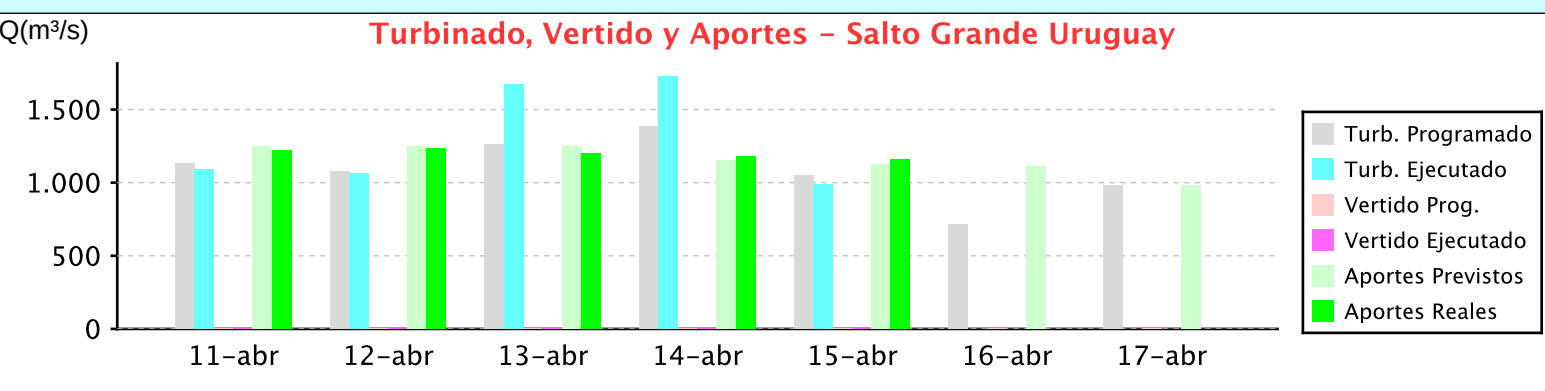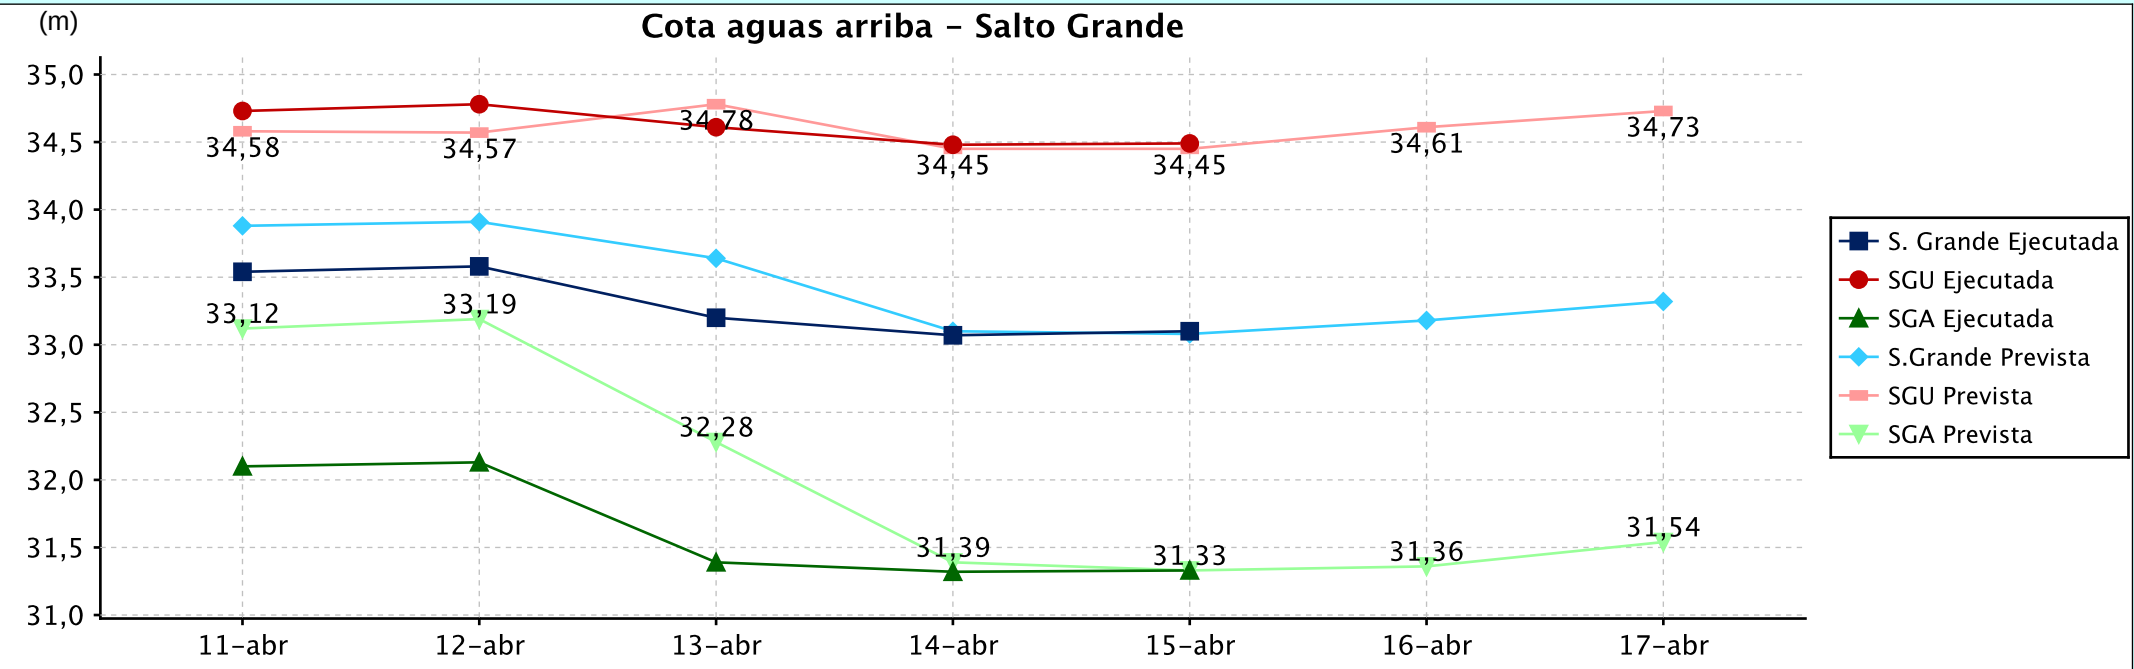

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,49
Cota Vista Arg	31,33
Cota real	33,10

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	55.780
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	706	691
Baygorria	694	819
Palmar	412	392
SGU	1.050	989

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-48
Baygorria	0	22
Palmar	0	-27
SGU	1.125	1.156

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
