




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 16 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.207
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.211
Central La Tablada	-81
Central P. del Tigre	5.682
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.010
C. Baygorria	1.826
C. Palmar	1.341
C. Salto Grande	3.450
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	11.894
TOTAL Generación	28.324

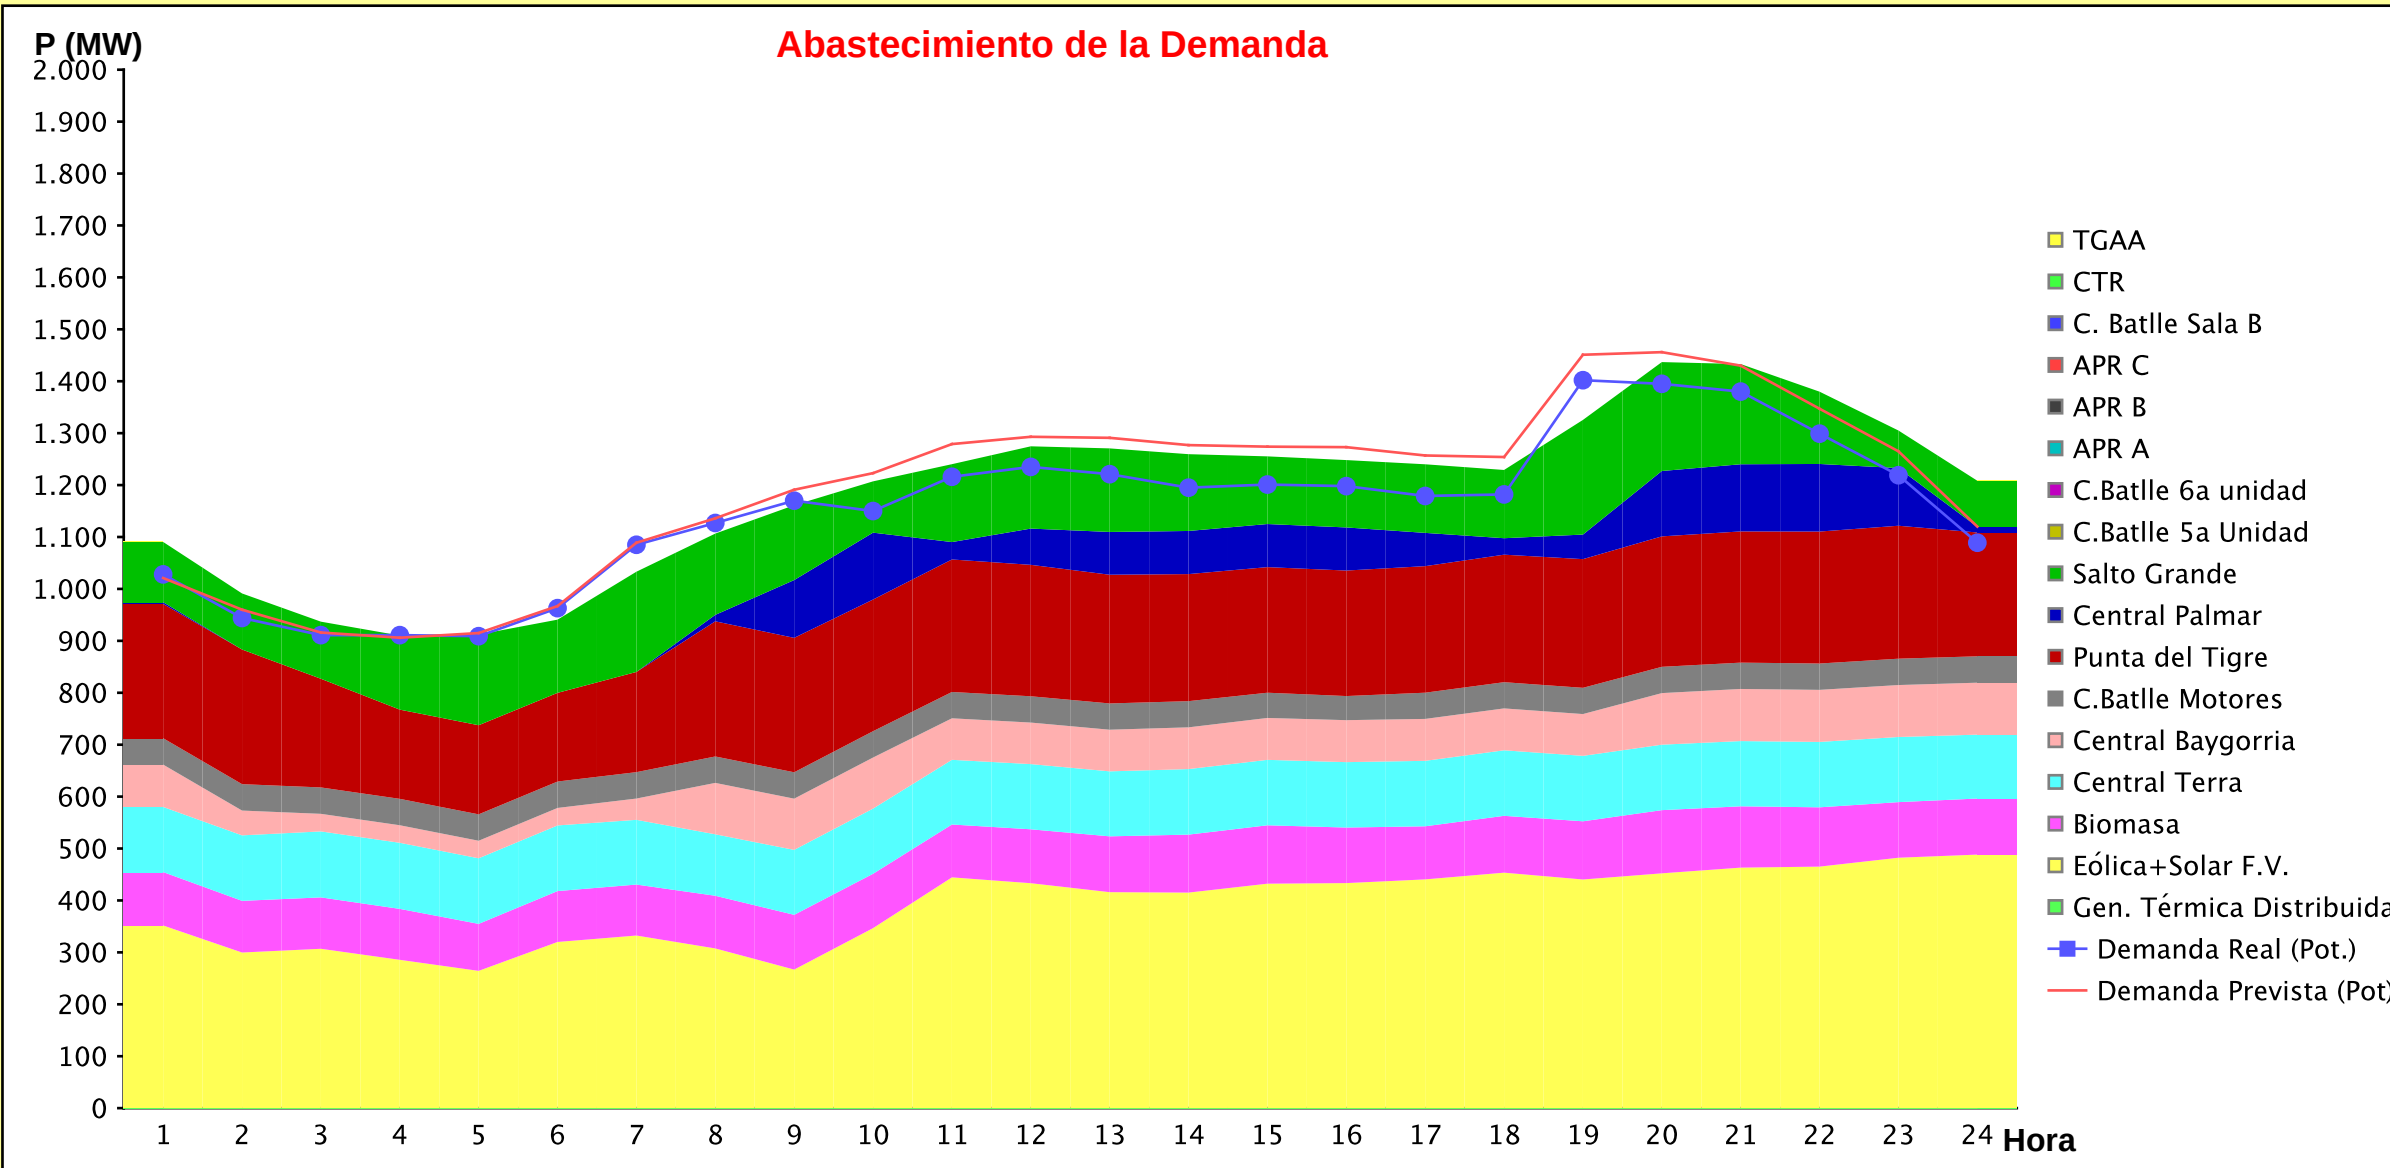

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.324
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.591
Diferencia (MWh)	-267
Ejecutada - Programada	-0,93 %

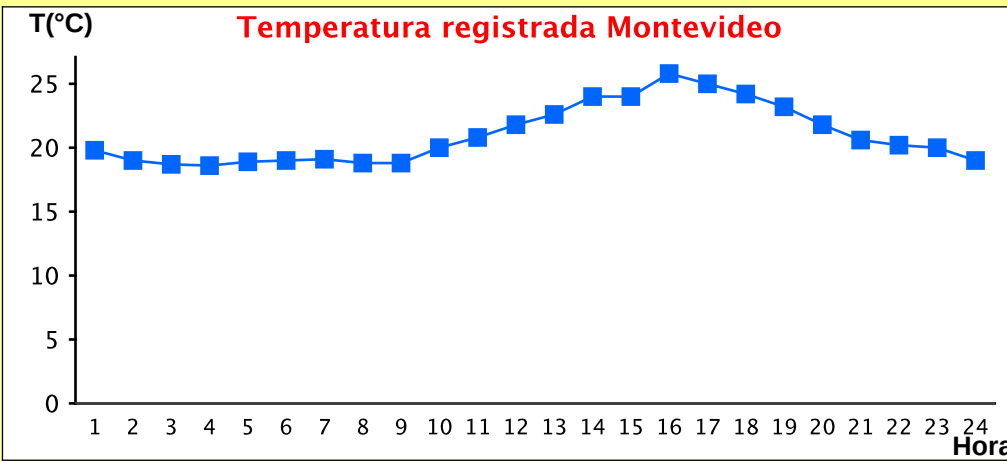


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1295,76 Hora 11:43
Potencia mínima:	898,21 Hora 03:29
Pico noche:	1449,38 Hora 19:09

Generación Media (MW)	
Eólica	389,4
Biomasa	105,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

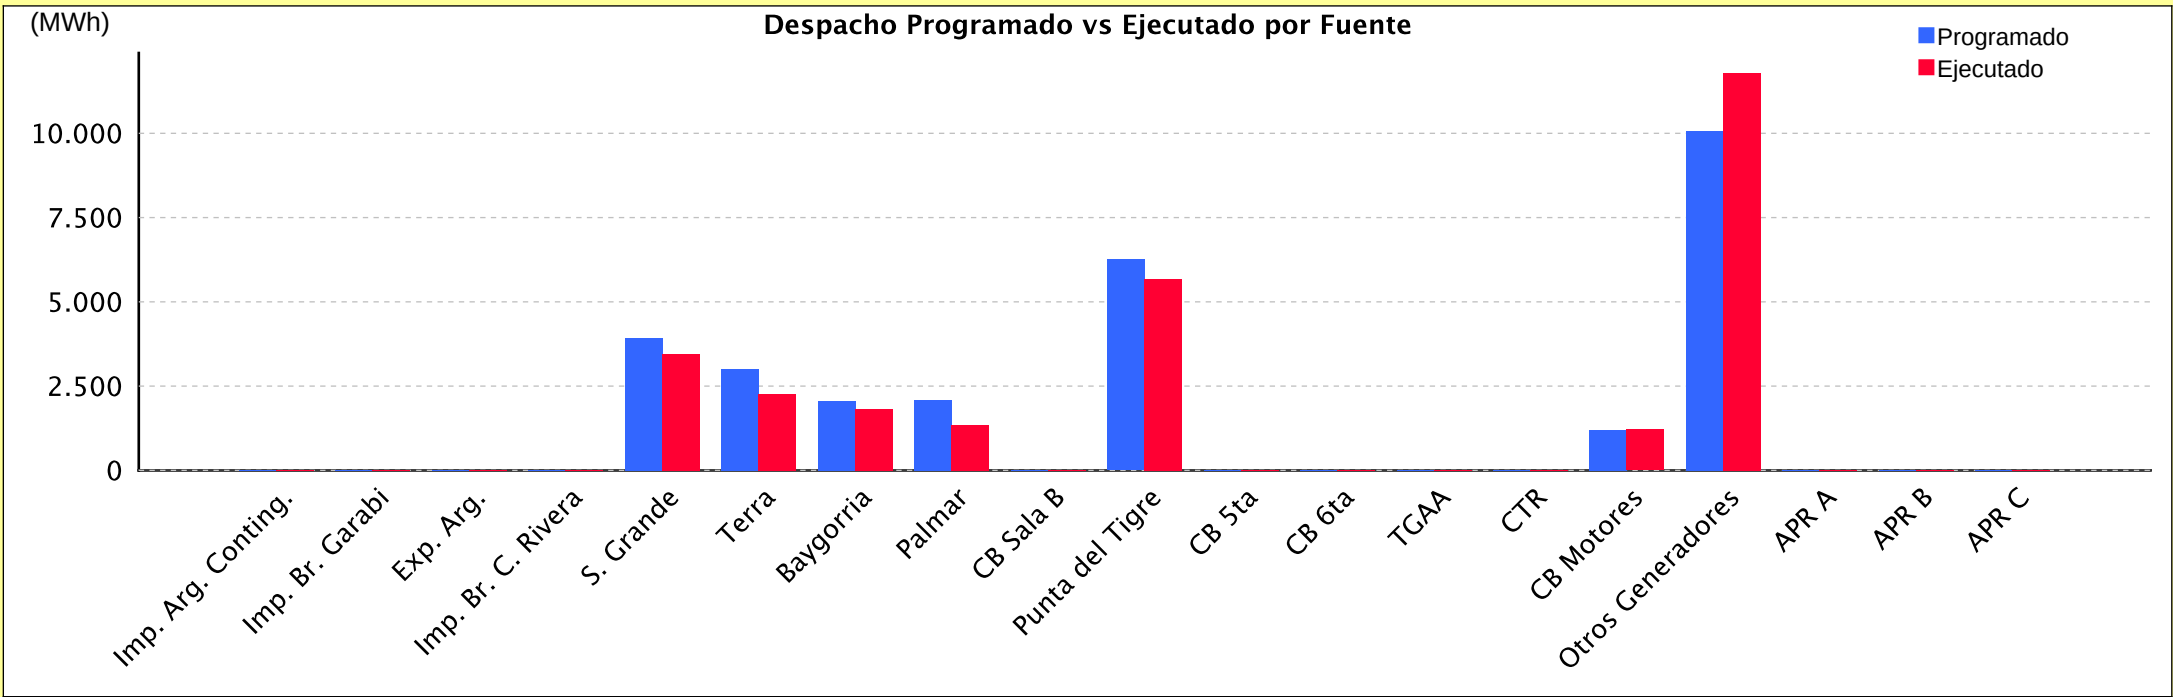
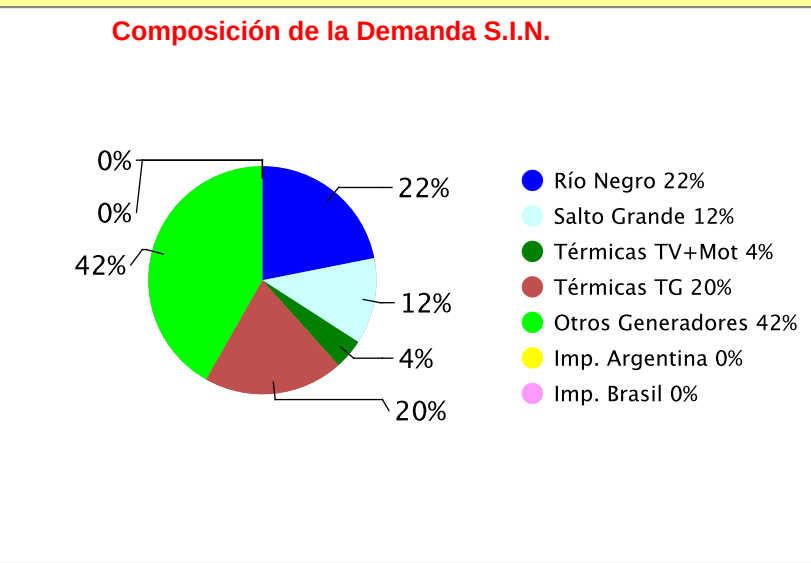


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

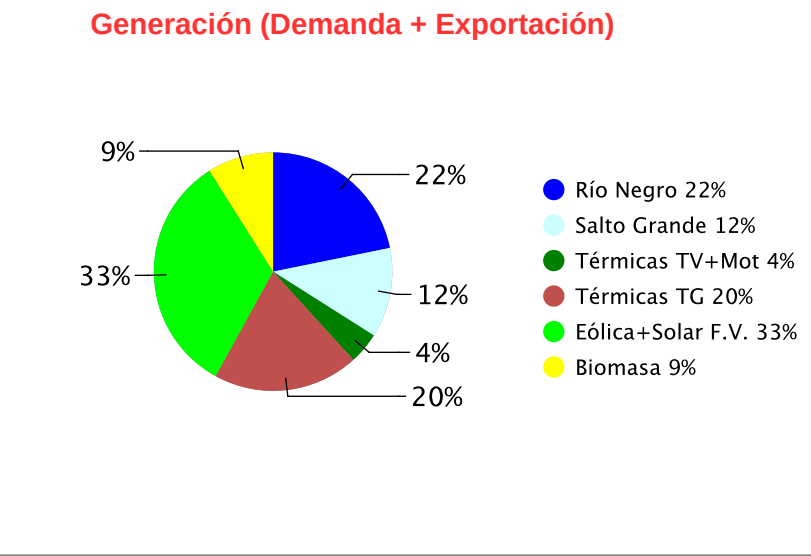



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

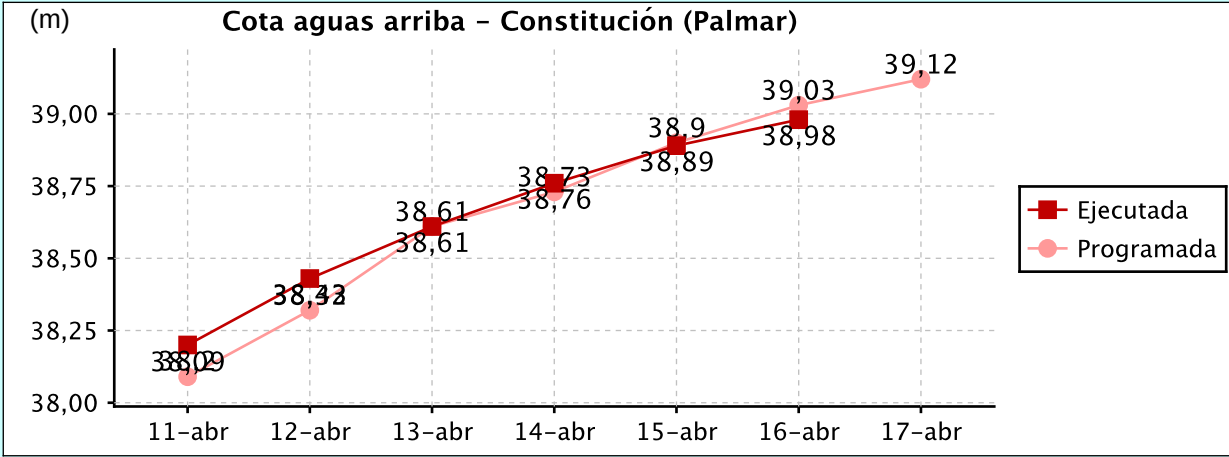
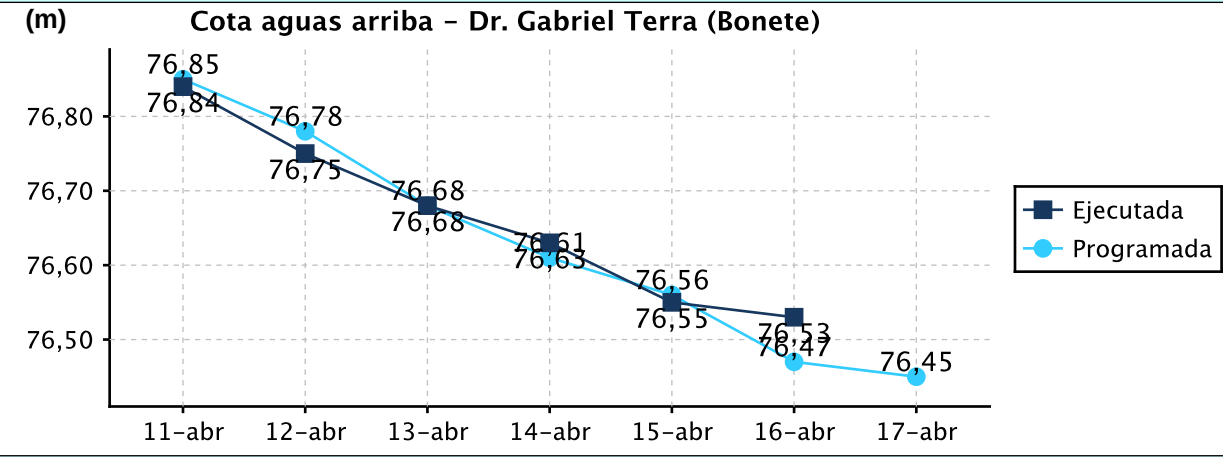


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,47	76,53
Baygorria	53,87	54
Palmar	39,03	38,98
SGU	34,61	34,65

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

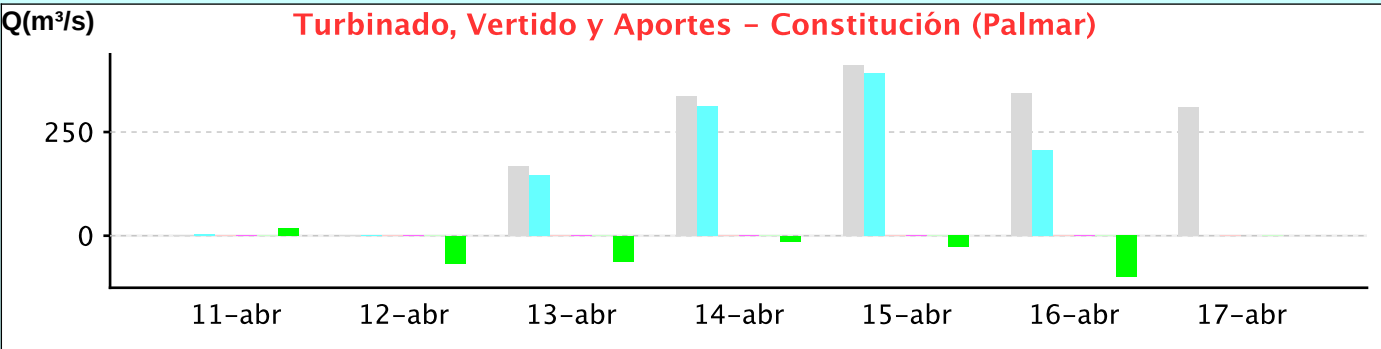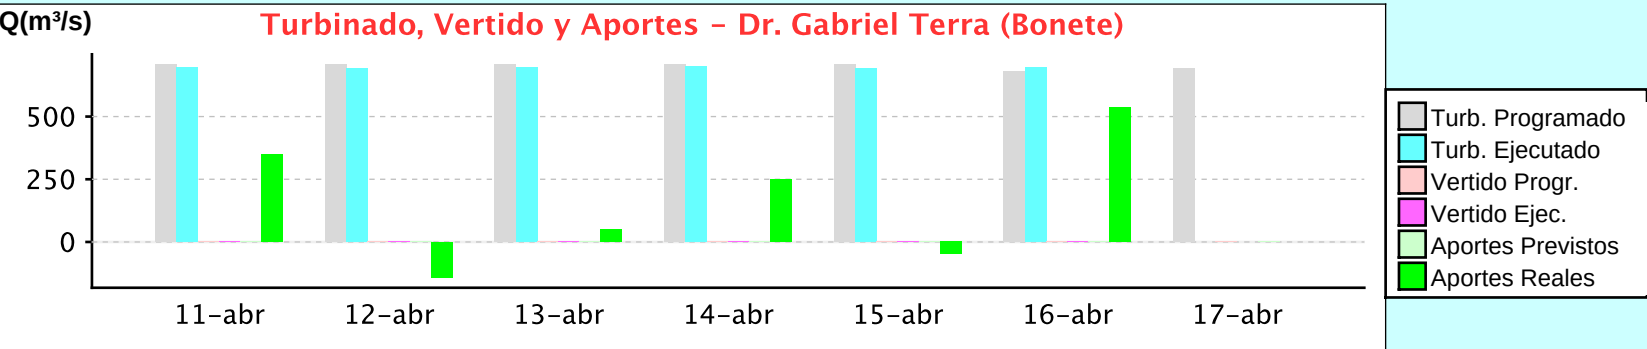

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

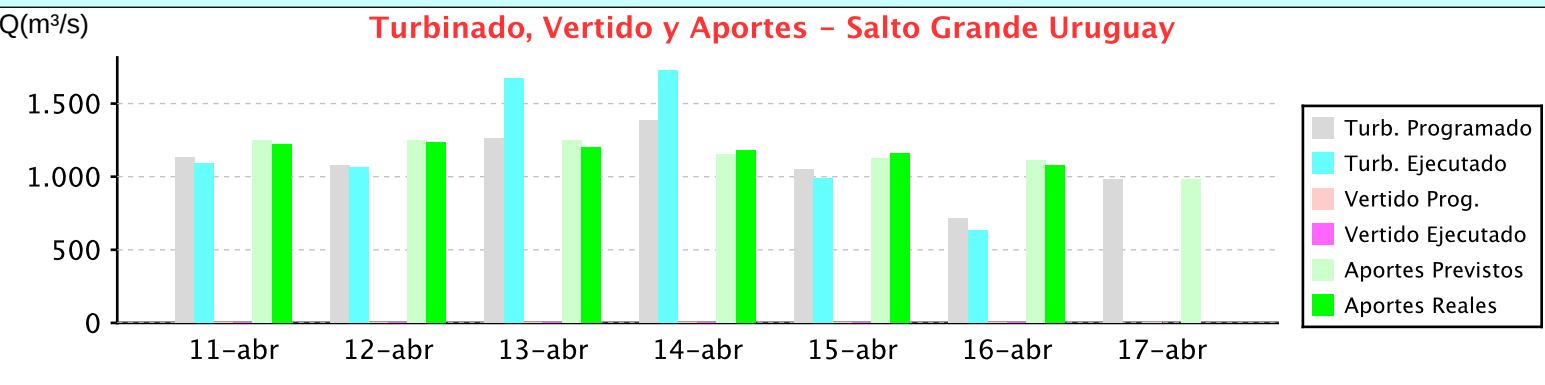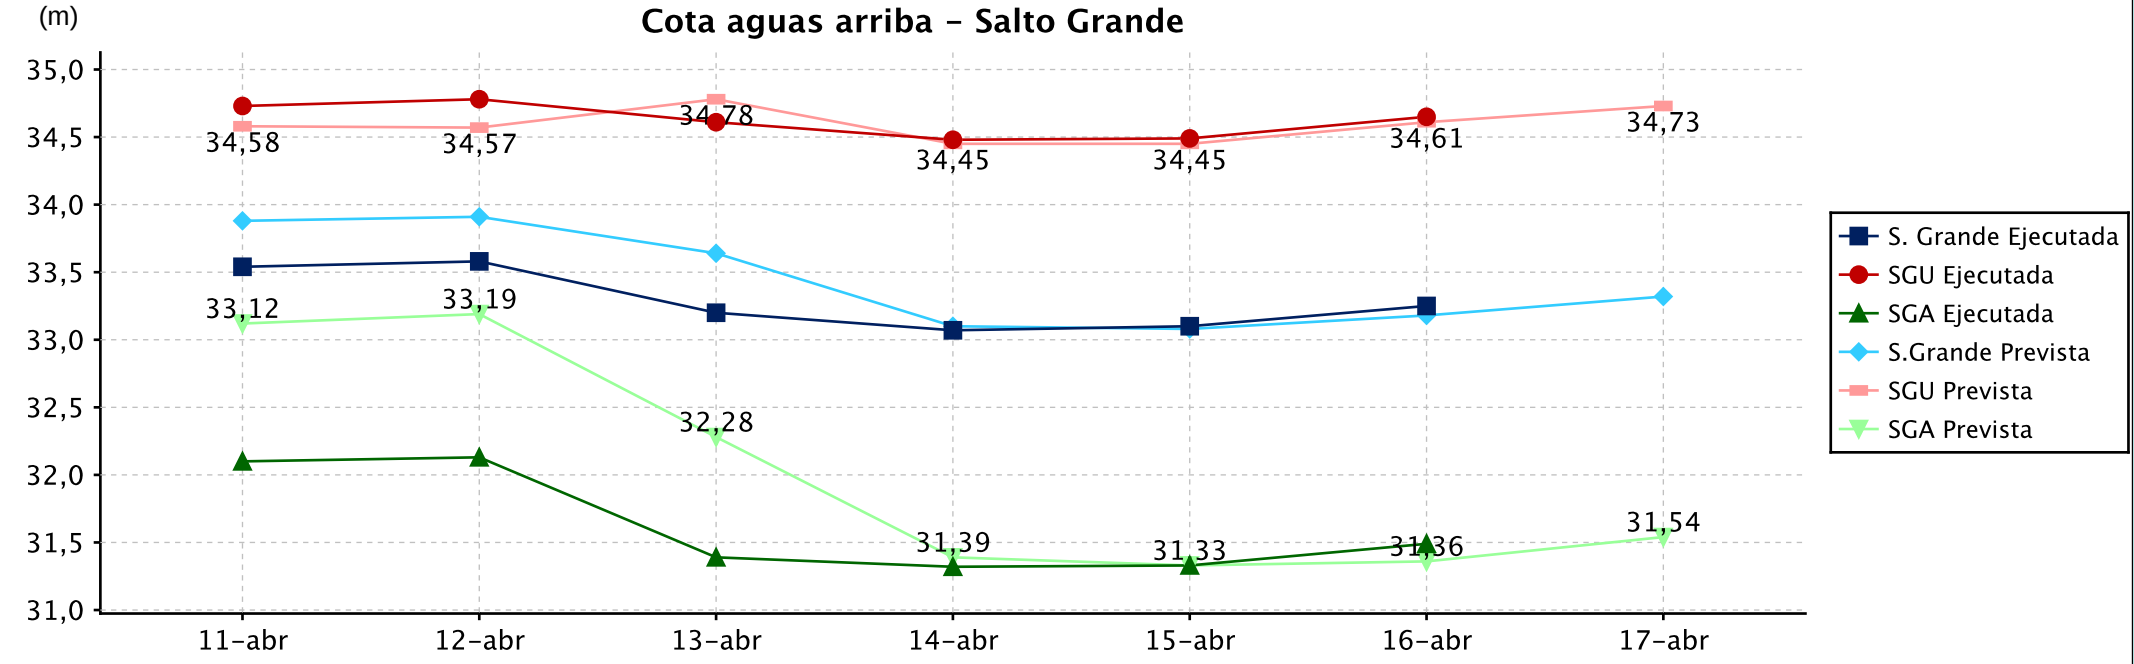

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,65
Cota Vista Arg	31,49
Cota real	33,25
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	57.261

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	679	698
Baygorria	623	603
Palmar	344	207
SGU	716	631

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	537
Baygorria	0	6
Palmar	0	-100
SGU	1.114	1.080

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
