




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 18 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.211
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.214
Central La Tablada	625
Central P. del Tigre	6.011
APR A	1.502
APR B	1.394
APR C	1.342
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	78
C. Baygorria	7
C. Palmar	0
C. Salto Grande	5.072
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.805
TOTAL Generación	25.046

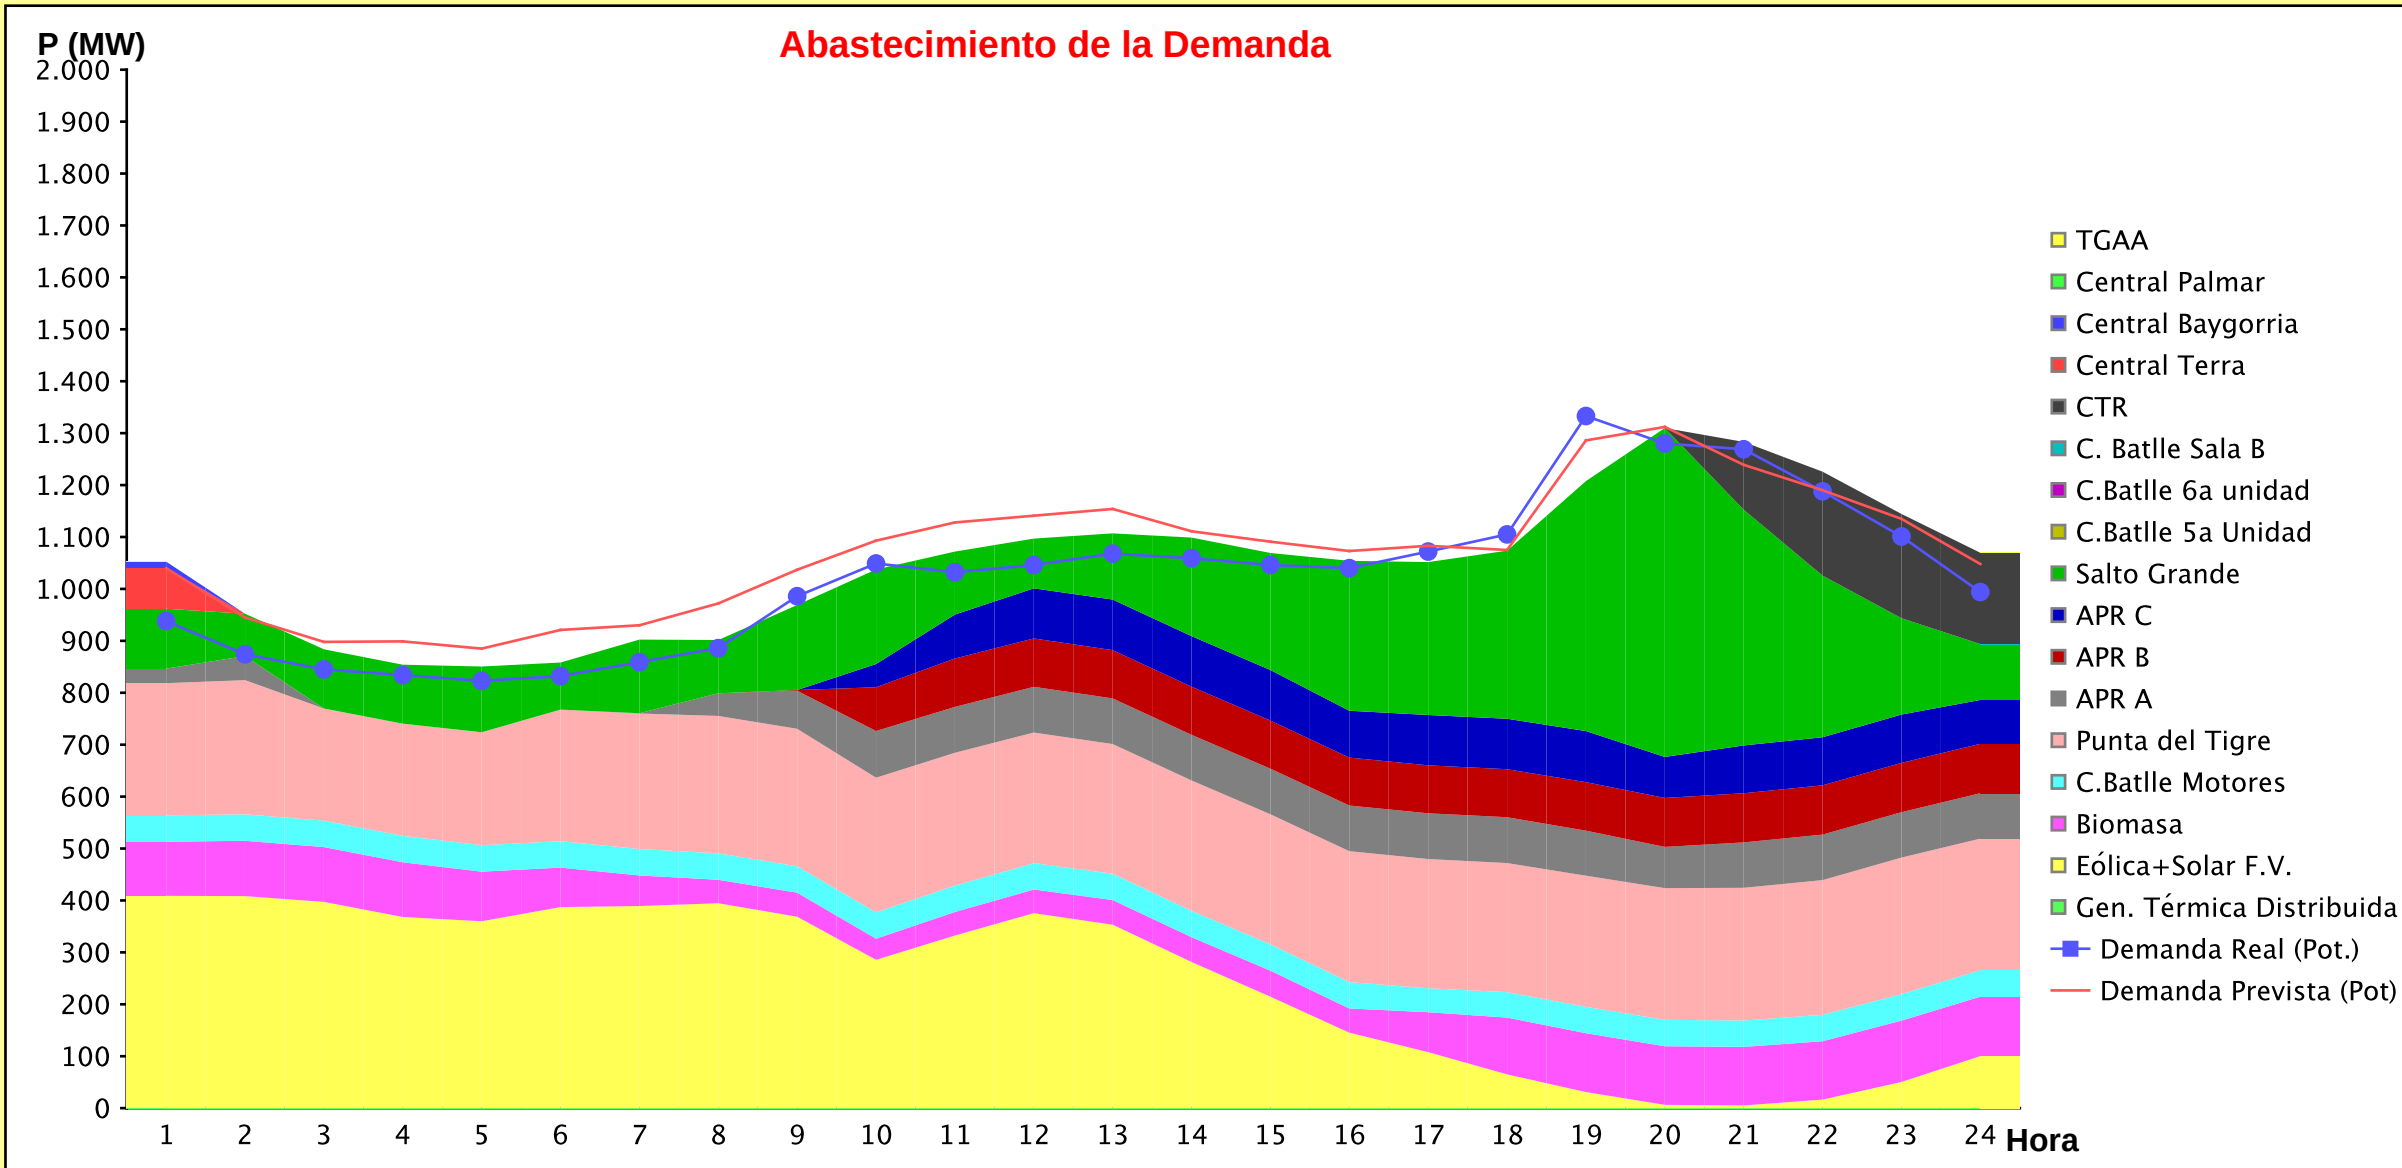

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.046
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	25.686
Diferencia (MWh)	-640
Ejecutada - Programada	-2,49 %

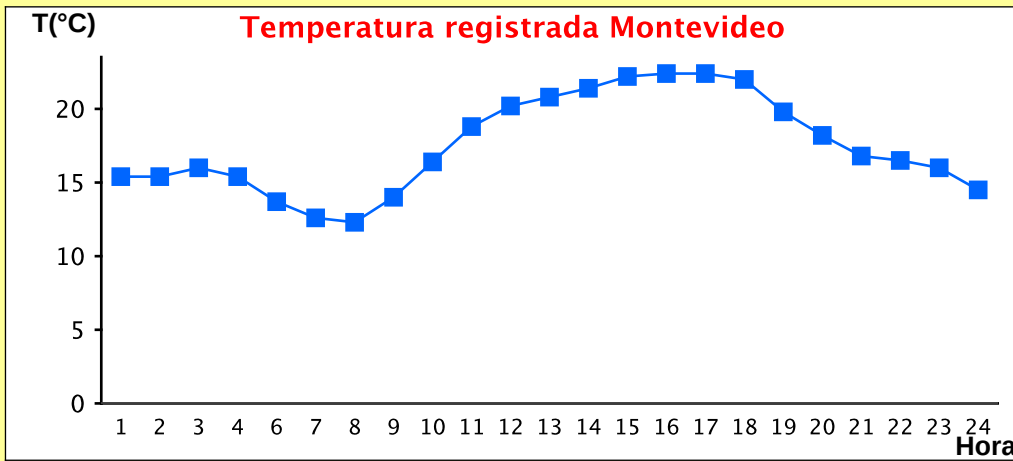

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1106,36 Hora 13:19
Potencia mínima:	862,79 Hora 05:07
Pico noche:	1380,62 Hora 19:23



Generación Media (MW)	
Eólica	244,2
Biomasa	81,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

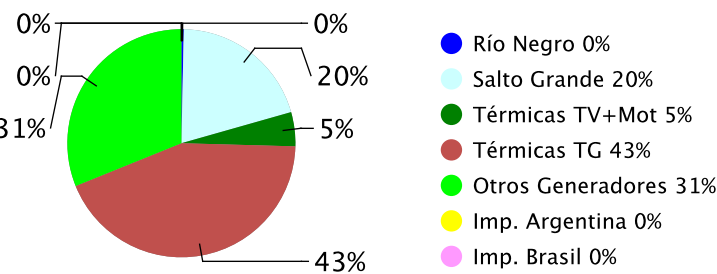



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

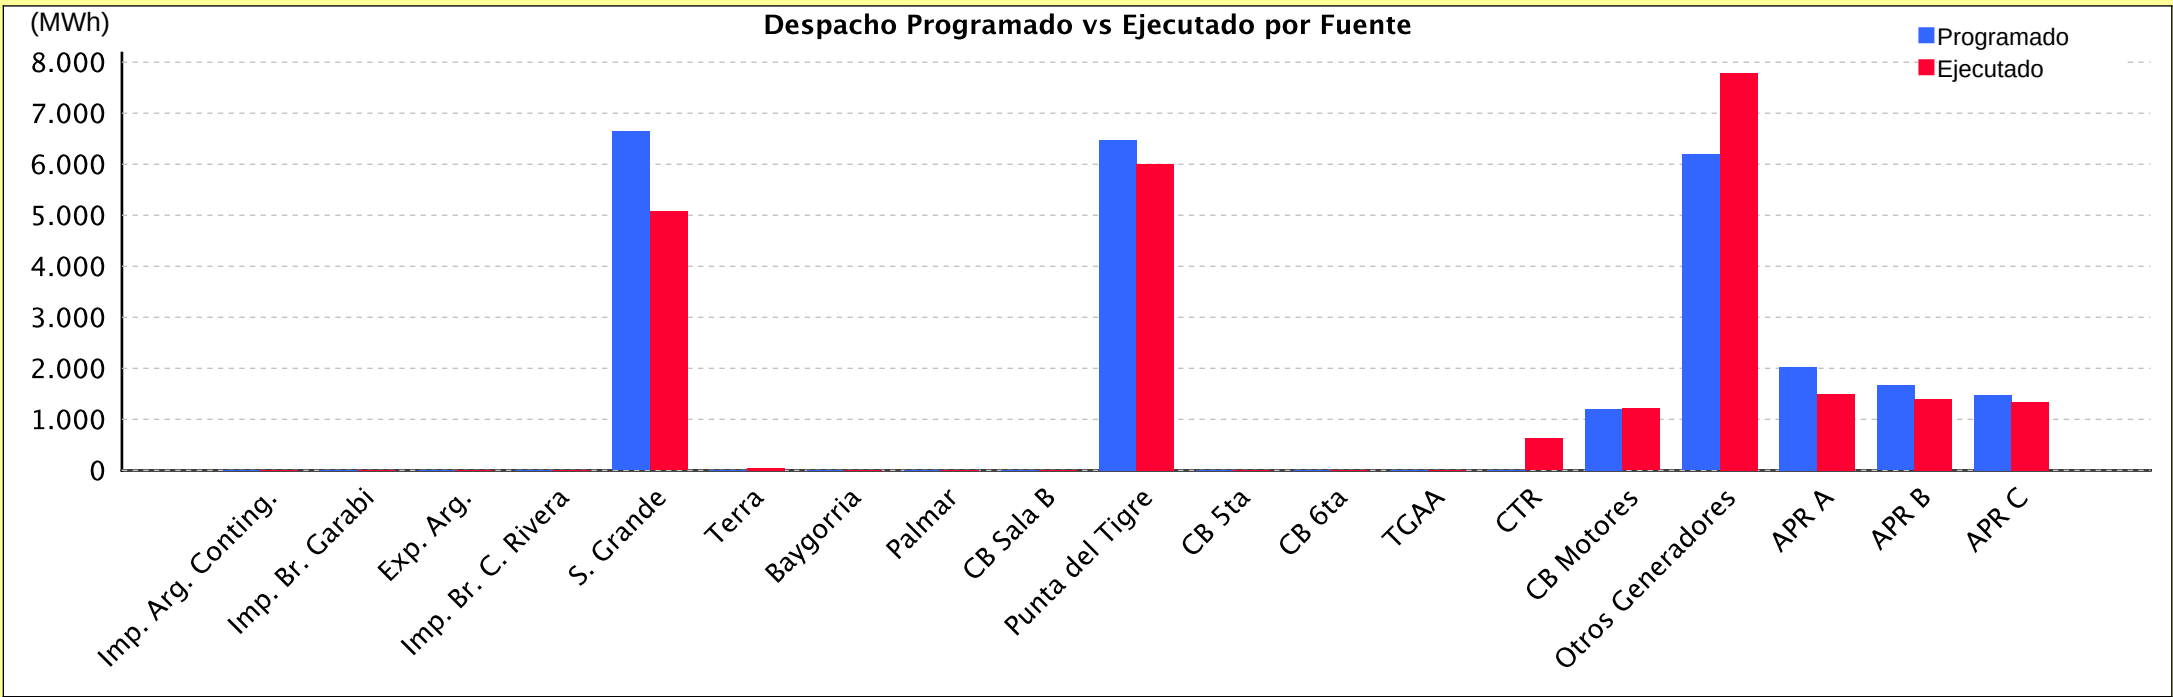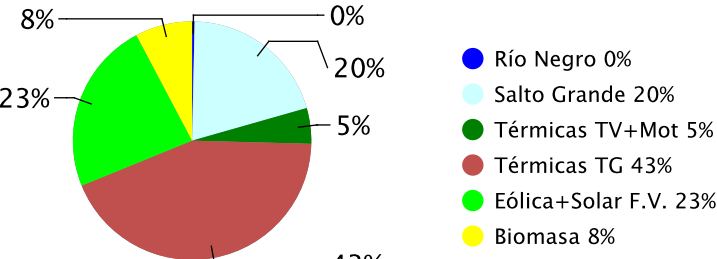



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

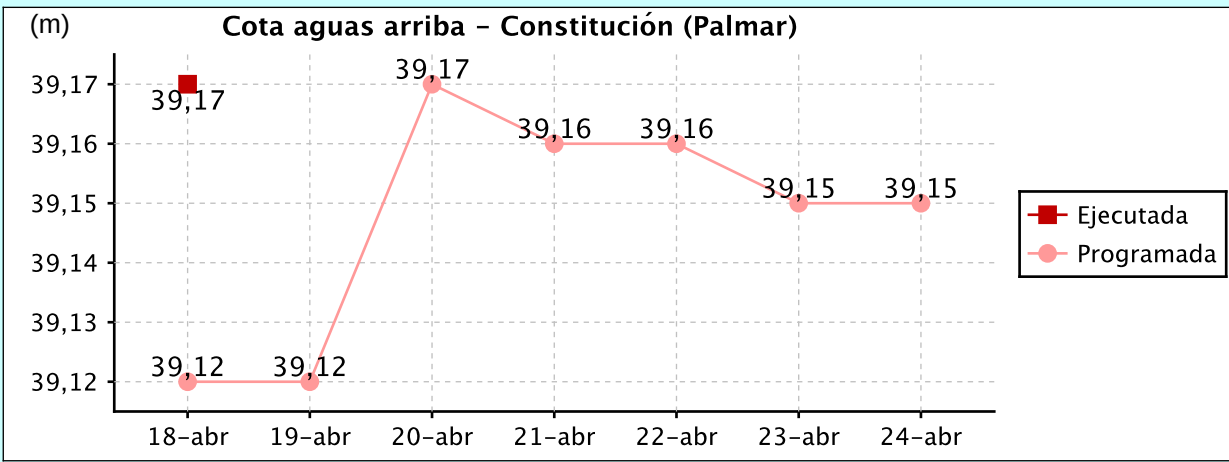
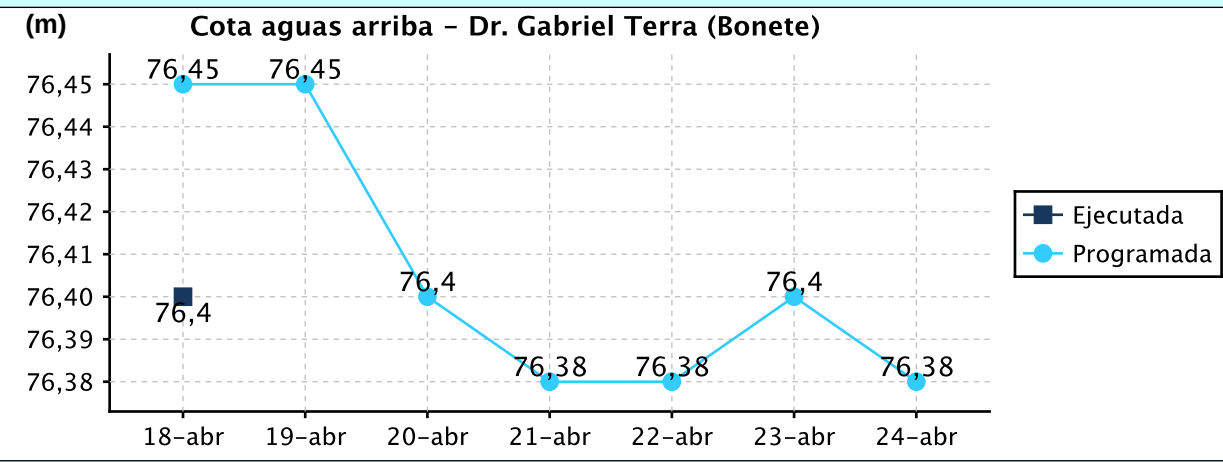


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,45	76,4
Baygorria	53,95	53,95
Palmar	39,12	39,17
SGU	34,69	34,66

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

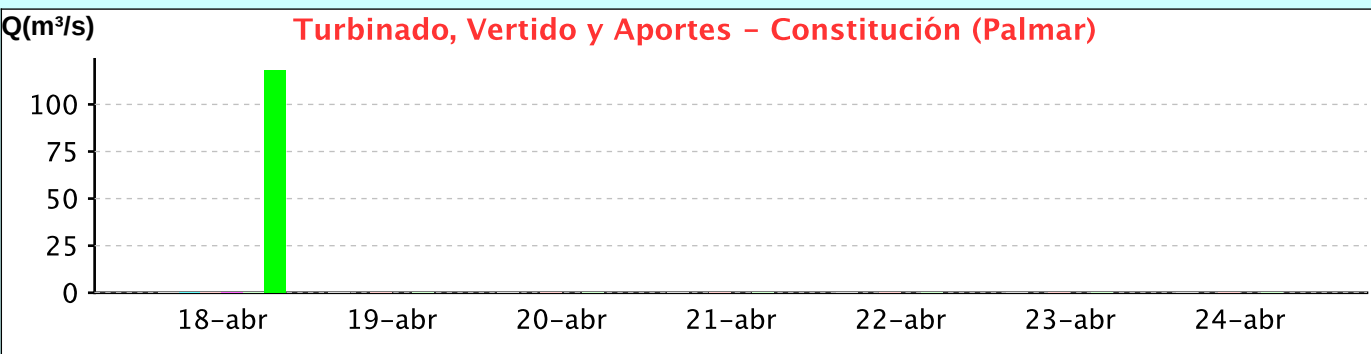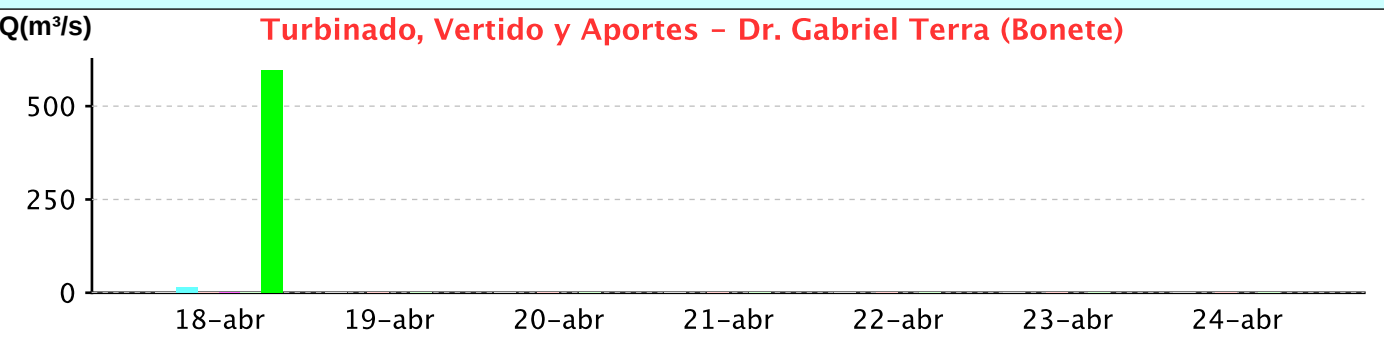

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

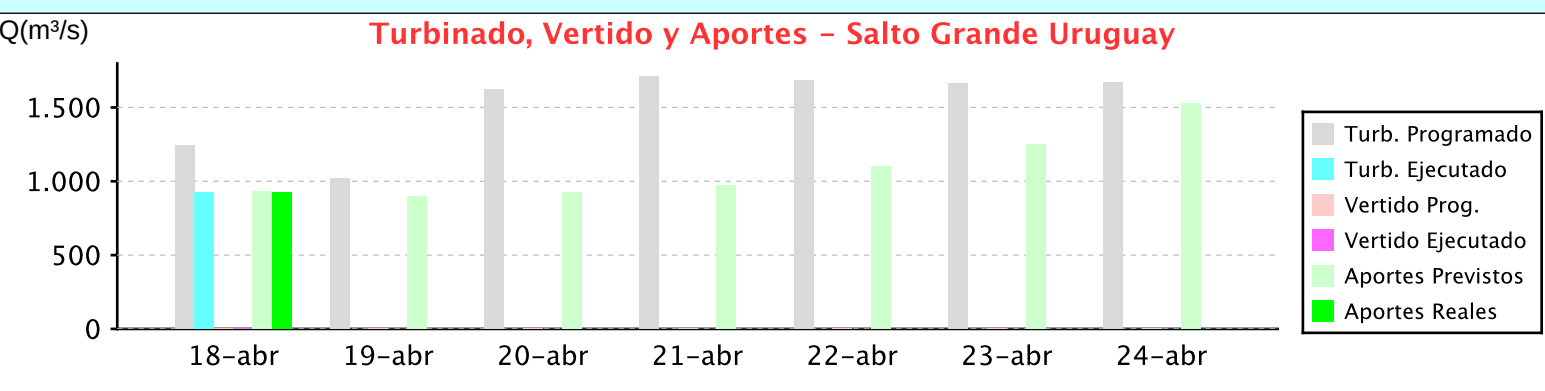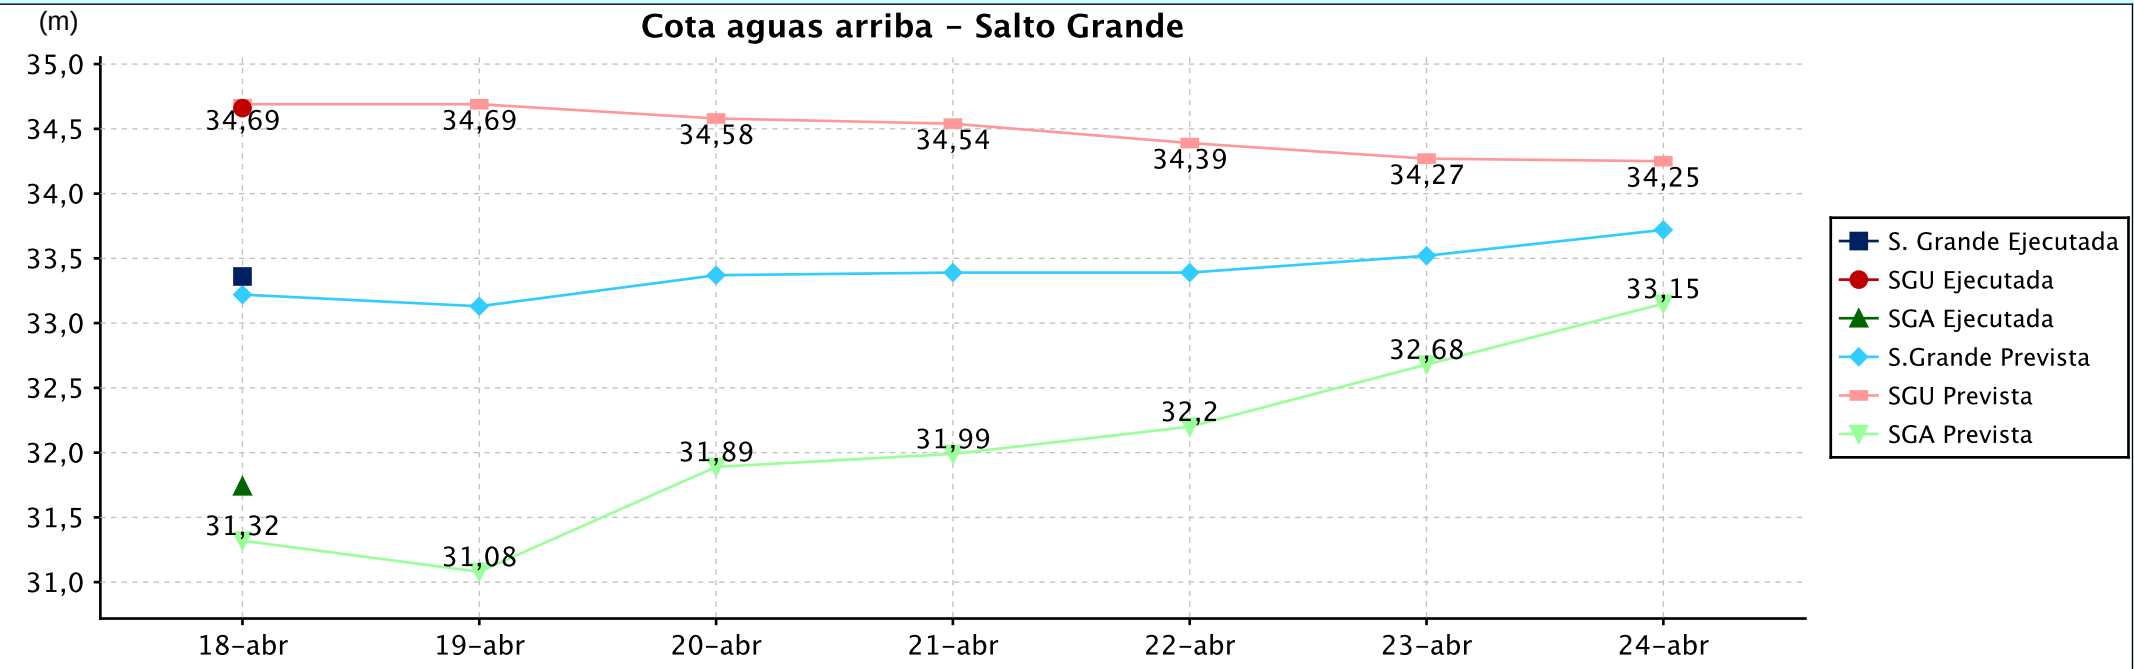

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,66
Cota Vista Arg	31,74
Cota real	33,36
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	54.013

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	16
Baygorria	0	5
Palmar	0	0
SGU	1.240	924

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	596
Baygorria	0	44
Palmar	0	118
SGU	929	925

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

5ta y 6ta fuera de servicio.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

28/04/2015 13:41
