




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 19 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.210
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.214
Central La Tablada	826
Central P. del Tigre	4.907
APR A	1.083
APR B	1.361
APR C	1.264
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	-6
C. Palmar	190
C. Salto Grande	4.823
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.342
TOTAL Generación	23.000

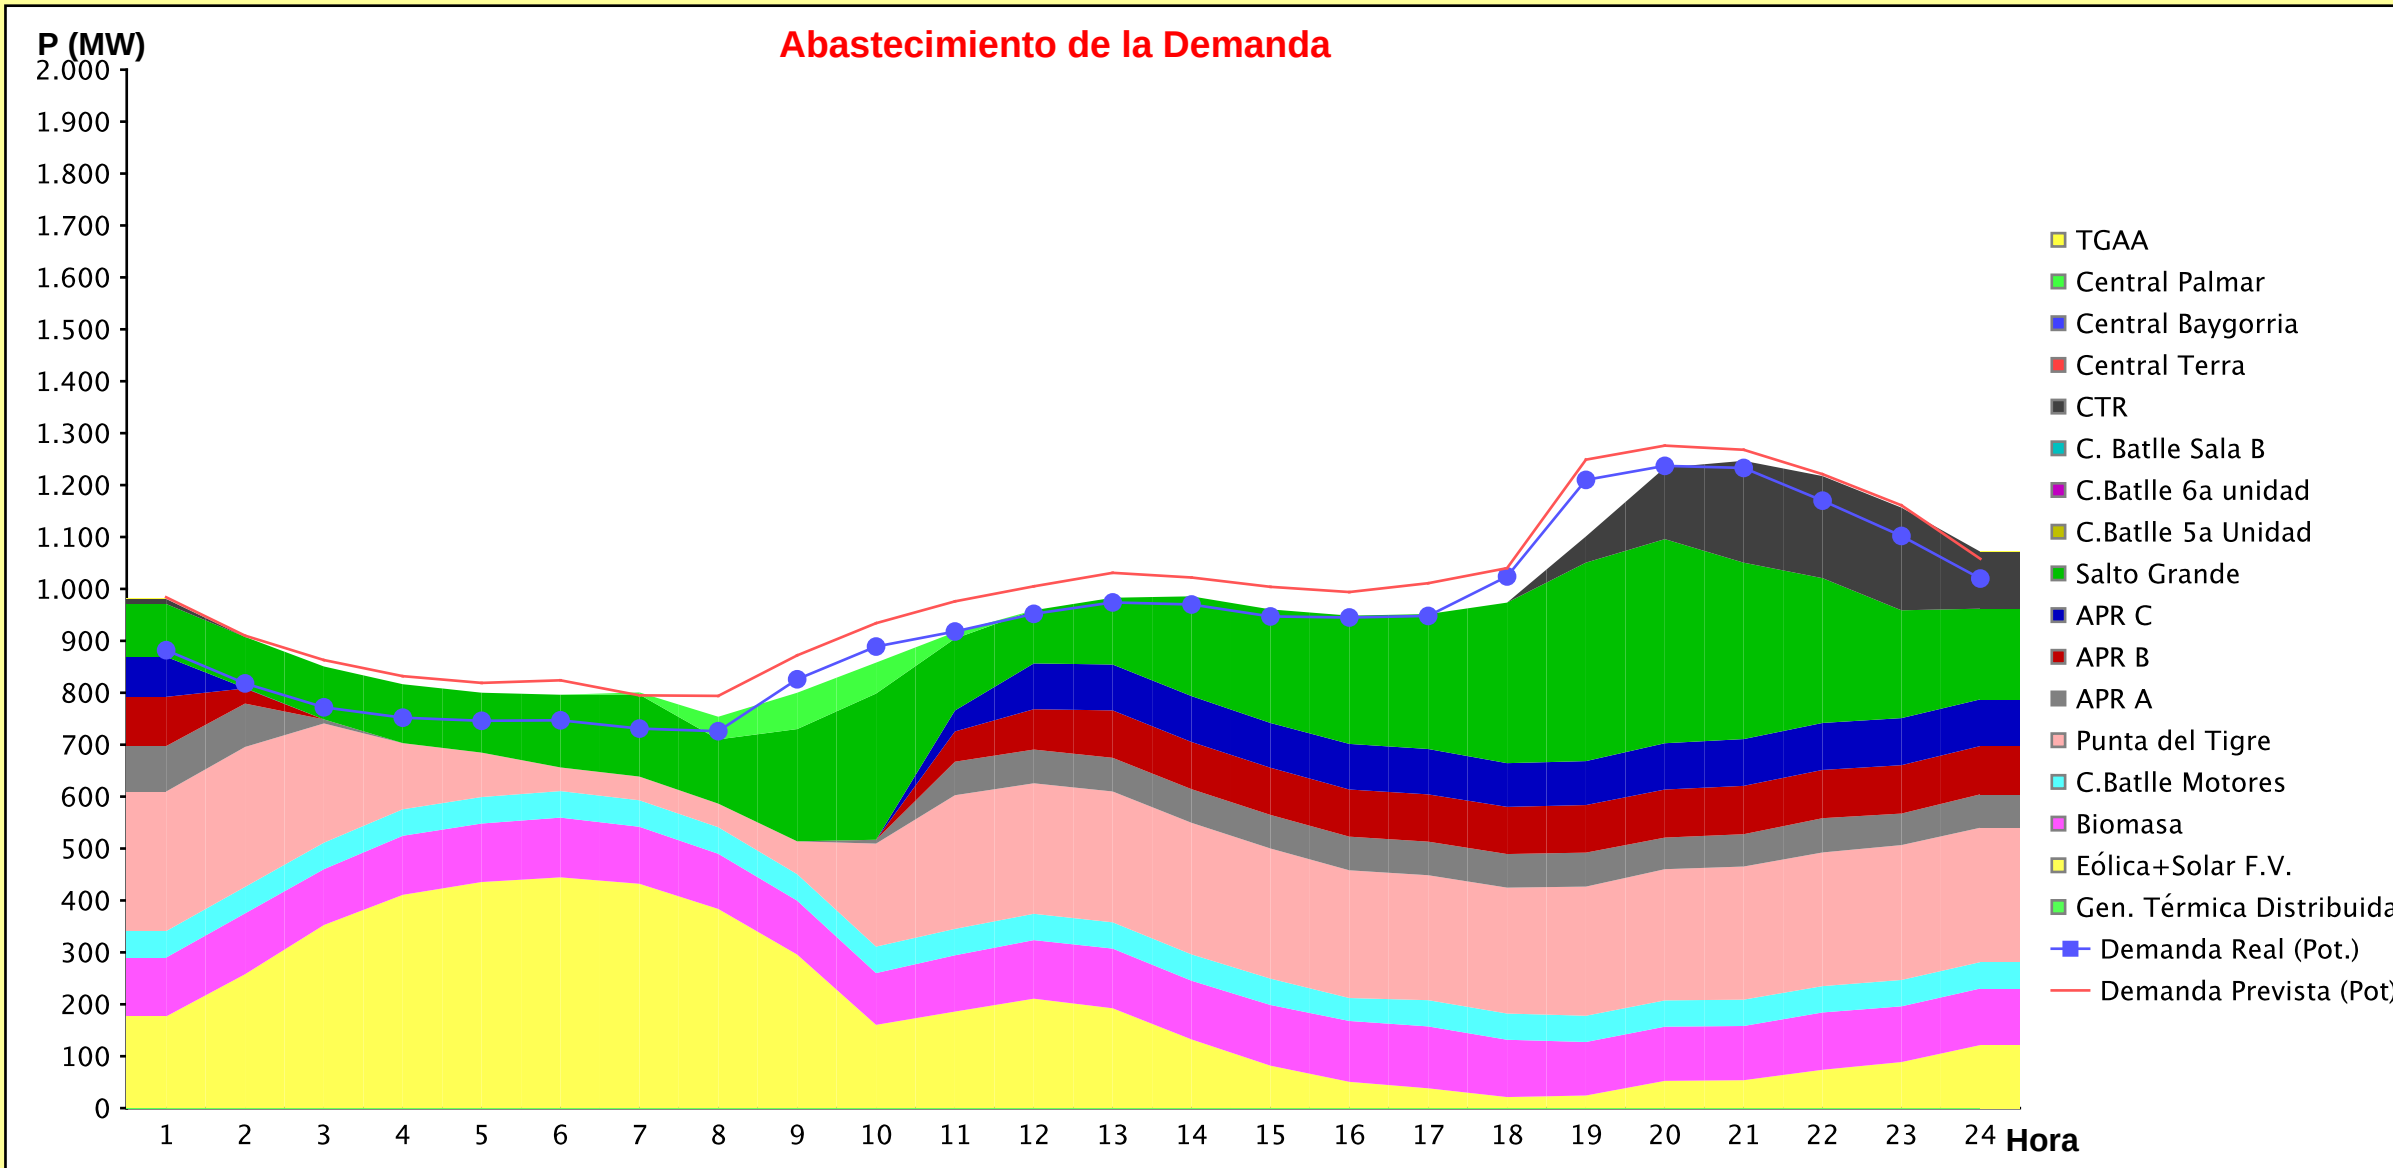

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.000
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	23.943
Diferencia (MWh)	-943
Ejecutada - Programada	-3,94 %


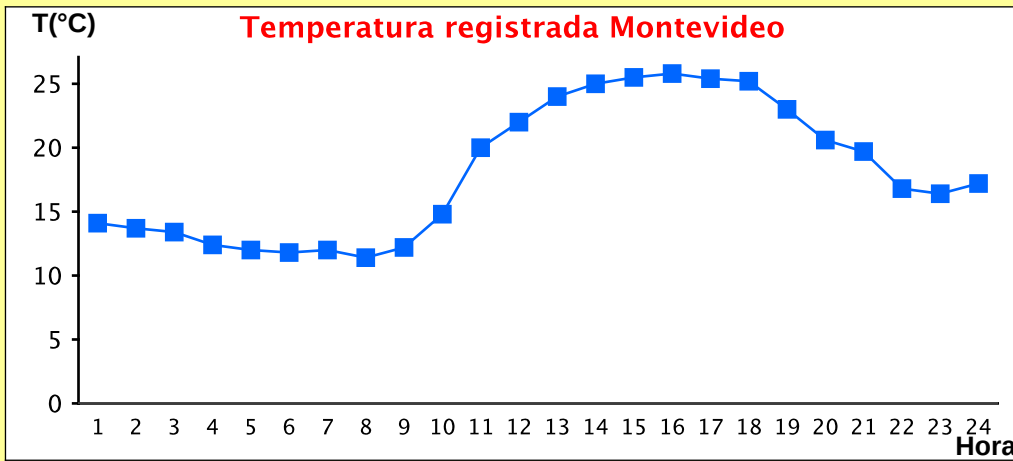


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	970,27 Hora 14:04
Potencia mínima:	681,38 Hora 07:11
Pico noche:	1248,75 Hora 19:27

Generación Media (MW)	
Eólica	195,2
Biomasa	110,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


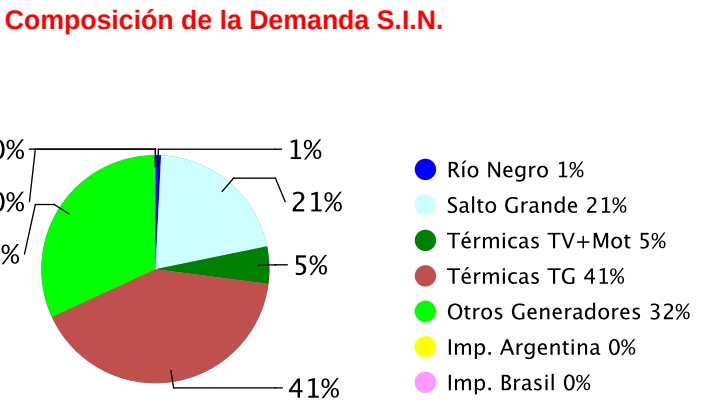


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

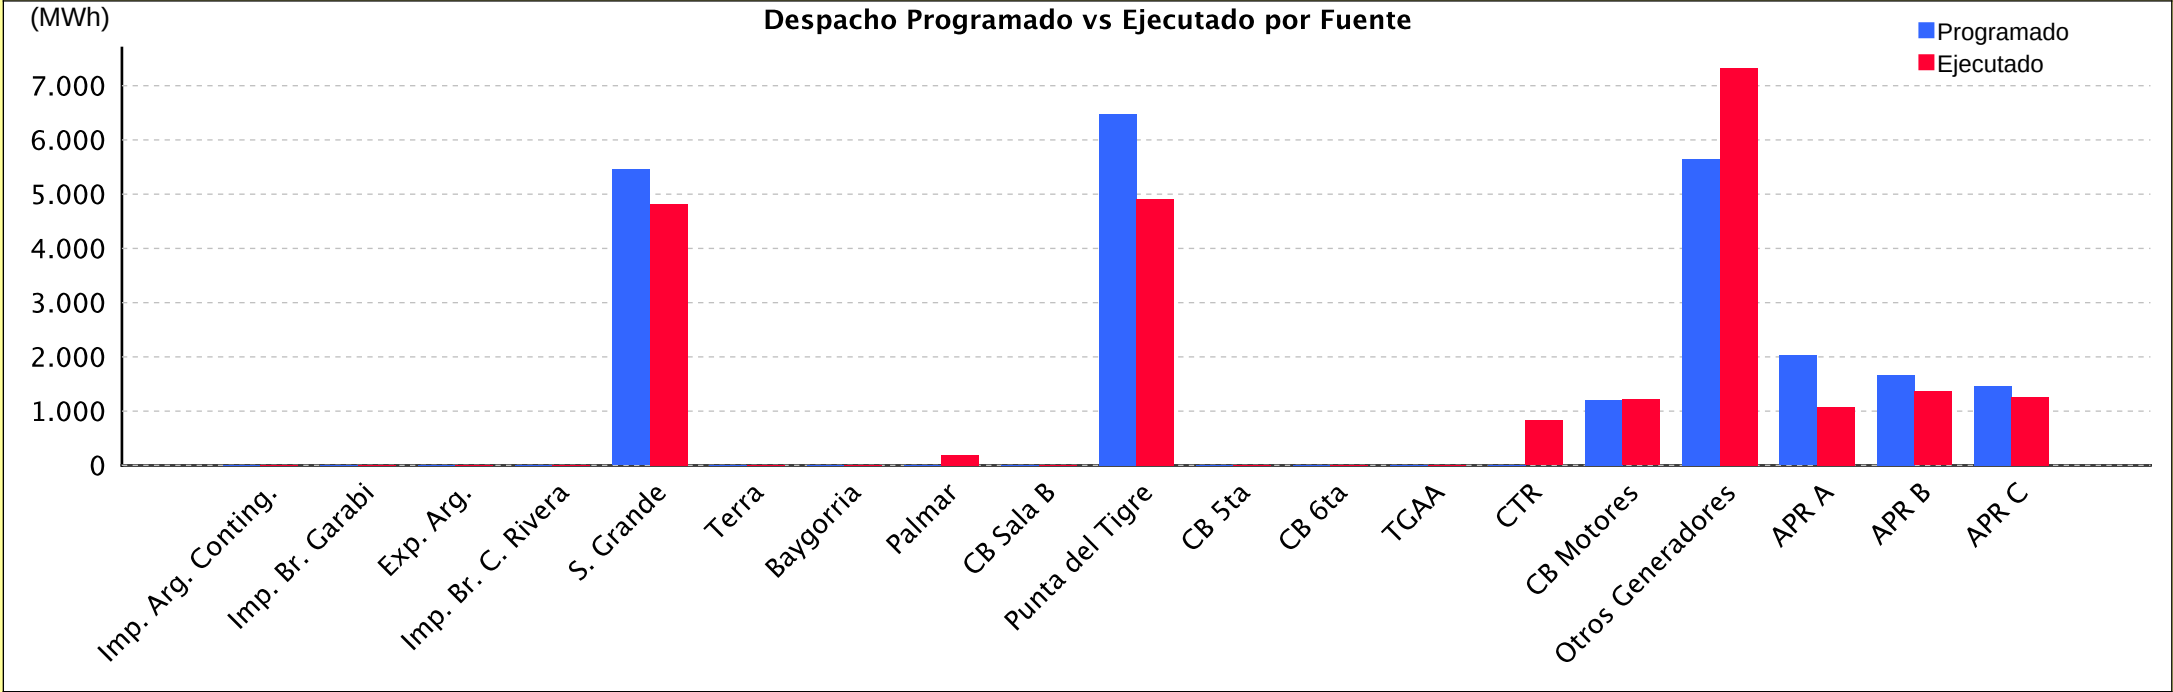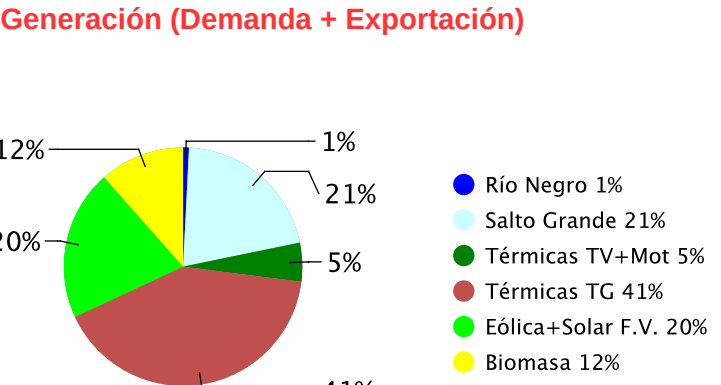



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

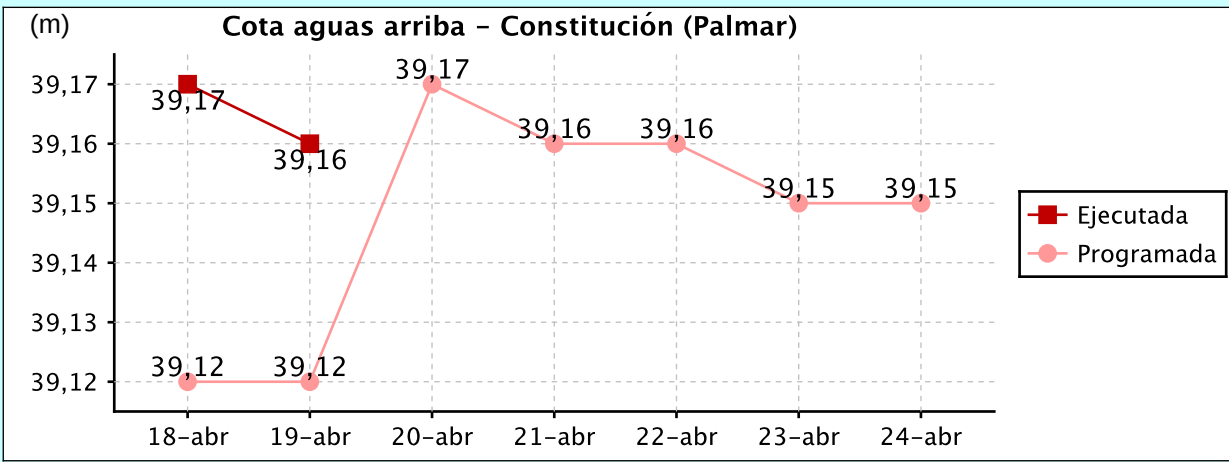
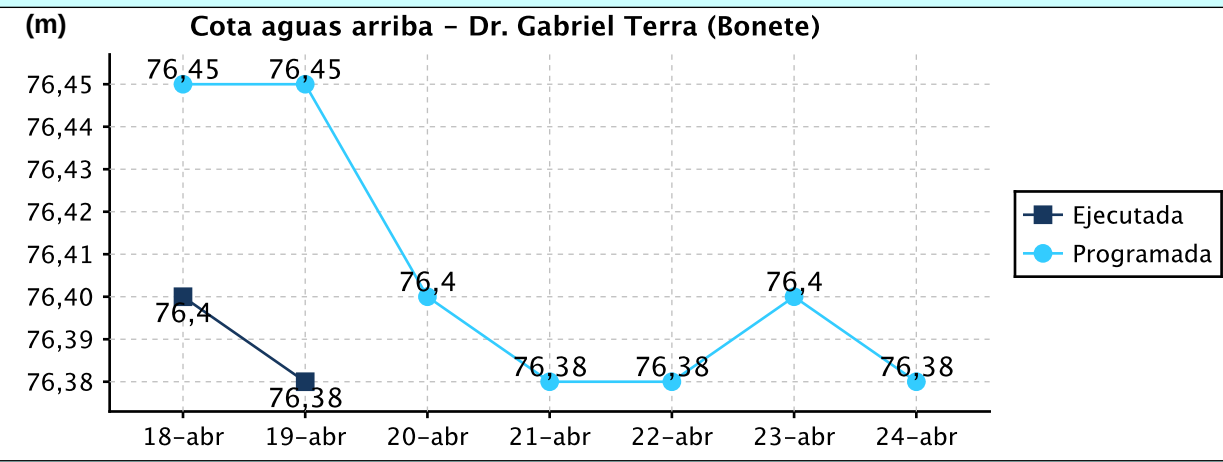


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,45	76,38
Baygorria	53,95	53,95
Palmar	39,12	39,16
SGU	34,69	34,69

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

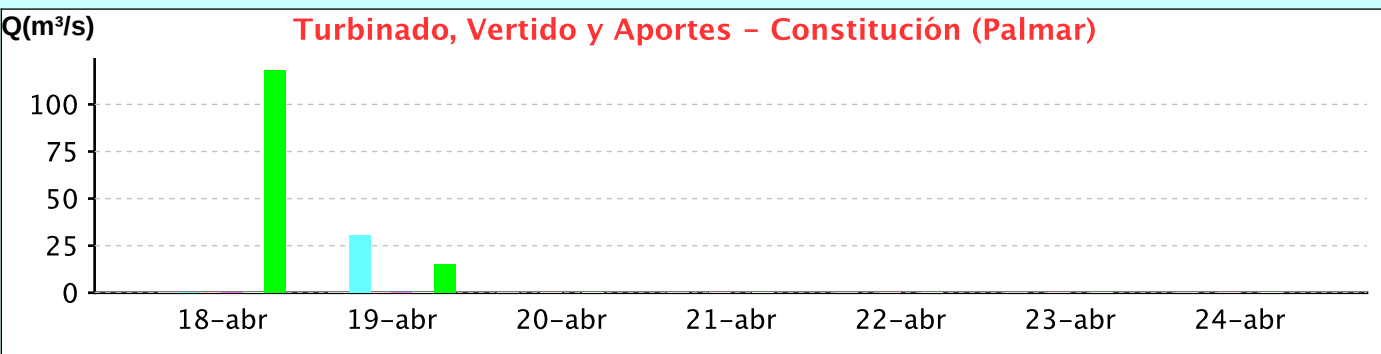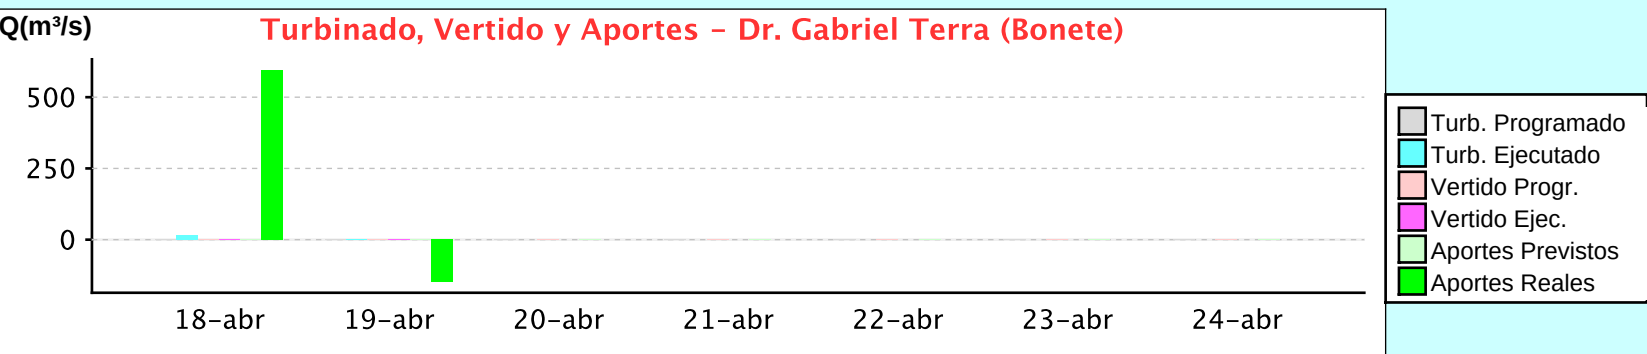

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

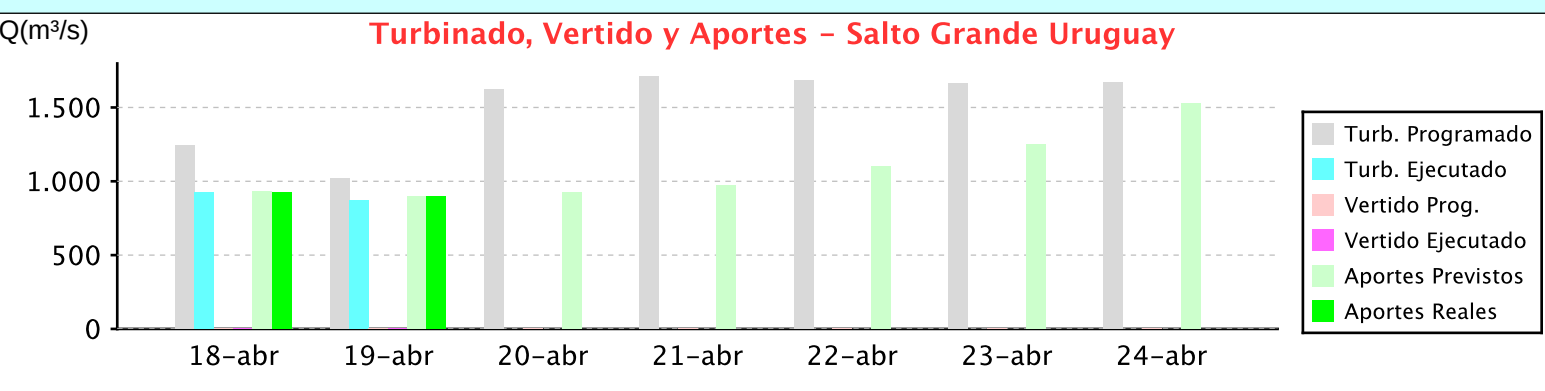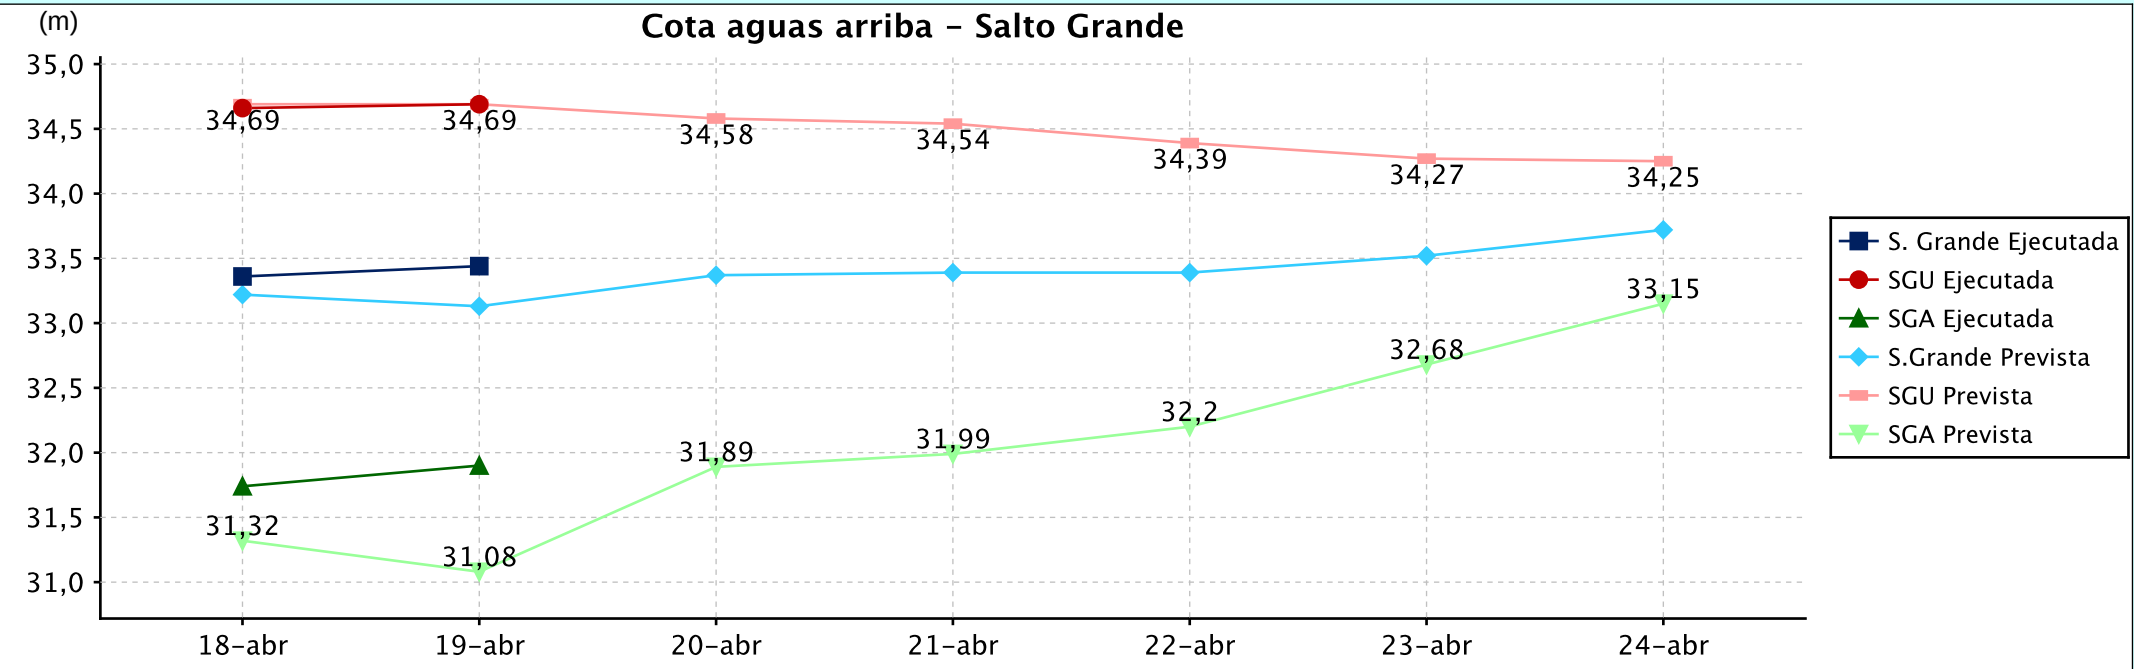

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,69
Cota Vista Arg	31,90
Cota real	33,44
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
52.401	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	31
SGU	1.019	870

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-149
Baygorria	0	9
Palmar	0	15
SGU	900	896

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

5ta y 6ta fuera de servicio.
CTR forzado.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

28/04/2015 13:43
