




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 20 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.198
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.202
Central La Tablada	1.847
Central P. del Tigre	6.162
APR A	1.571
APR B	2.235
APR C	1.918
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	-6
C. Palmar	0
C. Salto Grande	6.215
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.691
TOTAL Generación	26.830

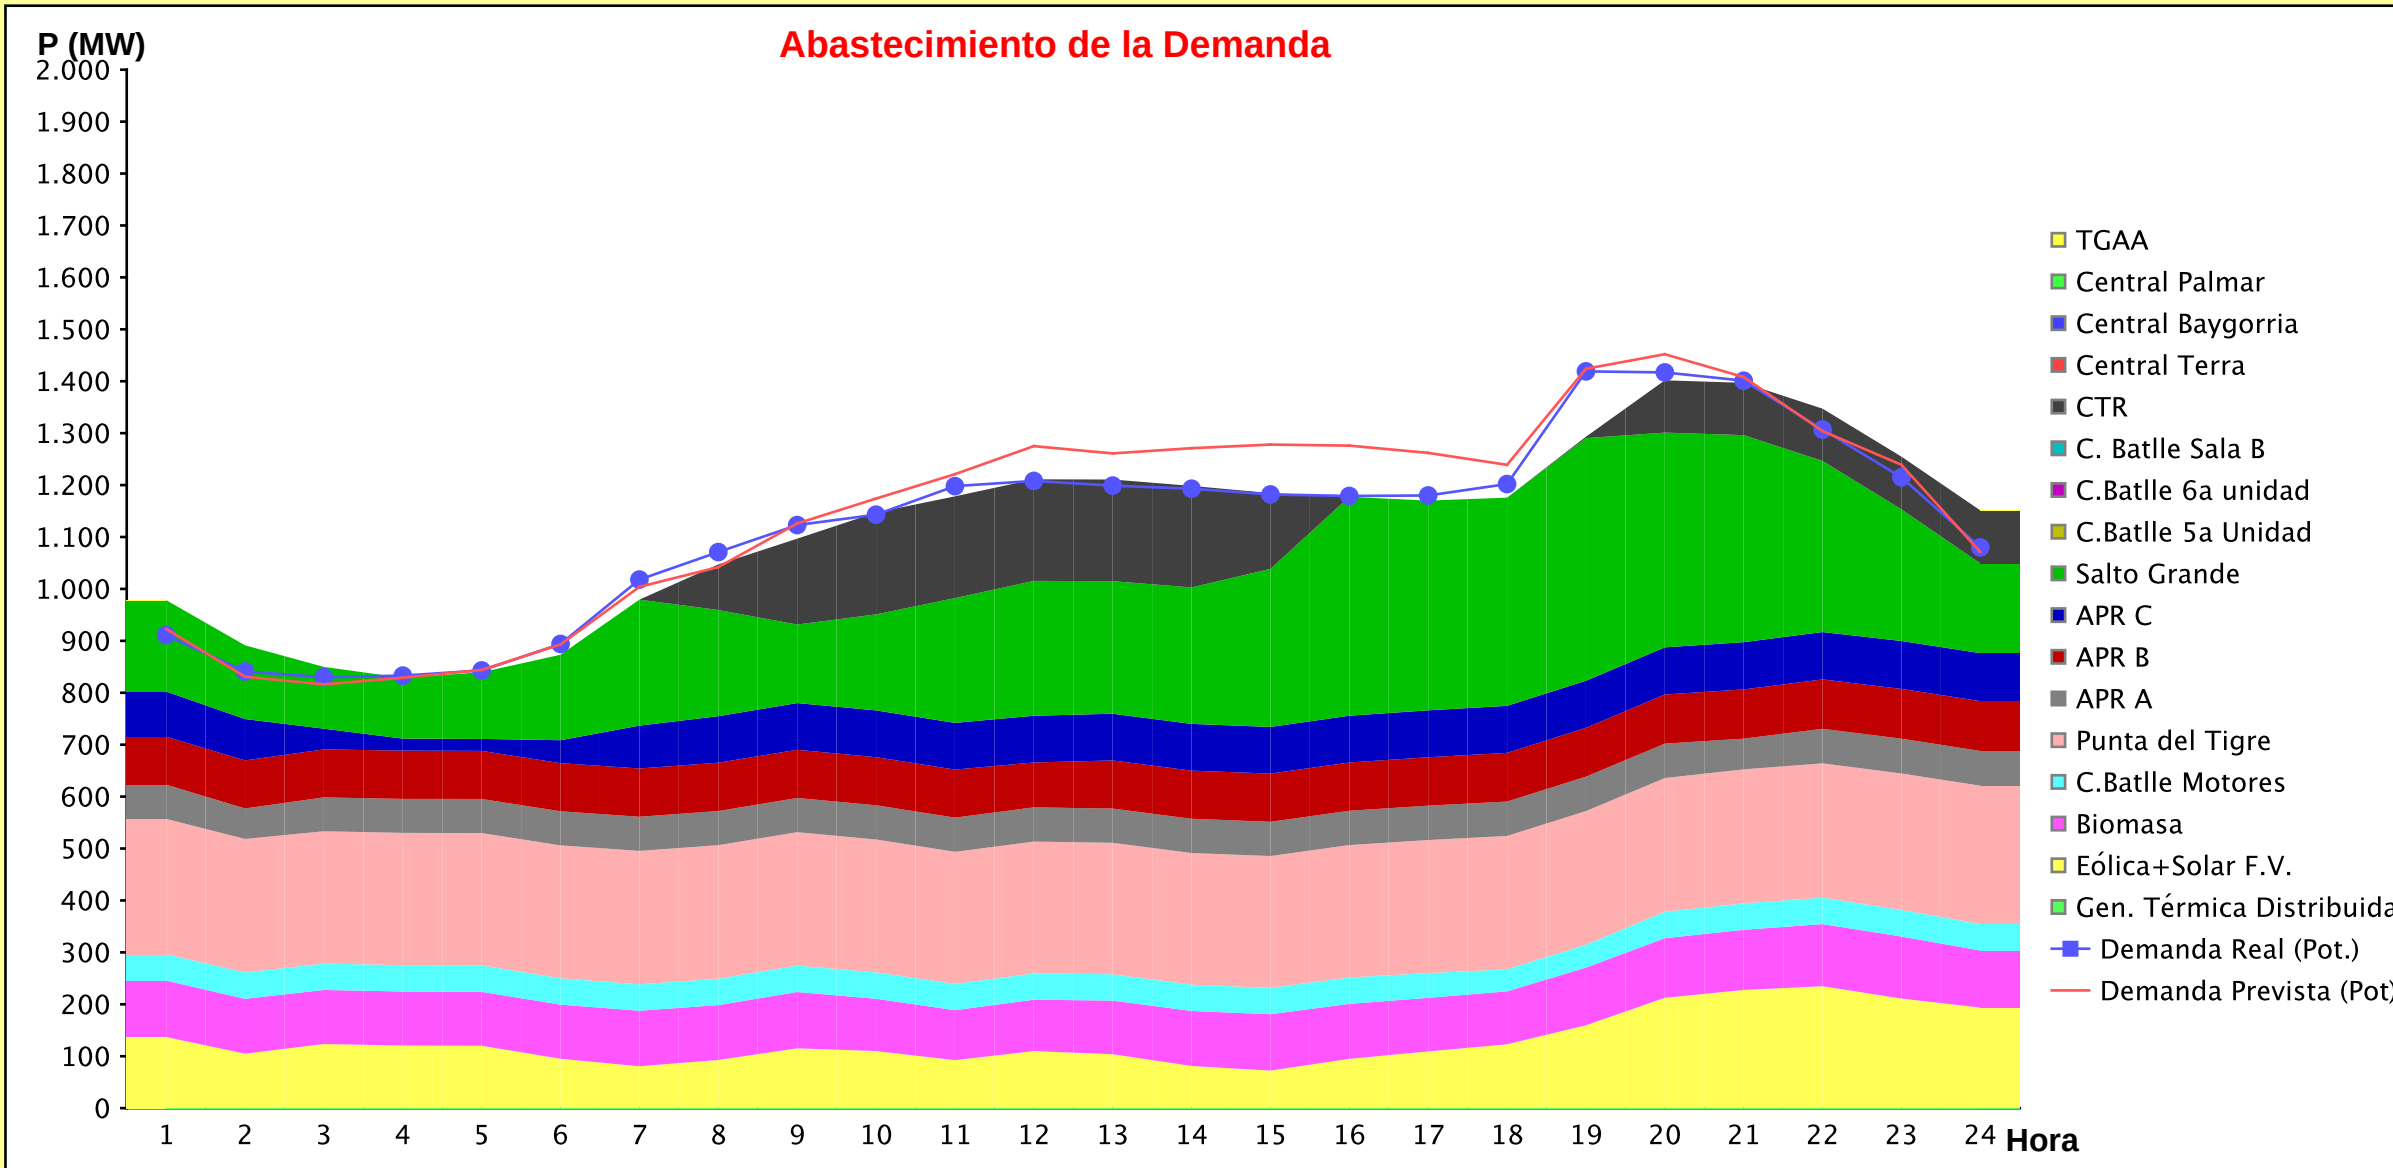

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.830
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.463
Diferencia (MWh)	-633
Ejecutada - Programada	-2,30 %

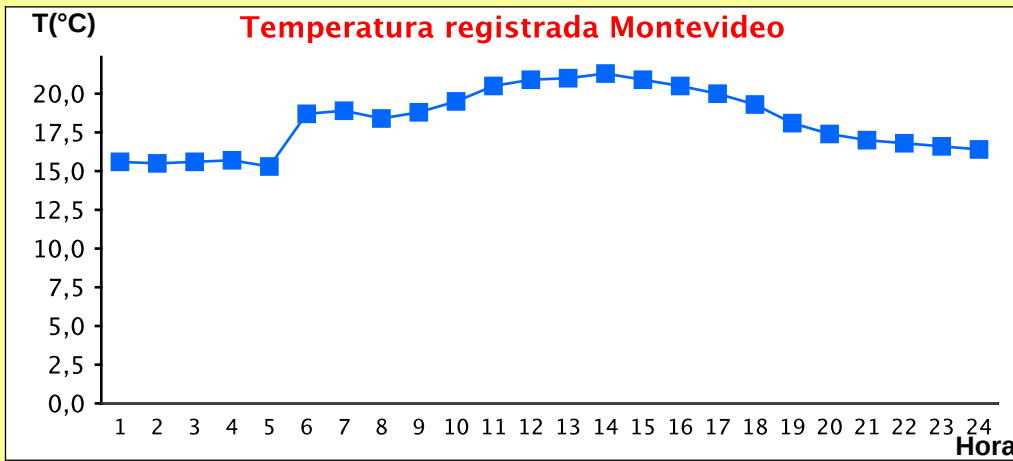


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1236,03 Hora 11:50
Potencia mínima:	824 Hora 03:32
Pico noche:	1419,54 Hora 19:52

Generación Media (MW)	
Eólica	130,8
Biomasa	108,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

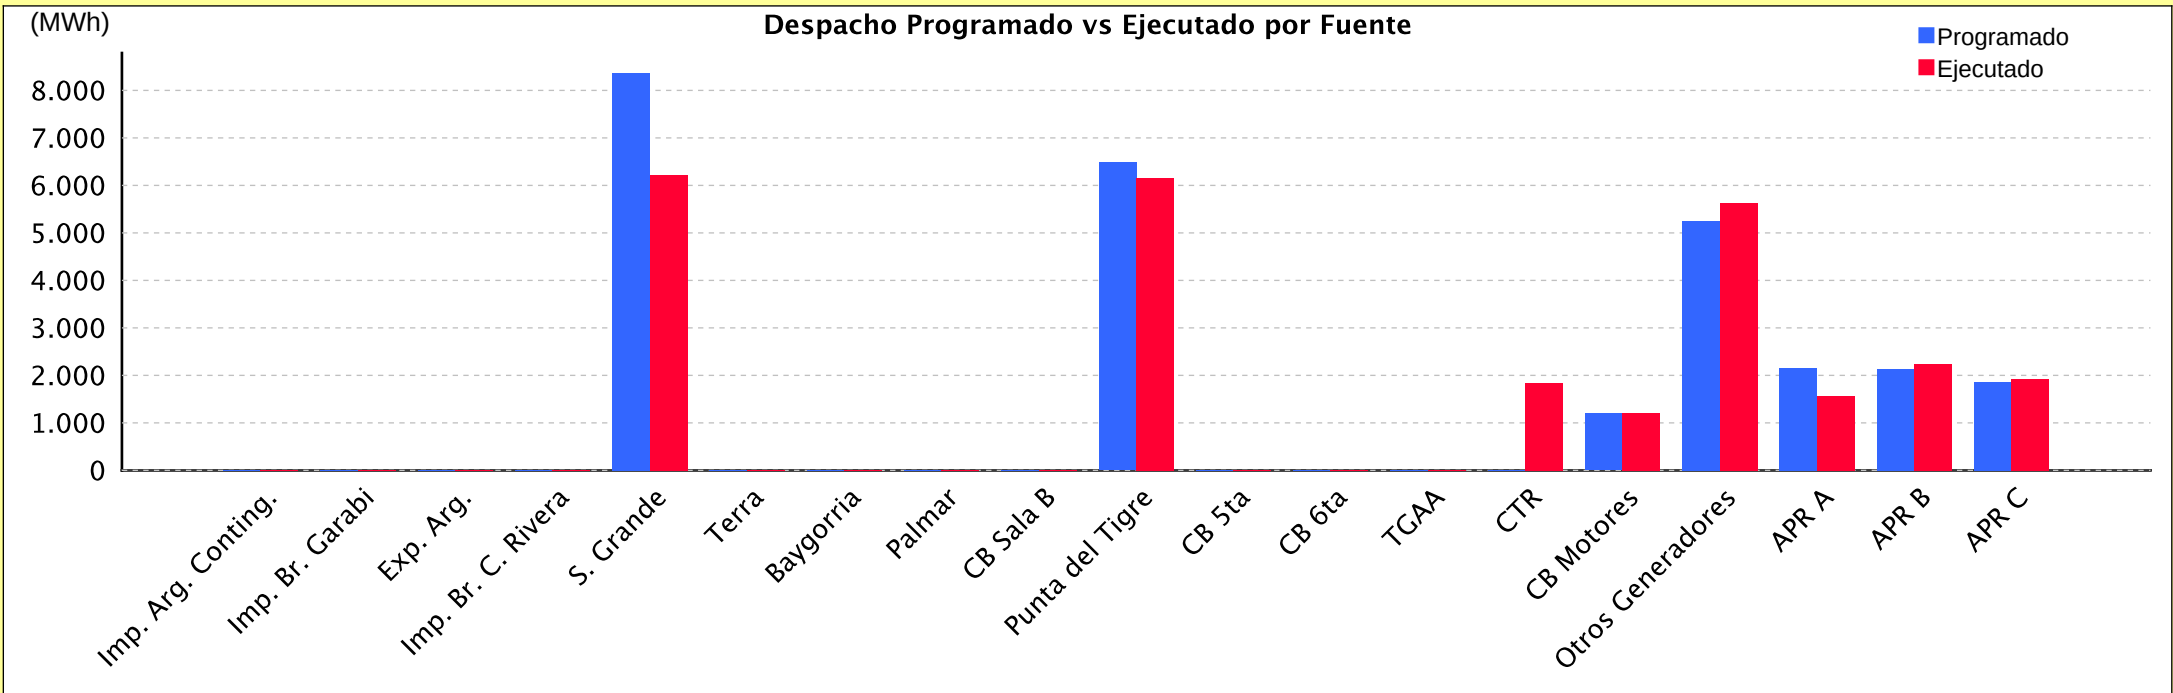
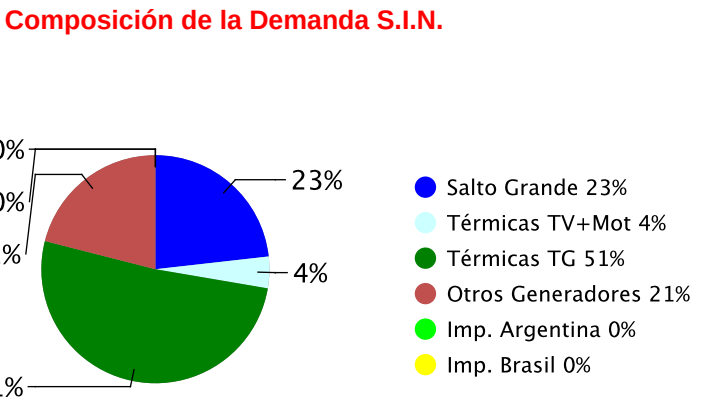


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

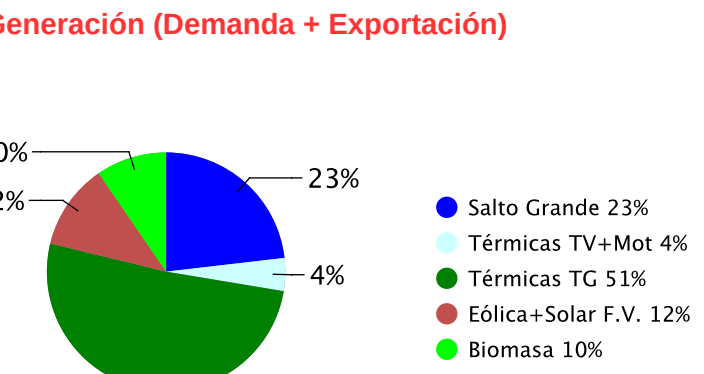



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

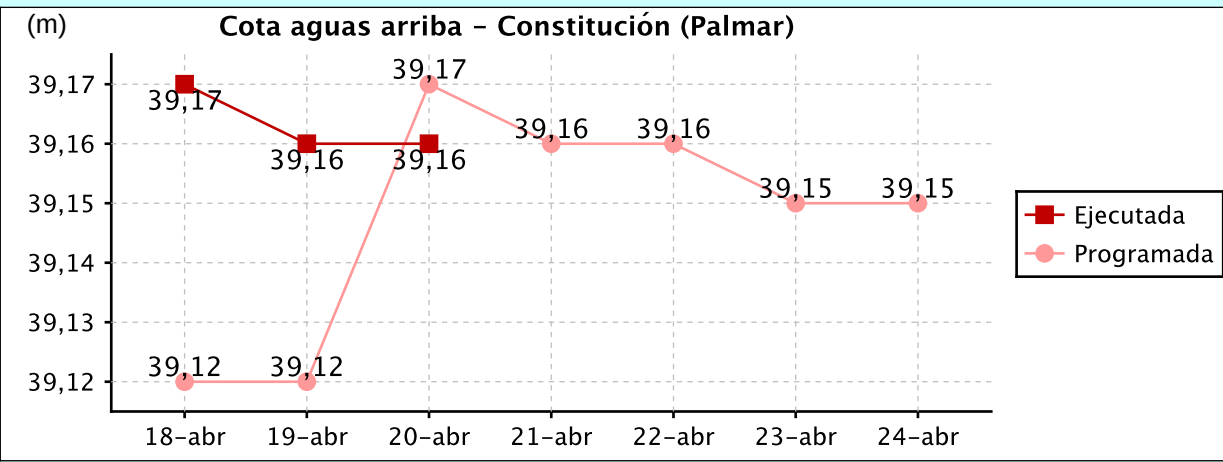
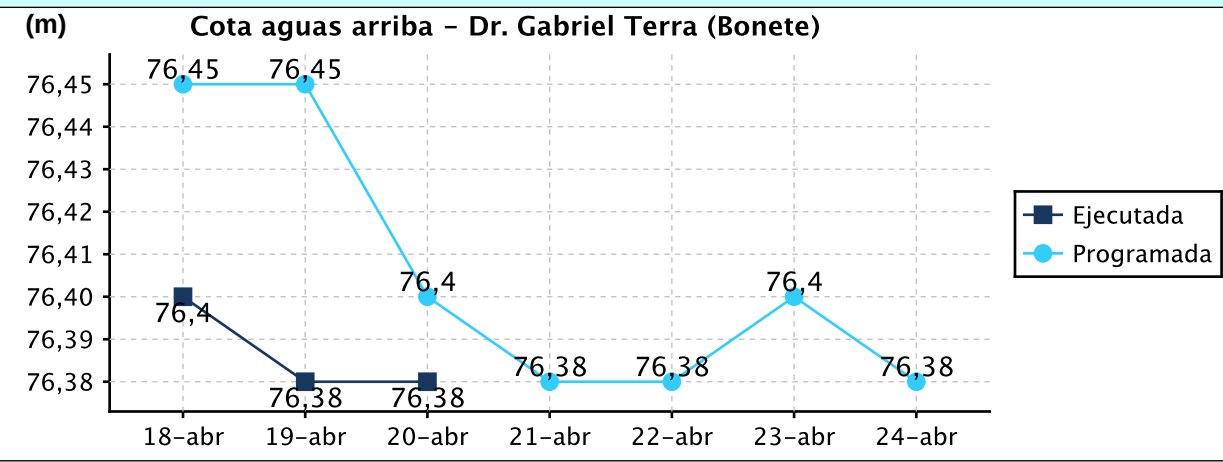


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,40	76,38
Baygorria	53,96	53,94
Palmar	39,17	39,16
SGU	34,58	34,61

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

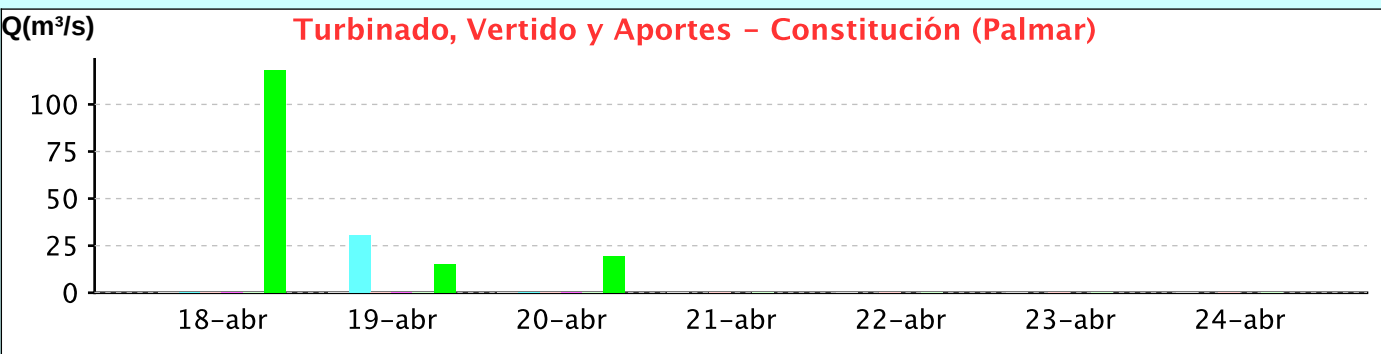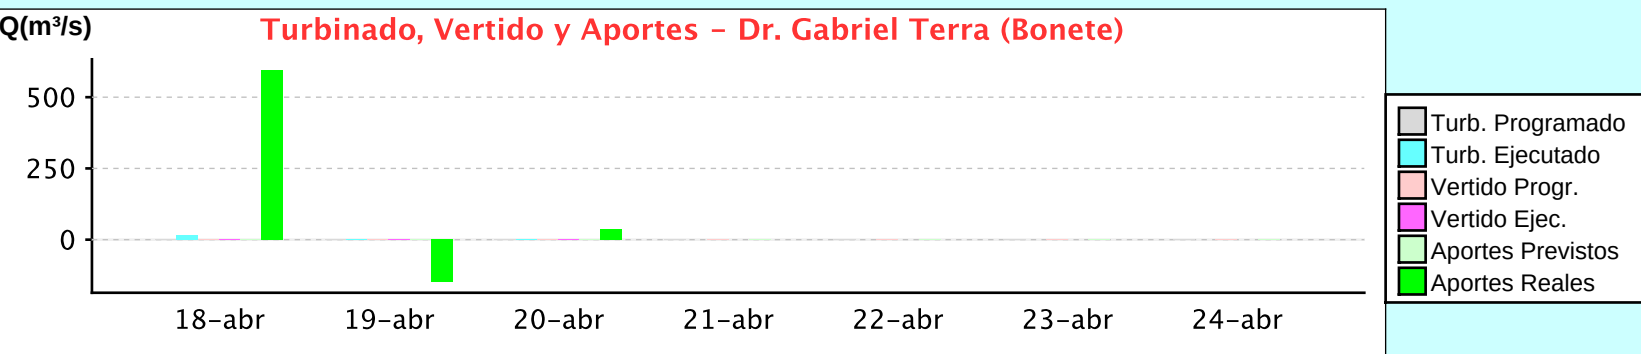

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

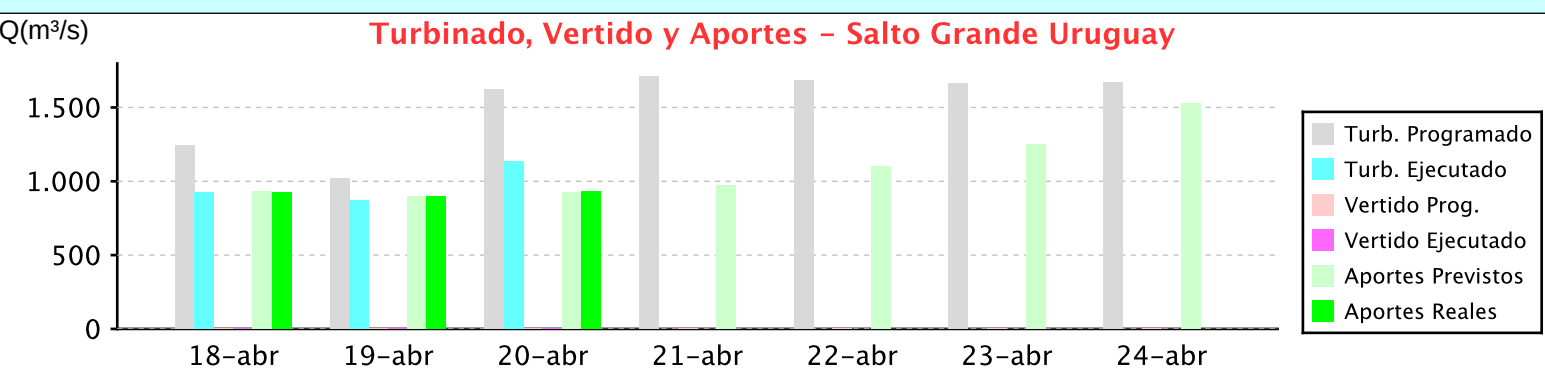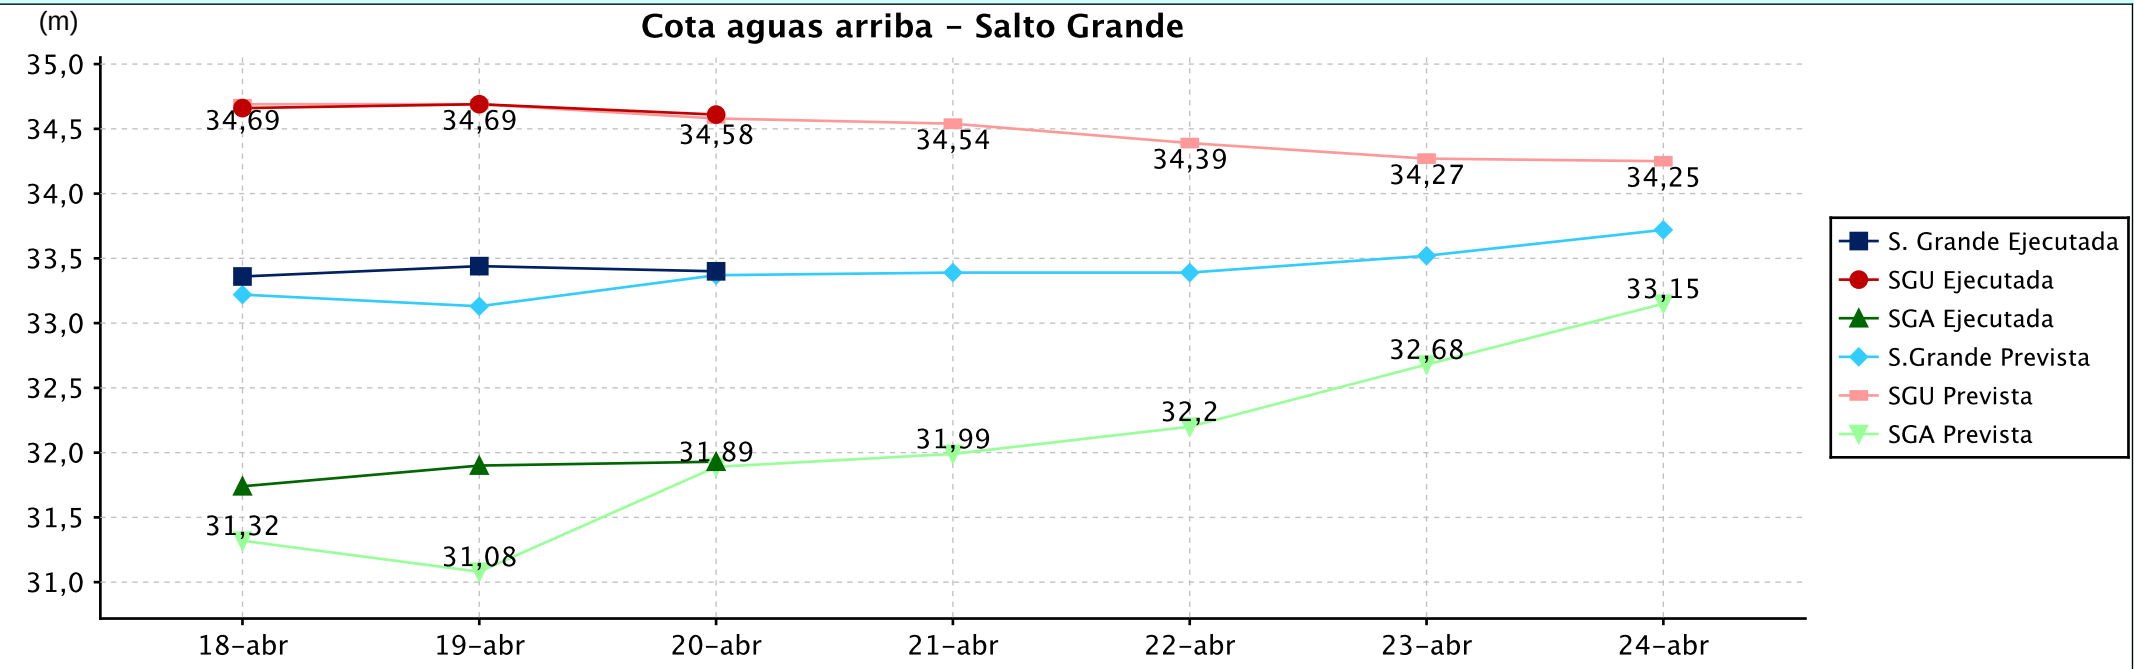

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,61
Cota Vista Arg	31,93
Cota real	33,40
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
49.956	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.621	1.133

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	36
Baygorria	0	-3
Palmar	0	19
SGU	925	934

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
