




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 21 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.140
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.143
Central La Tablada	636
Central P. del Tigre	6.266
APR A	1.565
APR B	1.929
APR C	1.814
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	-6
C. Palmar	0
C. Salto Grande	8.817
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.036
TOTAL Generación	27.195

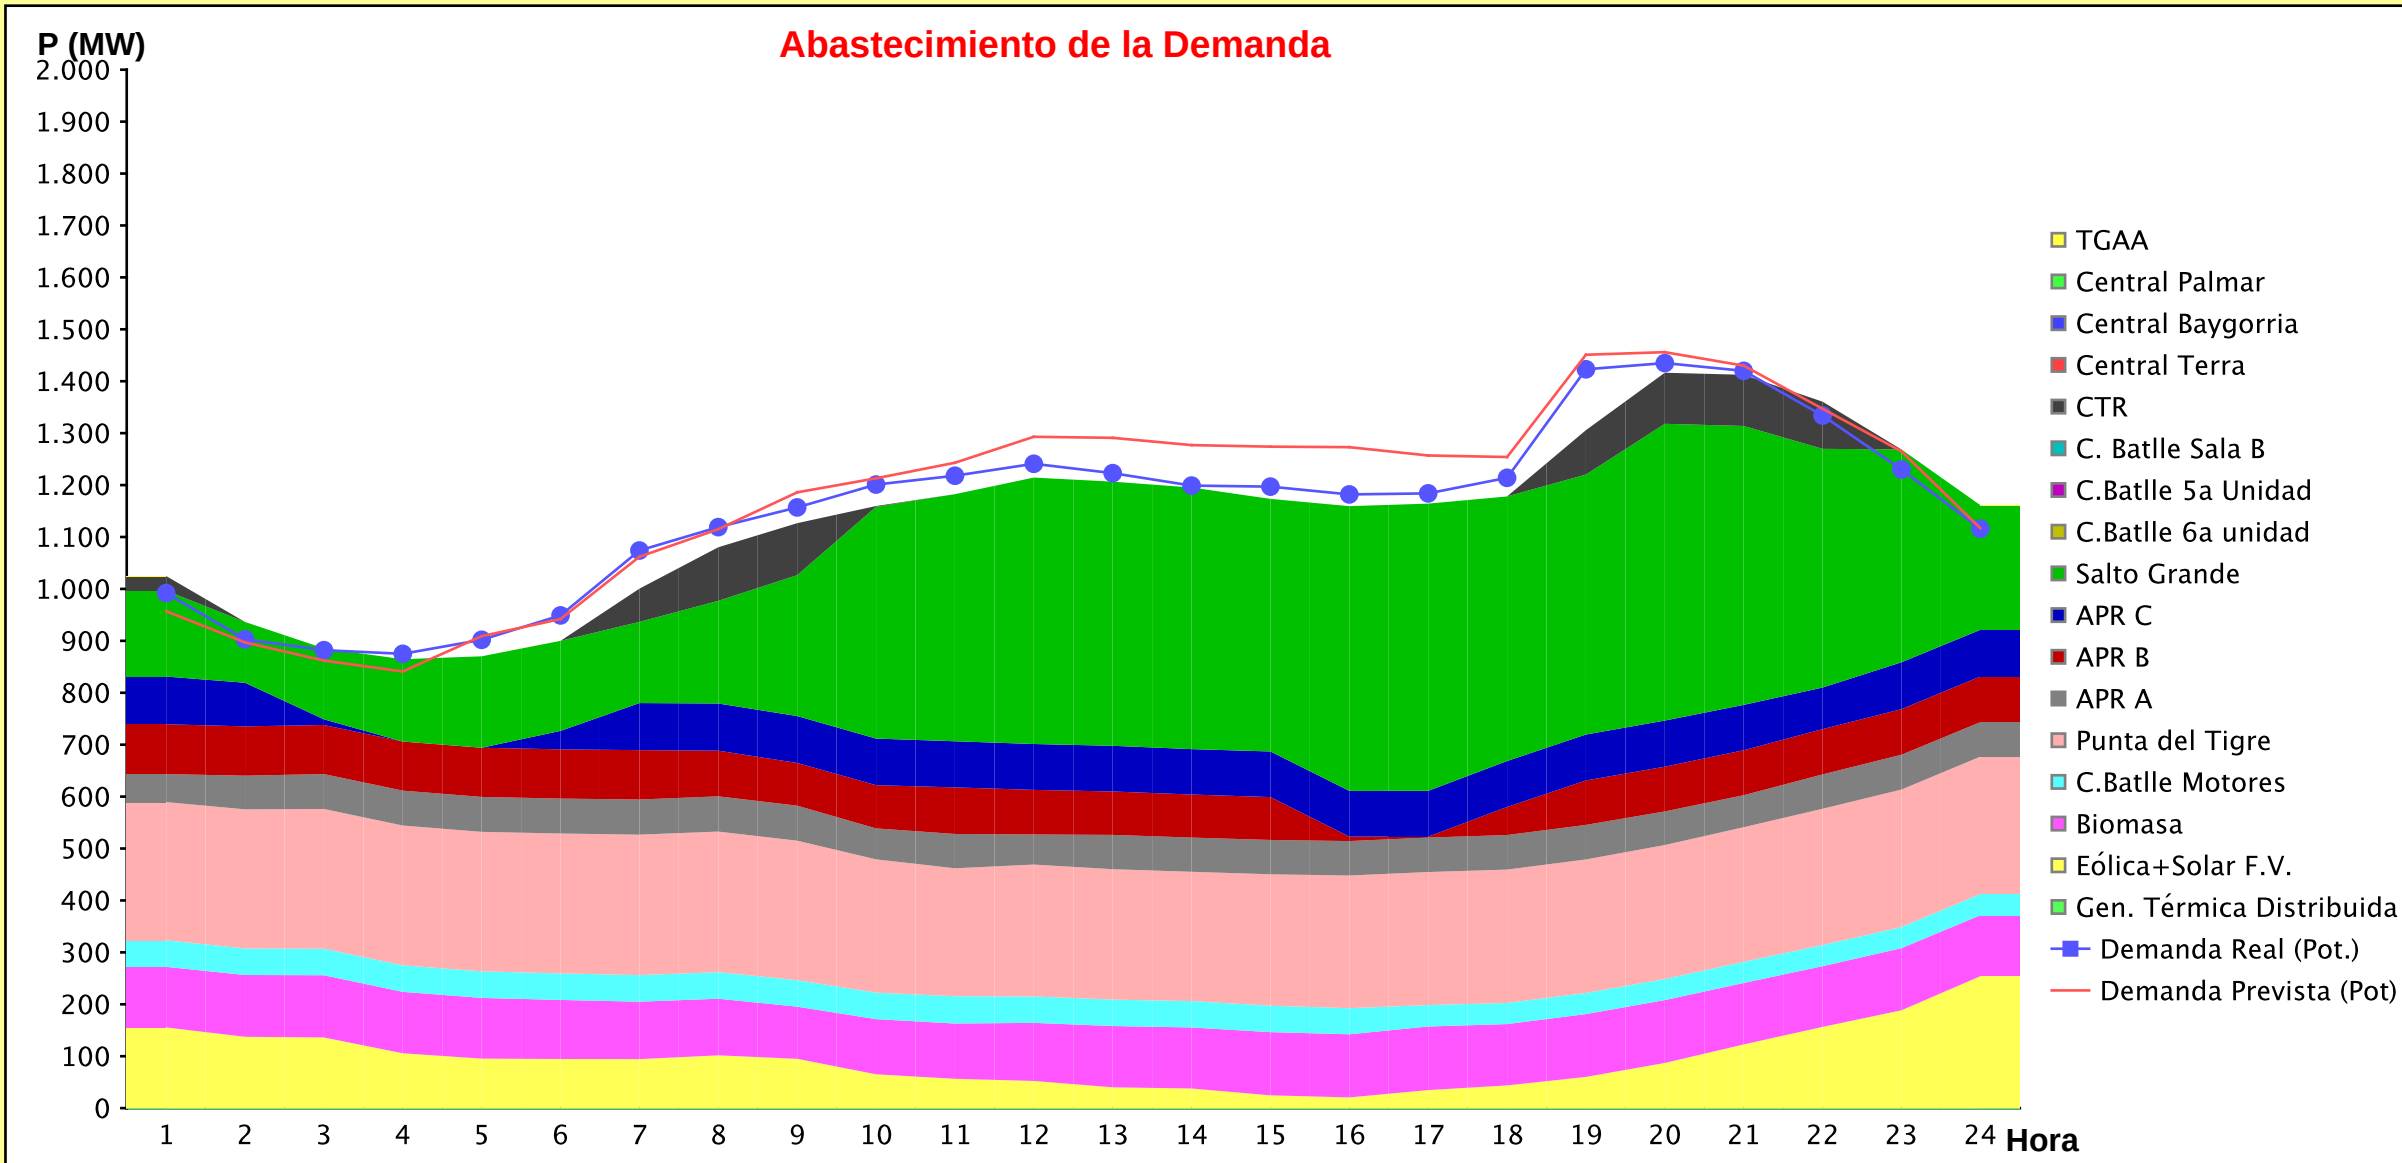

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.195
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.212
Diferencia (MWh)	-1.017
Ejecutada - Programada	-3,61 %

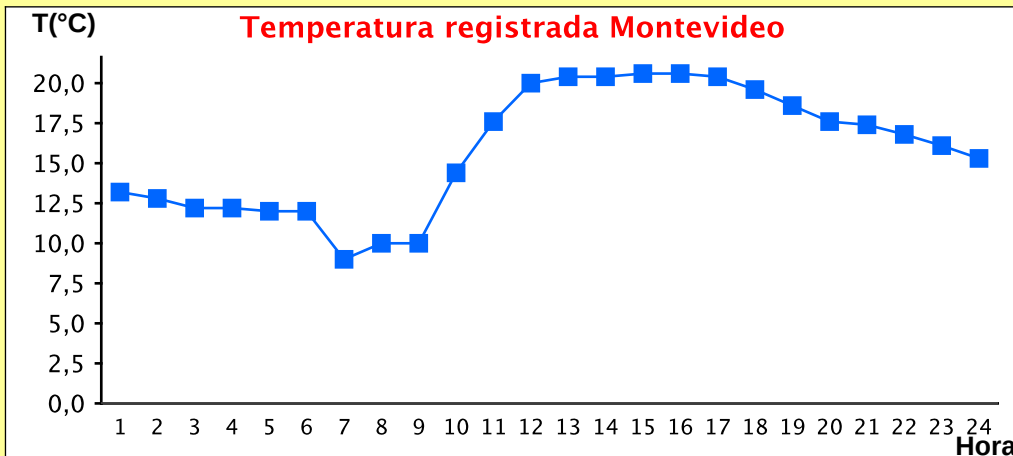


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1251,78 Hora 11:51
Potencia mínima:	862,02 Hora 03:34
Pico noche:	1440,49 Hora 19:20

Generación Media (MW)	
Eólica	95,4
Biomasa	116,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

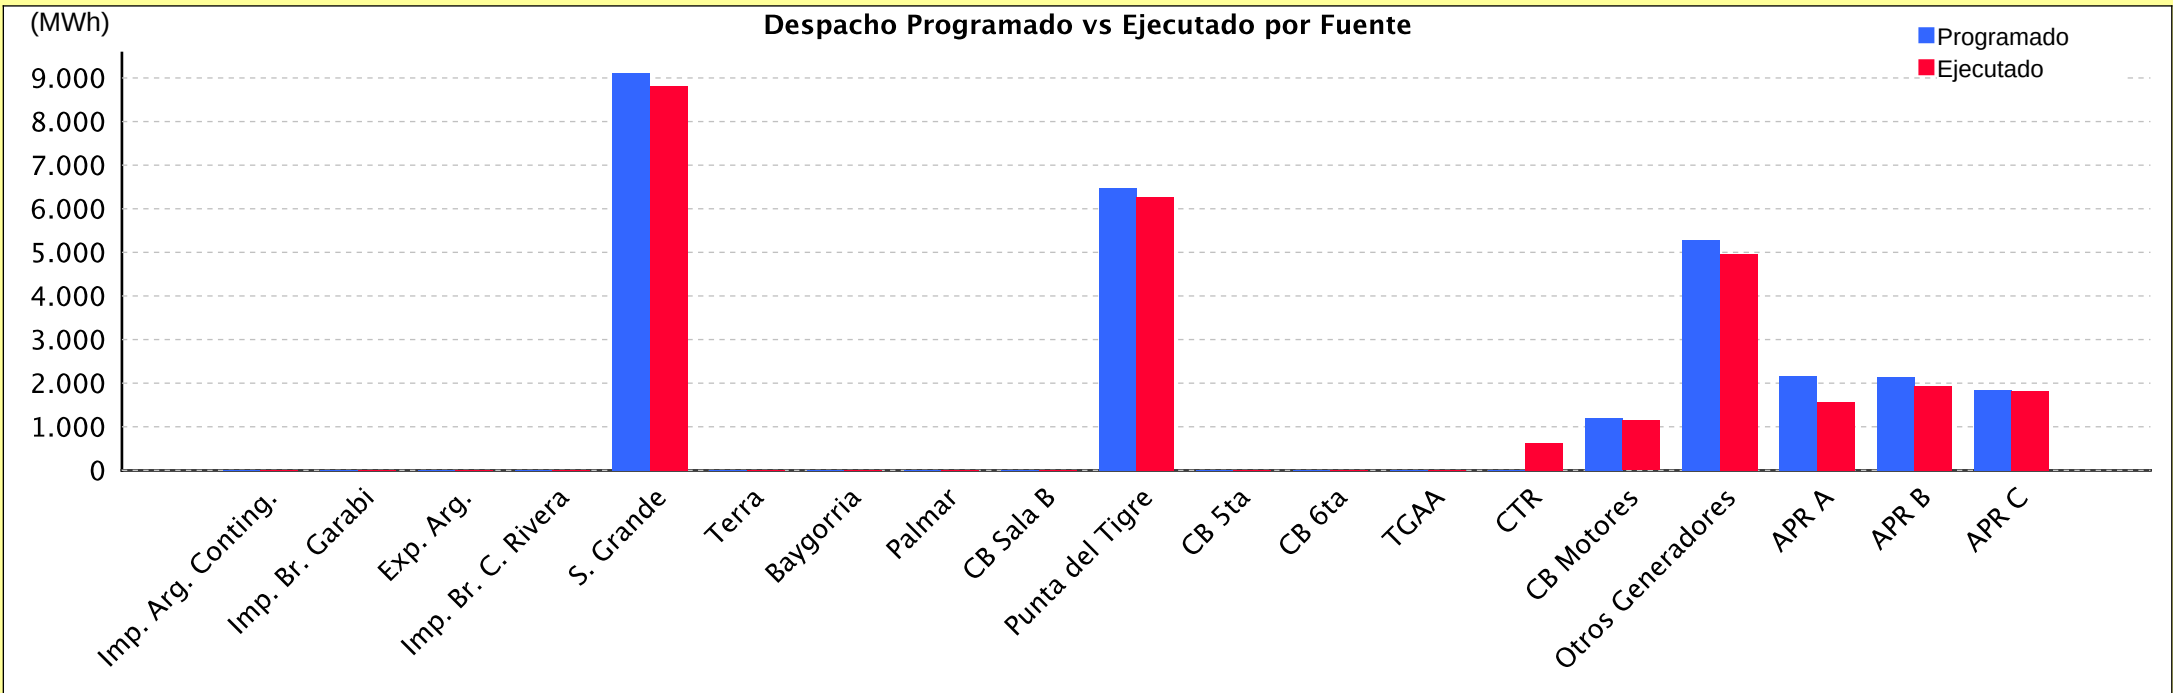
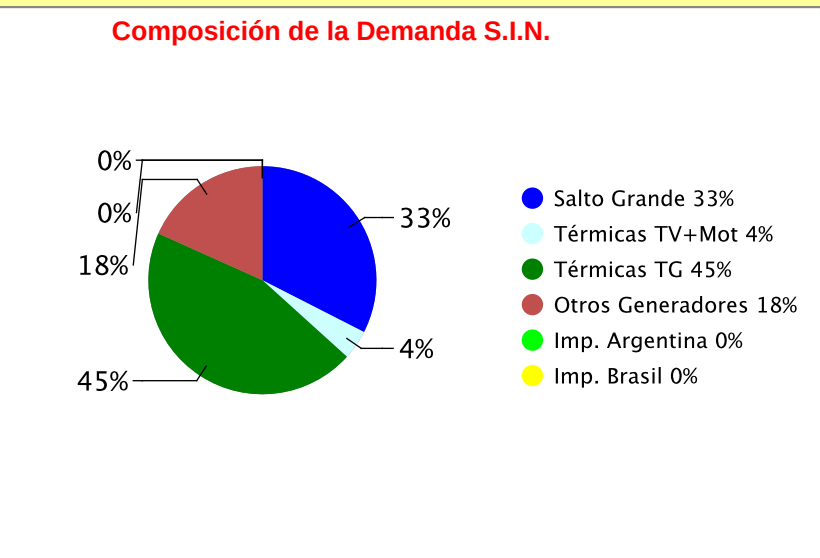


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

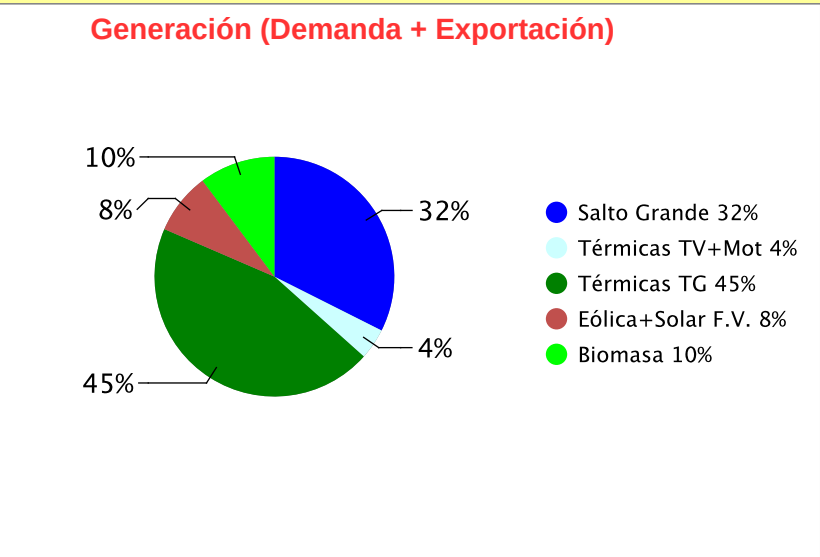



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

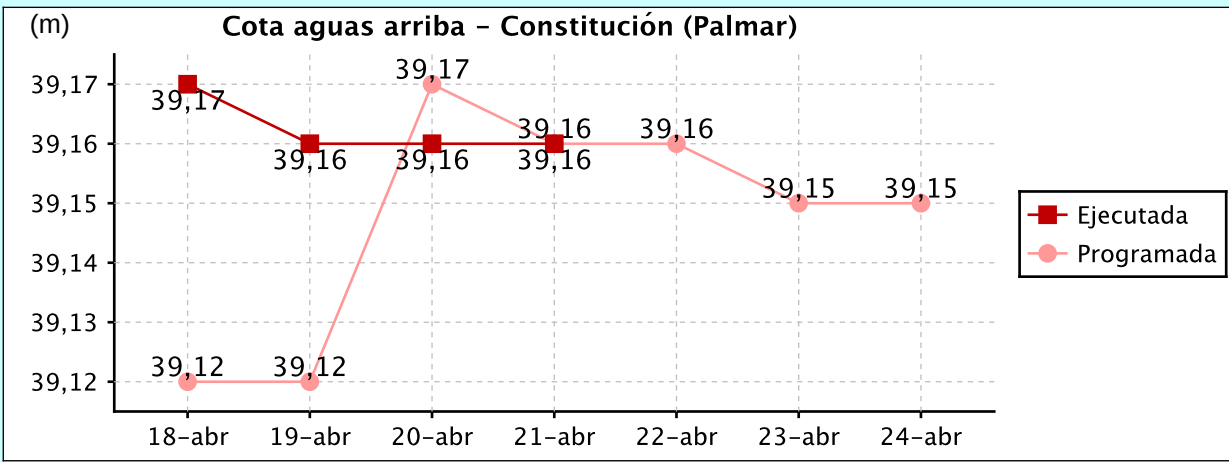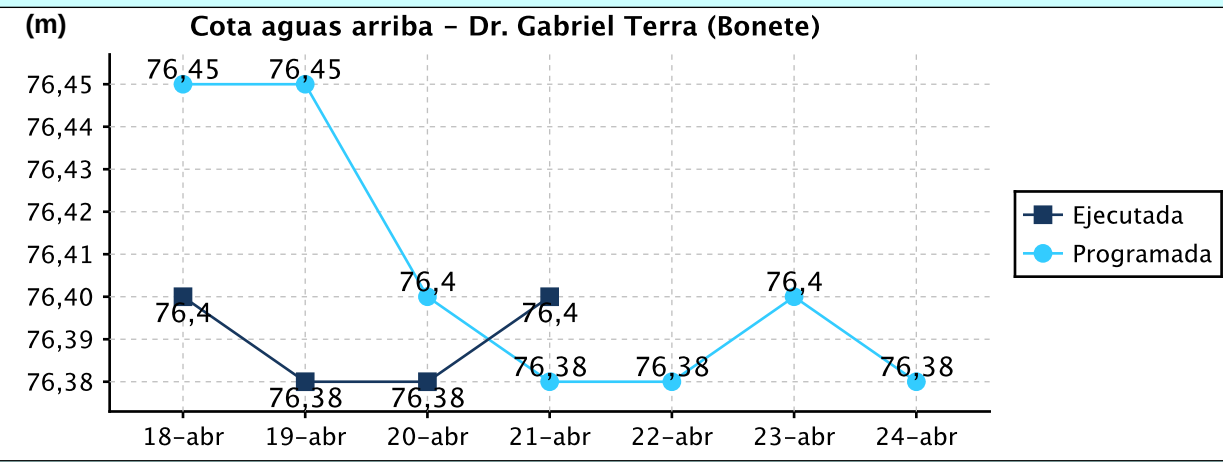


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,38	76,4
Baygorria	53,95	53,94
Palmar	39,16	39,16
SGU	34,54	0

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

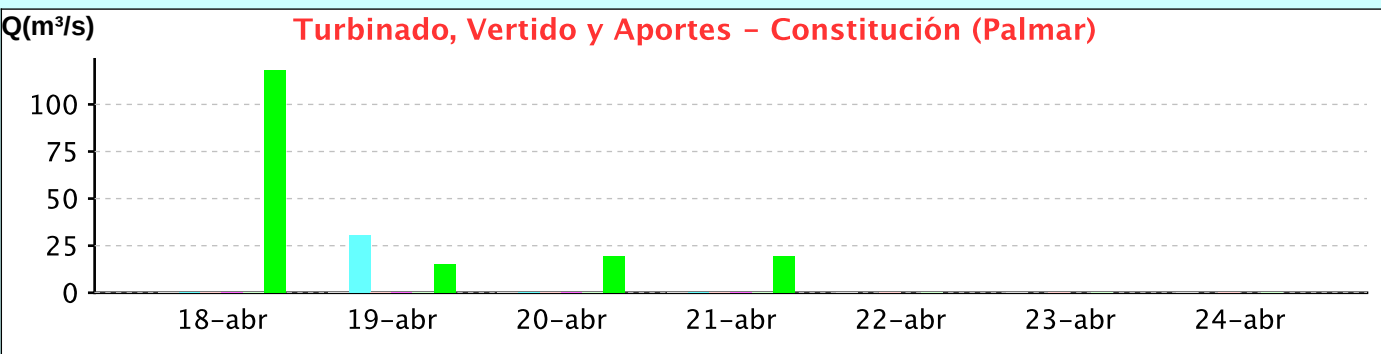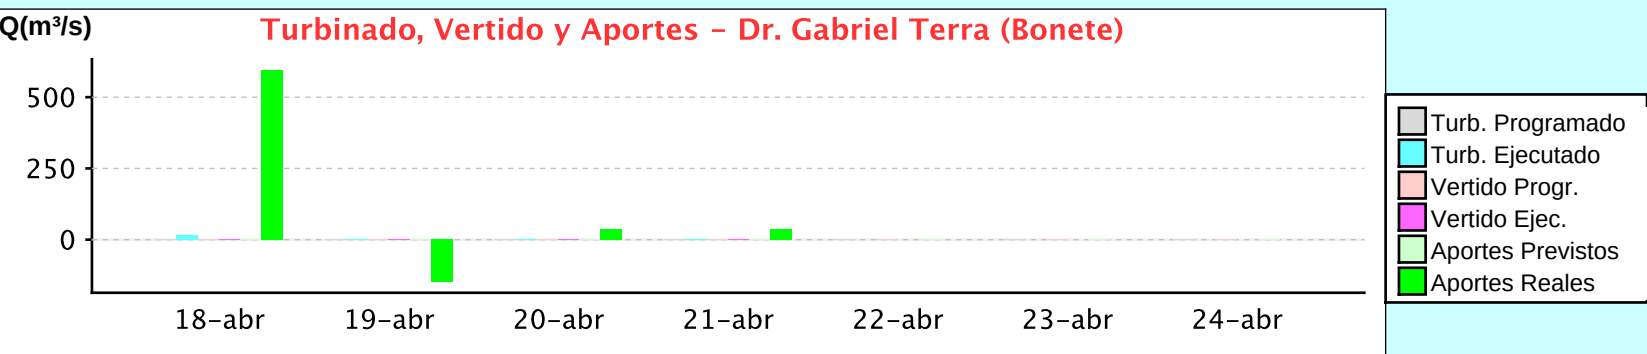

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

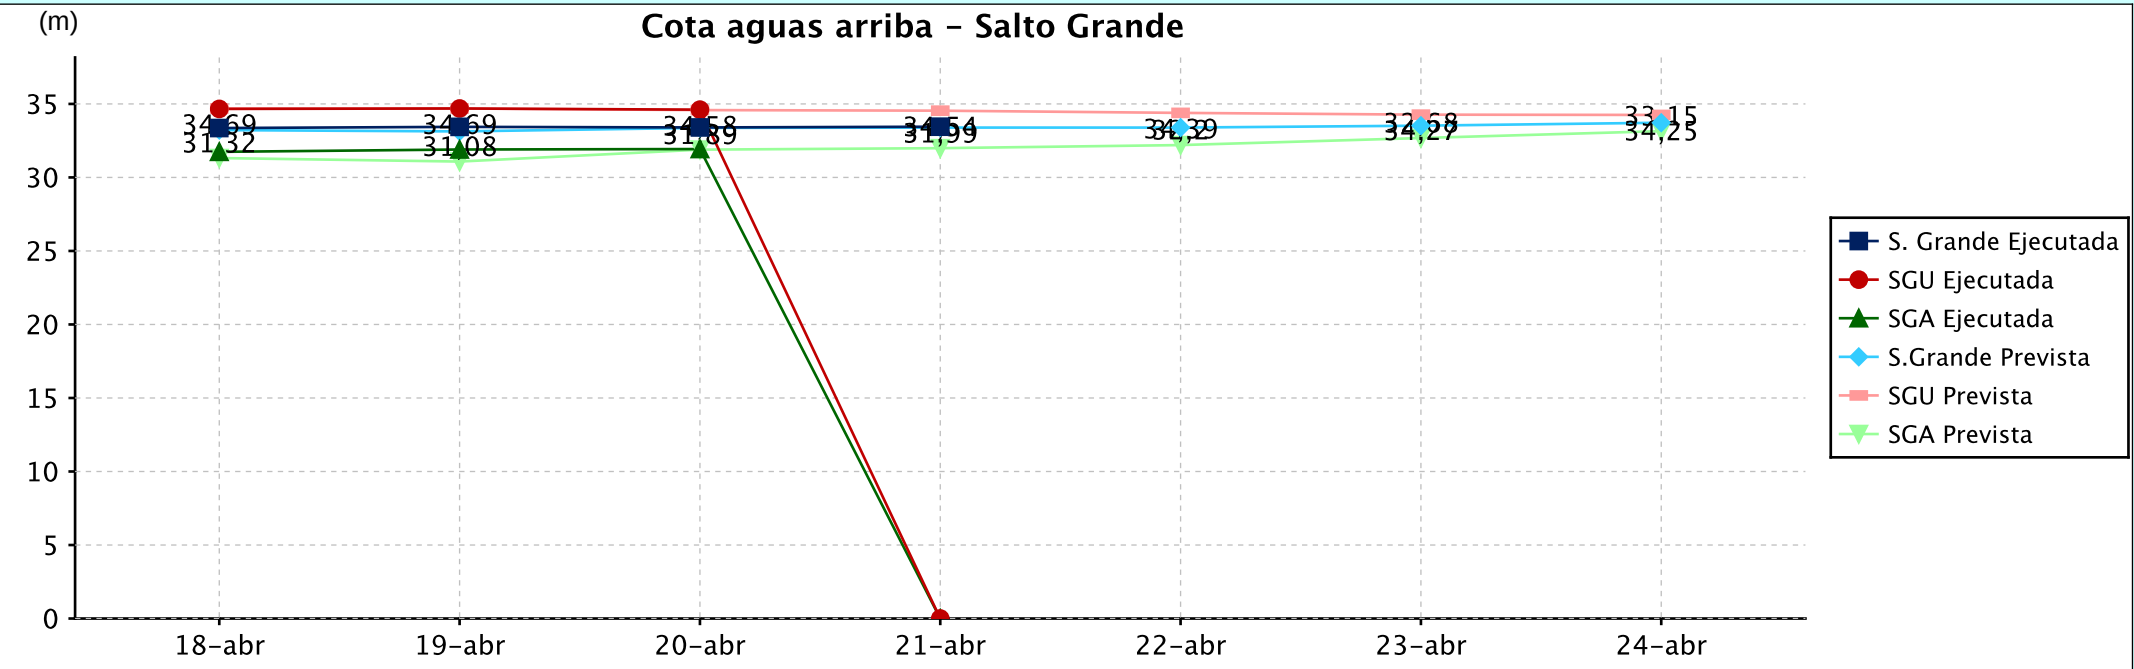


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.713	1.604

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	36
Baygorria	0	9
Palmar	0	19
SGU	975	998

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

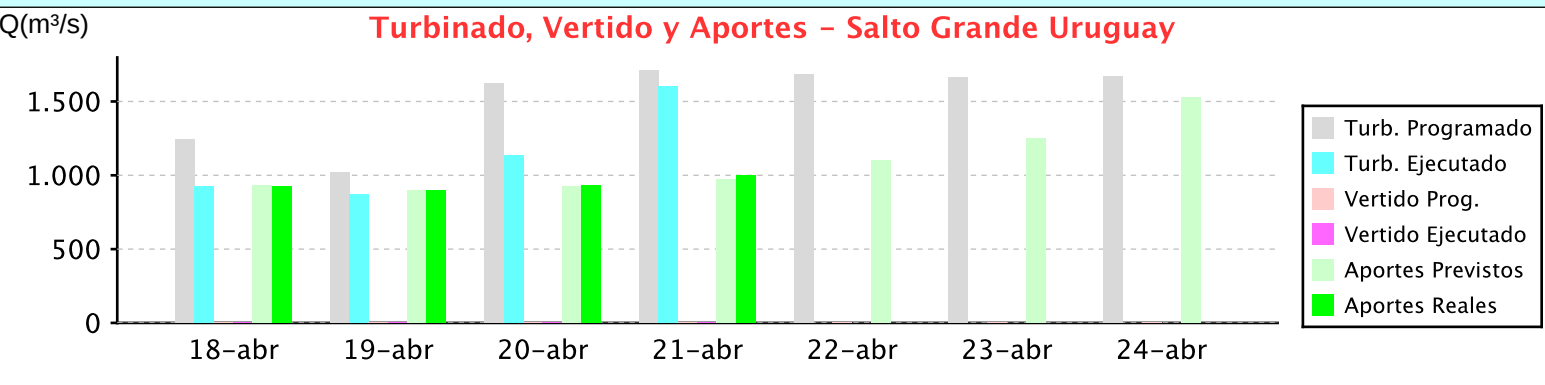

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	0,00
Cota Vista Arg	0,00
Cota real	33,45
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
42.680	

OBSERVACIONES

Falta la Cota Ejecutada de Salto Grande Uruguay y Salto Grande Argentina.
