




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 22 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.030
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.033
Central La Tablada	310
Central P. del Tigre	6.305
APR A	1.291
APR B	2.018
APR C	1.604
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	-7
C. Palmar	207
C. Salto Grande	8.611
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.902
TOTAL Generación	27.272

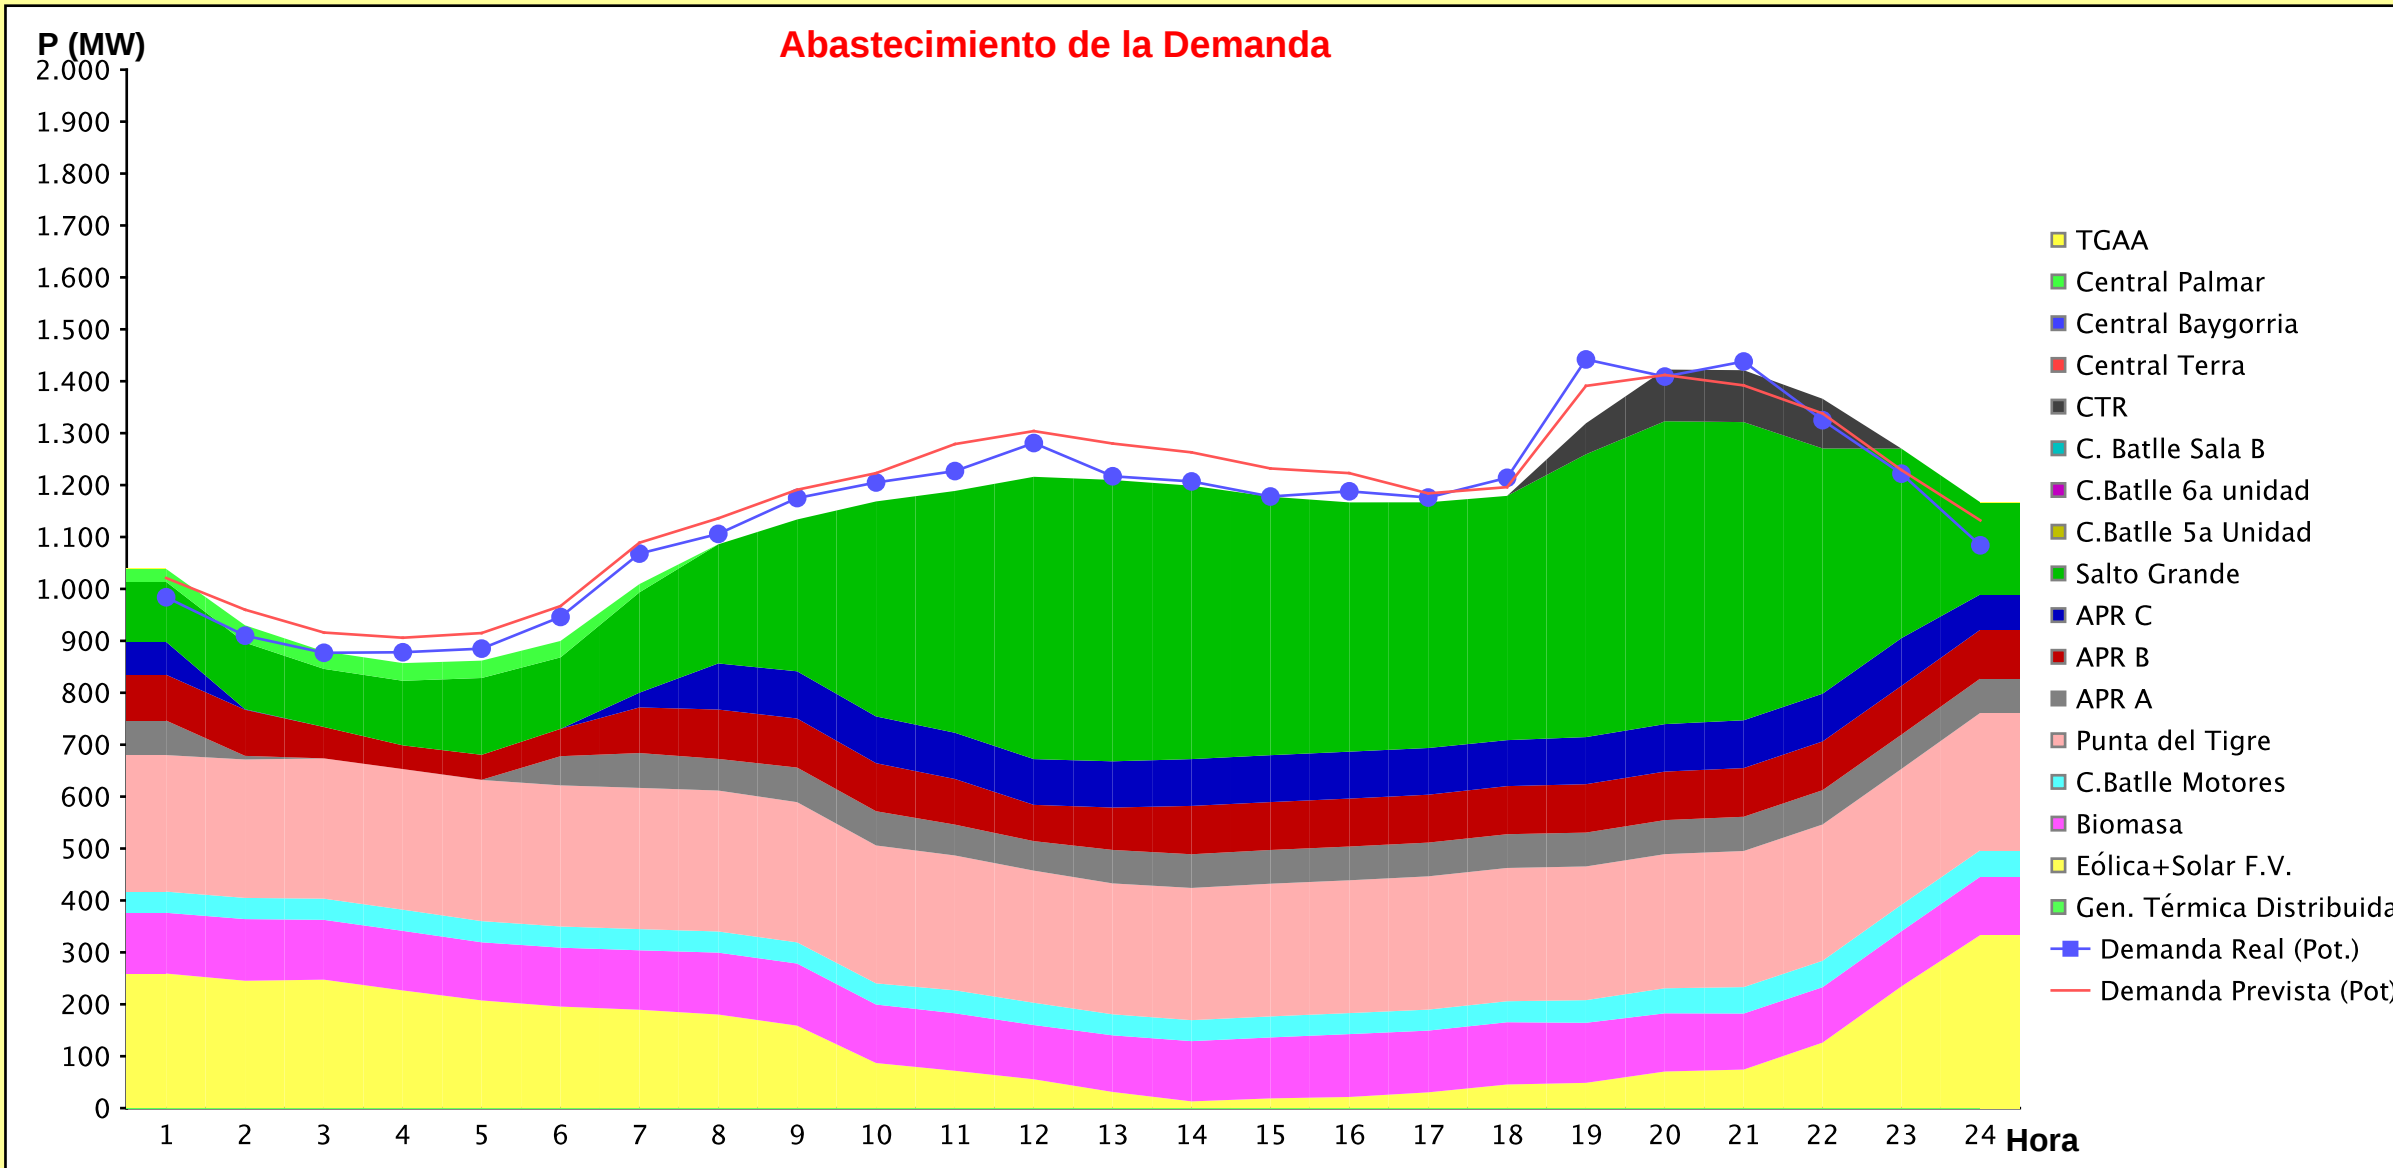

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.272
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.179
Diferencia (MWh)	-907
Ejecutada - Programada	-3,22 %

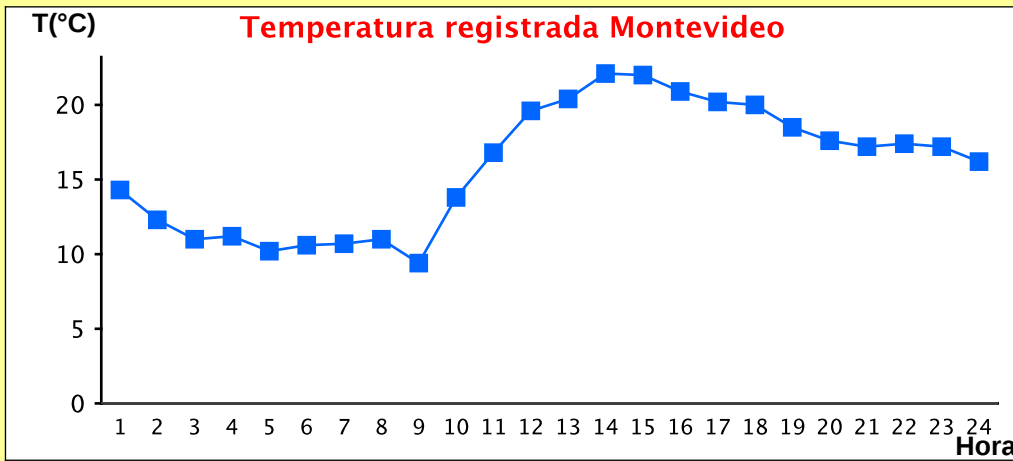


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1275,96 Hora 11:57
Potencia mínima:	862,46 Hora 04:41
Pico noche:	1449,03 Hora 18:59

Generación Media (MW)	
Eólica	133,2
Biomasa	114,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

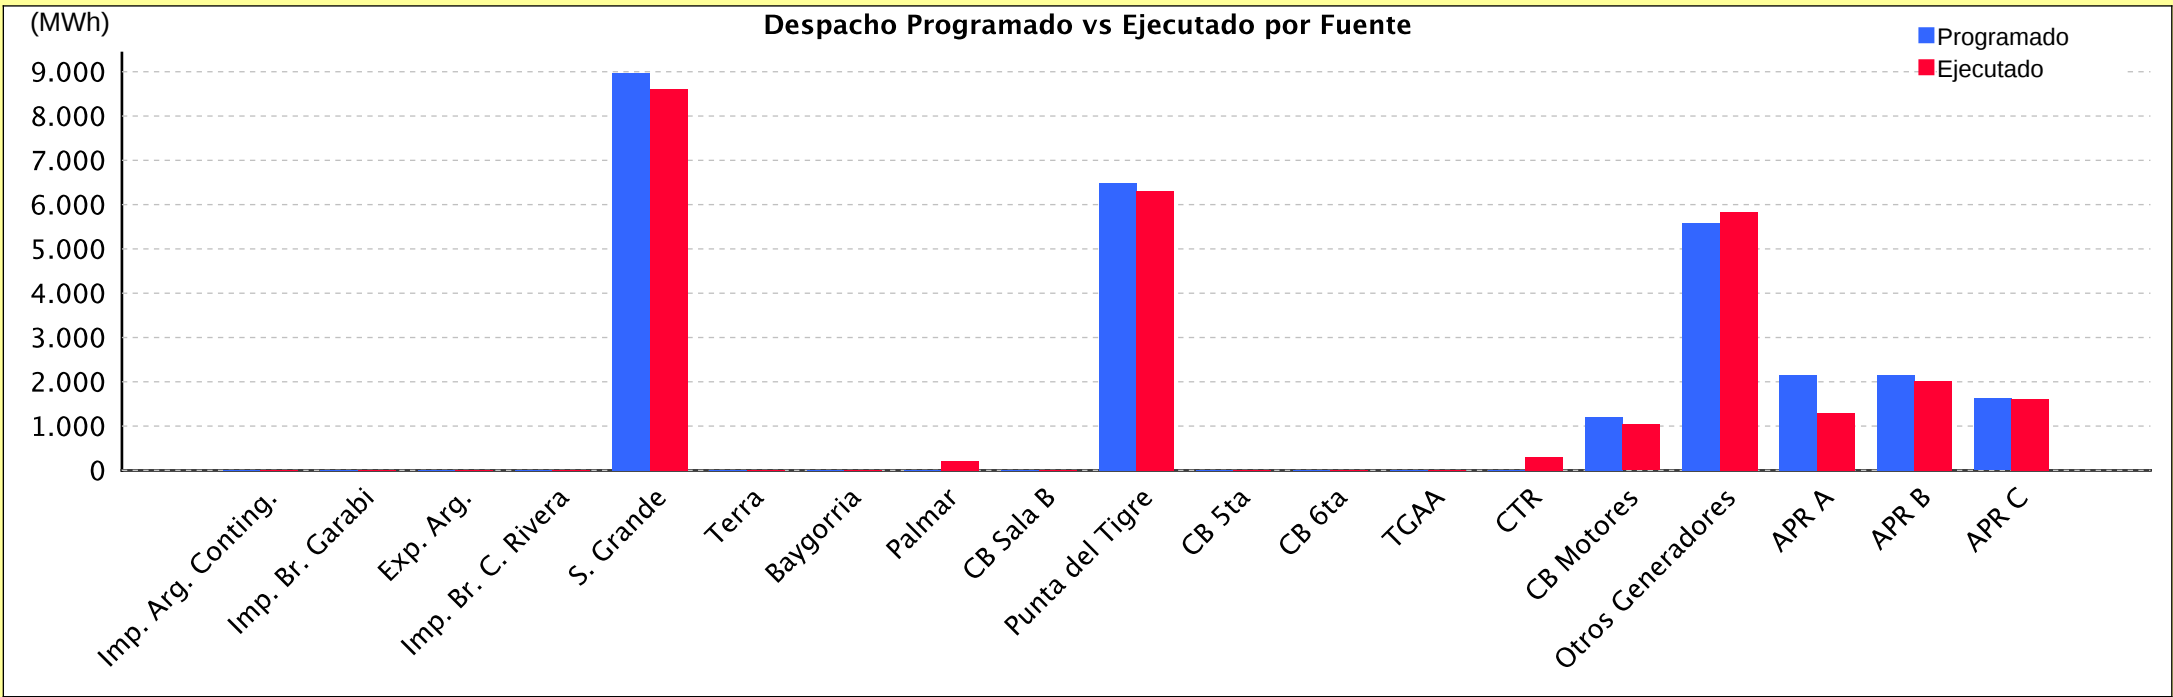
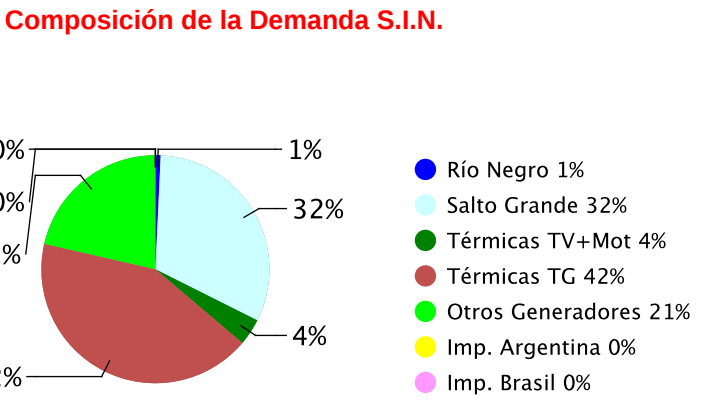


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

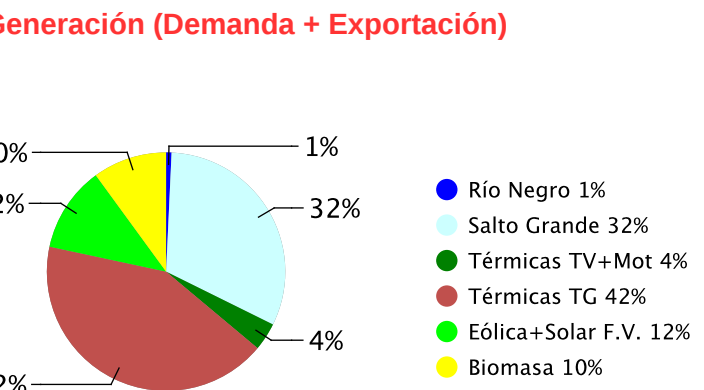



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

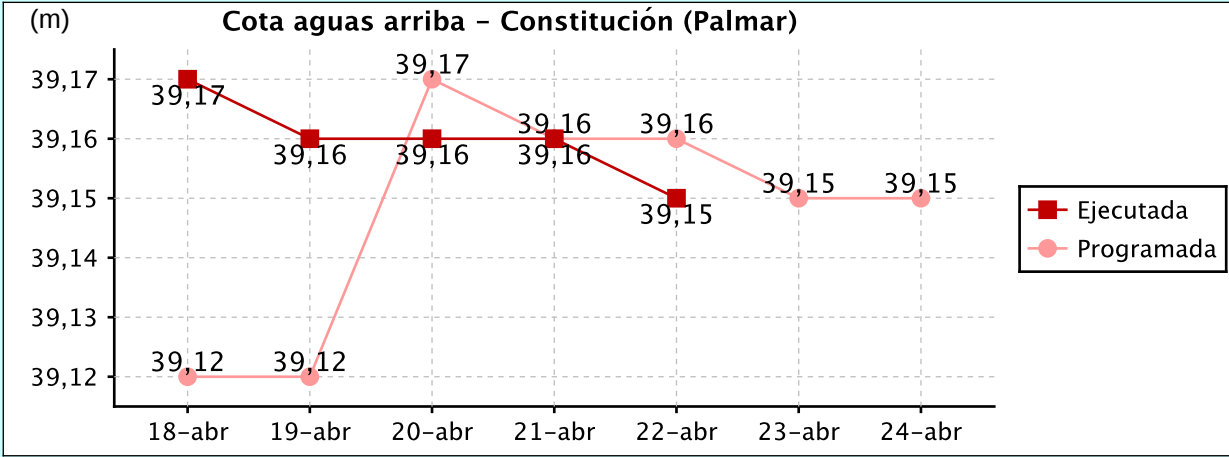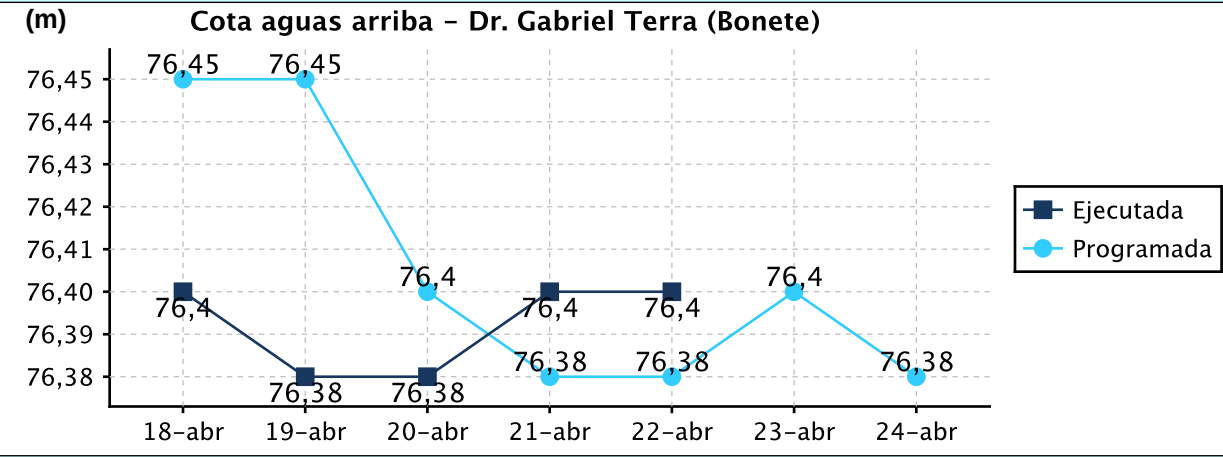


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,38	76,4
Baygorria	53,95	53,93
Palmar	39,16	39,15
SGU	34,39	34,37

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

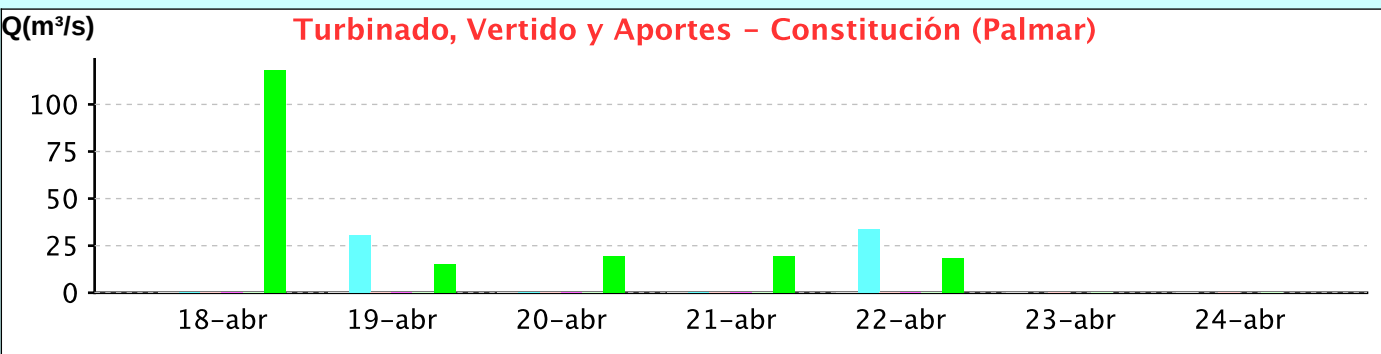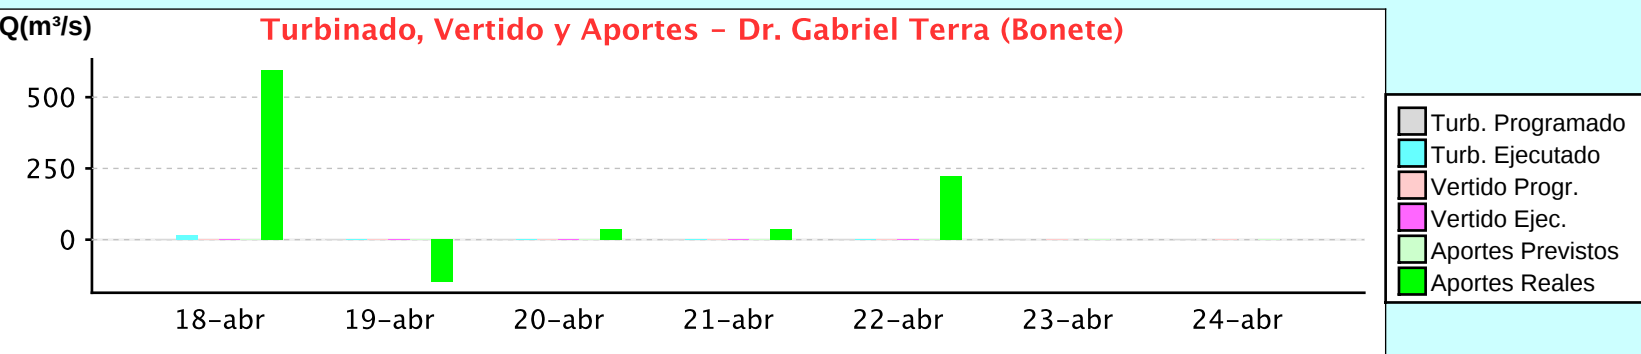

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

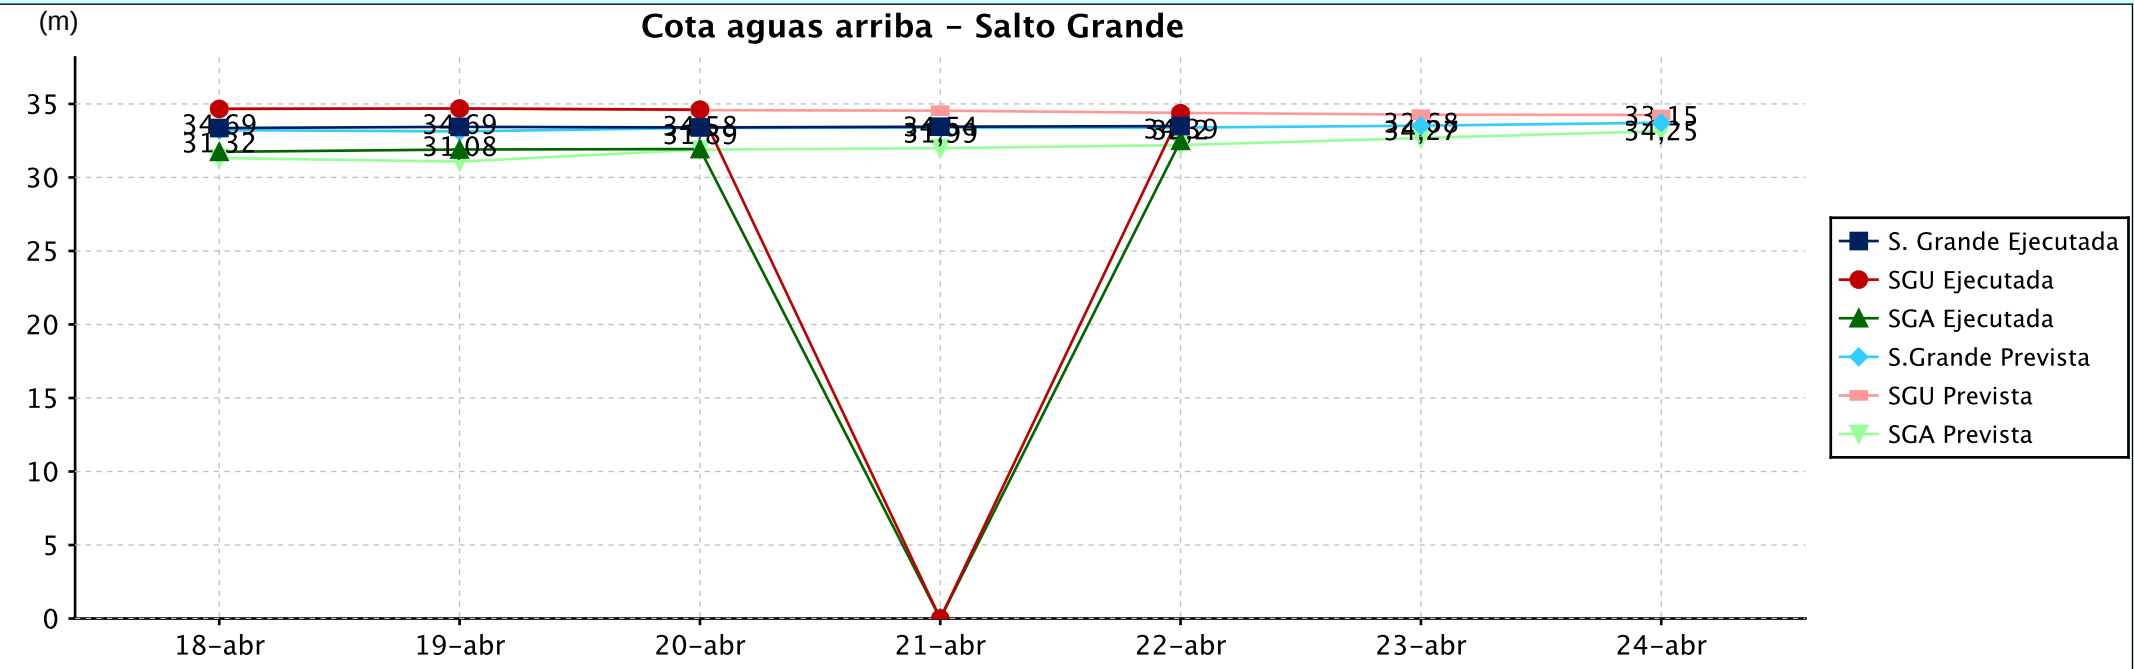


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	34
SGU	1.686	1.563

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	222
Baygorria	0	-3
Palmar	0	18
SGU	1.100	1.067

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

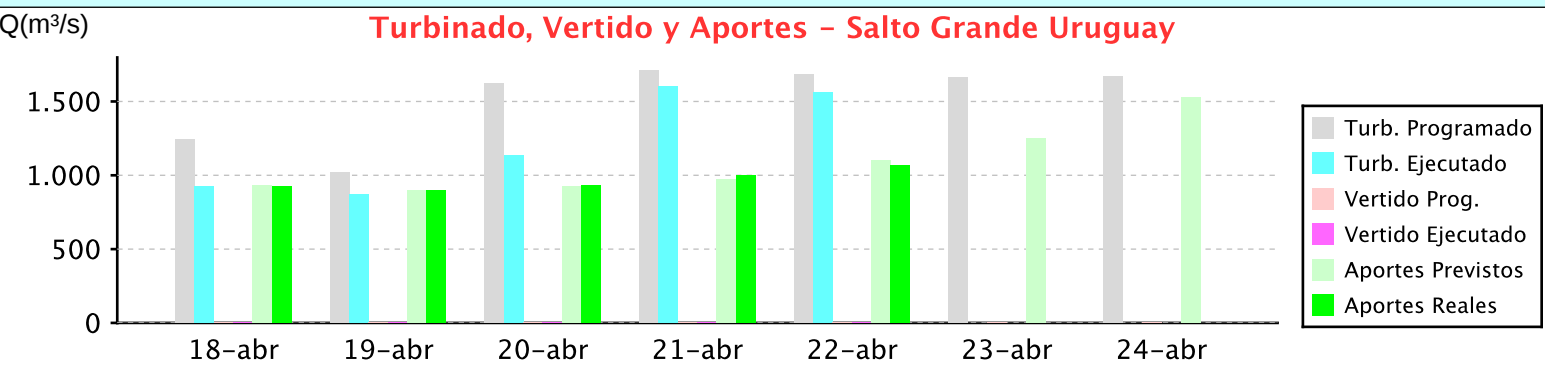

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,37
Cota Vista Arg	32,49
Cota real	33,49
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
35.870	

OBSERVACIONES

Falta la Cota Ejecutada de Salto Grande Uruguay y Salto Grande Argentina del día 21/04/2015.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

07/05/2015 11:49
