




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 23 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.205
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.209
Central La Tablada	279
Central P. del Tigre	6.068
APR A	1.307
APR B	1.635
APR C	1.465
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	-0
C. Baygorria	-7
C. Palmar	3
C. Salto Grande	8.608
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.497
TOTAL Generación	27.060

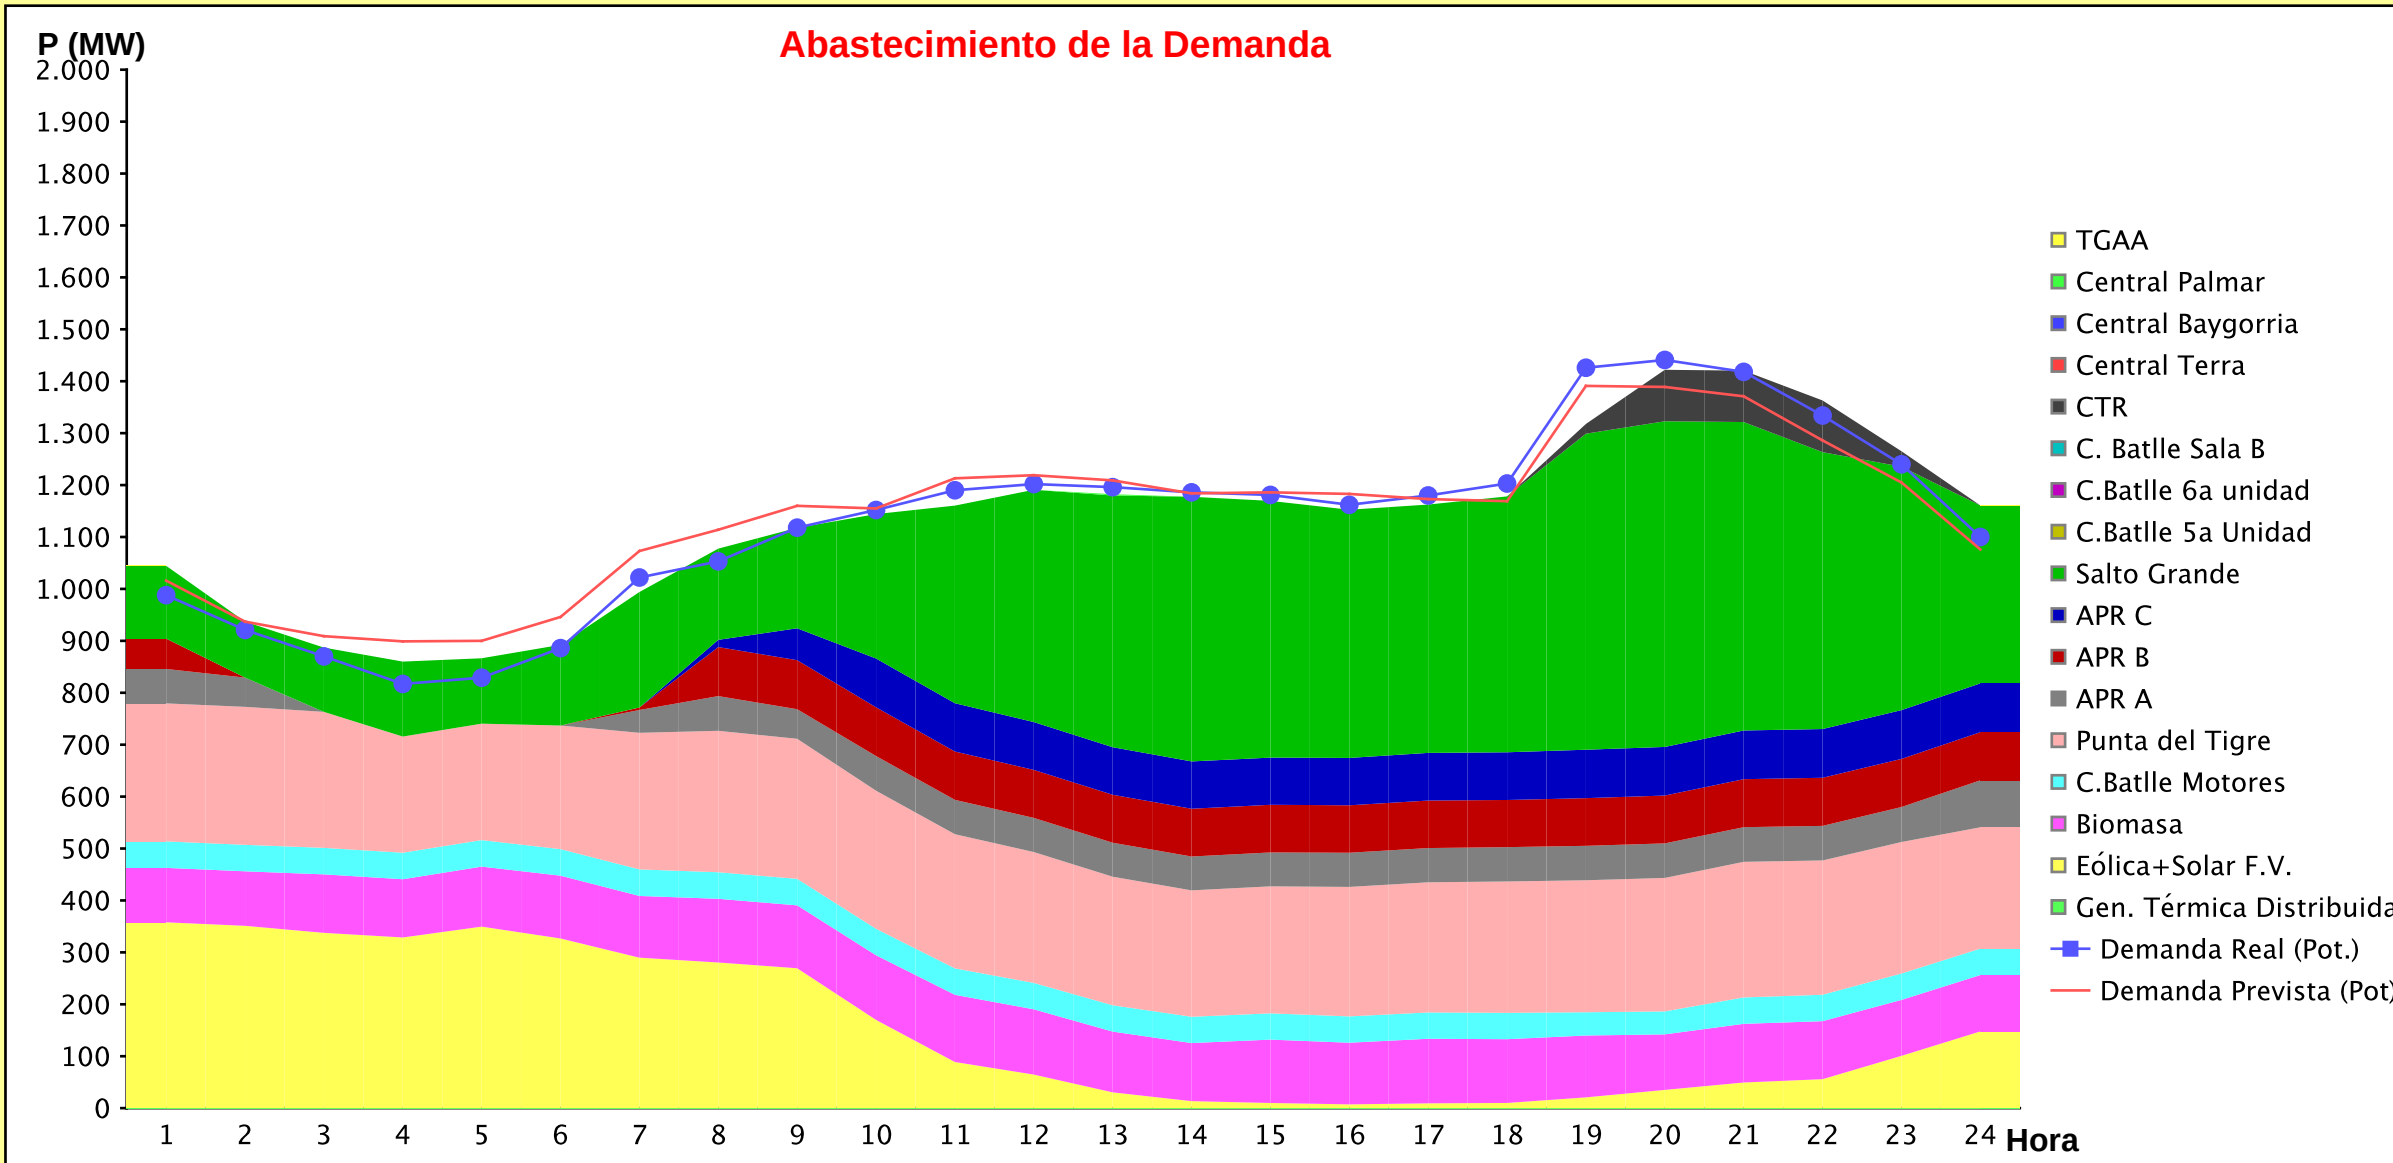

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.060
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.363
Diferencia (MWh)	-303
Ejecutada - Programada	-1,11 %

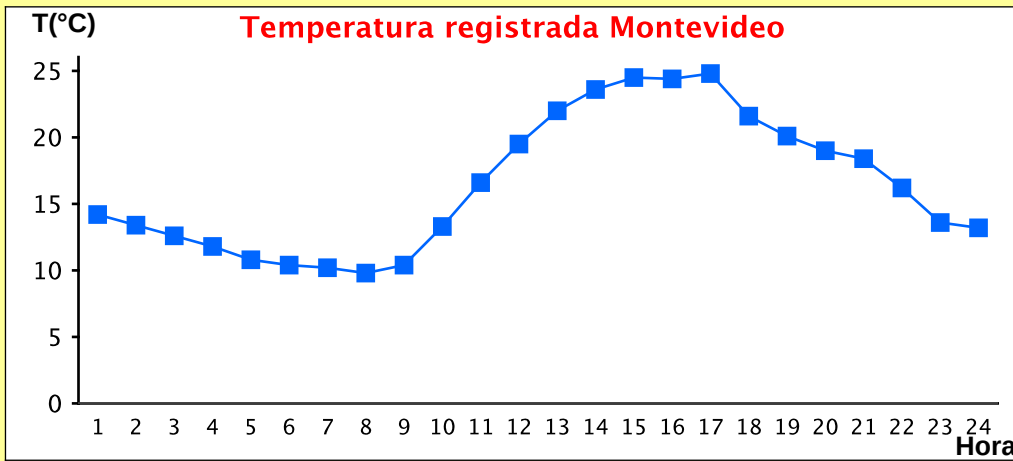


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1216,89 Hora 13:28
Potencia mínima:	795,36 Hora 04:26
Pico noche:	1447,52 Hora 19:50

Generación Media (MW)	
Eólica	155,3
Biomasa	116,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

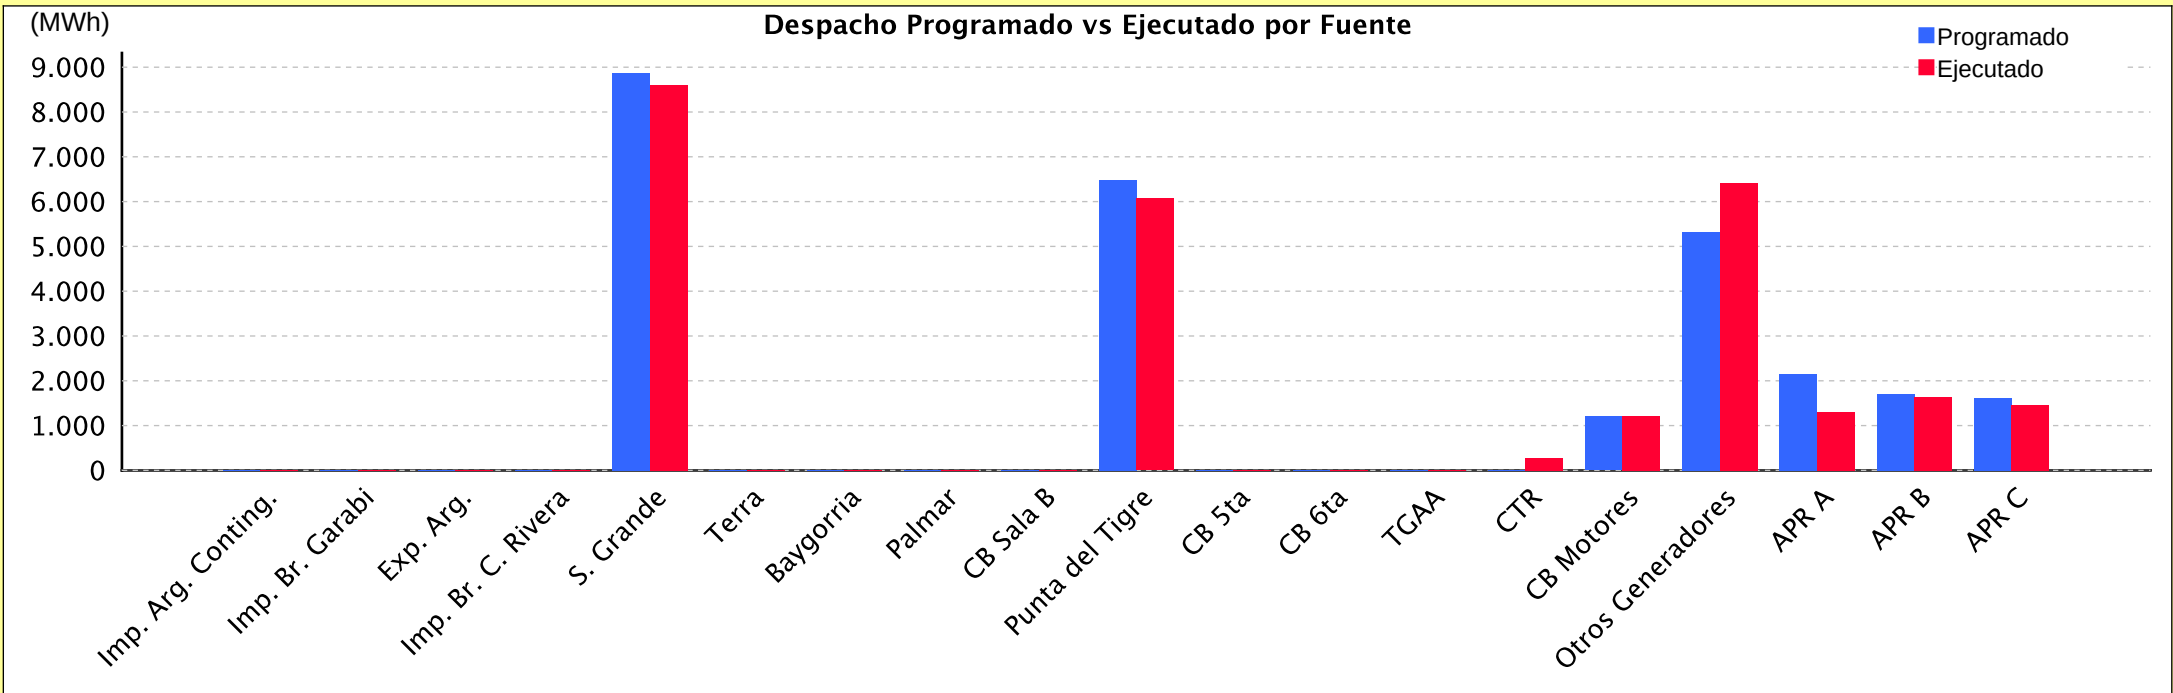
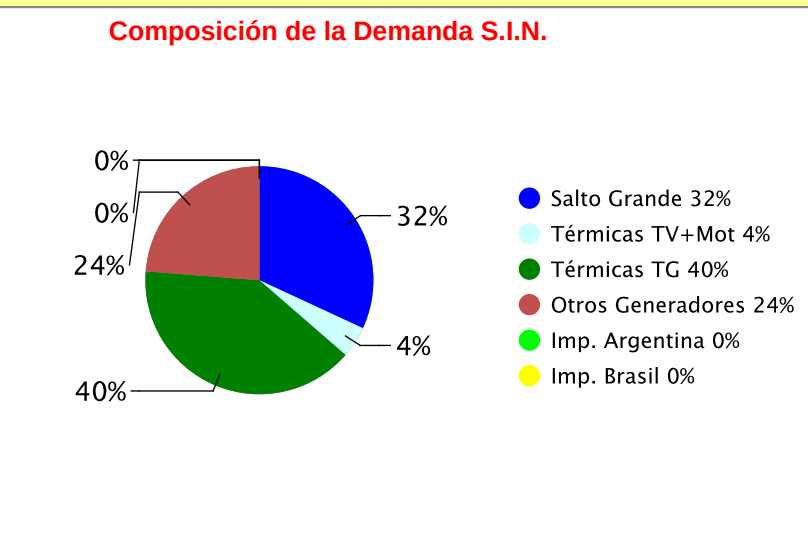


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

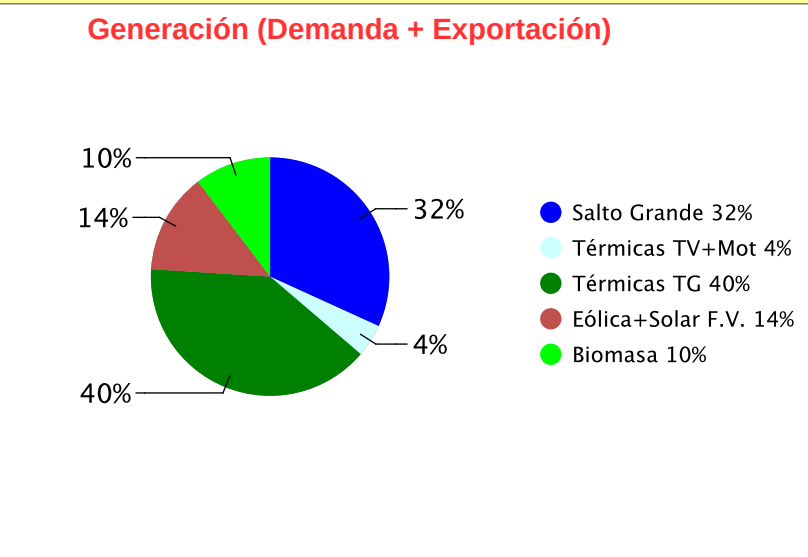



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

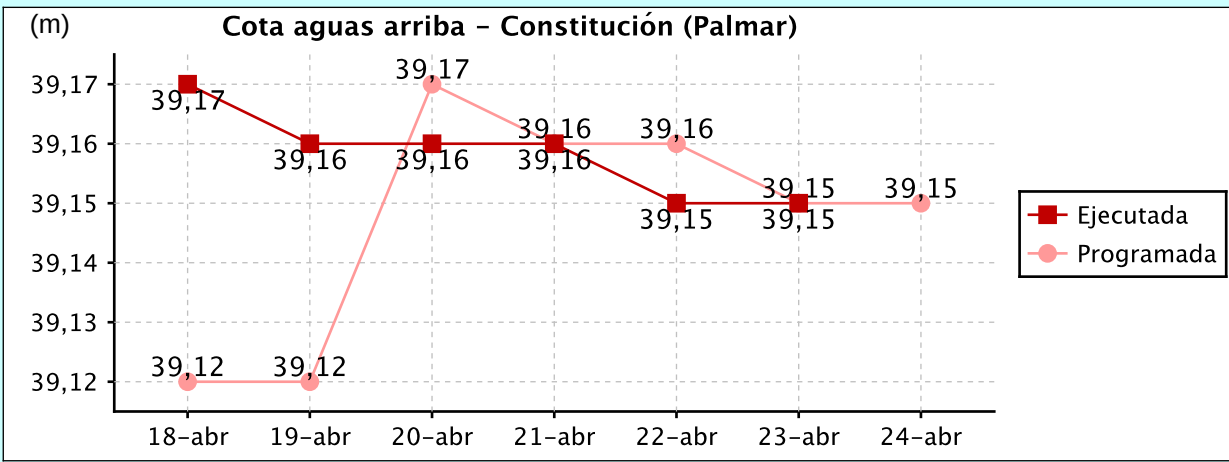
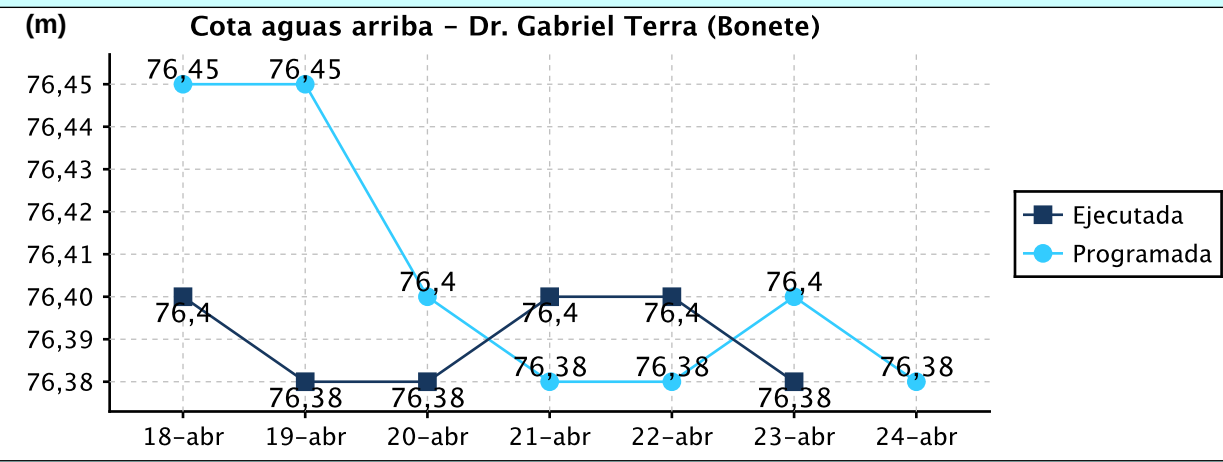


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,40	76,38
Baygorria	53,94	53,92
Palmar	39,15	39,15
SGU	34,27	34,33

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

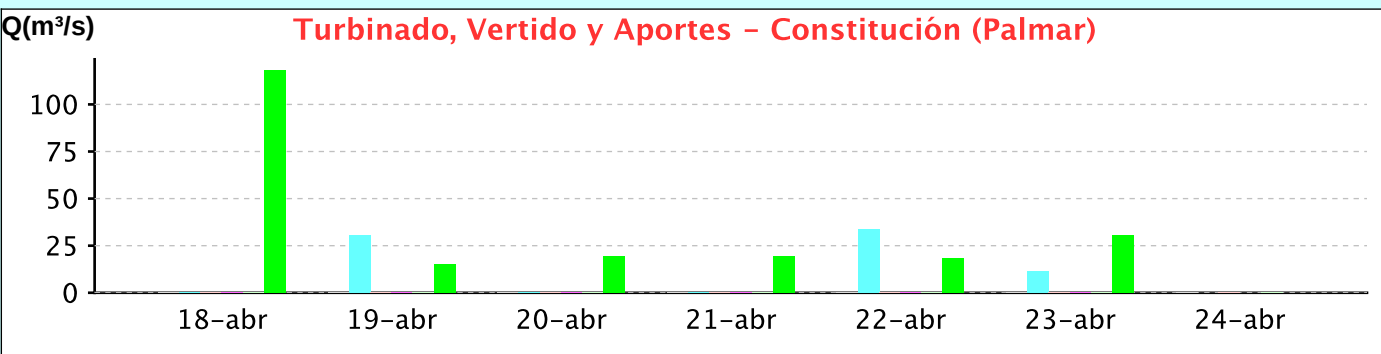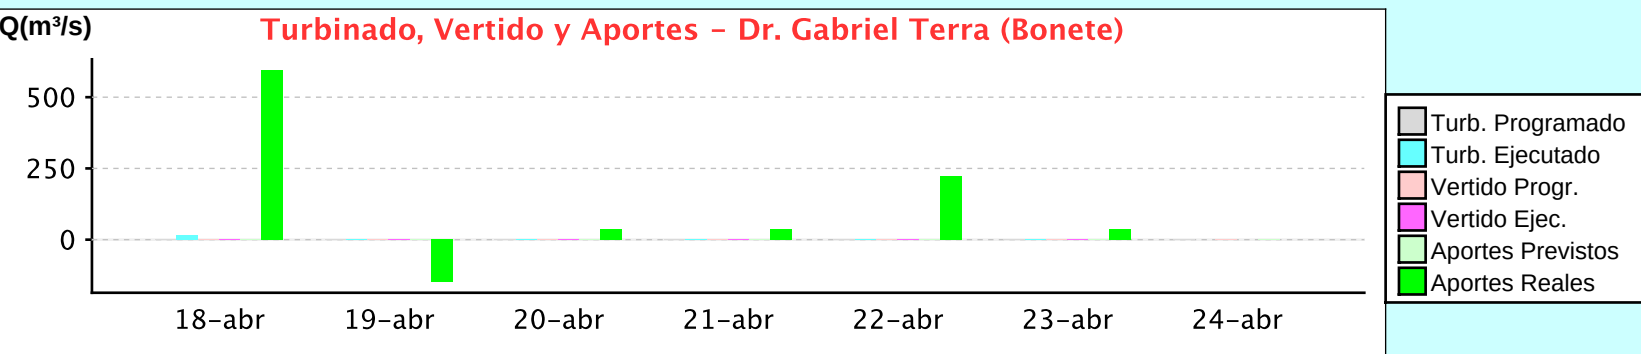

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

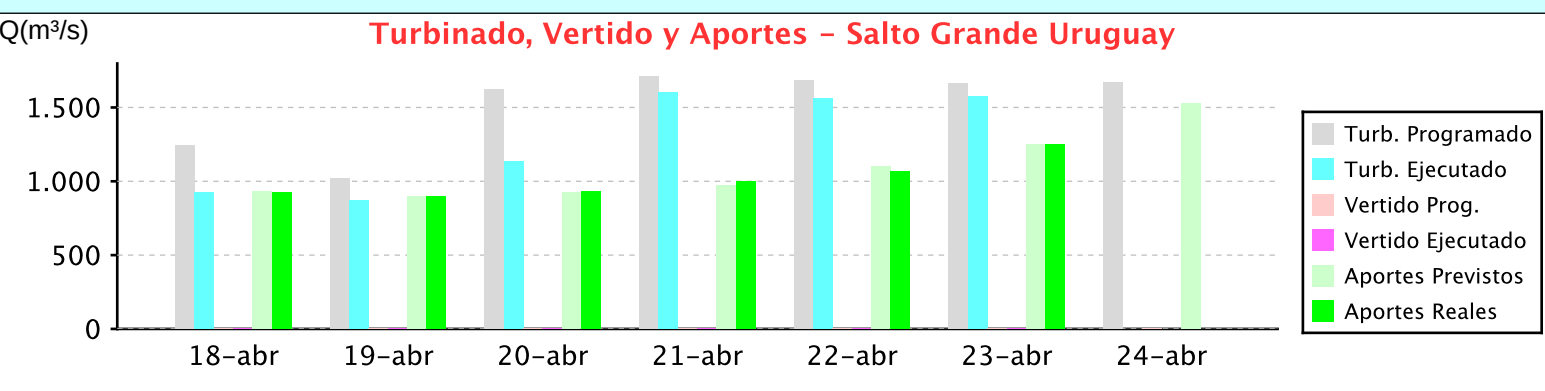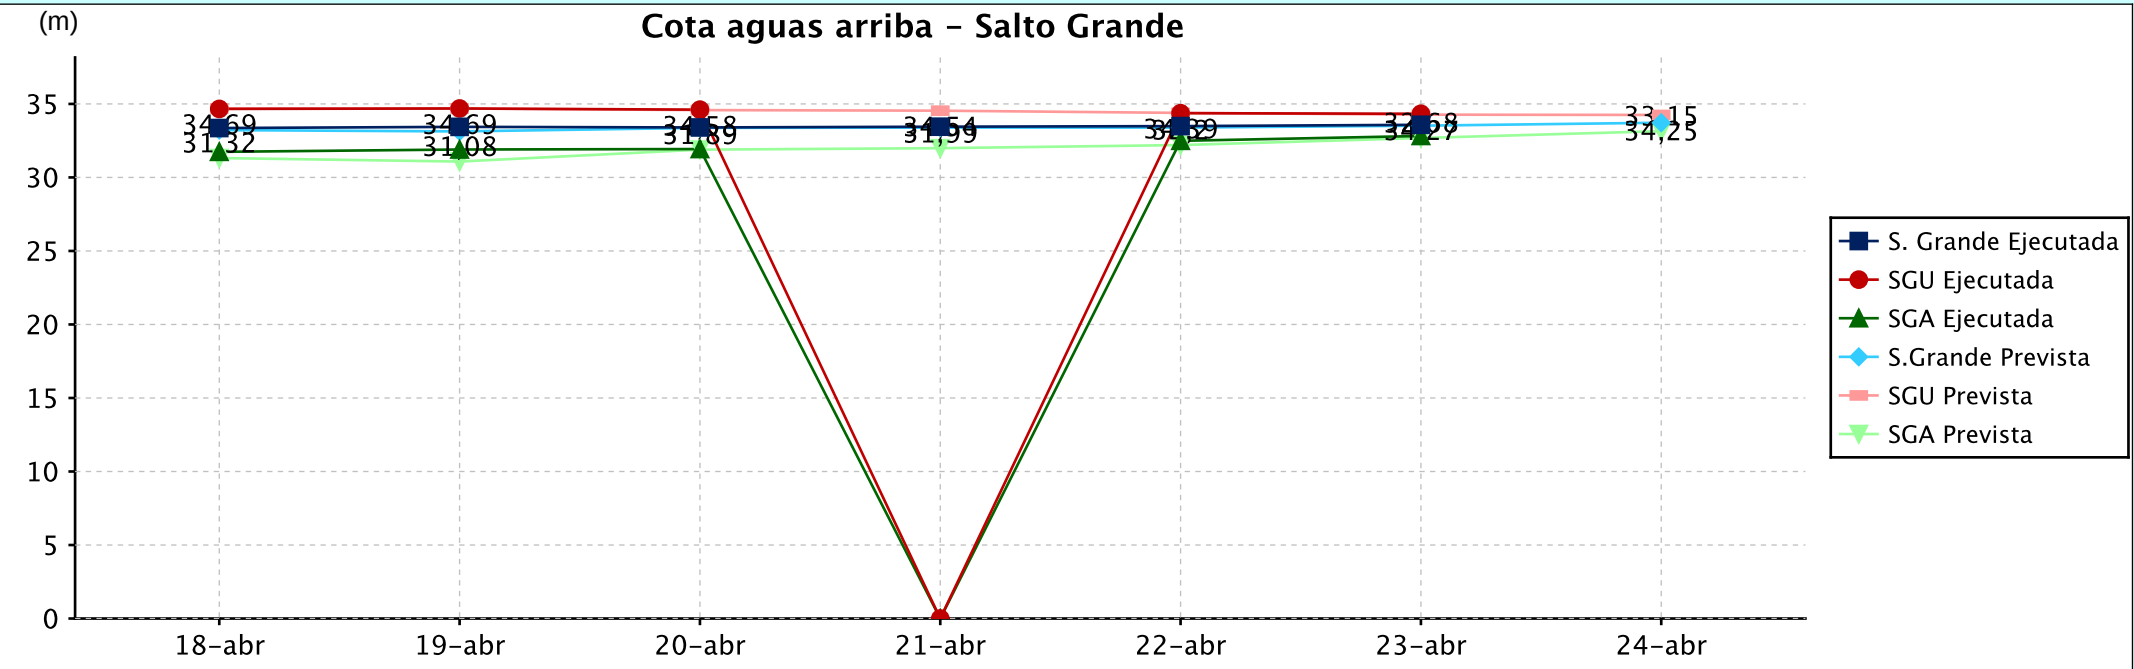

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,33
Cota Vista Arg	32,82
Cota real	33,58
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	29.530

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	11
SGU	1.663	1.577

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	36
Baygorria	0	9
Palmar	0	31
SGU	1.250	1.252

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
