




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 27 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.210
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.213
Central La Tablada	1.844
Central P. del Tigre	5.735
APR A	2.102
APR B	2.228
APR C	1.718
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	927
C. Baygorria	793
C. Palmar	676
C. Salto Grande	5.907
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.831
TOTAL Generación	26.972

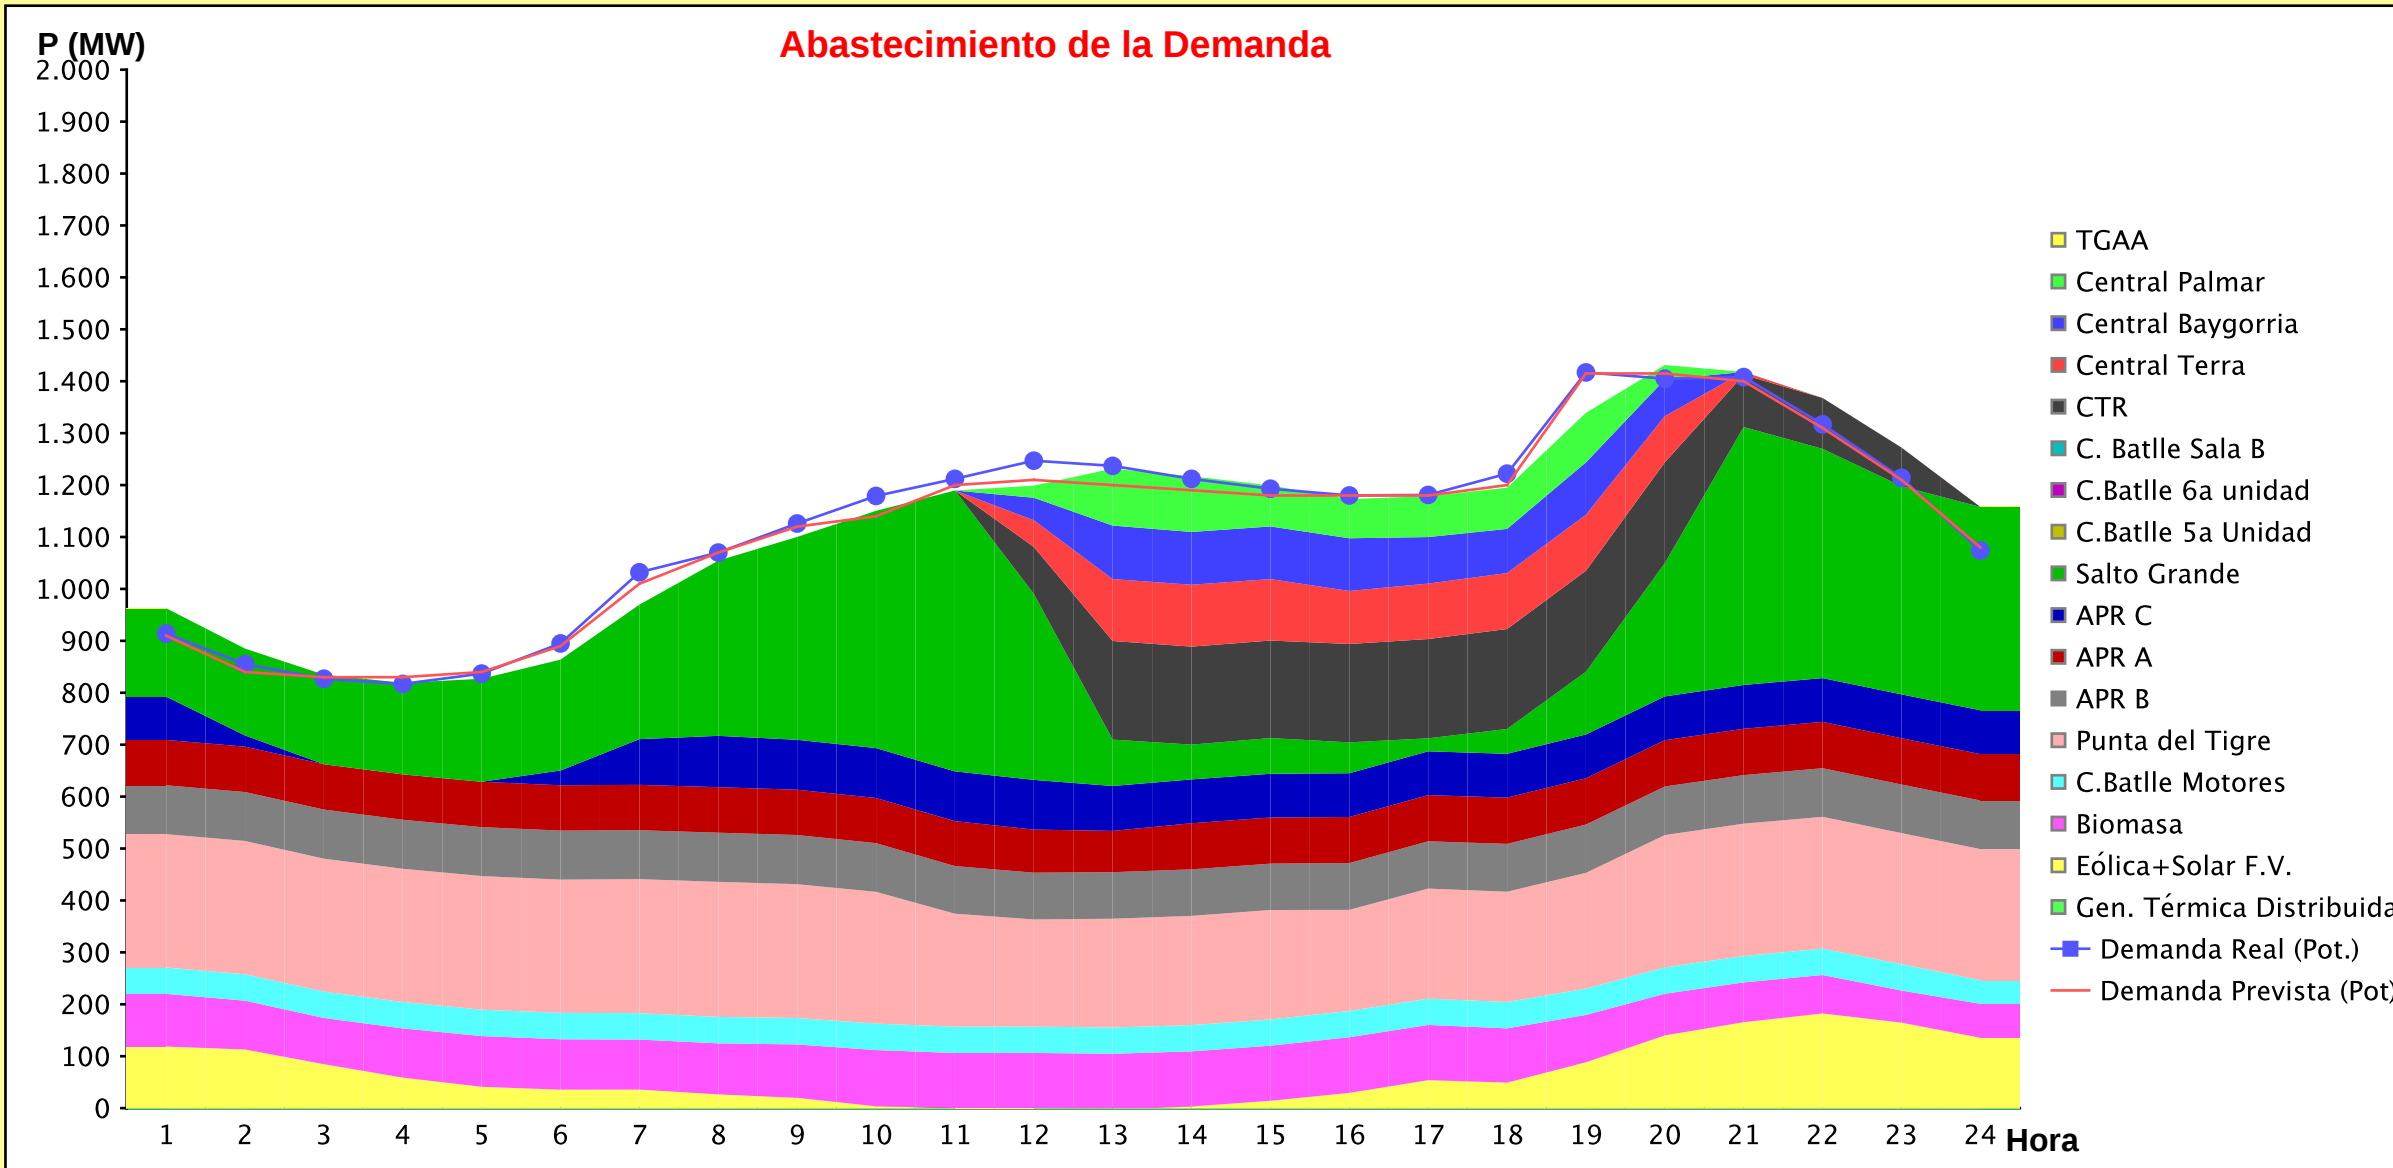

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.972
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.850
Diferencia (MWh)	122
Ejecutada - Programada	0,45 %

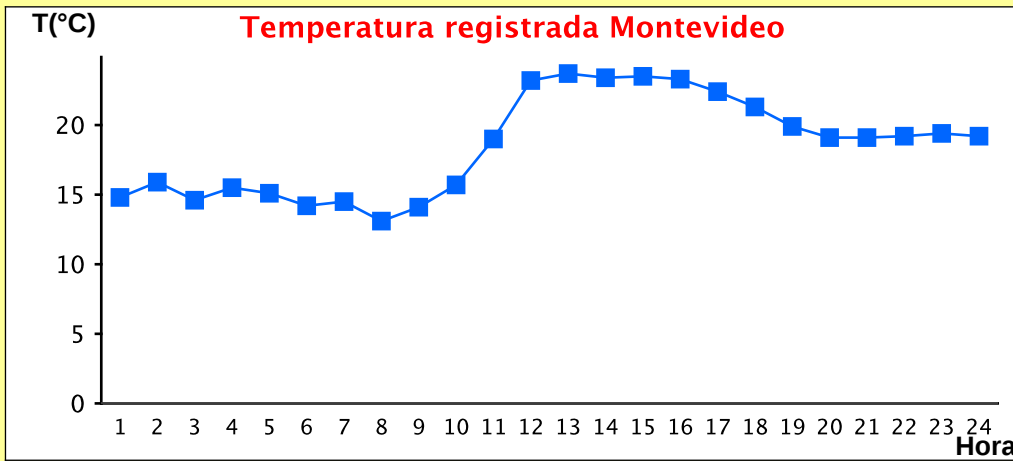



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1259,08 Hora 13:07
Potencia mínima:	810 Hora 03:30
Pico noche:	1445,77 Hora 19:08

Generación Media (MW)	
Eólica	66,6
Biomasa	95,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

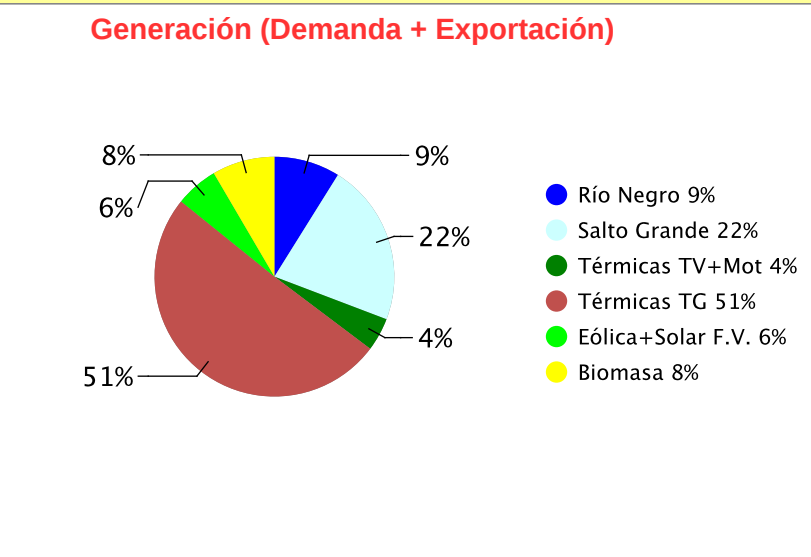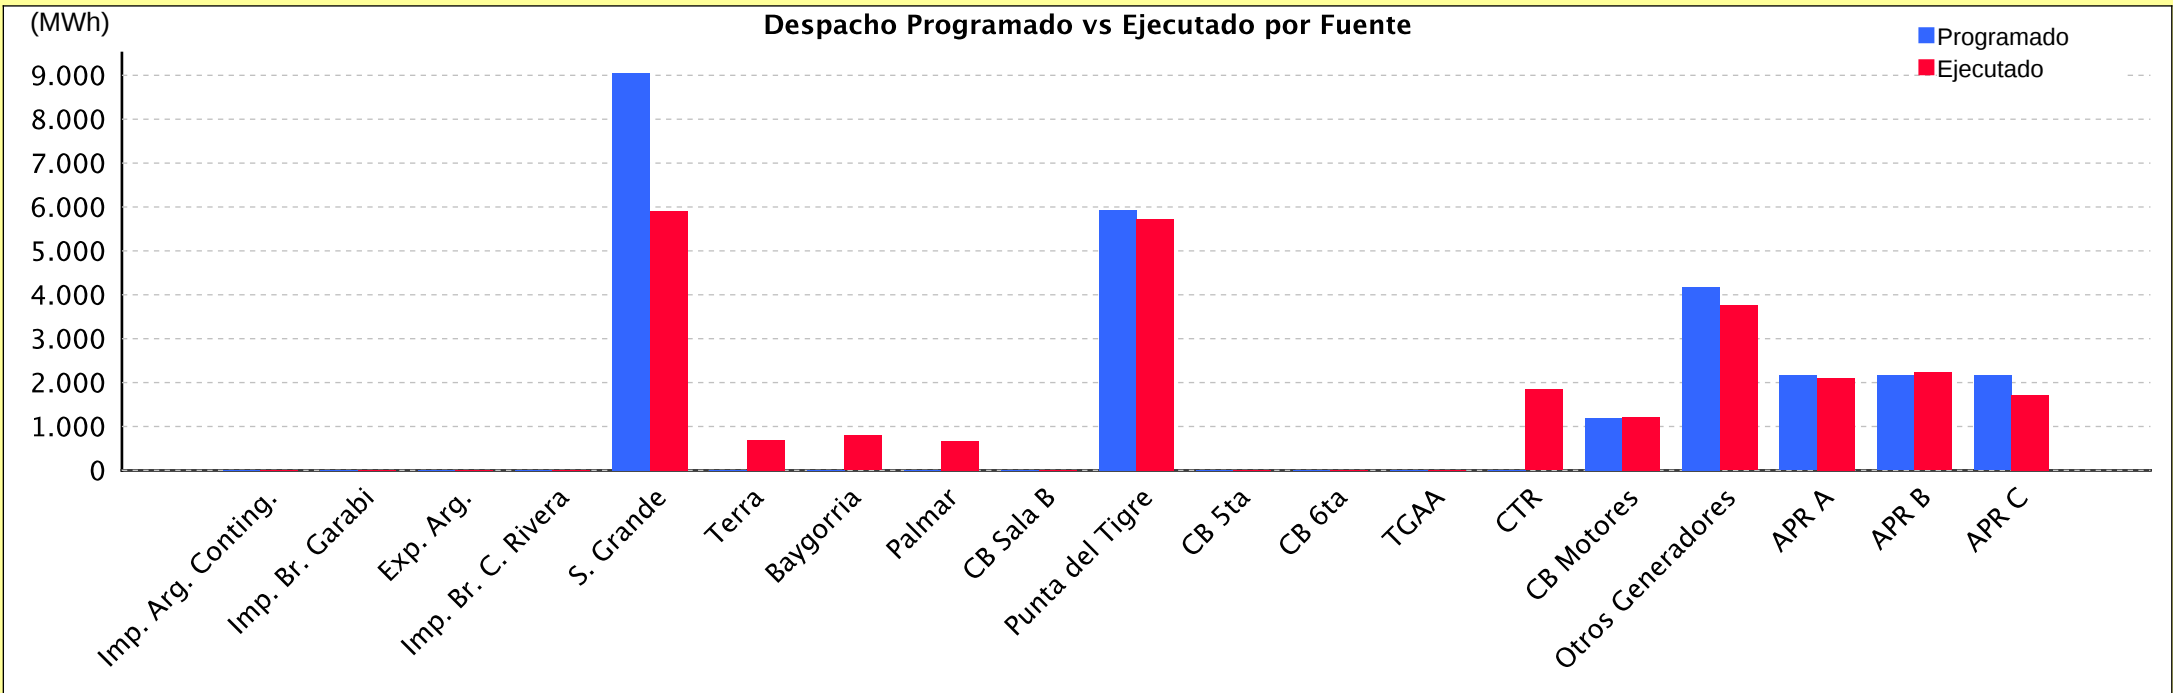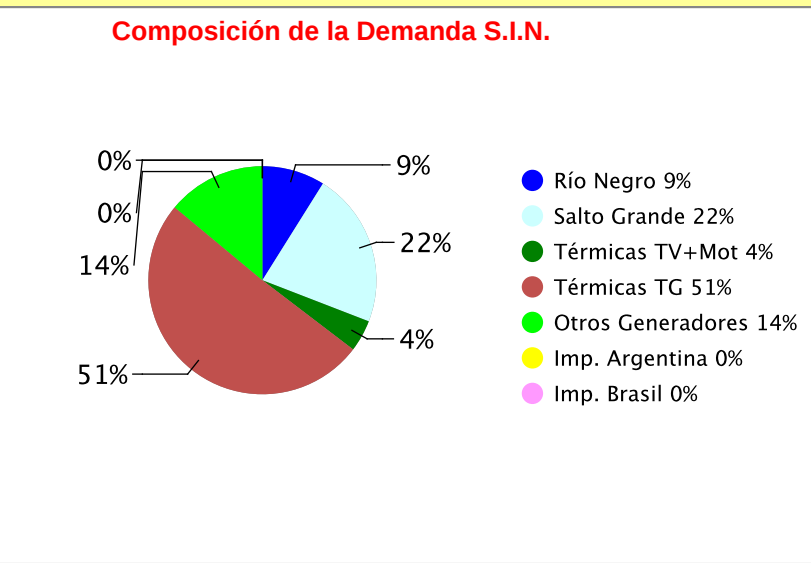



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

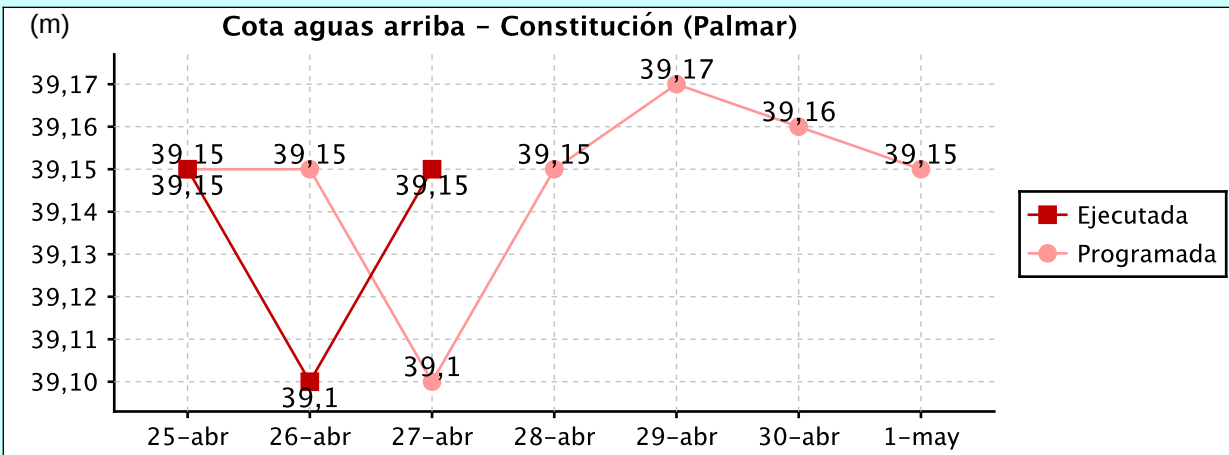
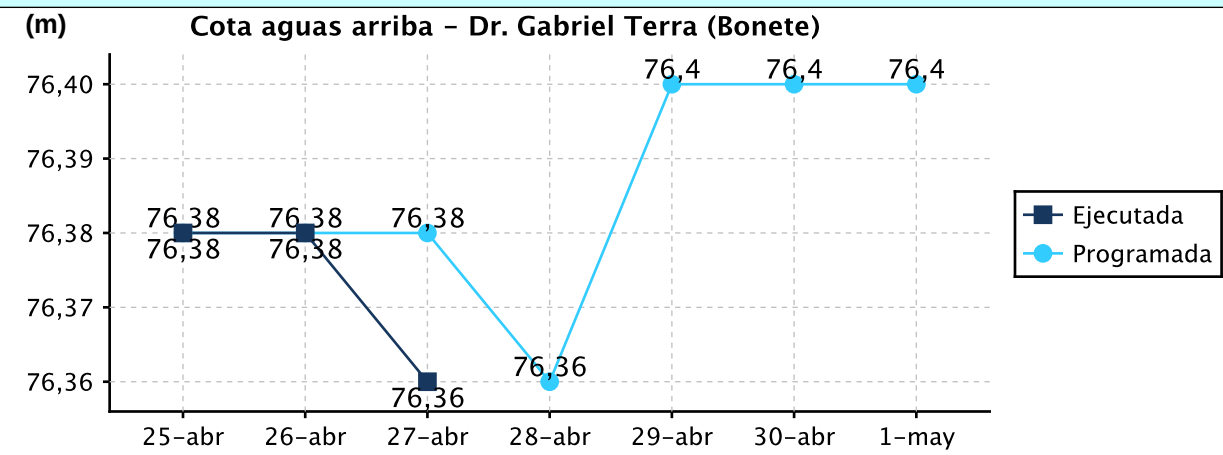


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,38	76,36
Baygorria	53,93	53,91
Palmar	39,10	39,15
SGU	34,77	35,04

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

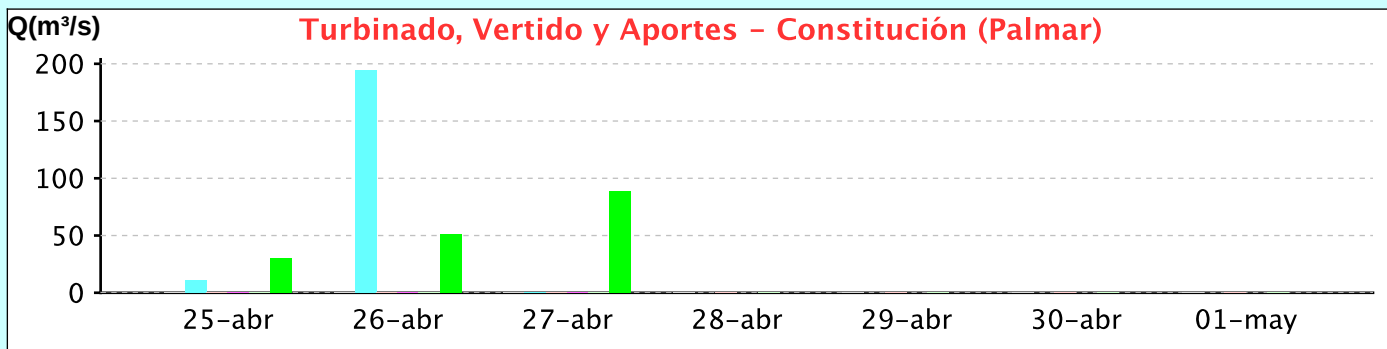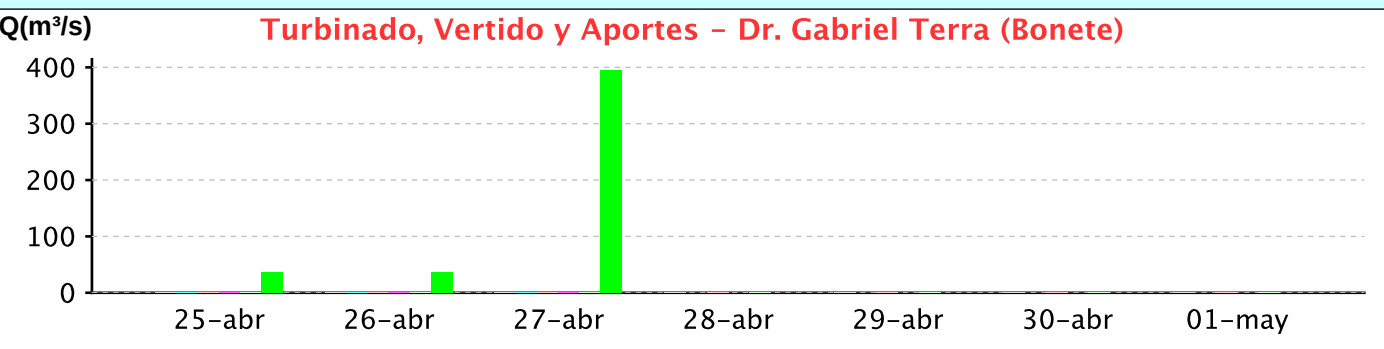

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

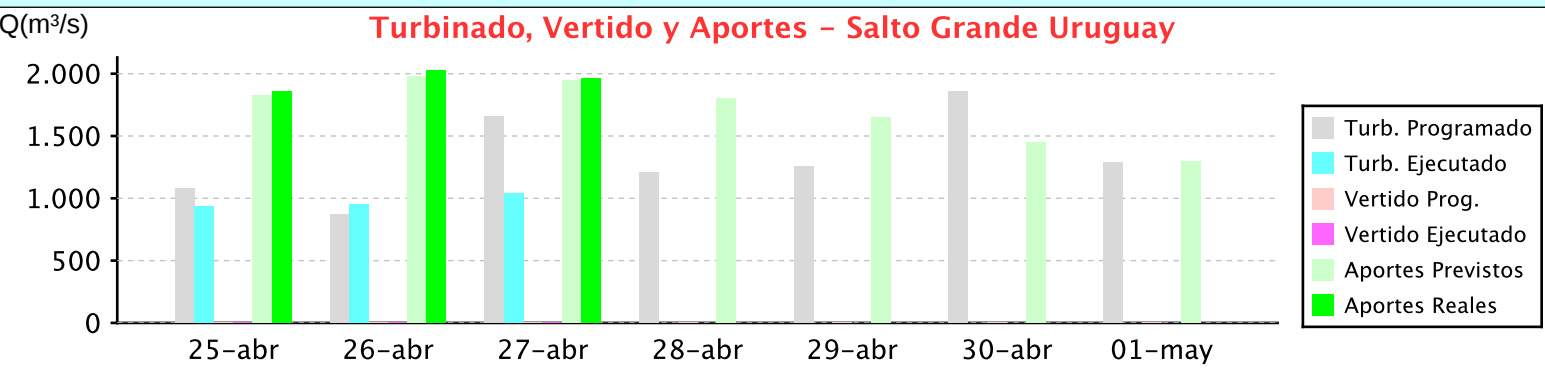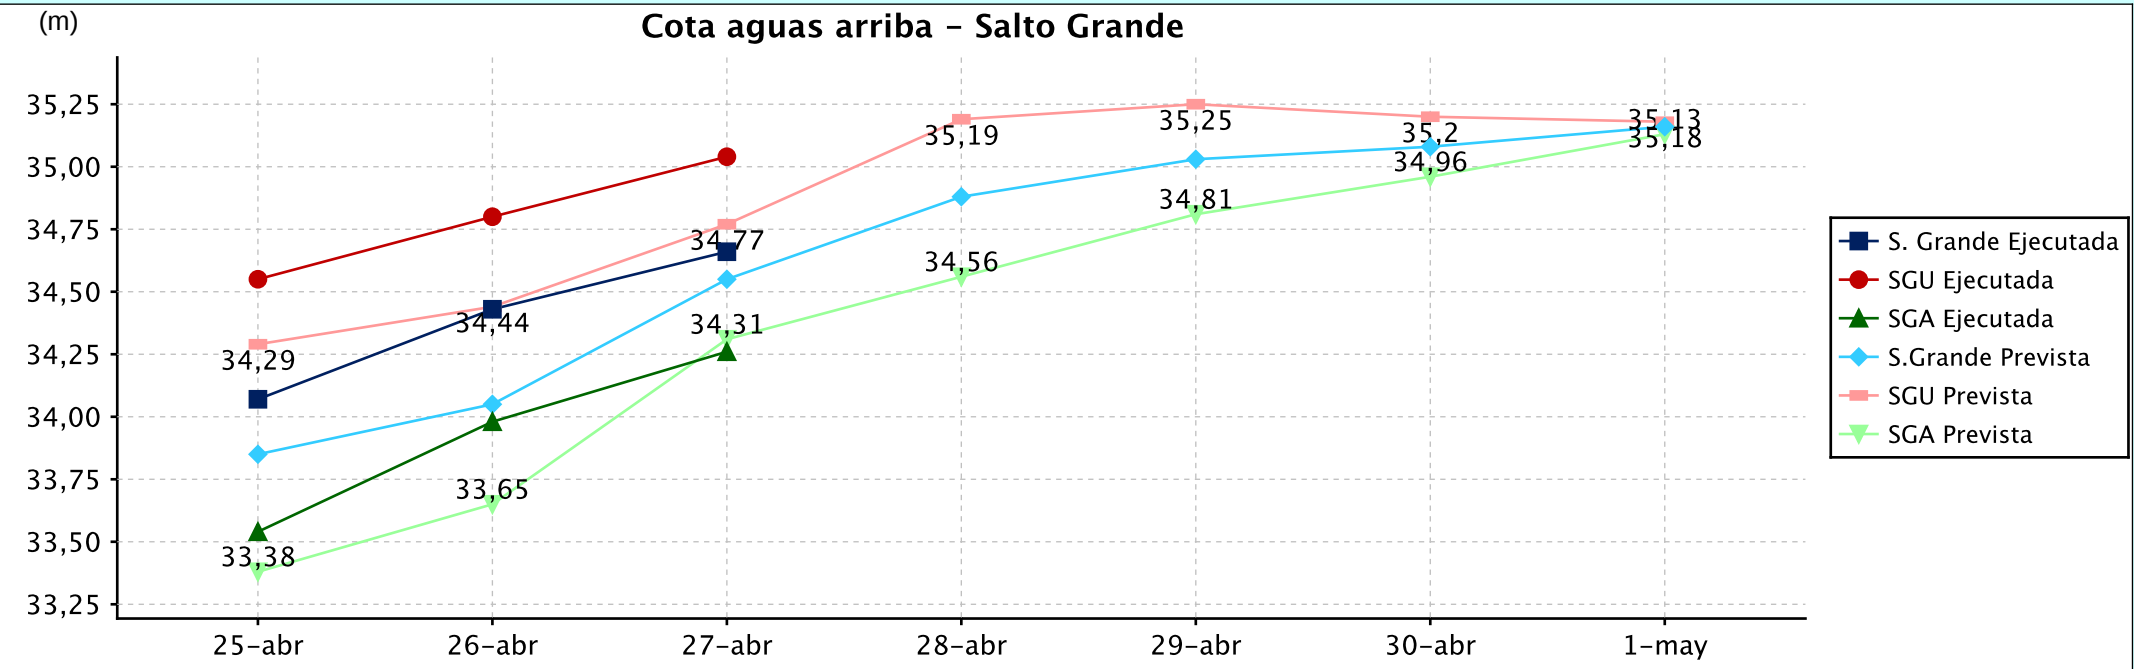

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,04
Cota Vista Arg	34,26
Cota real	34,66

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	17.567
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.660	1.038

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	395
Baygorria	0	-49
Palmar	0	89
SGU	1.950	1.964

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
