




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 28 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.204
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.208
Central La Tablada	-85
Central P. del Tigre	5.764
APR A	2.064
APR B	2.203
APR C	1.601
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	-6
C. Palmar	0
C. Salto Grande	6.184
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.380
TOTAL Generación	27.309

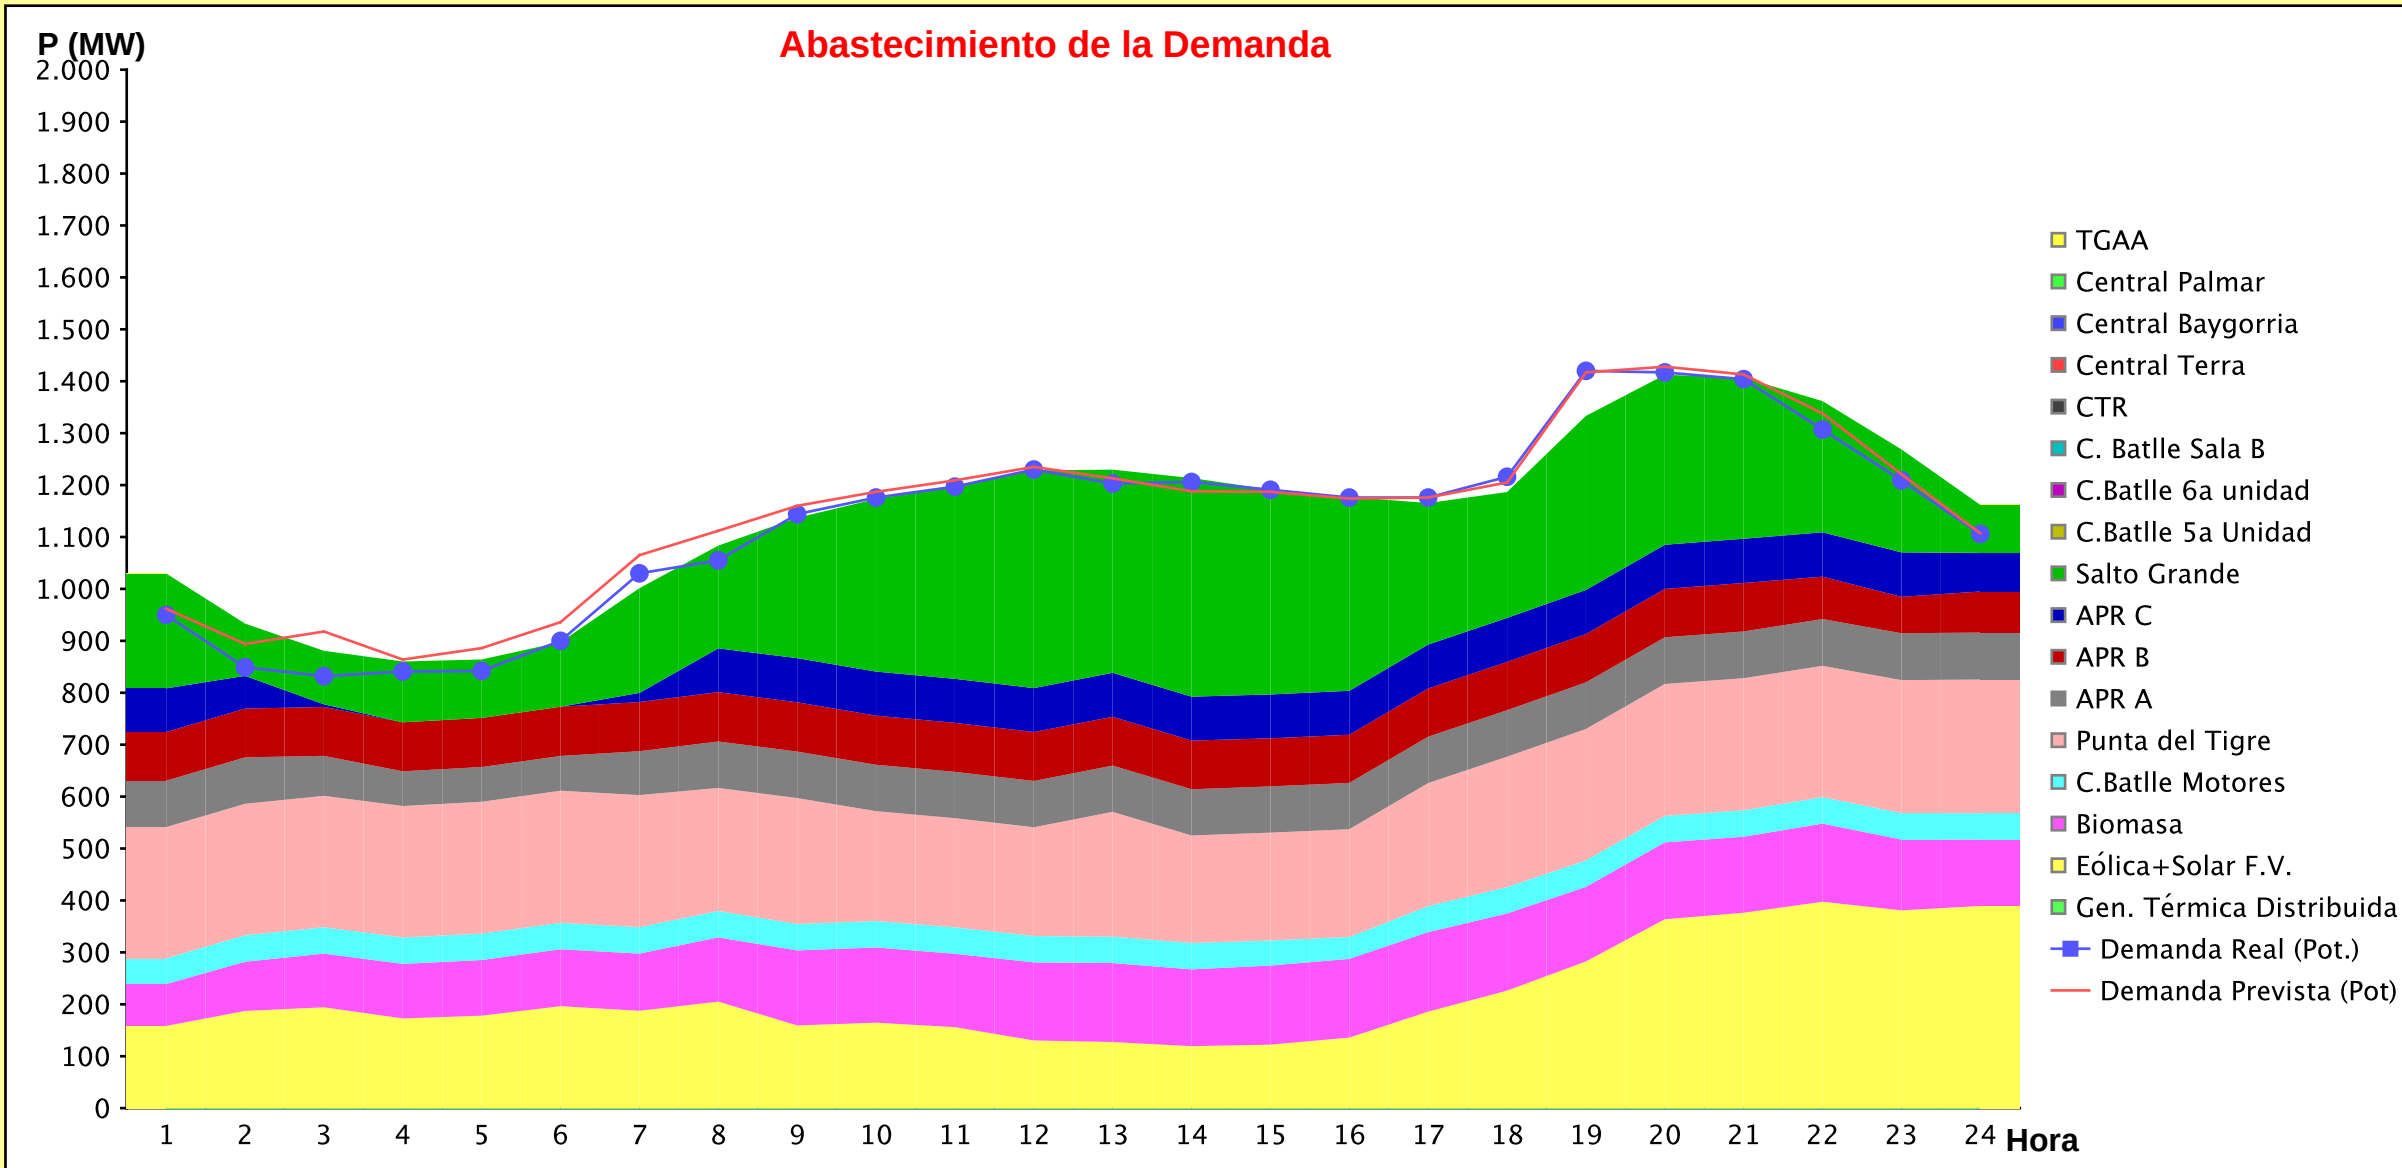

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.309
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	27.495
Diferencia (MWh)	-186
Ejecutada - Programada	-0,67 %

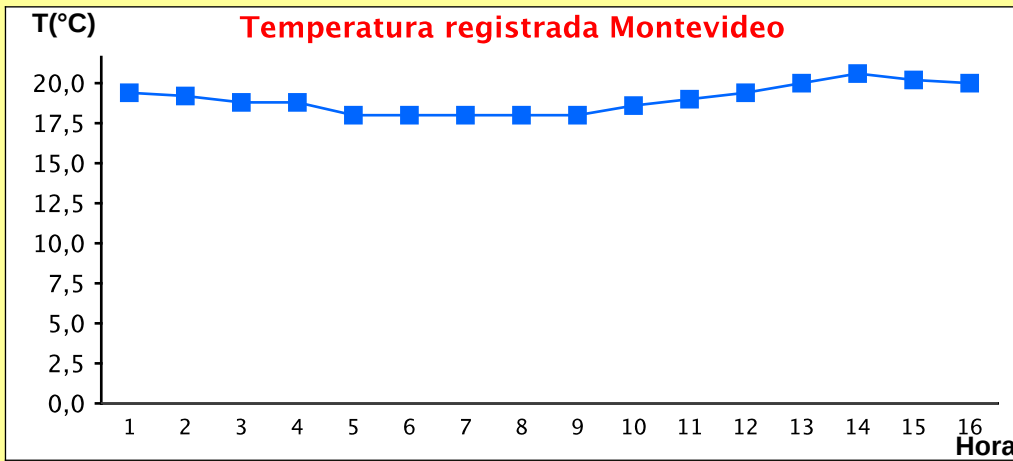

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1240,56 Hora 11:53
Potencia mínima:	817 Hora 02:45
Pico noche:	1425,16 Hora 19:40


Generación Media (MW)	
Eólica	216,9
Biomasa	132,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

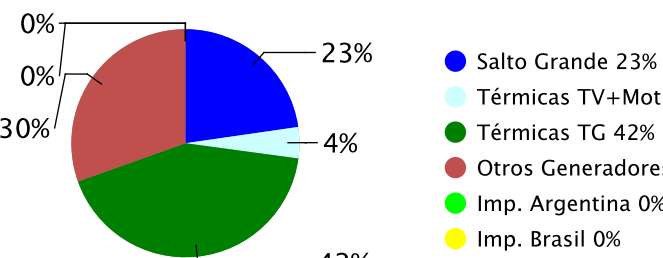



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

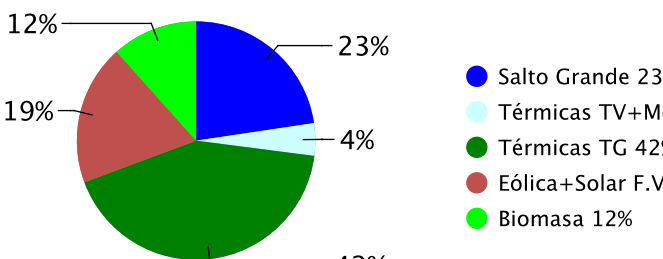



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

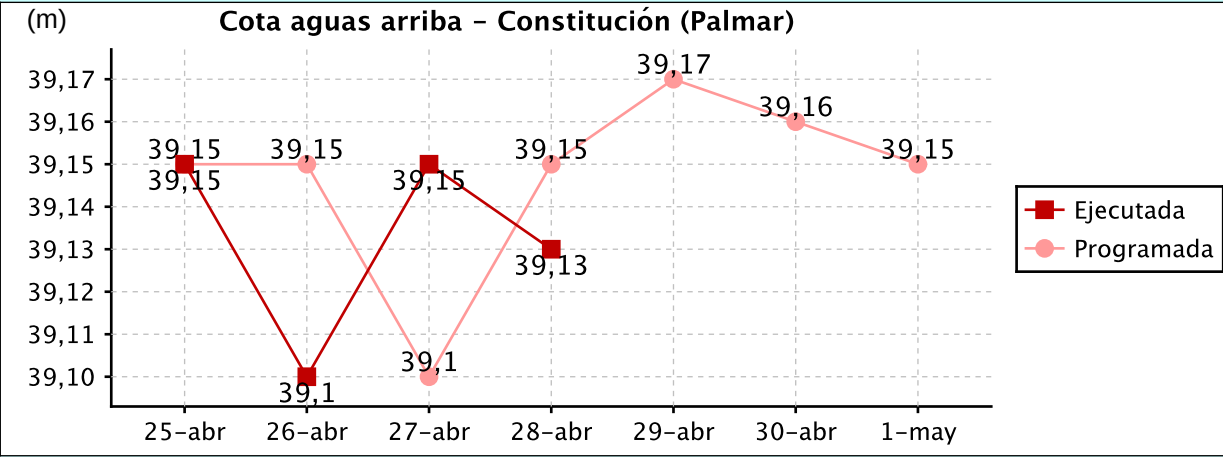
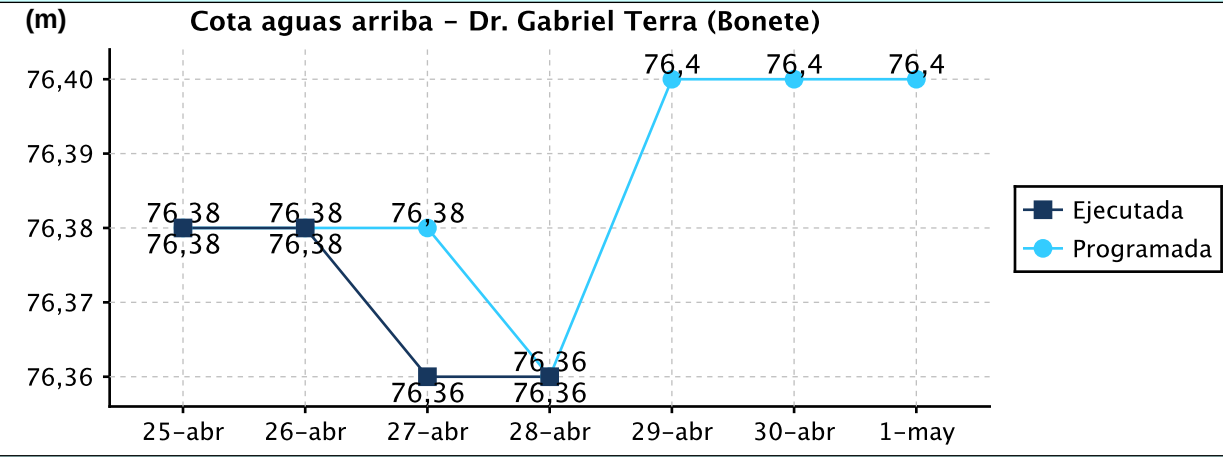


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,36	76,36
Baygorria	53,92	53,85
Palmar	39,15	39,13
SGU	35,19	35,19

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

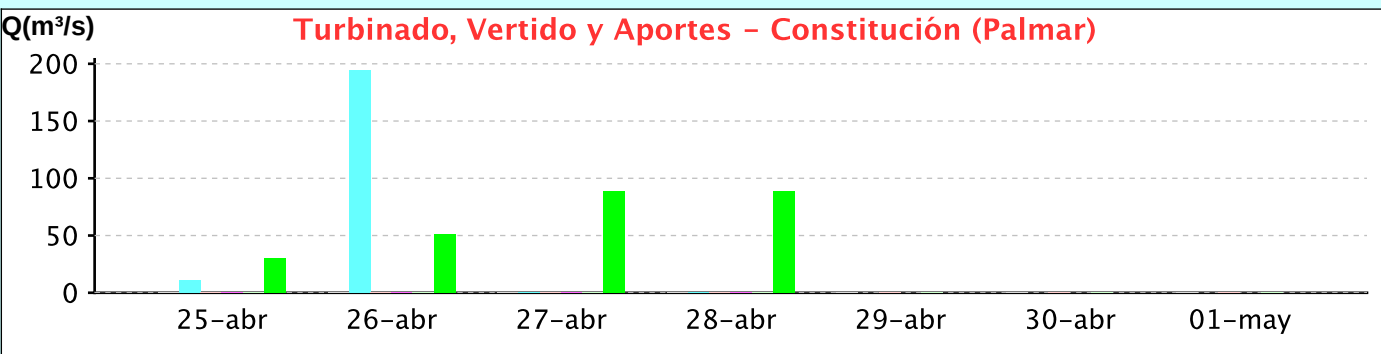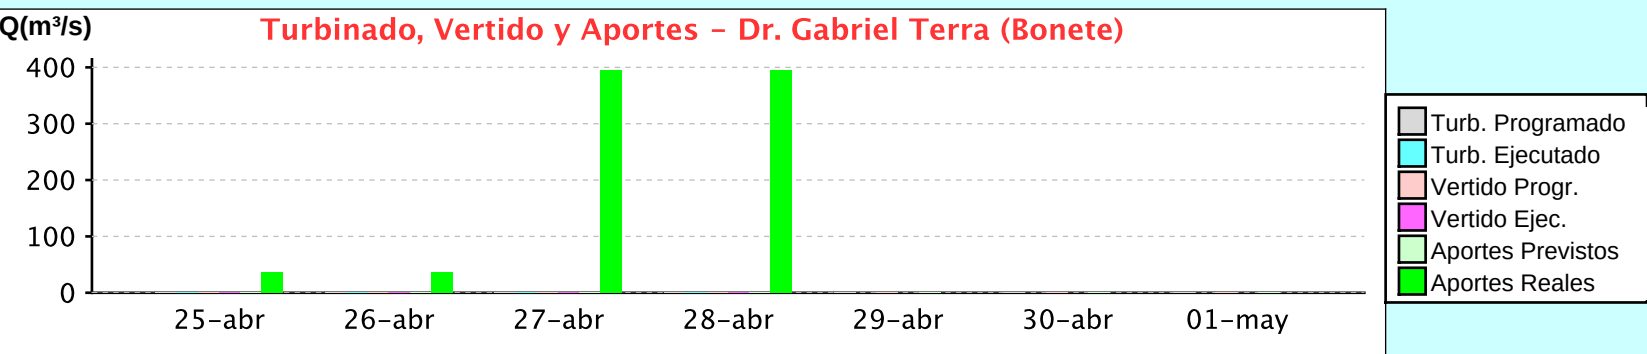

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

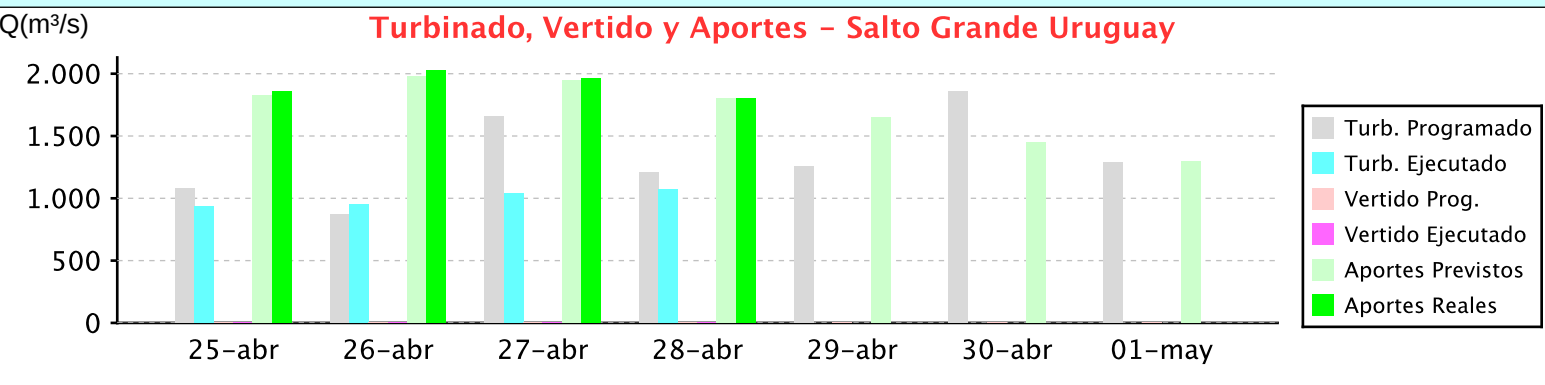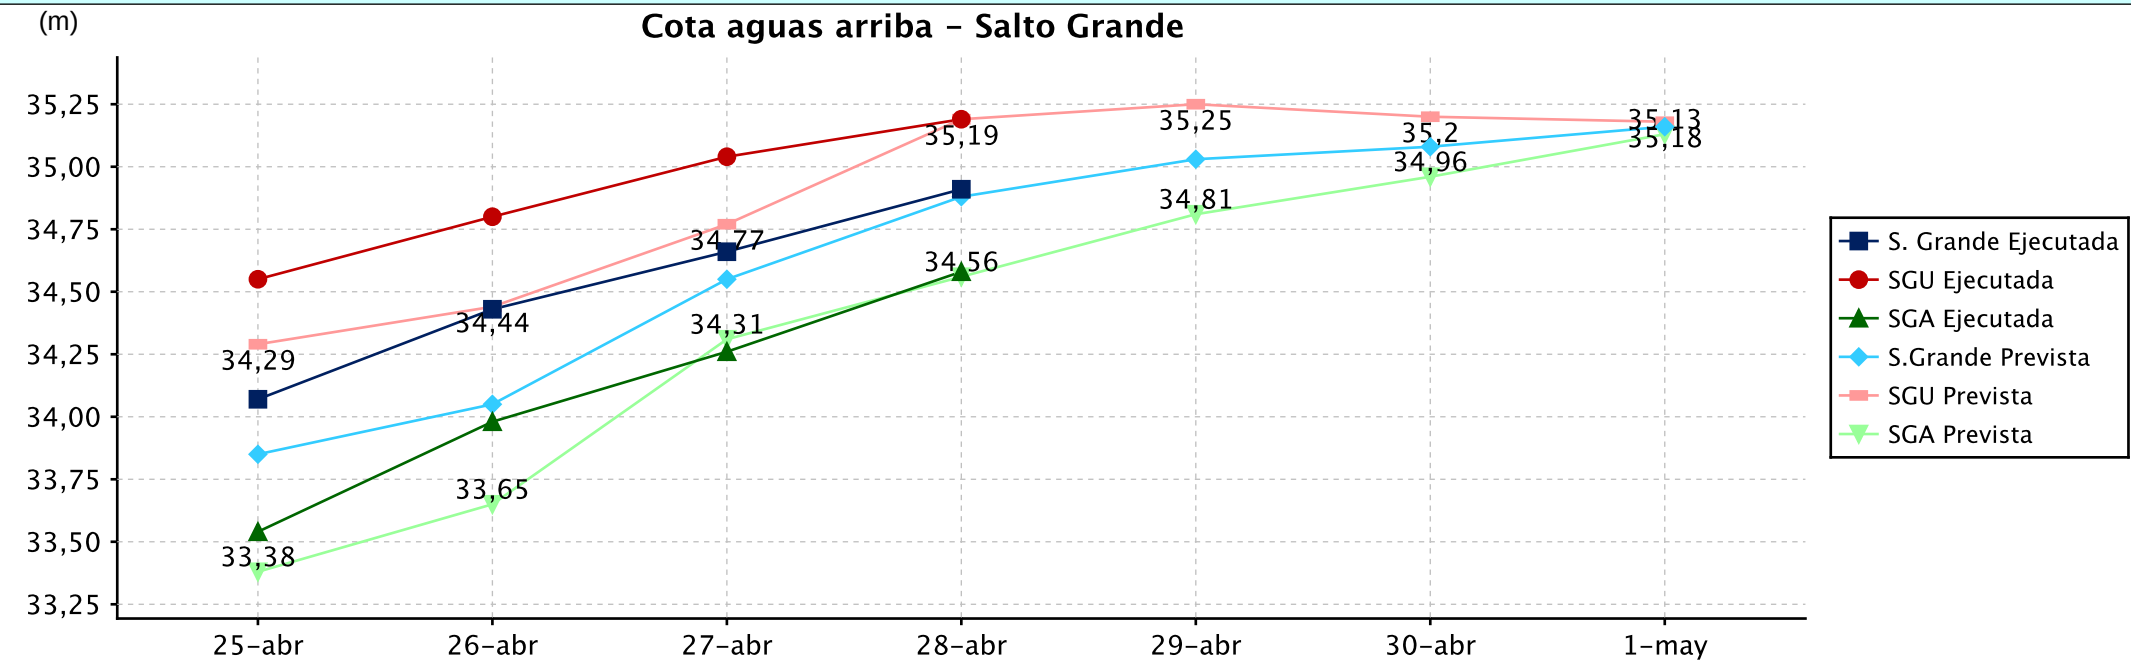

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,19
Cota Vista Arg	34,58
Cota real	34,91
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
14.332	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.209	1.069

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	395
Baygorria	0	-49
Palmar	0	89
SGU	1.800	1.806

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
