




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 03 de mayo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.215
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.219
Central La Tablada	-96
Central P. del Tigre	5.230
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	113
C. Baygorria	-7
C. Palmar	456
C. Salto Grande	7.283
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	9.442
TOTAL Generación	23.631

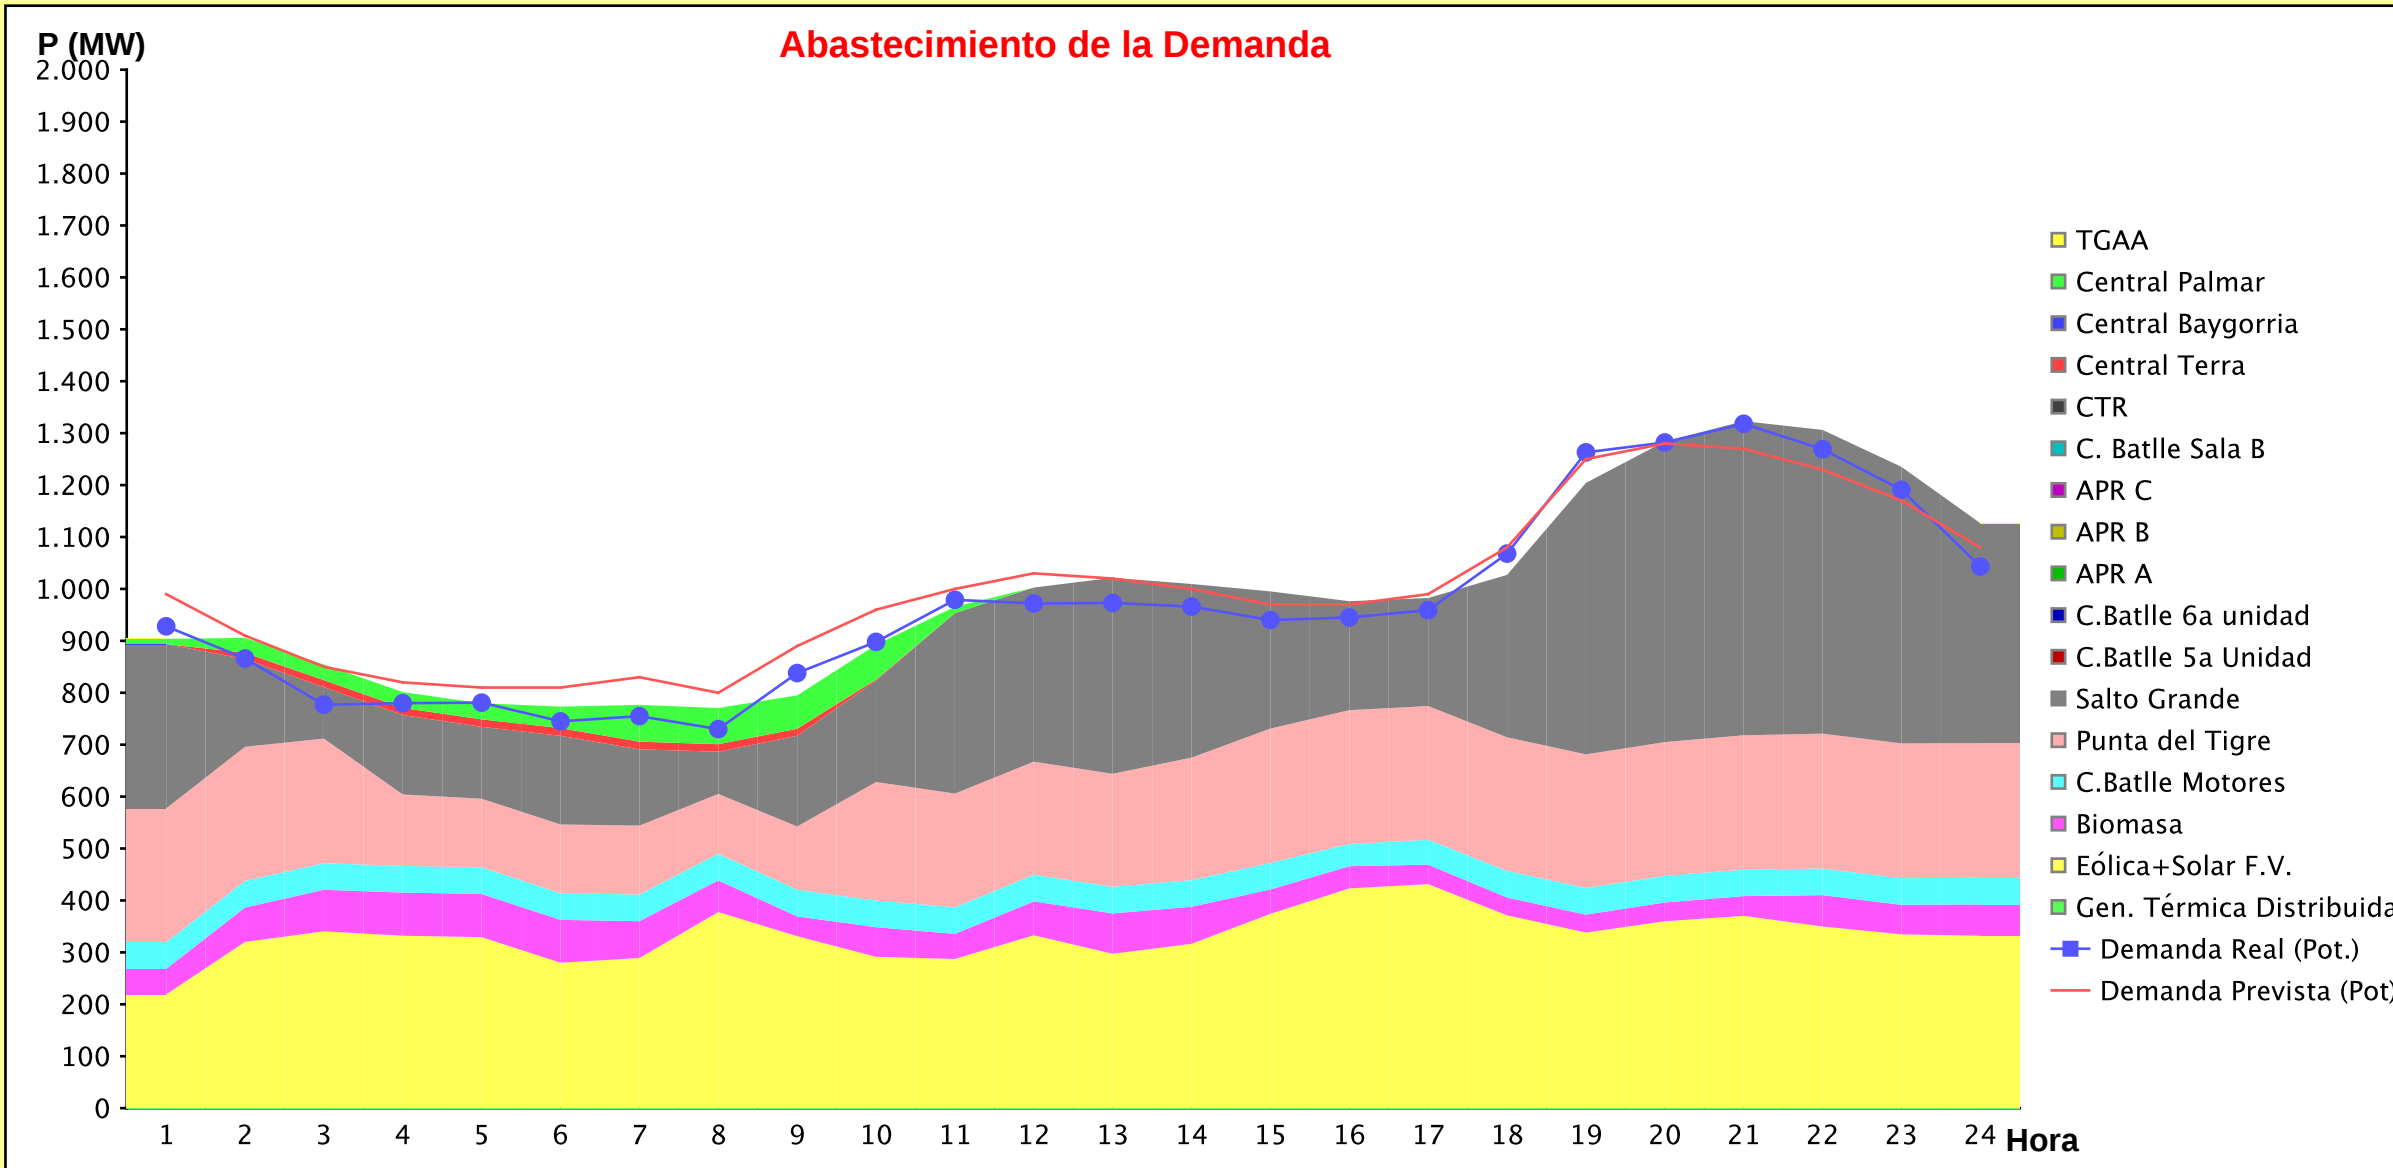

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.631
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	24.010
Diferencia (MWh)	-379
Ejecutada - Programada	-1,58 %


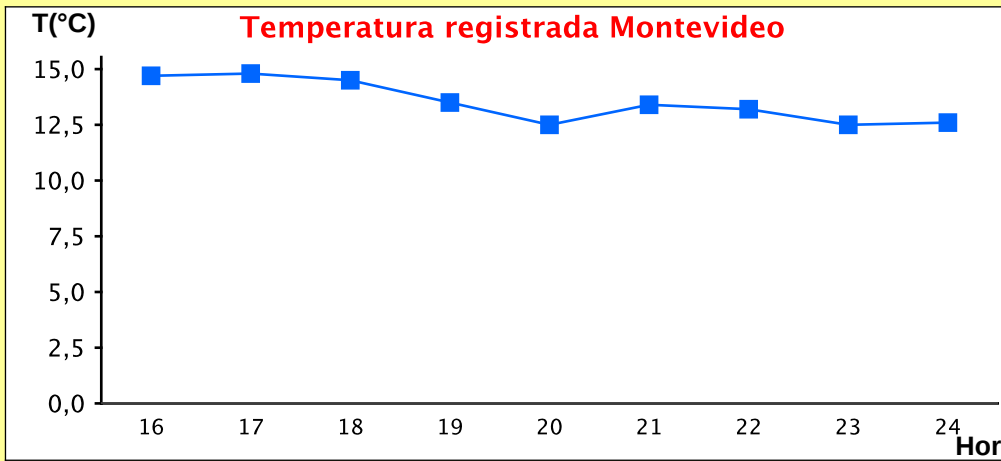


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1031,84 Hora 12:28
Potencia mínima:	732,7 Hora 07:44
Pico noche:	1366,94 Hora 20:37

Generación Media (MW)	
Eólica	334,6
Biomasa	67,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


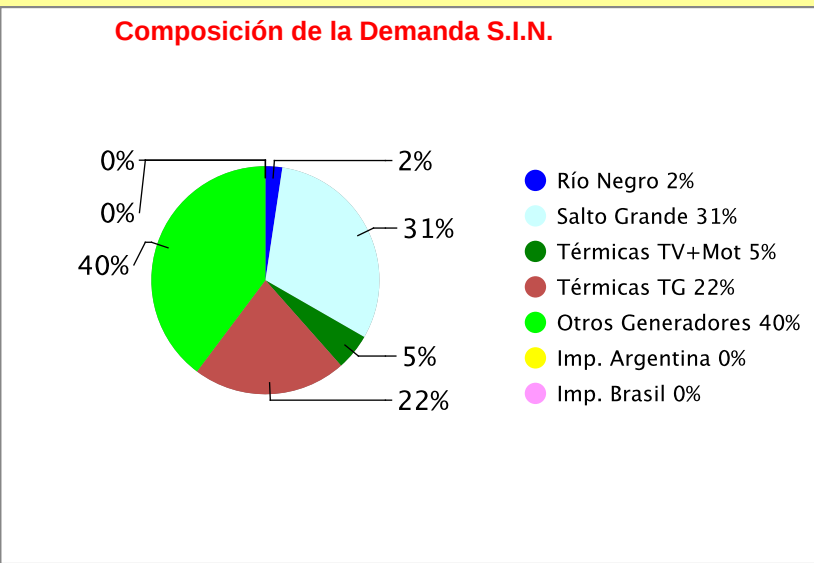


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

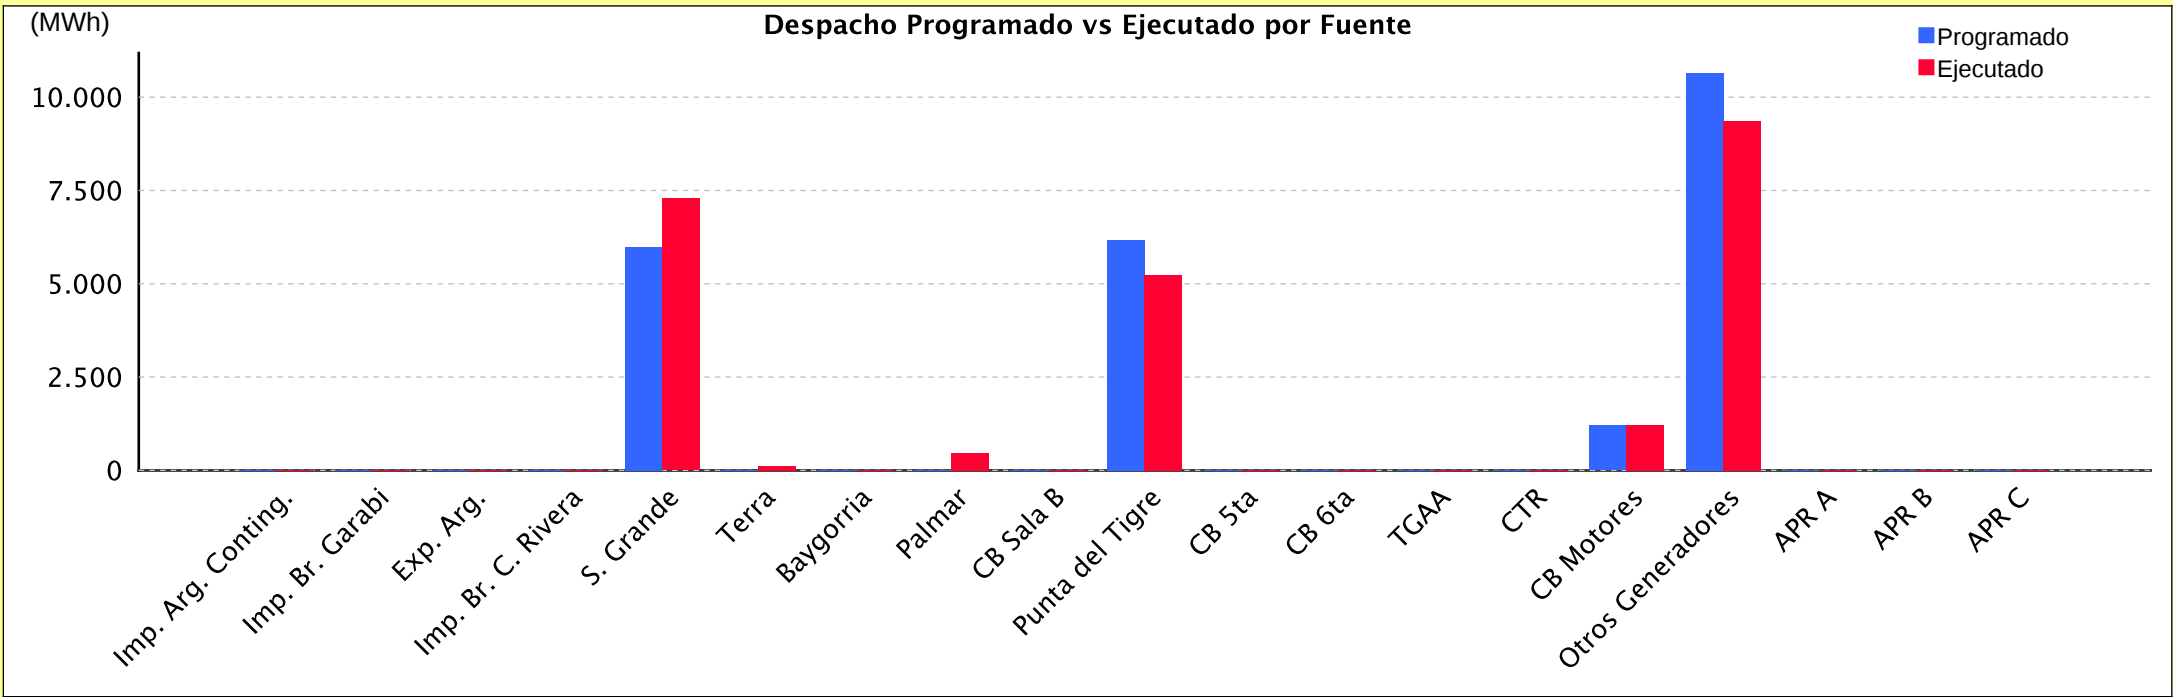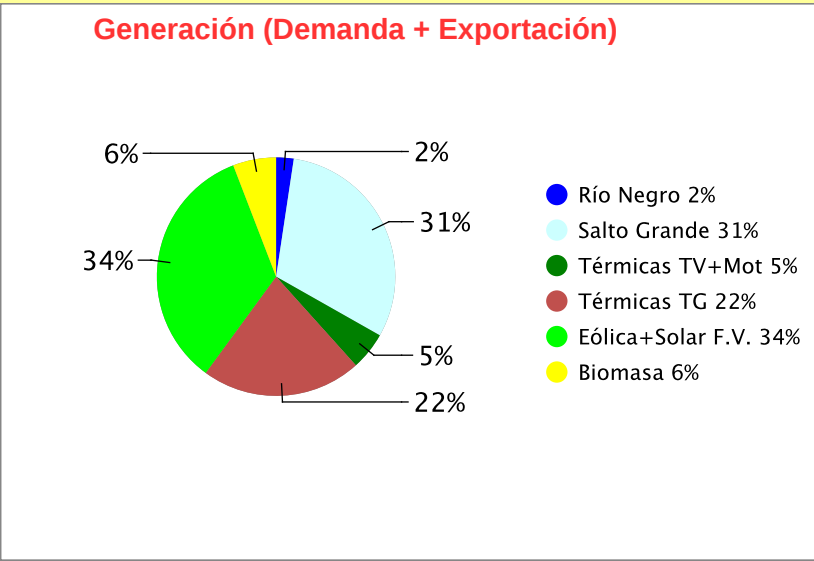



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

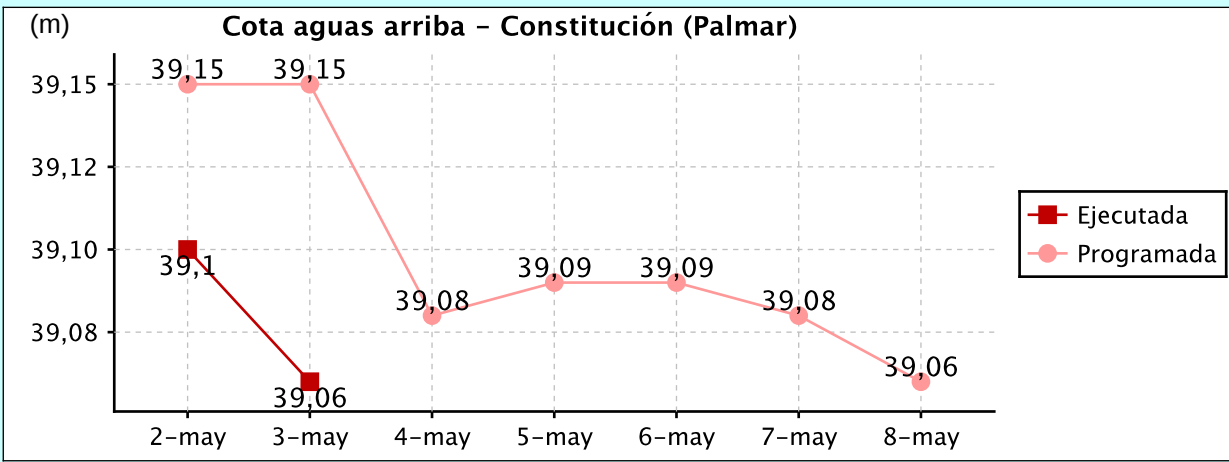
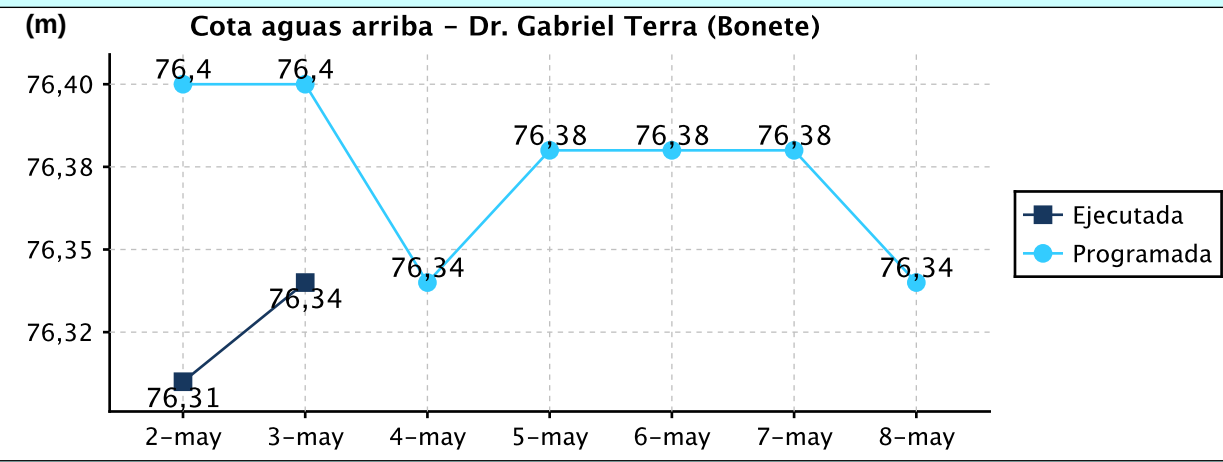


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,40	76,34
Baygorria	53,90	53,94
Palmar	39,15	39,06
SGU	35,14	35,11

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

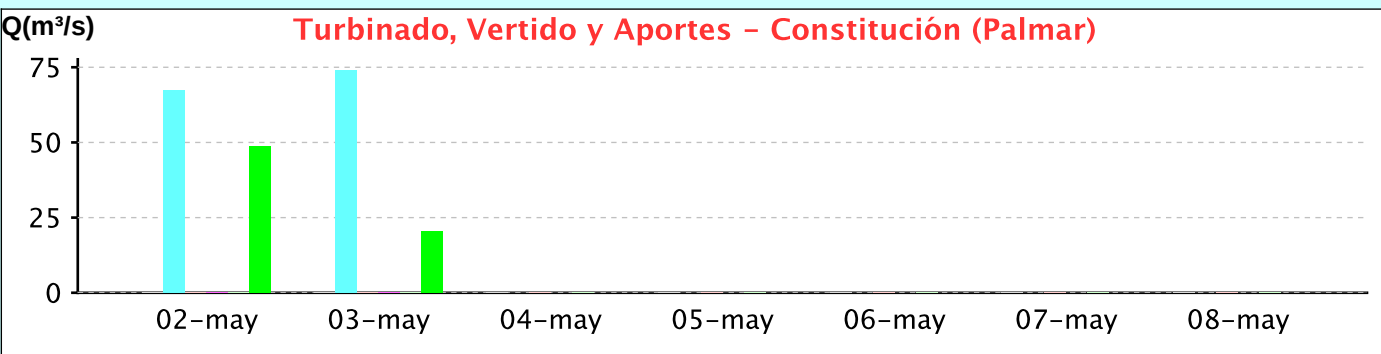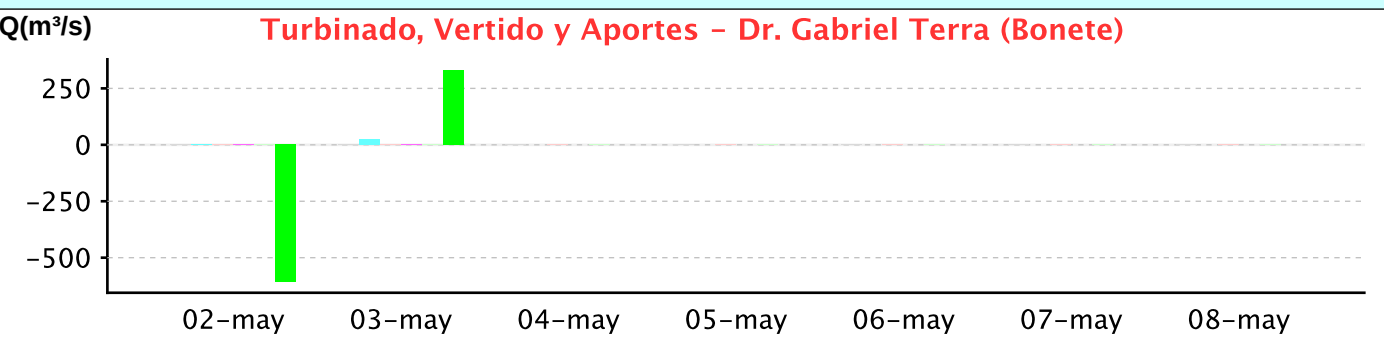

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

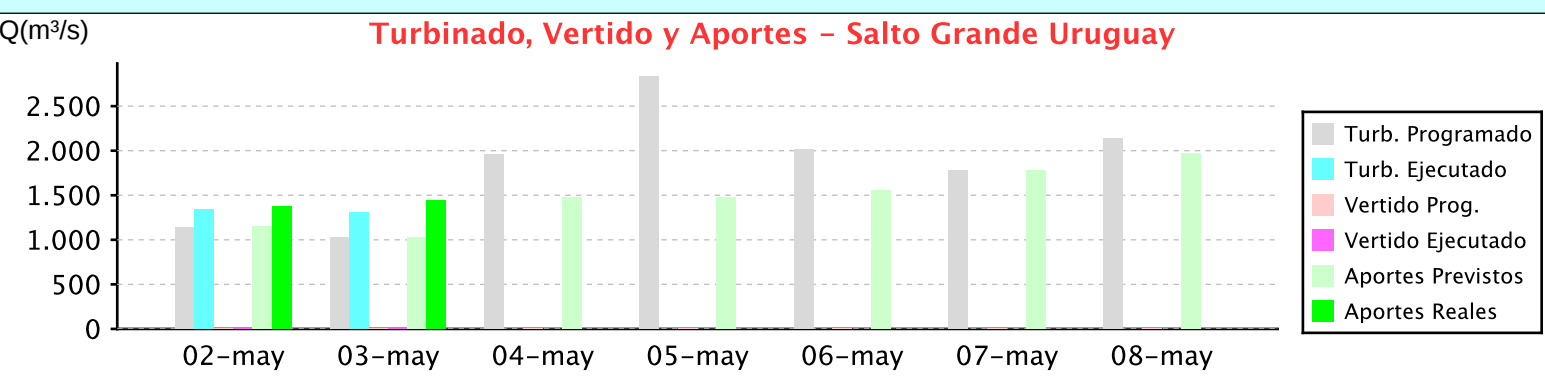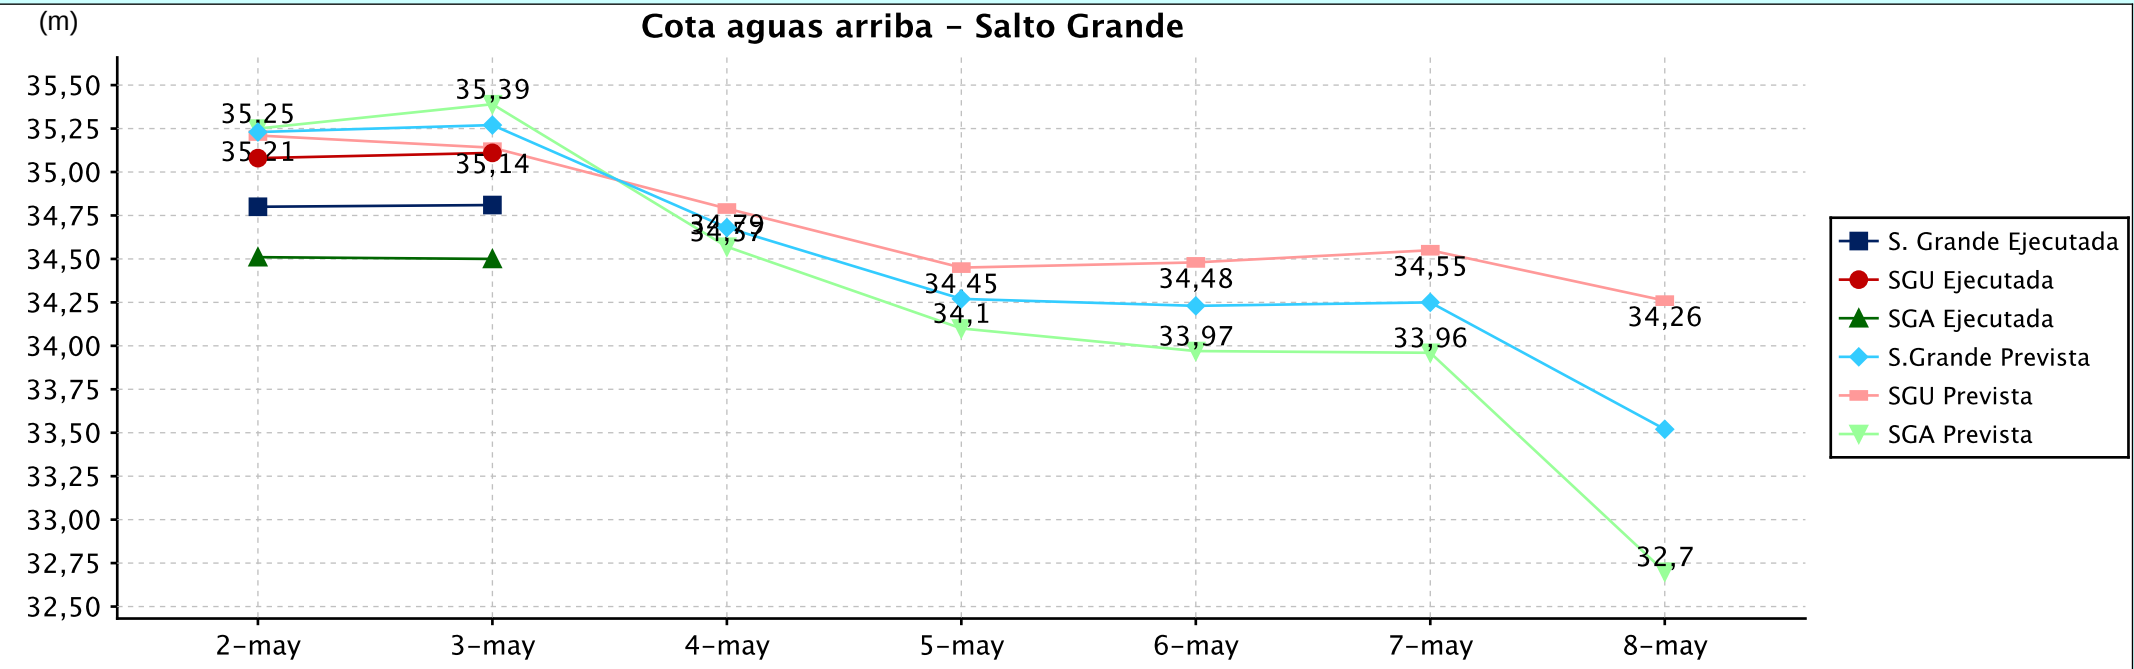

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,11
Cota Vista Arg	34,50
Cota real	34,81
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
13.943	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	26
Baygorria	0	0
Palmar	0	74
SGU	1.026	1.304

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	332
Baygorria	0	-19
Palmar	0	21
SGU	1.025	1.440

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
