




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 05 de mayo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.211
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.216
Central La Tablada	449
Central P. del Tigre	6.076
APR A	495
APR B	1.452
APR C	515
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	169
C. Baygorria	-8
C. Palmar	69
C. Salto Grande	14.021
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.125
TOTAL Generación	28.574

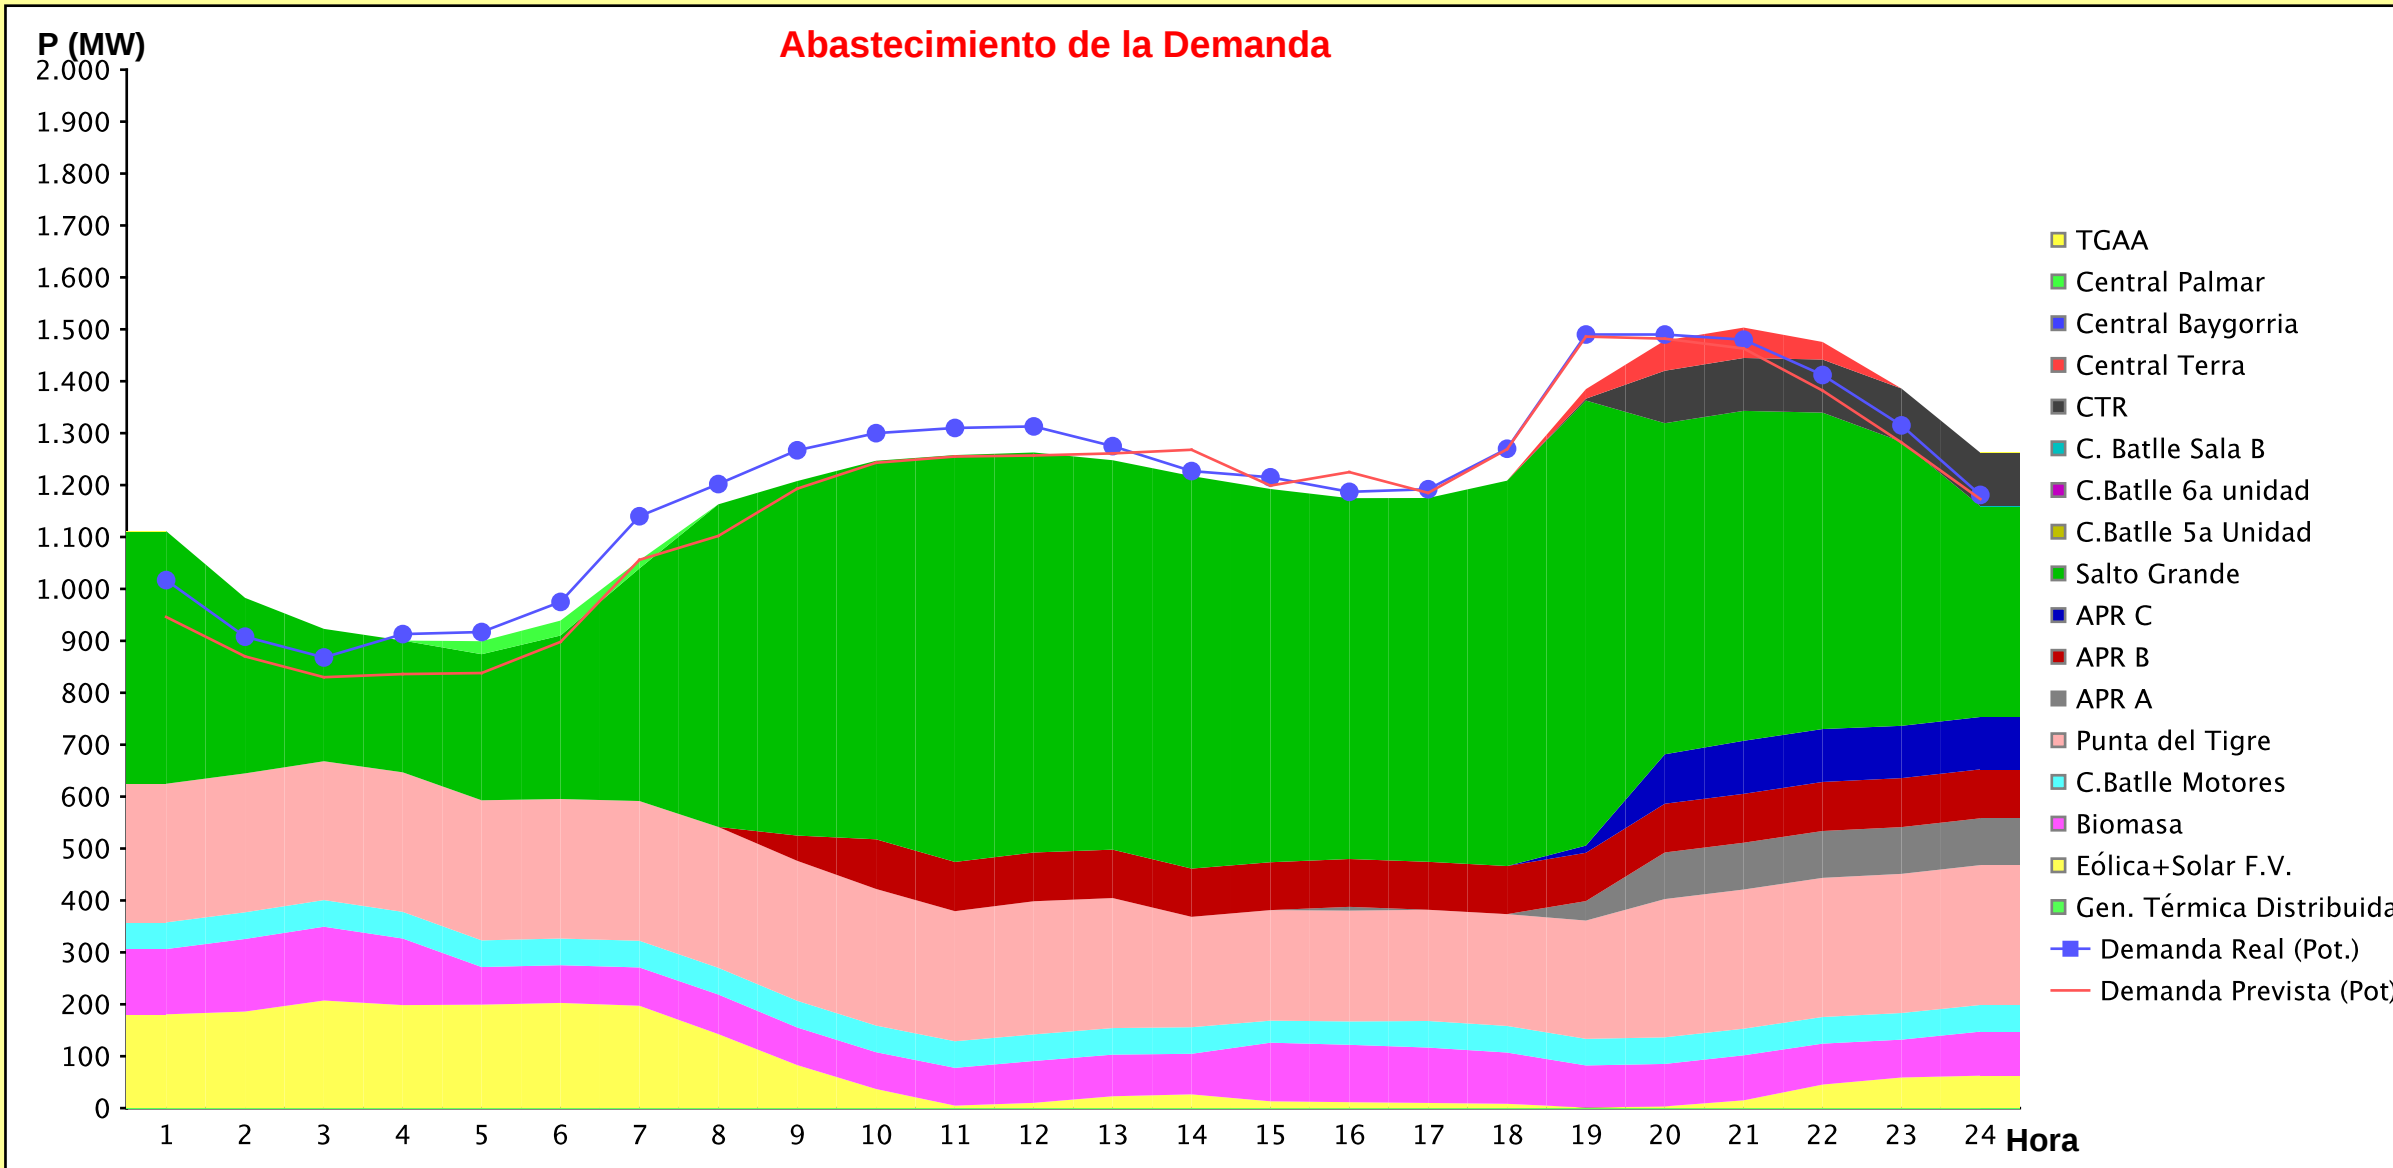

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.574
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.999
Diferencia (MWh)	575
Ejecutada - Programada	2,05 %


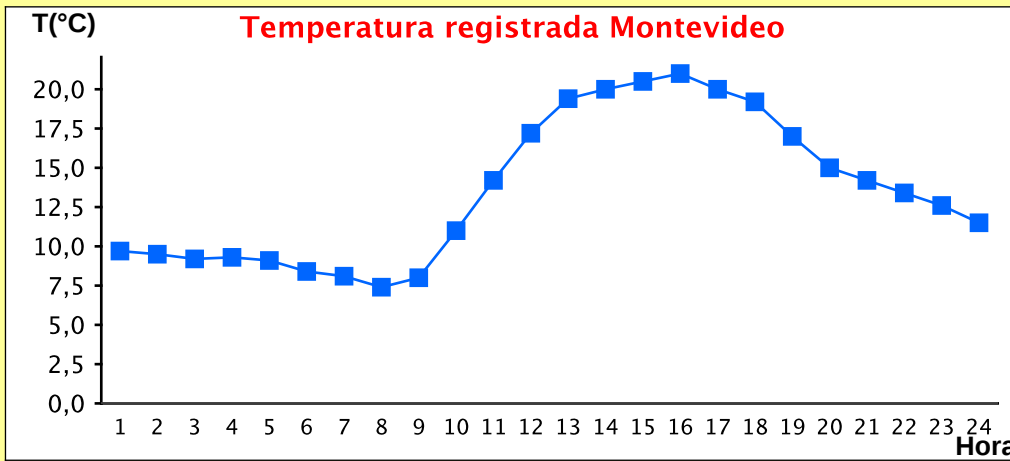


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1313,32 Hora 11:49
Potencia mínima:	875,39 Hora 03:49
Pico noche:	1481,37 Hora 19:04

Generación Media (MW)	
Eólica	81,5
Biomasa	102,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


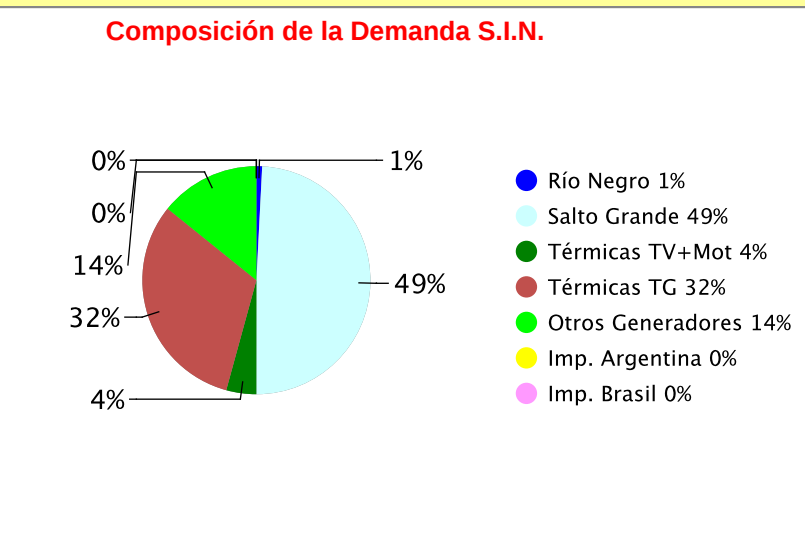


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

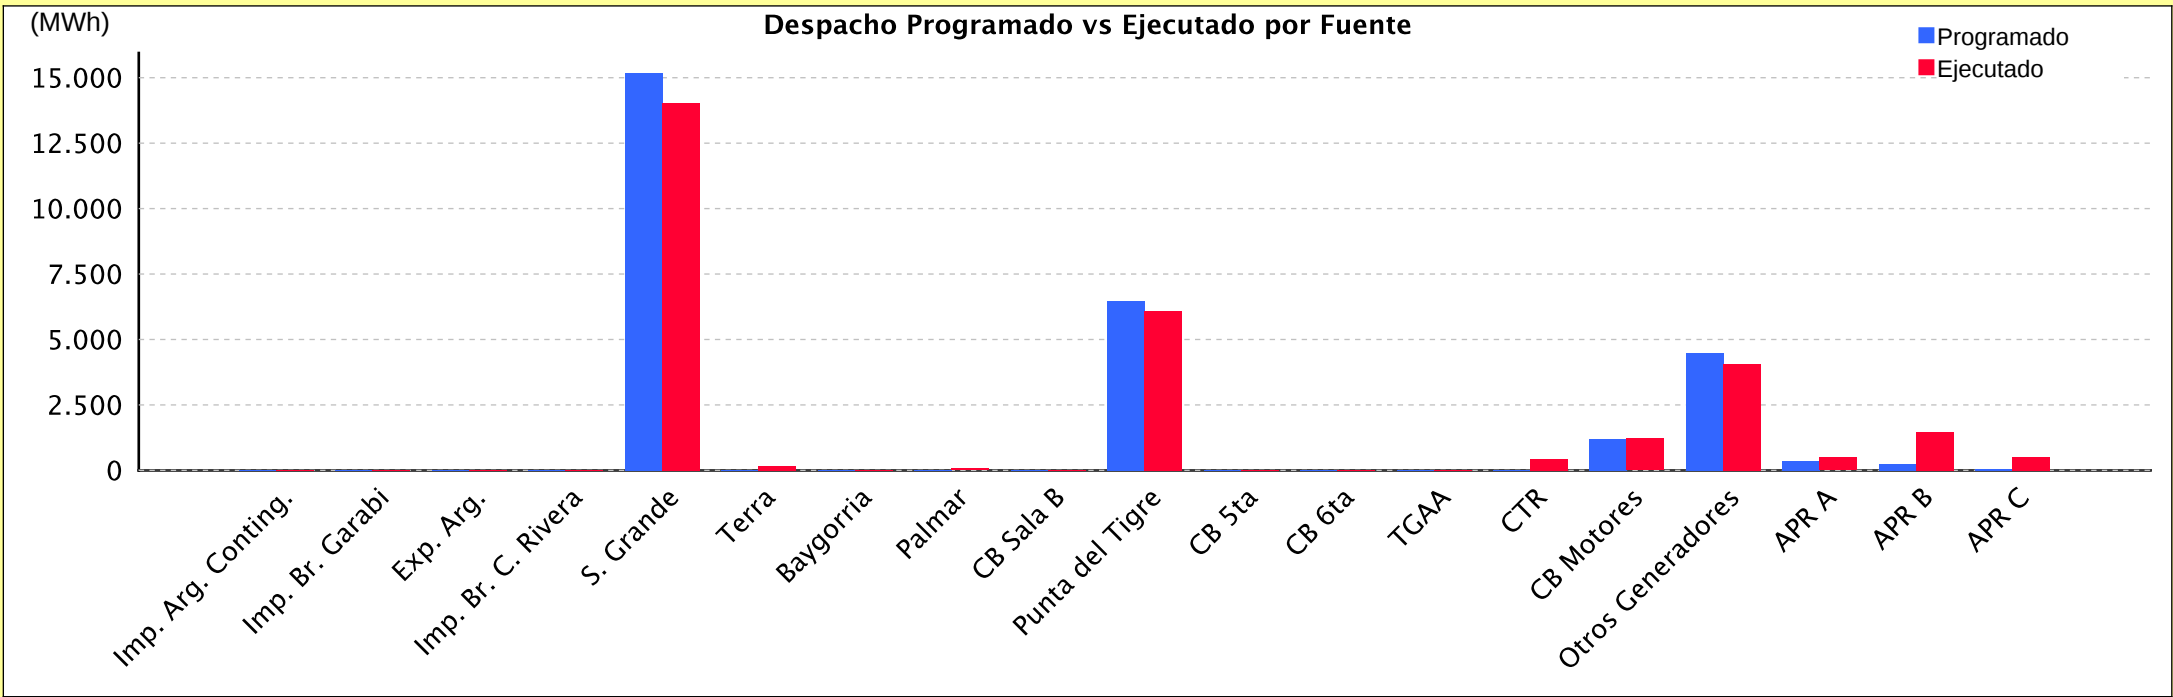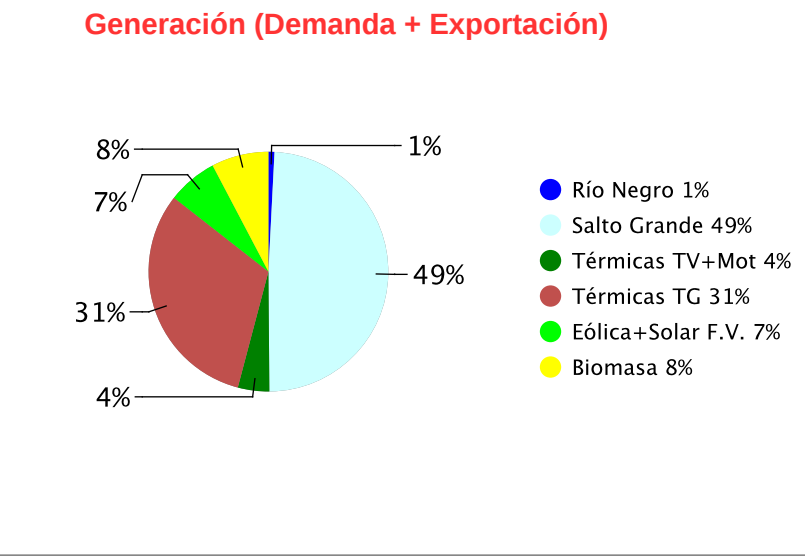



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

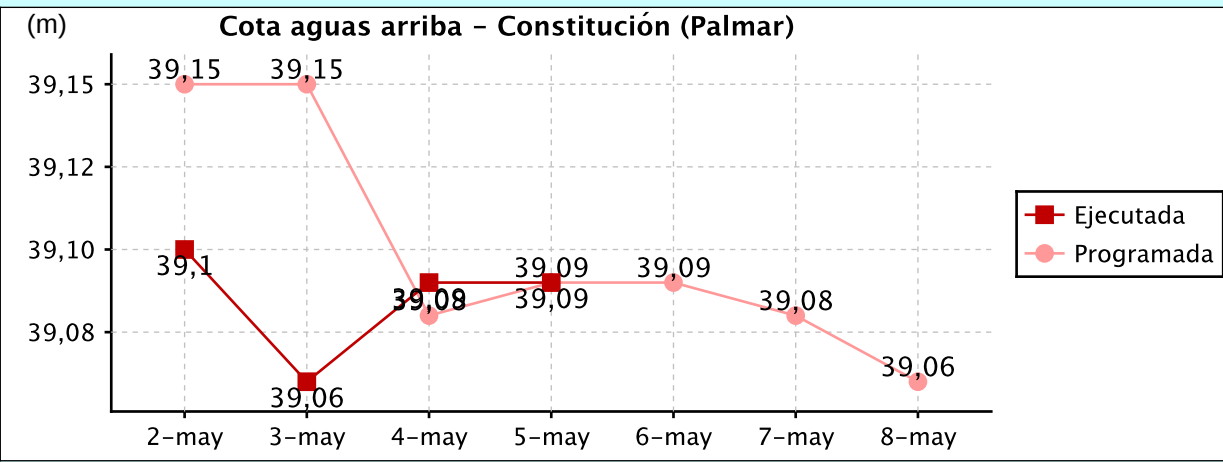
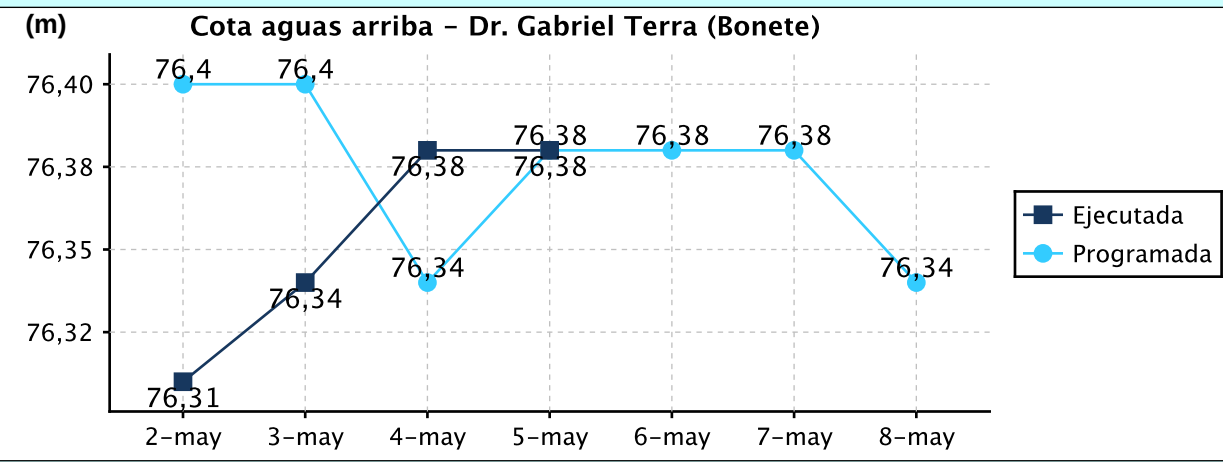


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,38	76,38
Baygorria	53,95	53,97
Palmar	39,09	39,09
SGU	34,45	34,52

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

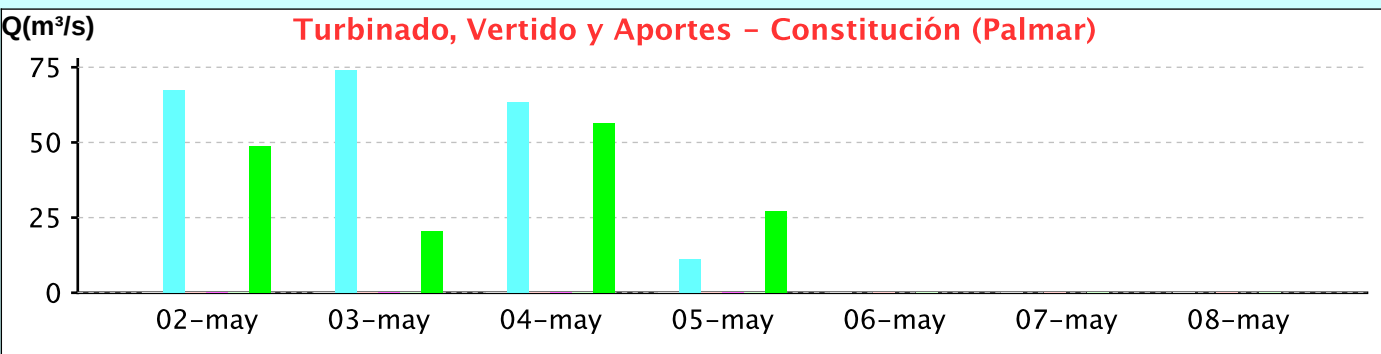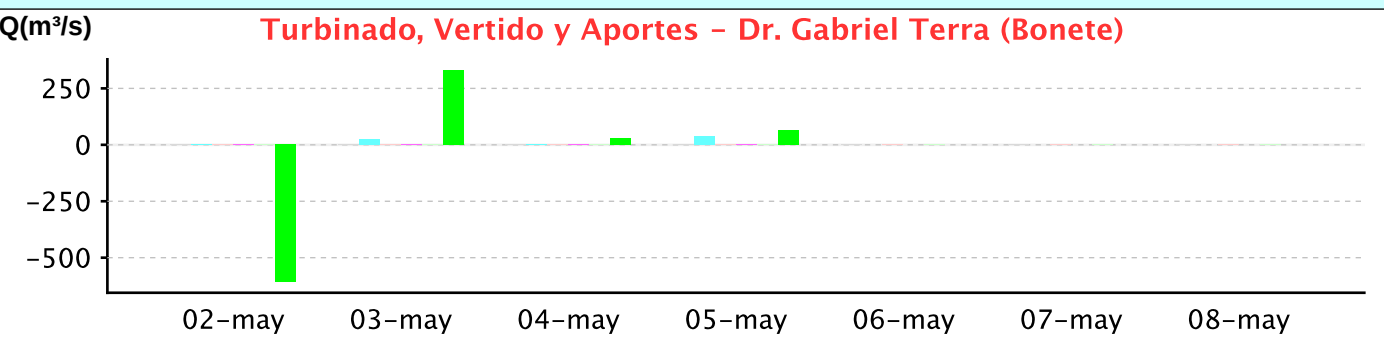

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

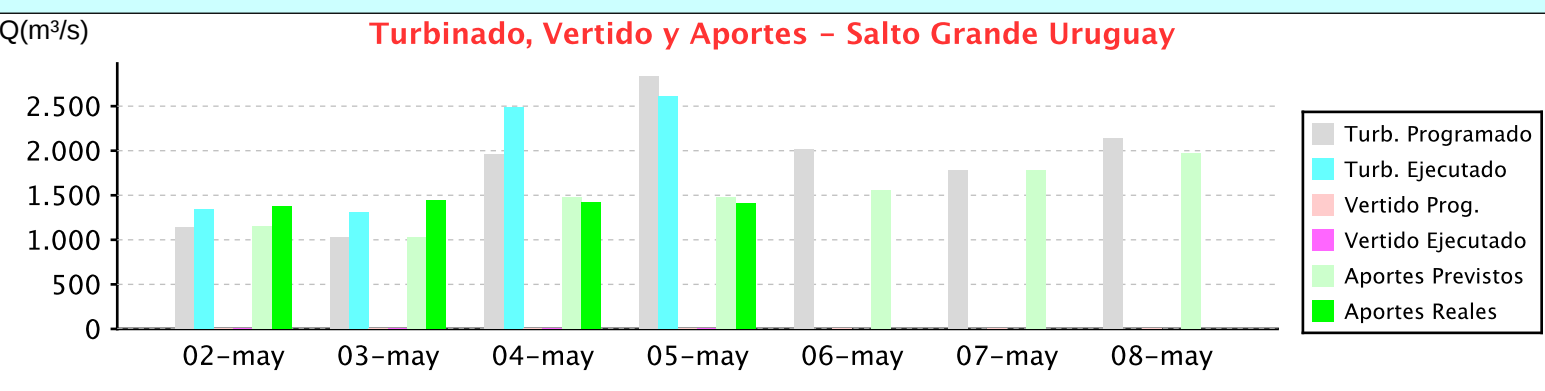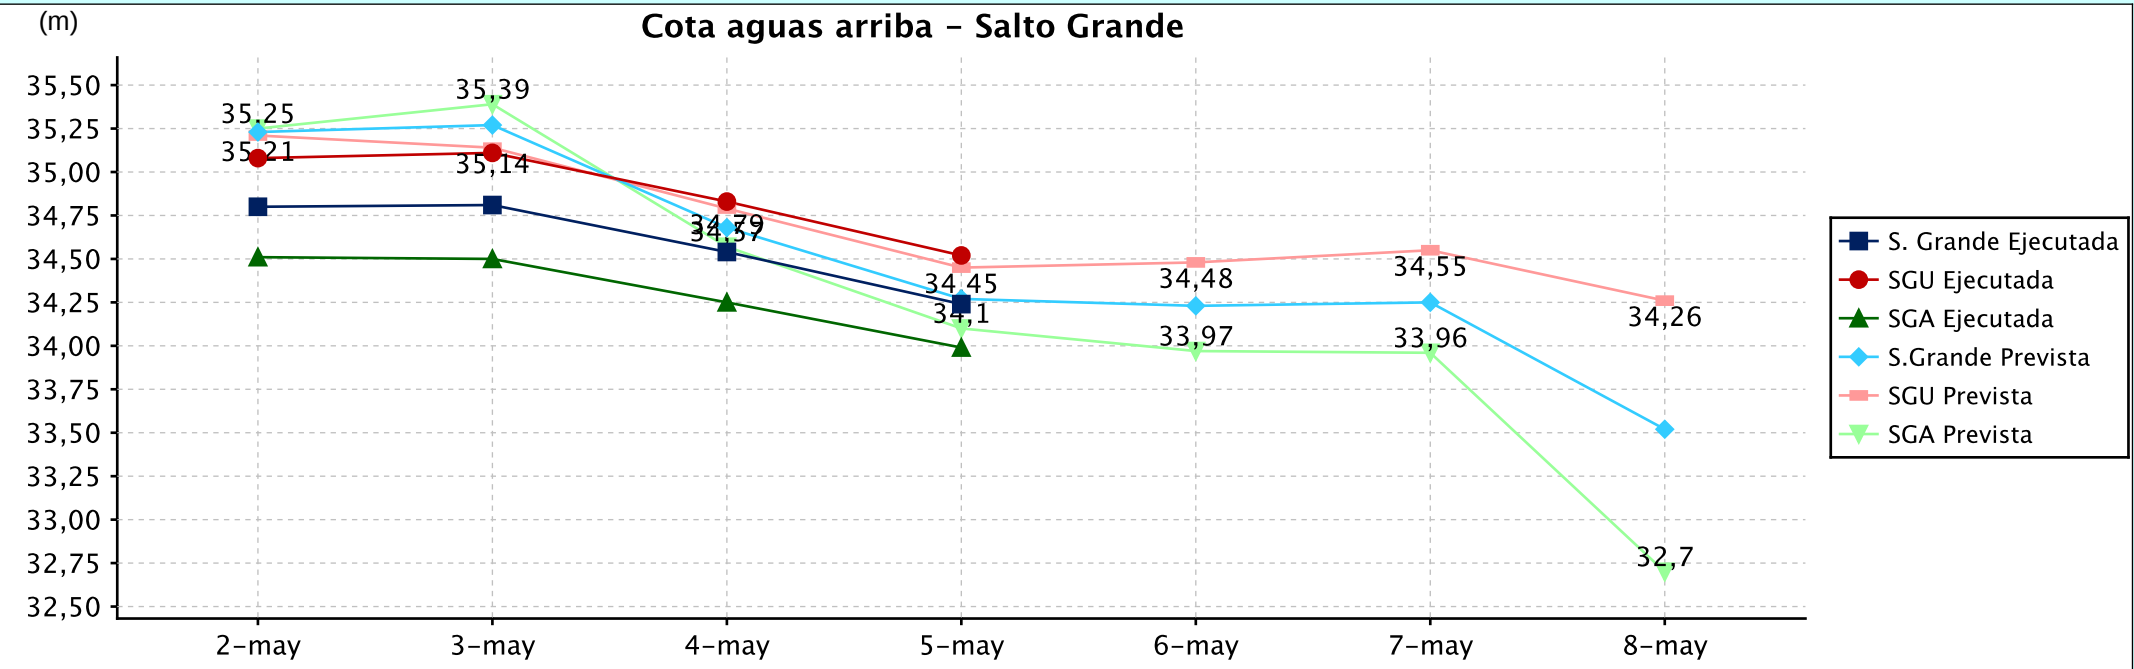

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,52
Cota Vista Arg	33,99
Cota real	34,24
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
12.014	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	38
Baygorria	0	0
Palmar	0	11
SGU	2.837	2.612

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	66
Baygorria	0	4
Palmar	0	27
SGU	1.475	1.412

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
