




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 06 de mayo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.216
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.220
Central La Tablada	60
Central P. del Tigre	6.091
APR A	1.970
APR B	2.261
APR C	1.893
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	-8
C. Palmar	400
C. Salto Grande	8.150
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.505
TOTAL Generación	29.537

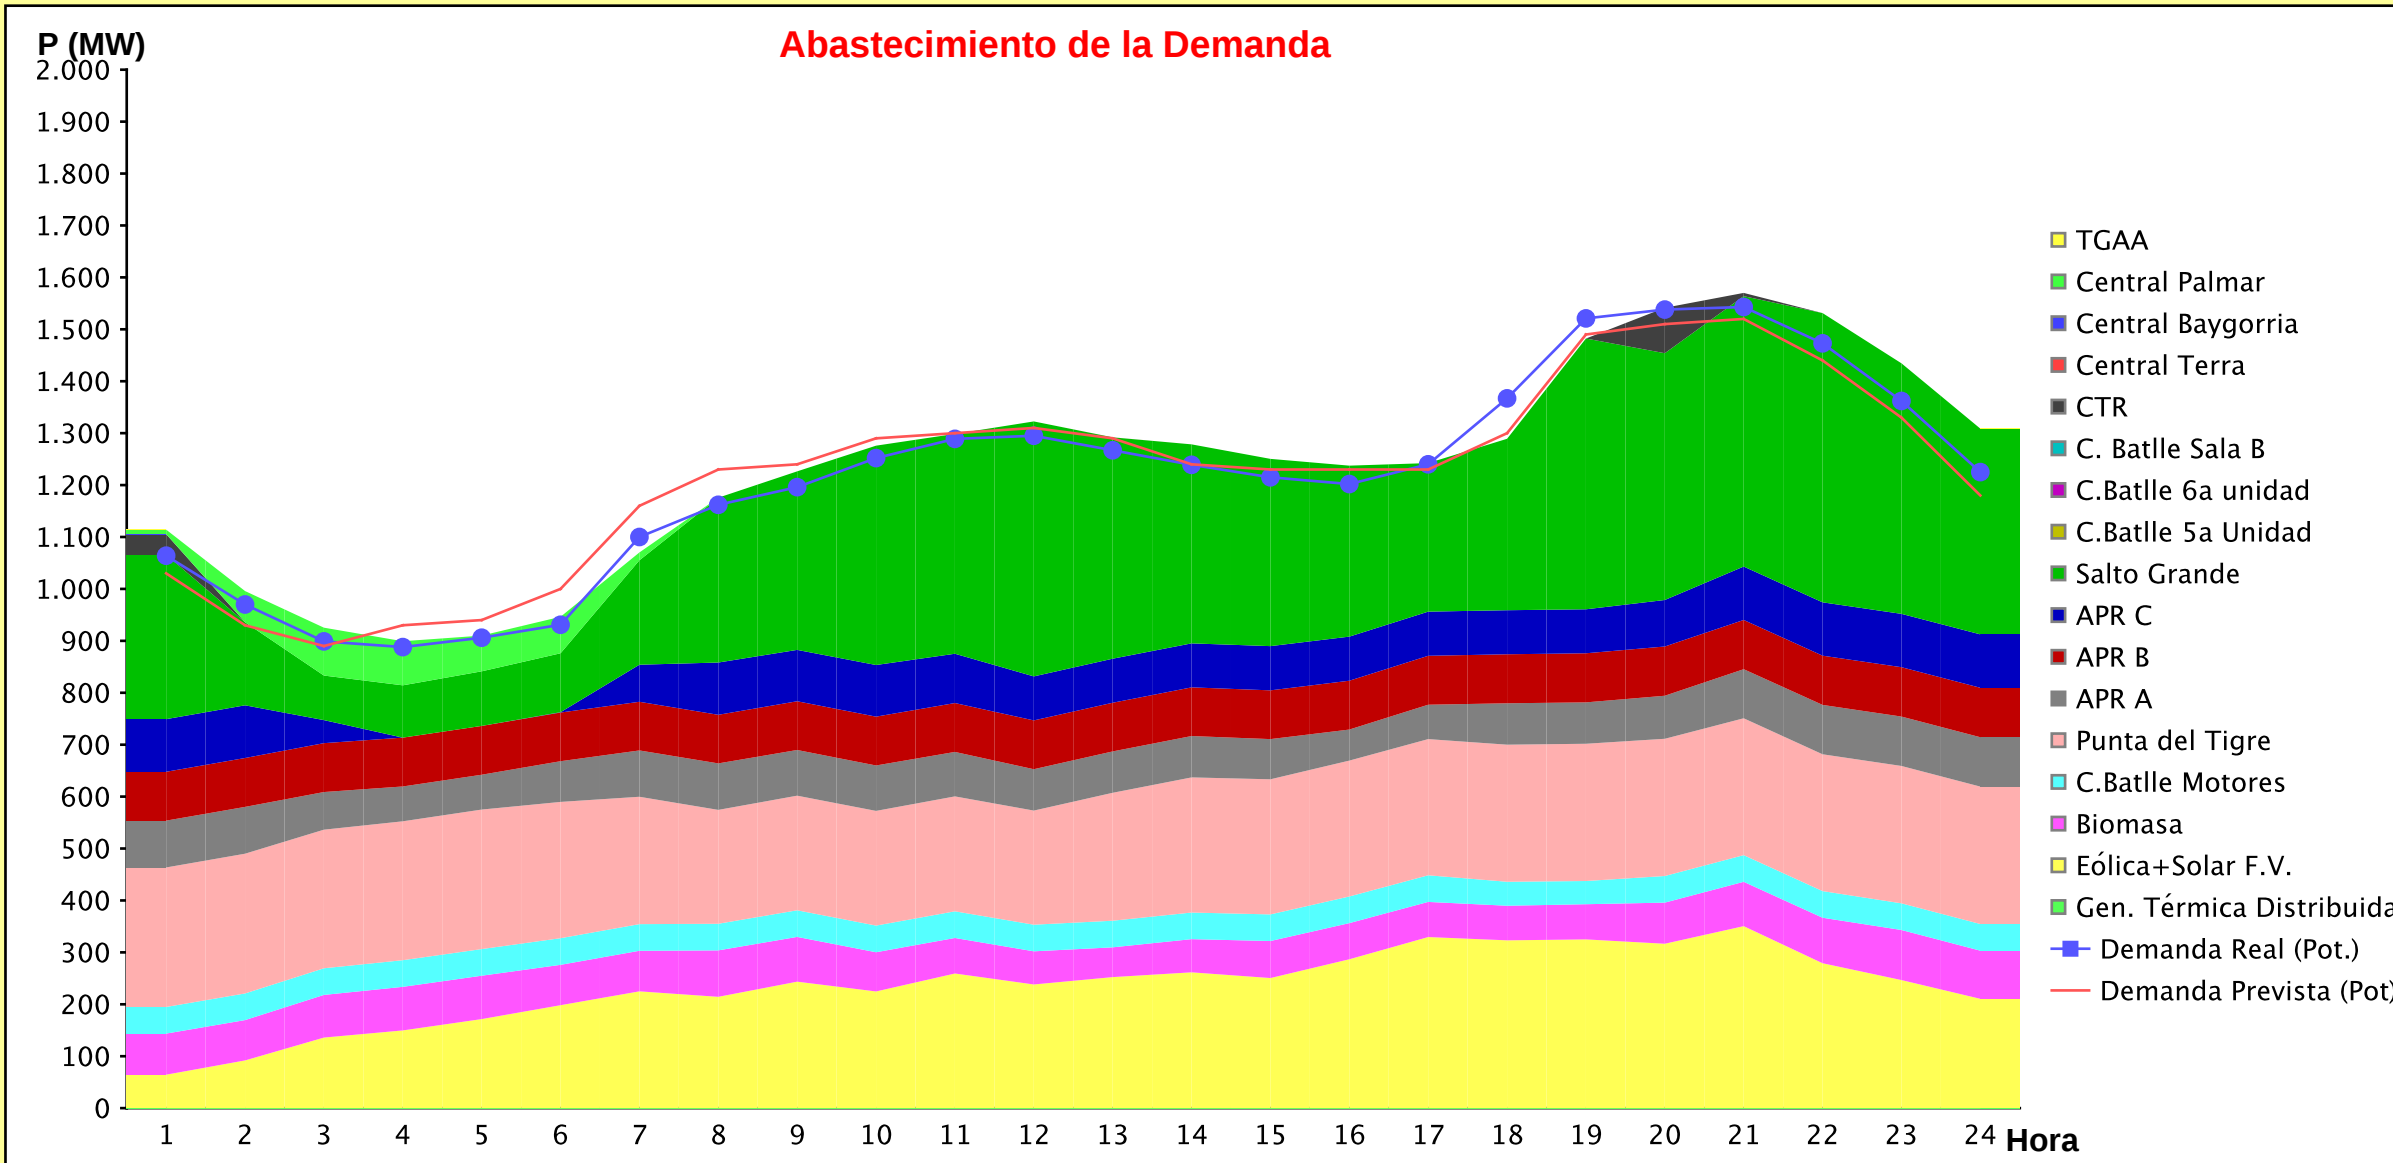

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.537
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	29.240
Diferencia (MWh)	297
Ejecutada - Programada	1,02 %

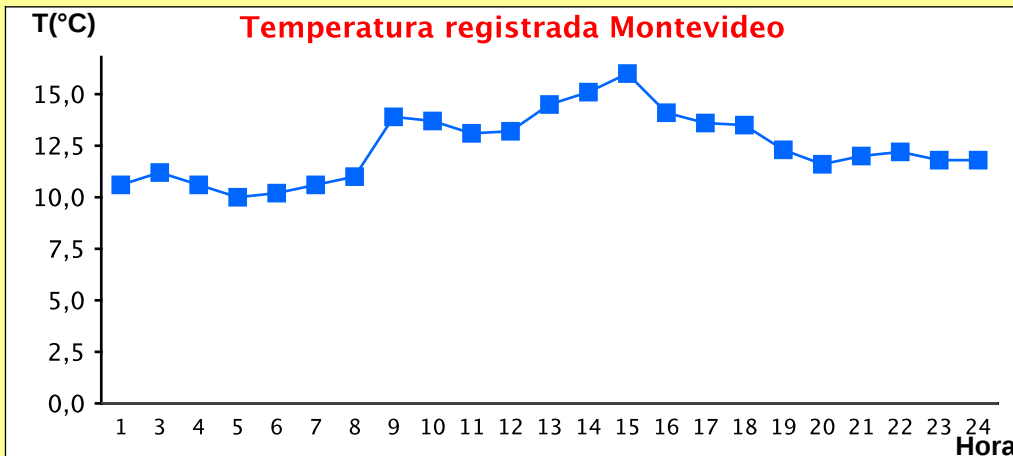

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1345,69 Hora 11:15
Potencia mínima:	804,04 Hora 04:05
Pico noche:	1582,28 Hora 20:10



Generación Media (MW)	
Eólica	235,7
Biomasa	77,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

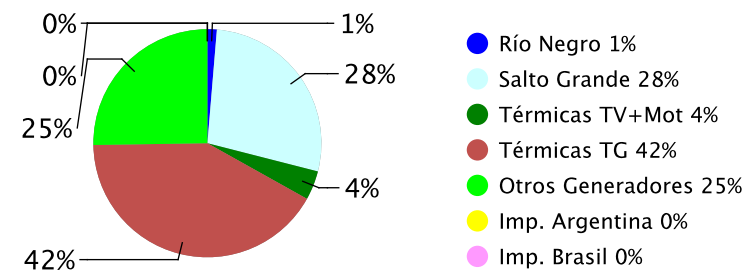



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

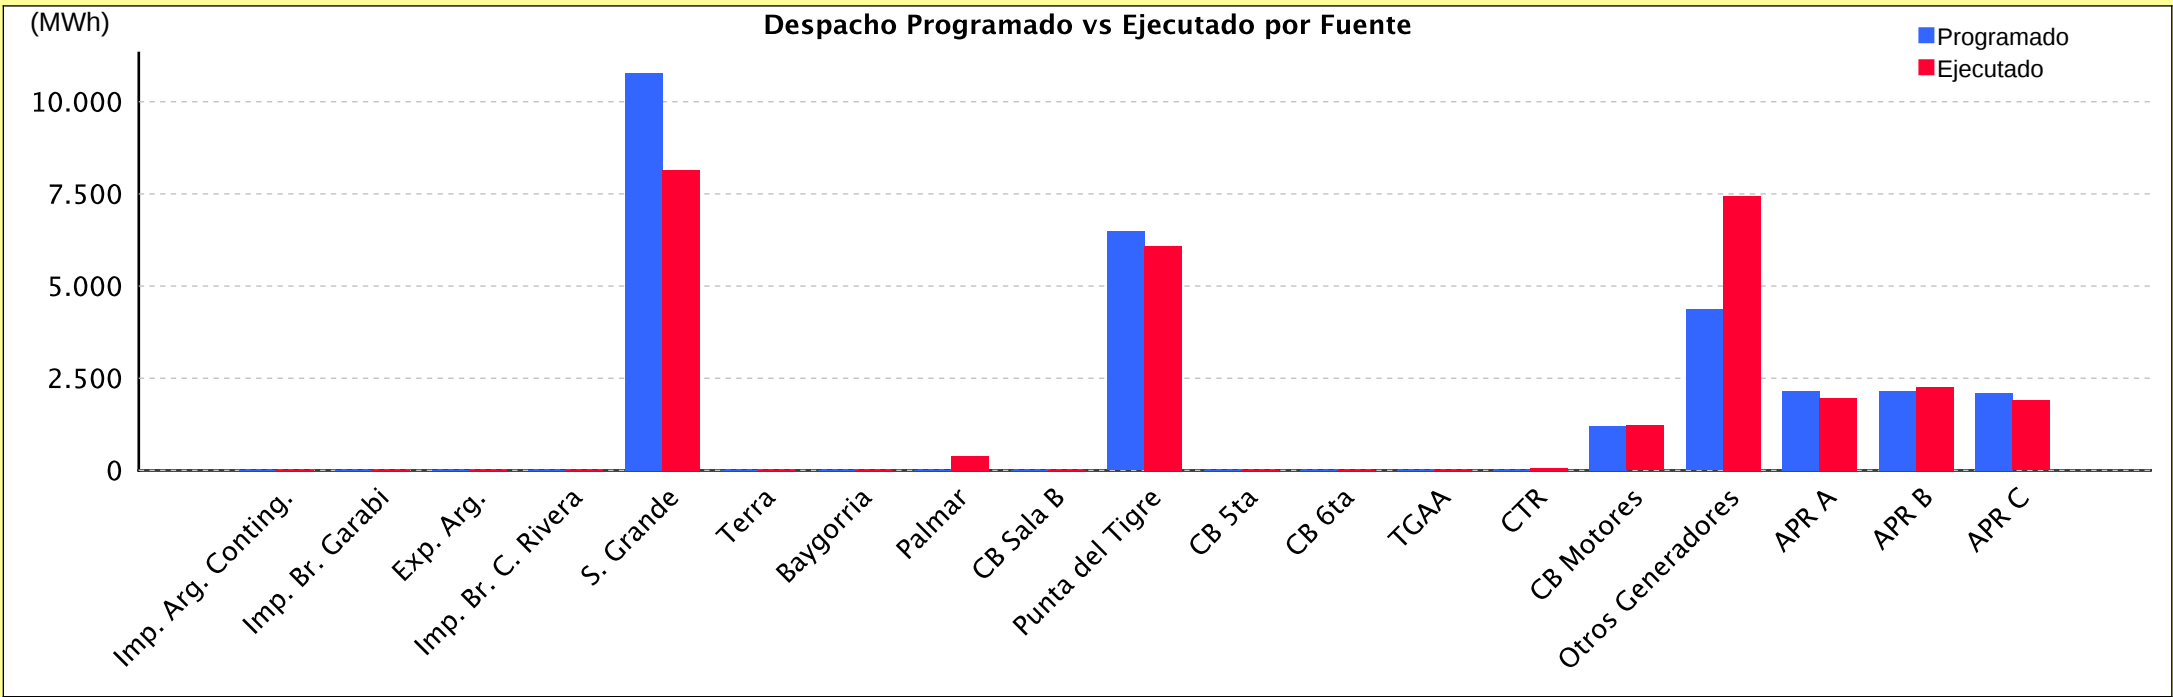



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

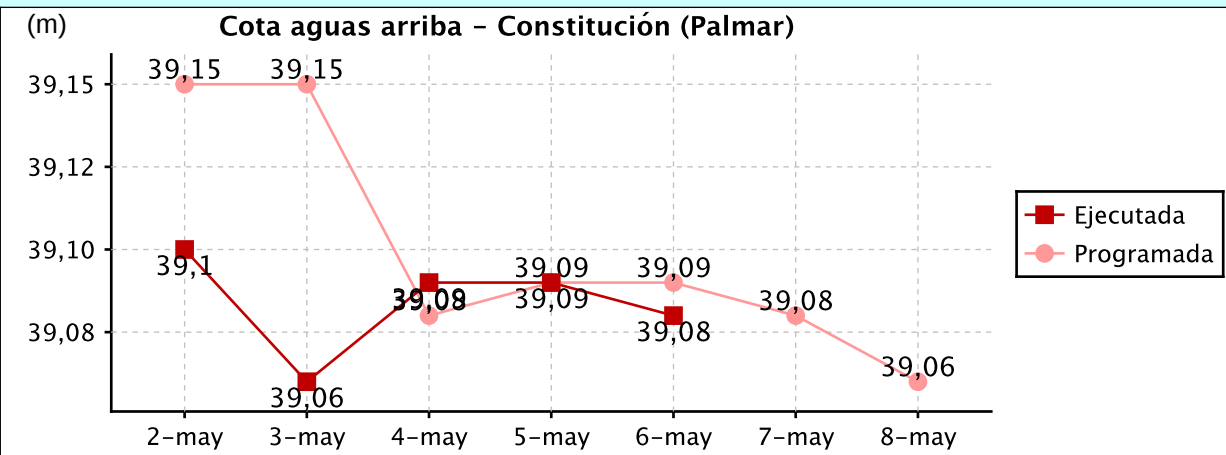
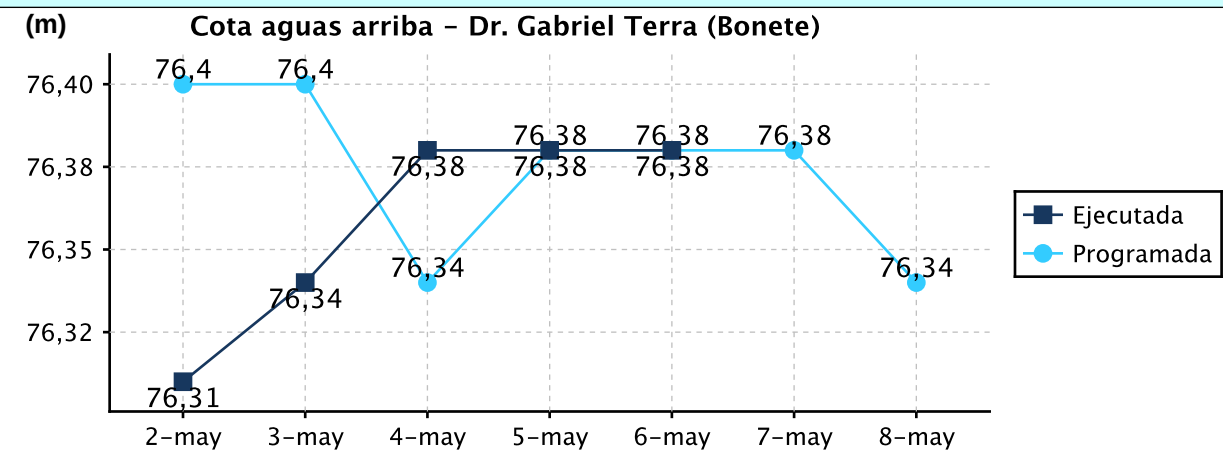


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,38	76,38
Baygorria	53,98	53,97
Palmar	39,09	39,08
SGU	34,48	34,53

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

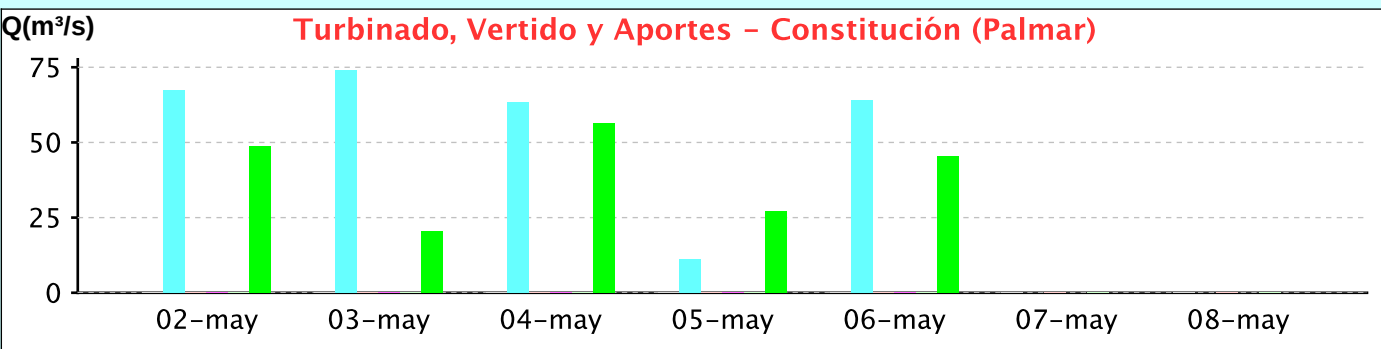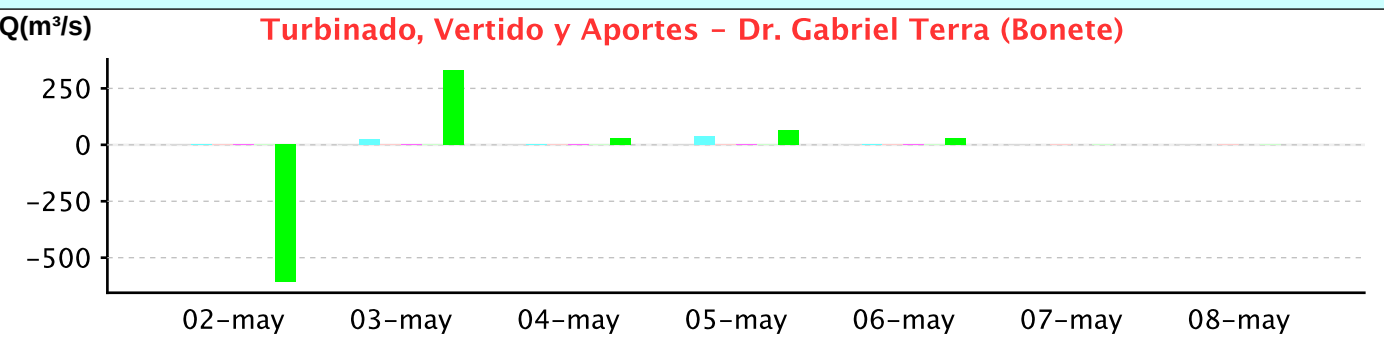

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

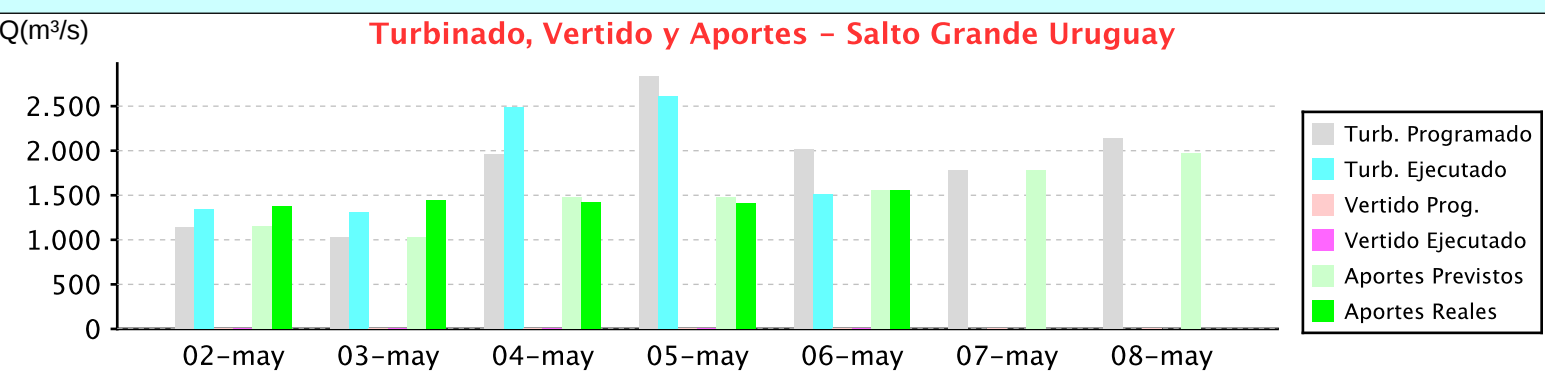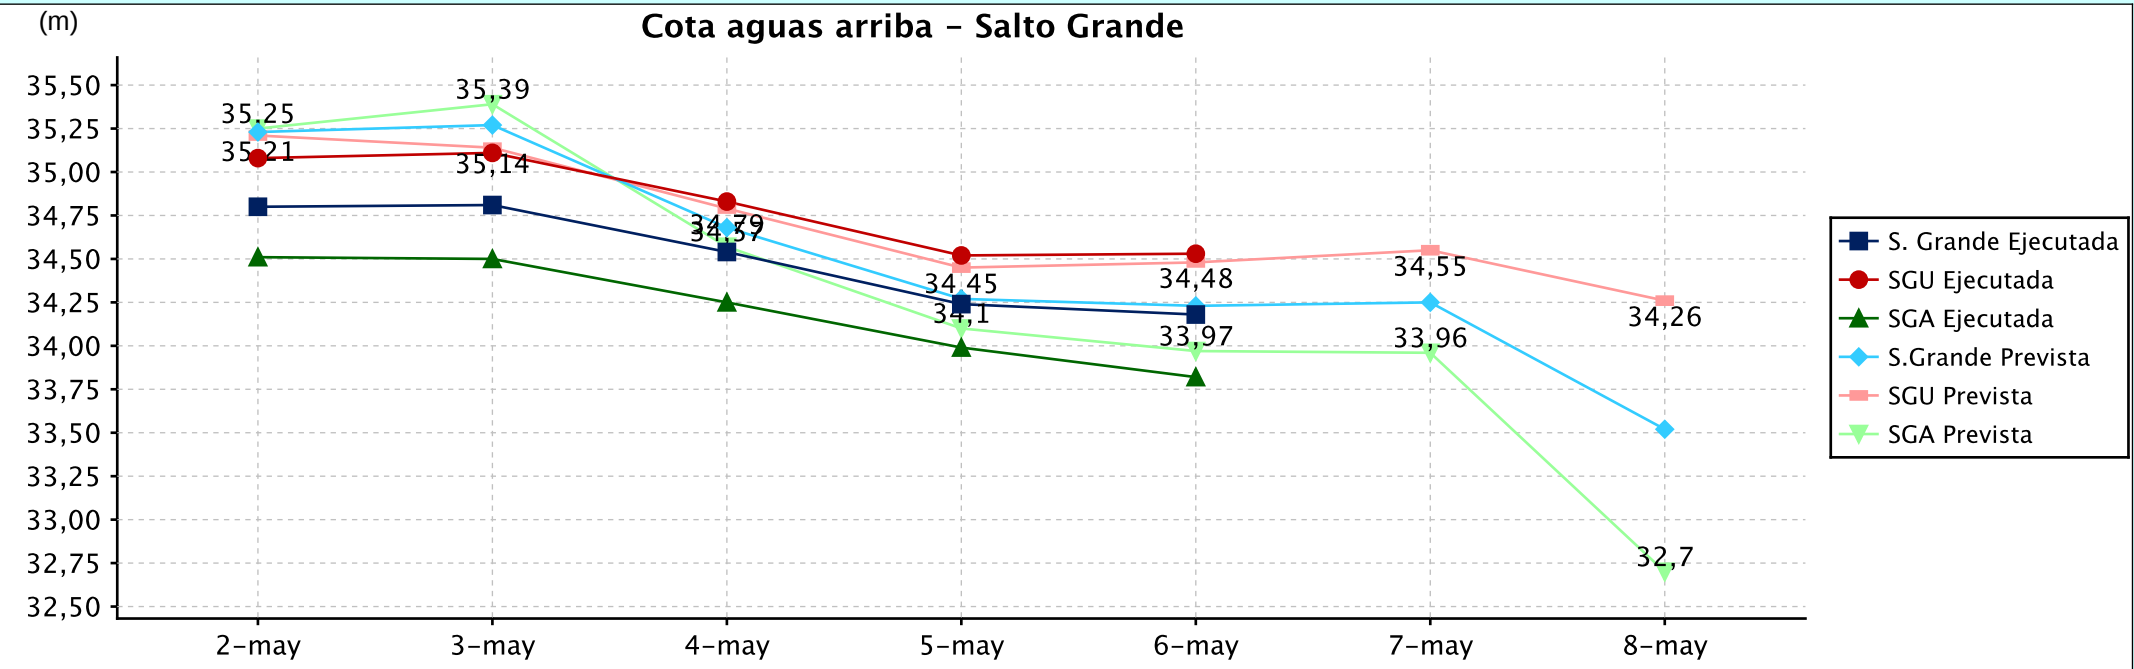

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,53
Cota Vista Arg	33,82
Cota real	34,18
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
15.250	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	64
SGU	2.012	1.511

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	28
Baygorria	0	8
Palmar	0	45
SGU	1.550	1.556

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
