




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 08 de mayo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.226
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.230
Central La Tablada	-88
Central P. del Tigre	6.311
APR A	2.089
APR B	527
APR C	190
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	-0
C. Baygorria	-8
C. Palmar	0
C. Salto Grande	11.284
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.781
TOTAL Generación	29.313

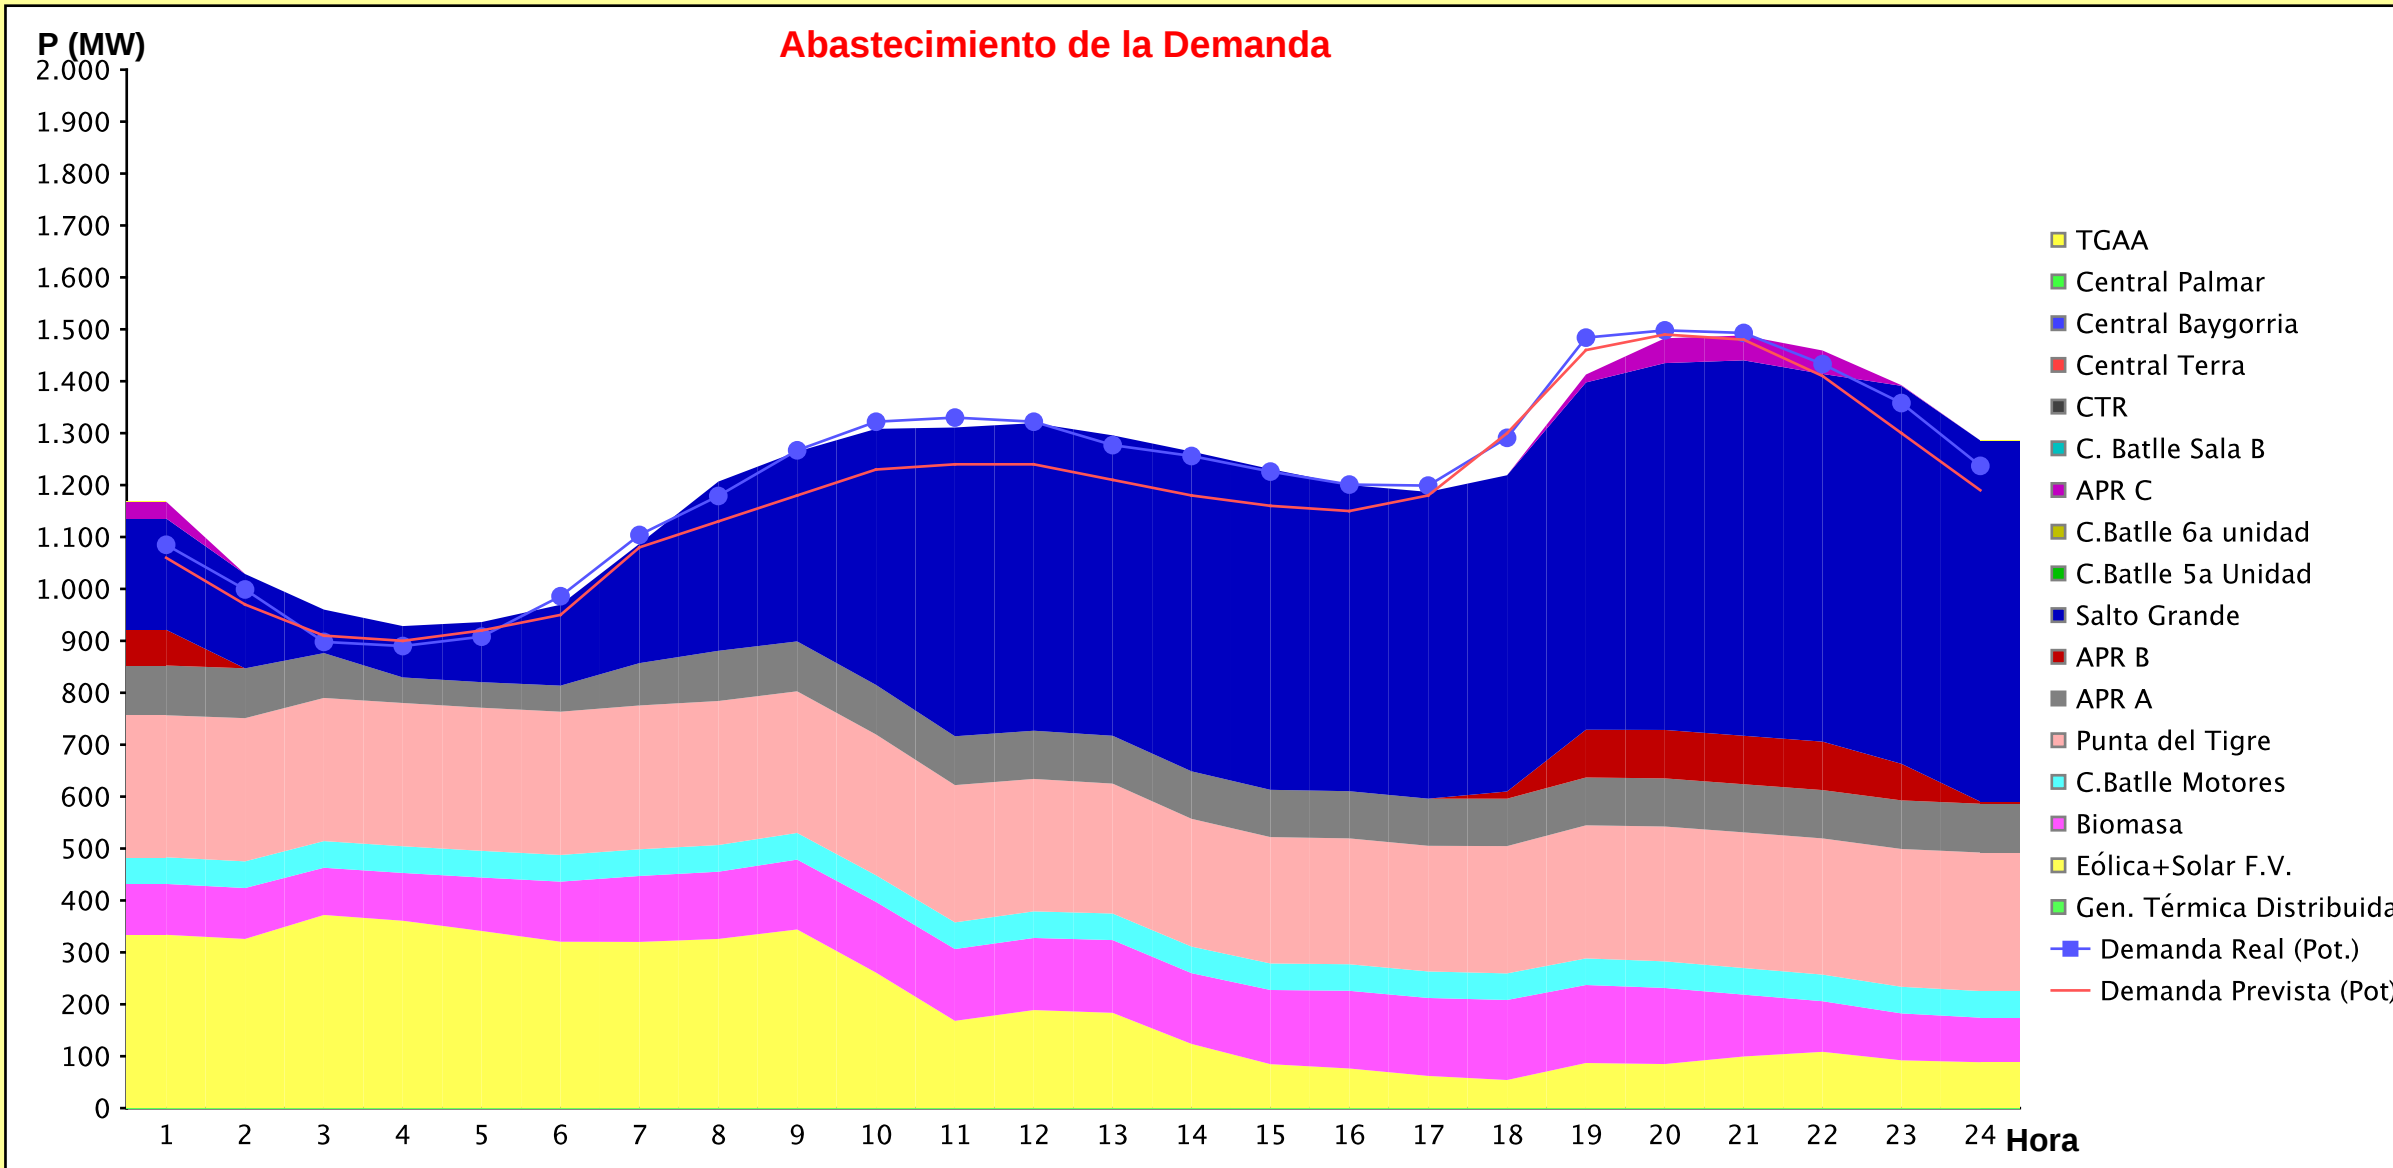

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.313
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.320
Diferencia (MWh)	993
Ejecutada - Programada	3,51 %

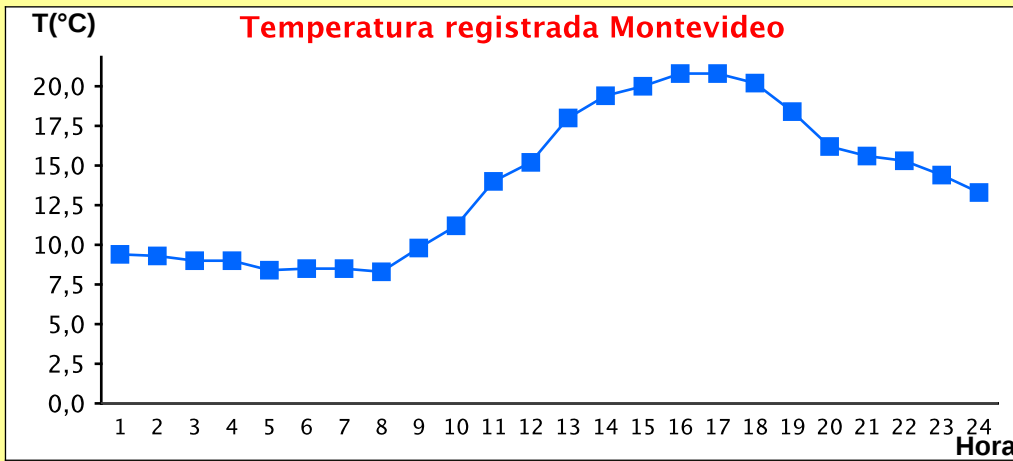



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1355,69 Hora 11:02
Potencia mínima:	918,27 Hora 03:17
Pico noche:	1500,03 Hora 20:21

Generación Media (MW)	
Eólica	201,0
Biomasa	123,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

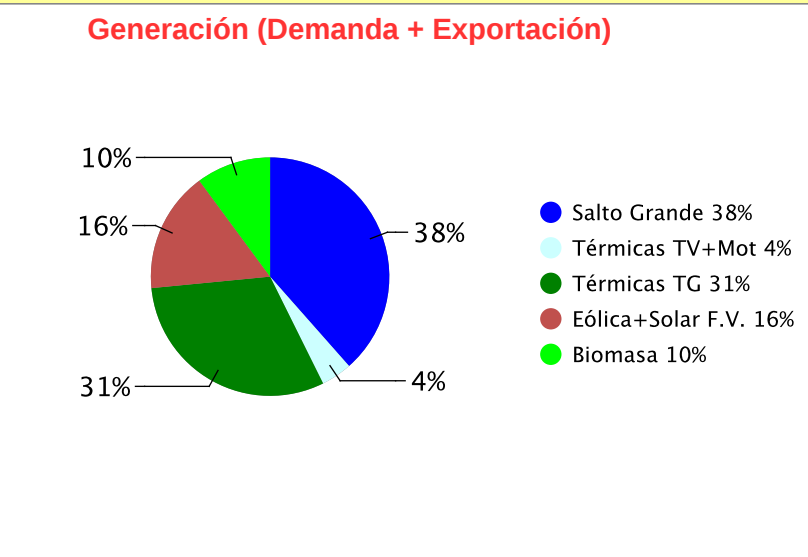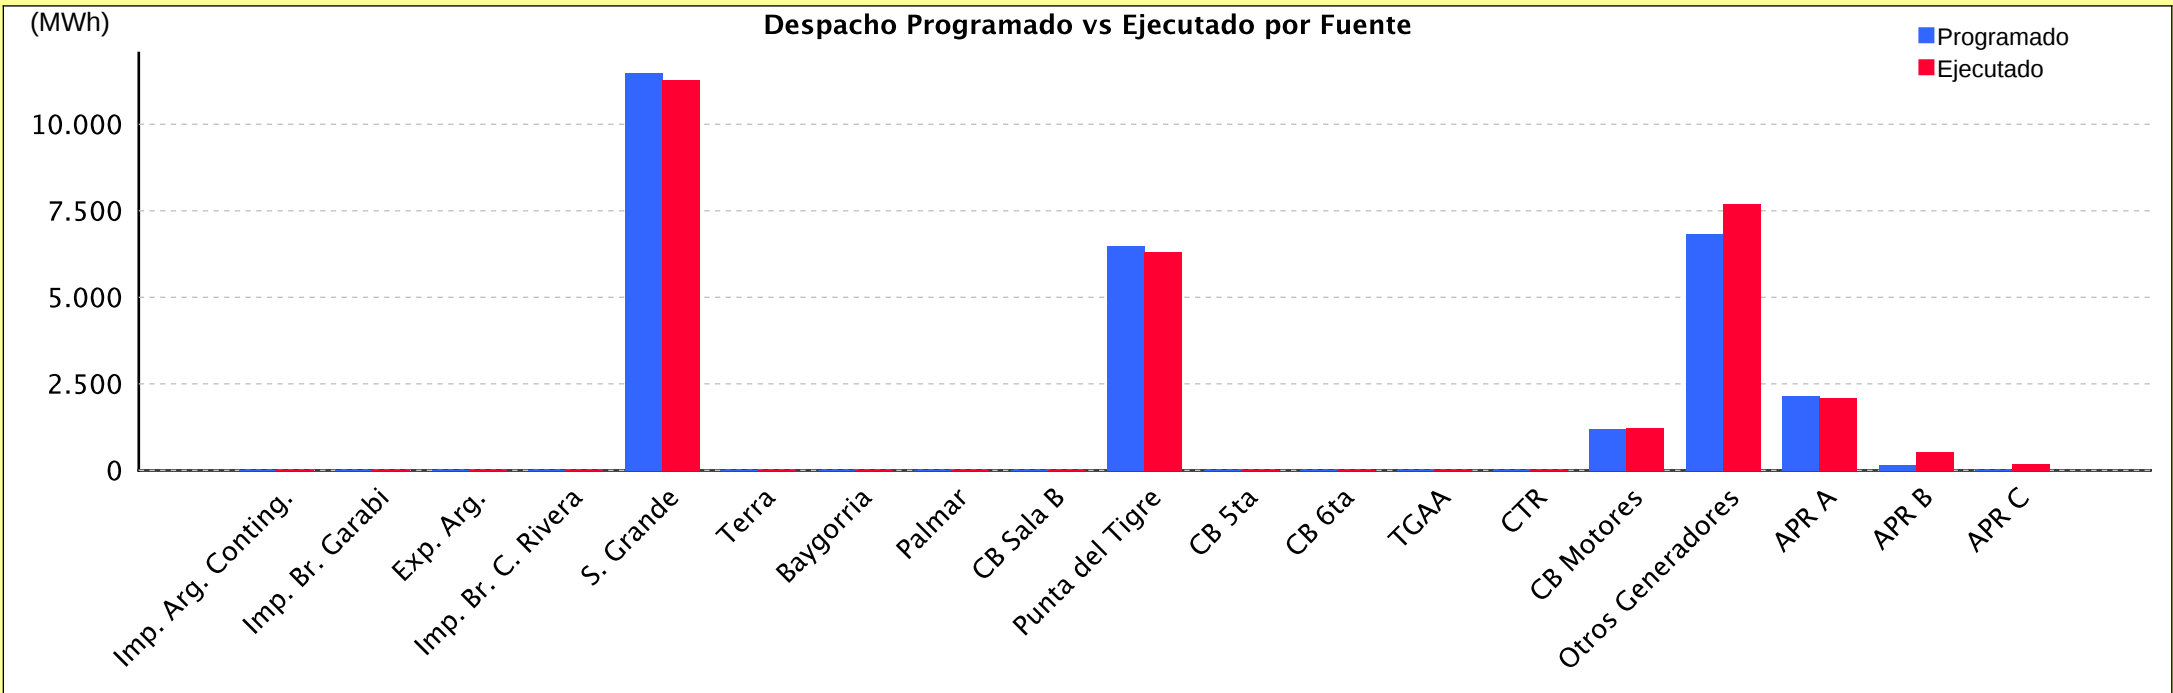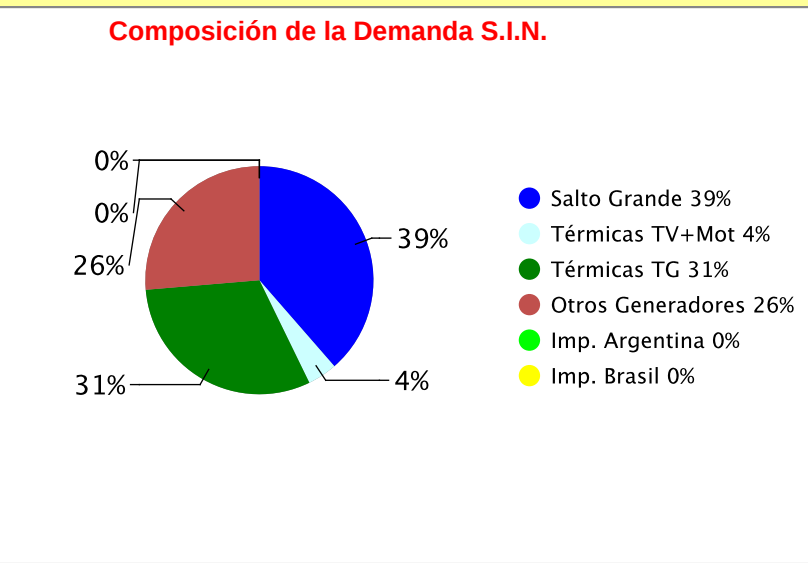



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

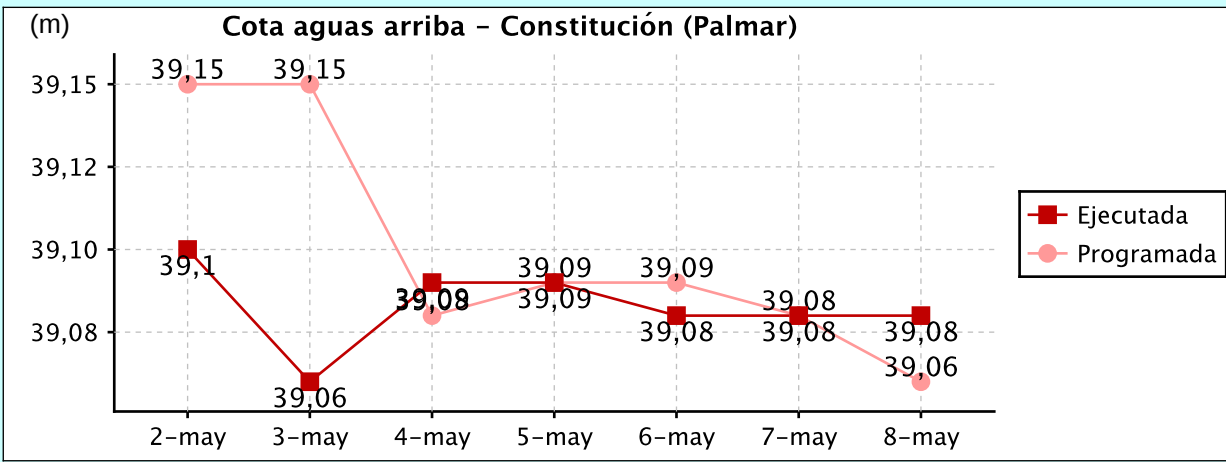
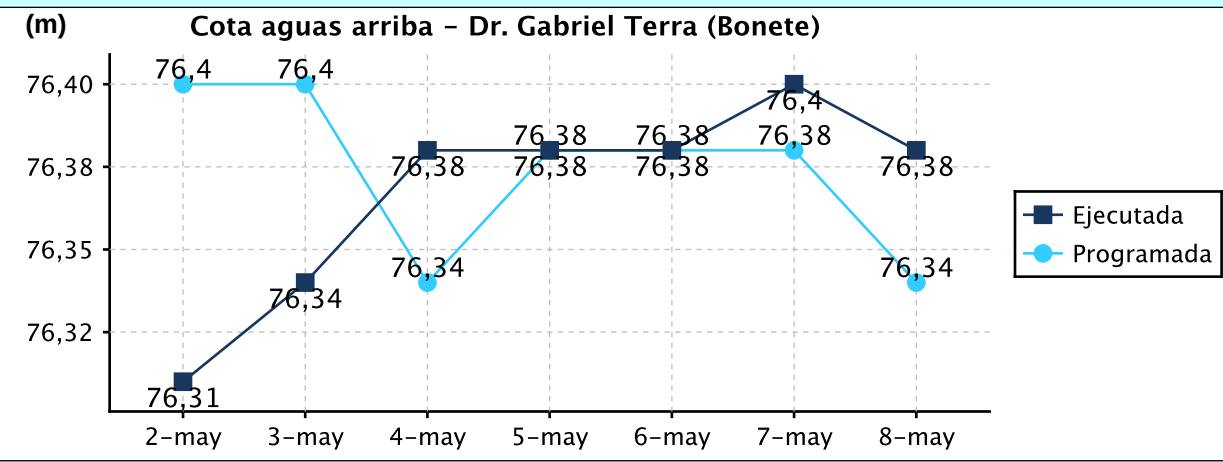


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,34	76,38
Baygorria	53,95	53,96
Palmar	39,06	39,08
SGU	34,26	34,4

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

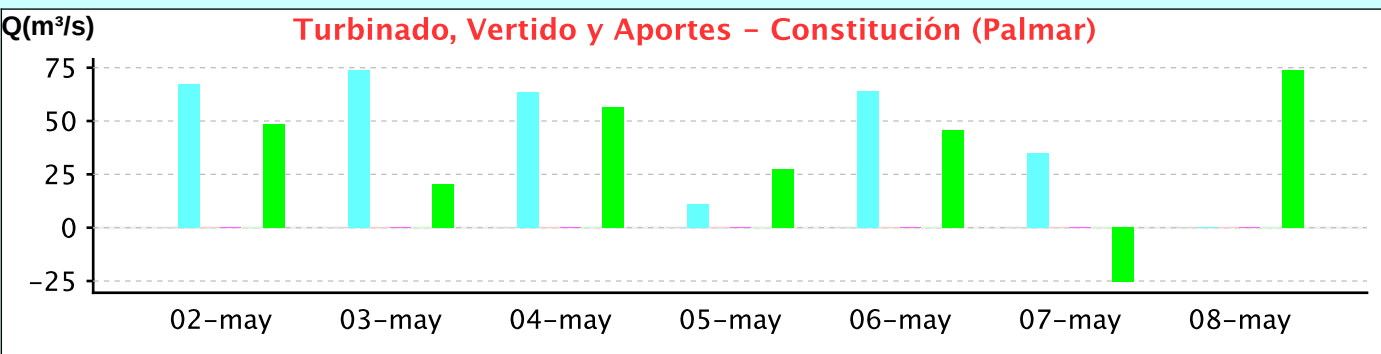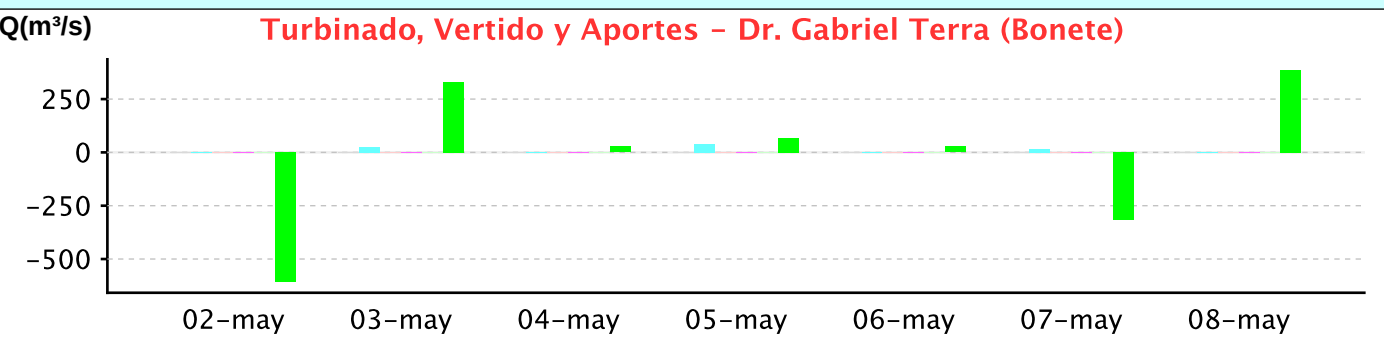

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

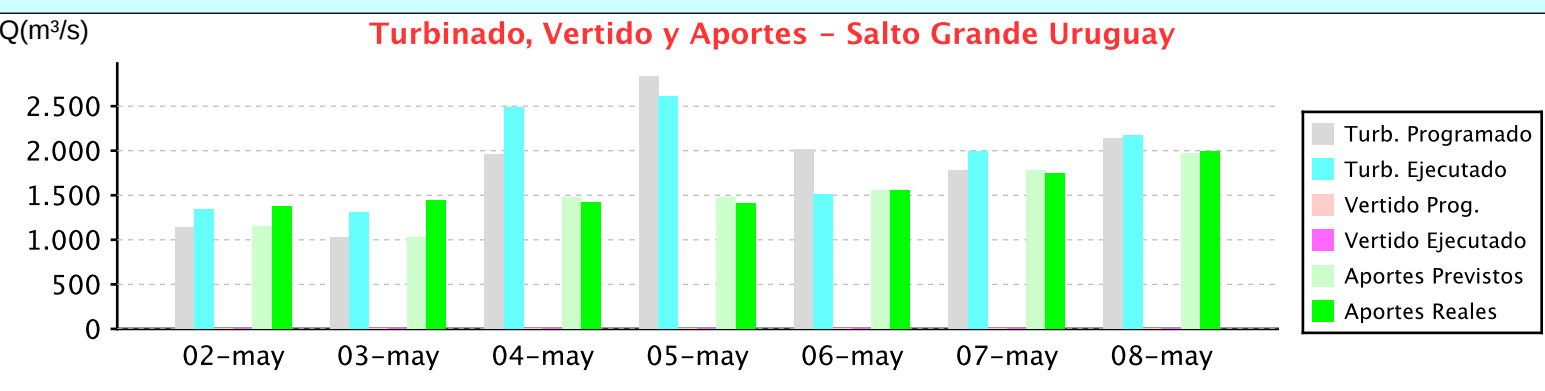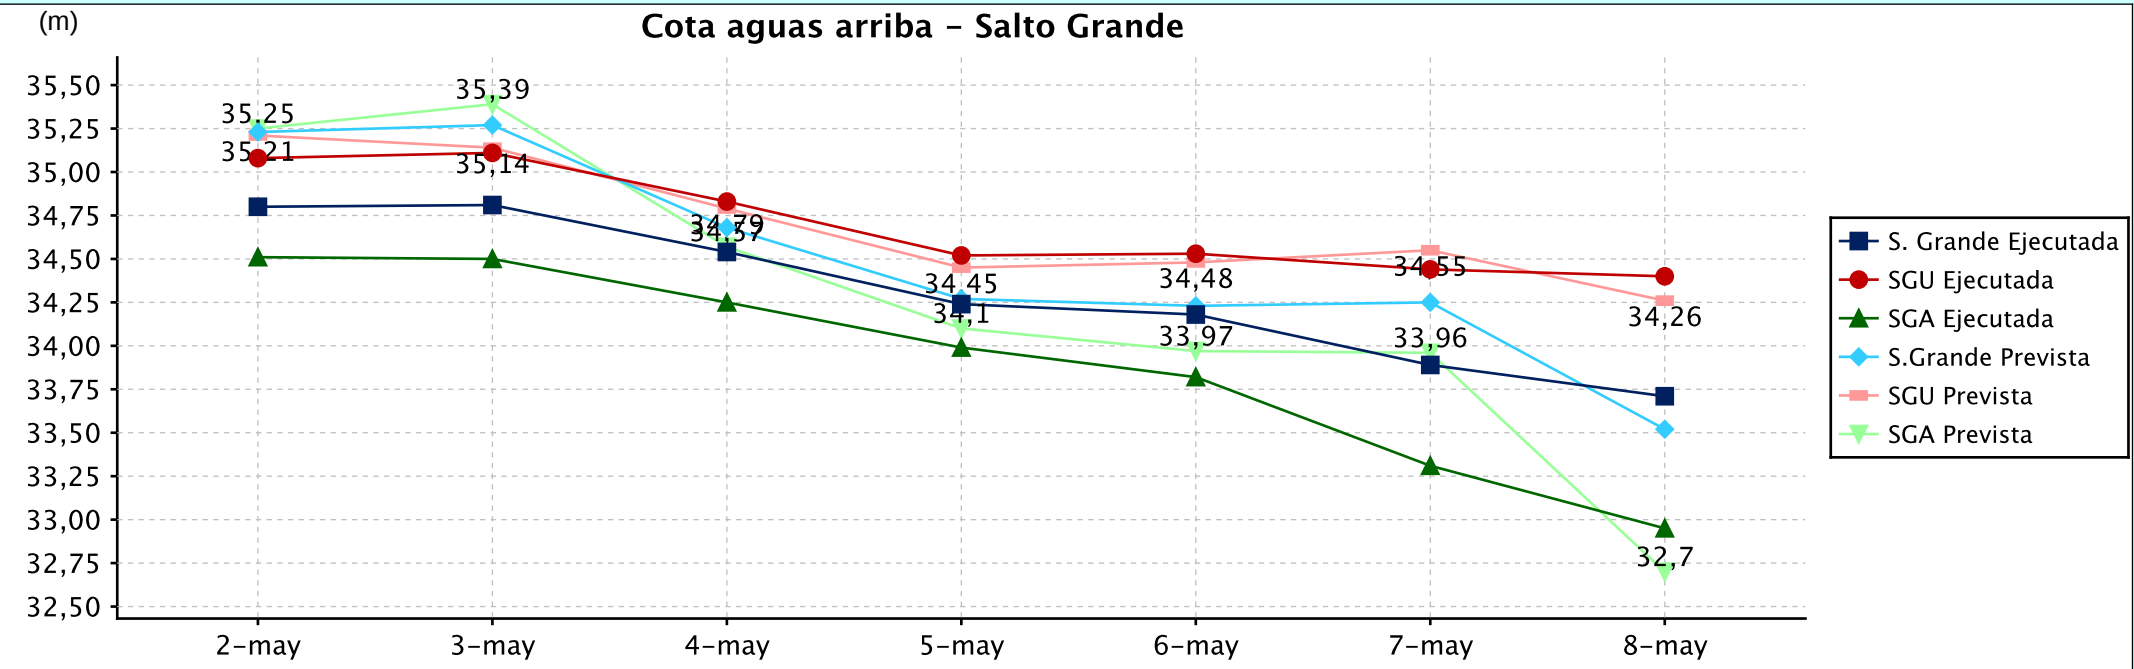

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,40
Cota Vista Arg	32,95
Cota real	33,71
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	28.717

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	2.143	2.170

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	387
Baygorria	0	31
Palmar	0	74
SGU	1.975	1.986

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
