




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO  
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 10 de mayo de 2015


| Generación Térmica    |        |
|-----------------------|--------|
| Central Battle        | 1.176  |
| Sala B                | -4     |
| 5ta.                  | 0      |
| 6ta.                  | 0      |
| Motores               | 1.180  |
| Central La Tablada    | -101   |
| Central P. del Tigre  | 6.263  |
| APR A                 | 2.220  |
| APR B                 | -3     |
| APR C                 | 0      |
| Central Maldonado     | 0      |
| Generación Hidráulica |        |
| C.G.Terra             | -0     |
| C. Baygorria          | -7     |
| C. Palmar             | 391    |
| C. Salto Grande       | 9.469  |
| Importación (MWh)     |        |
| Argentina             | 0      |
| Contingente           | 0      |
| Brasil                | 0      |
| Rivera                | 0      |
| SADI                  | 0      |
| Otros Generadores     |        |
| Otros Generadores     | 5.232  |
| TOTAL Generación      | 24.641 |

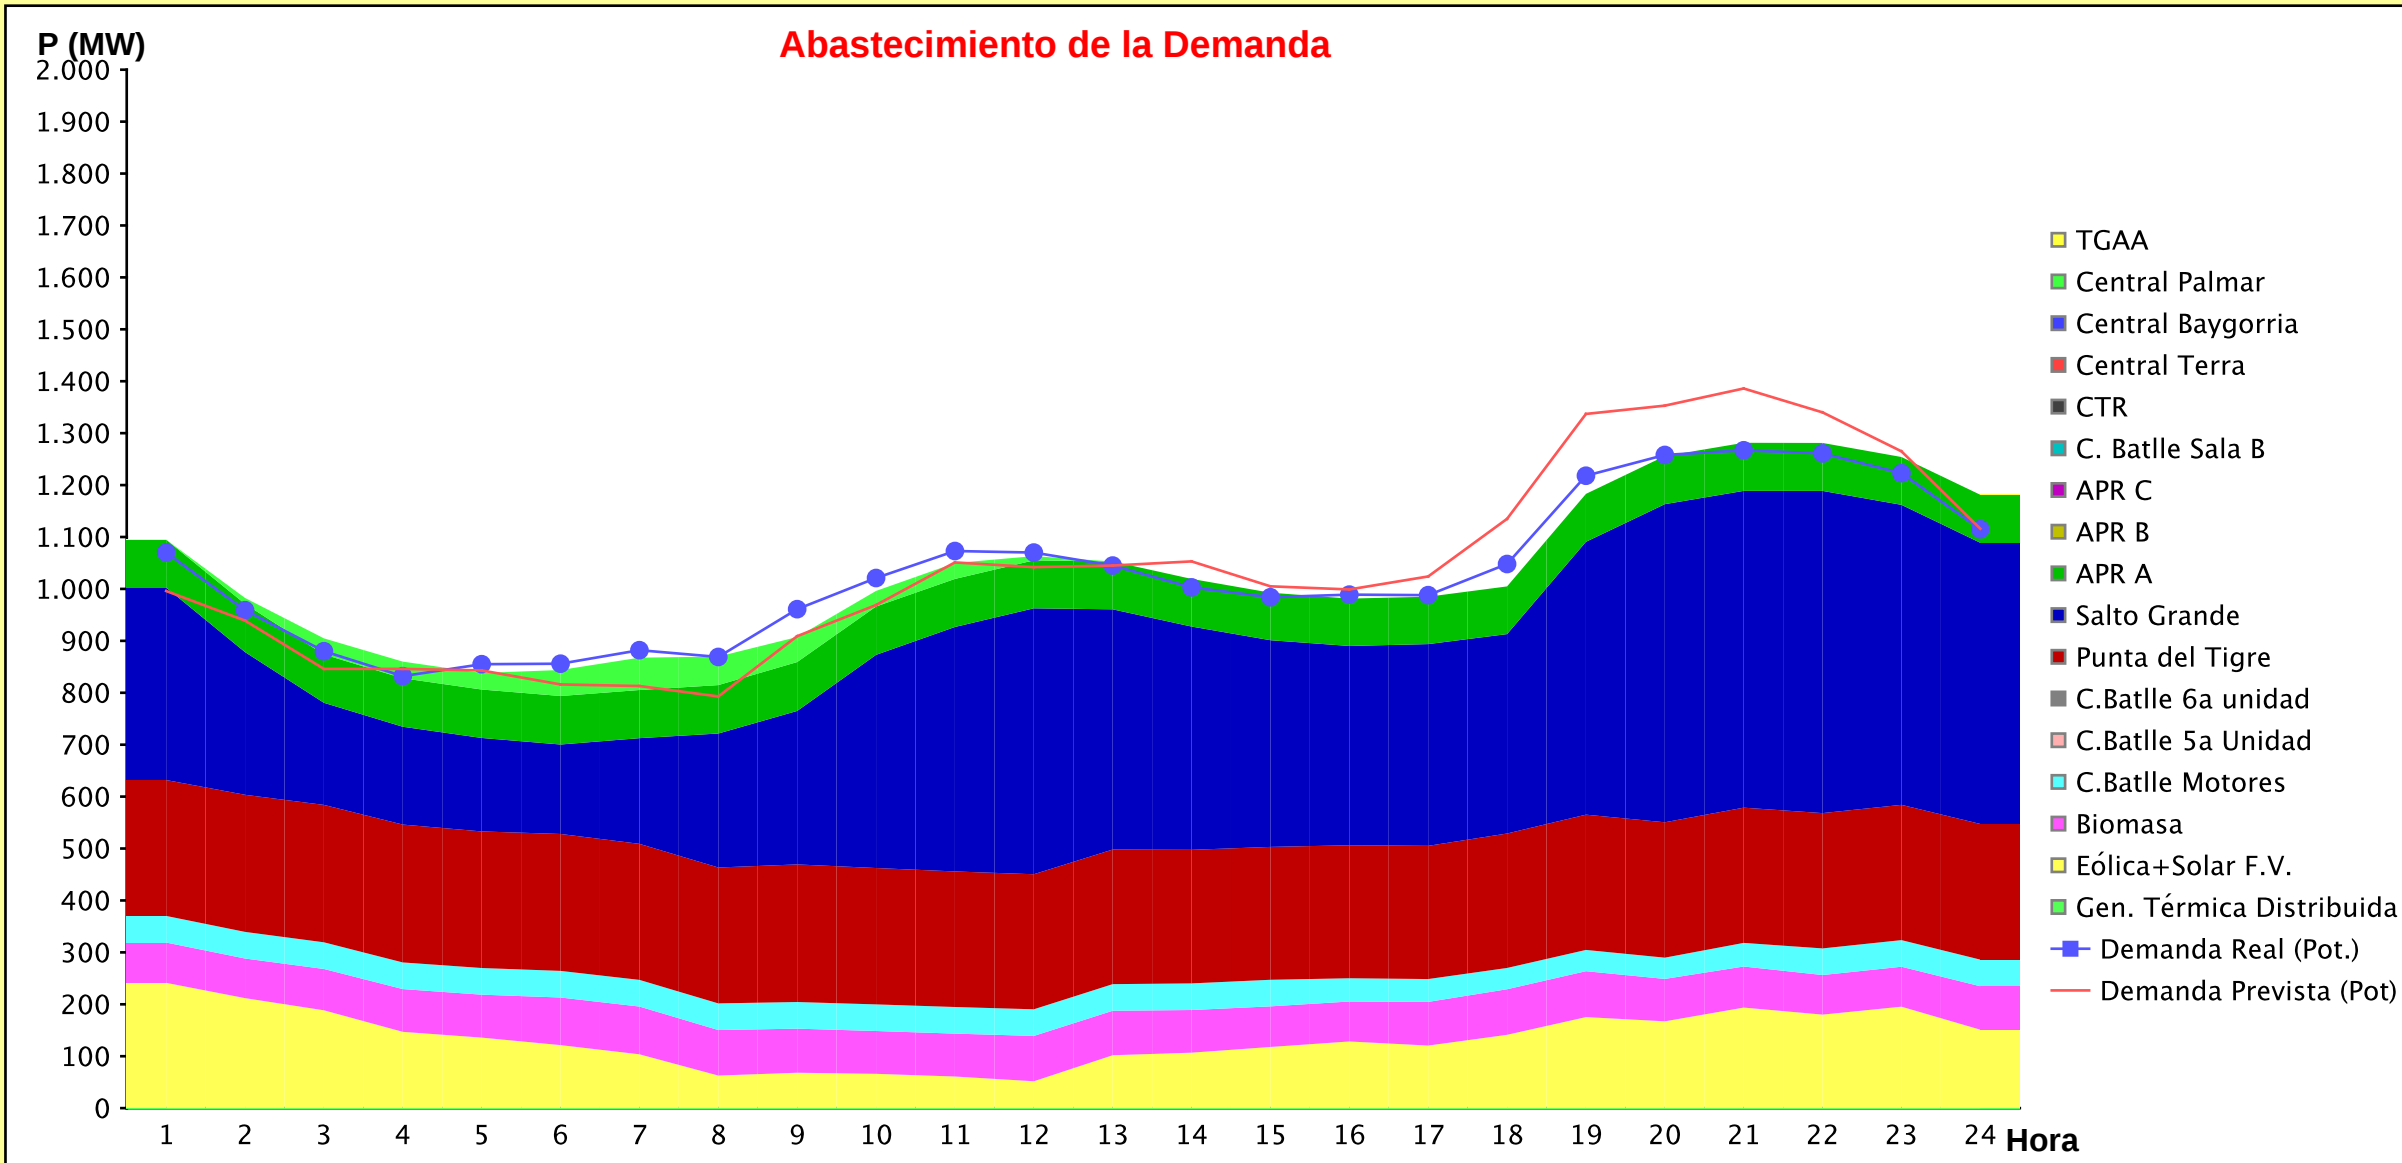

| Exportación (MWh)       |   |
|-------------------------|---|
| Exportación a Arg.      | 0 |
| Hidráulica              | 0 |
| Térmica                 | 0 |
| Exportación a Brasil    | 0 |
| TOTAL Exportación (MWh) | 0 |




|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)                              | 24.641 |
| (en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) |        |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Demanda Programada (MWh) | 24.921  |
| Diferencia (MWh)         | -280    |
| Ejecutada - Programada   | -1,12 % |

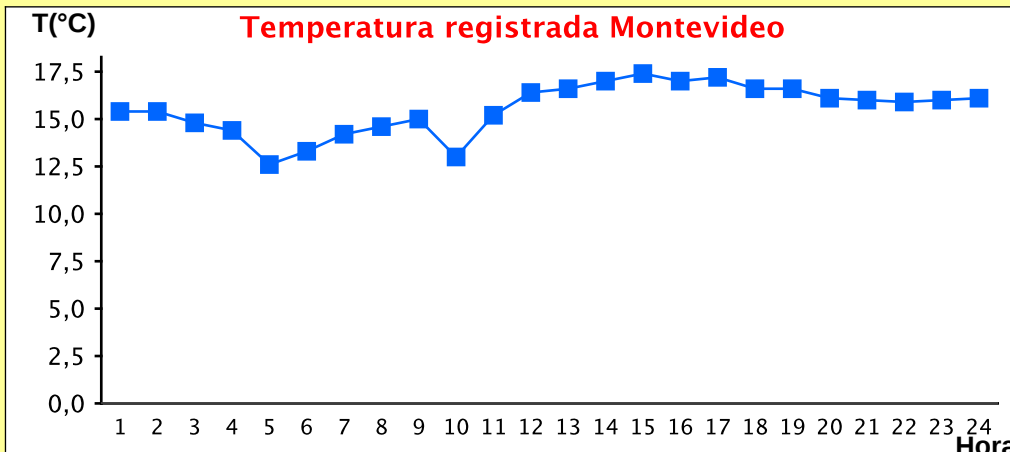



| Picos de Potencia (MW) |                    |
|------------------------|--------------------|
| Pico mediodía:         | 1079,32 Hora 11:16 |
| Potencia mínima:       | 814,03 Hora 03:52  |
| Pico noche:            | 1292,05 Hora 22:10 |

| Generación Media (MW)  |       |
|------------------------|-------|
| Eólica                 | 135,2 |
| Biomasa                | 82,9  |
| Solar fotovoltaica     | 0,1   |
| Térmica distribuida    | 0,0   |
| Imp. Brasil Conversora | 0,0   |
| Imp. Argentina         | 0,0   |

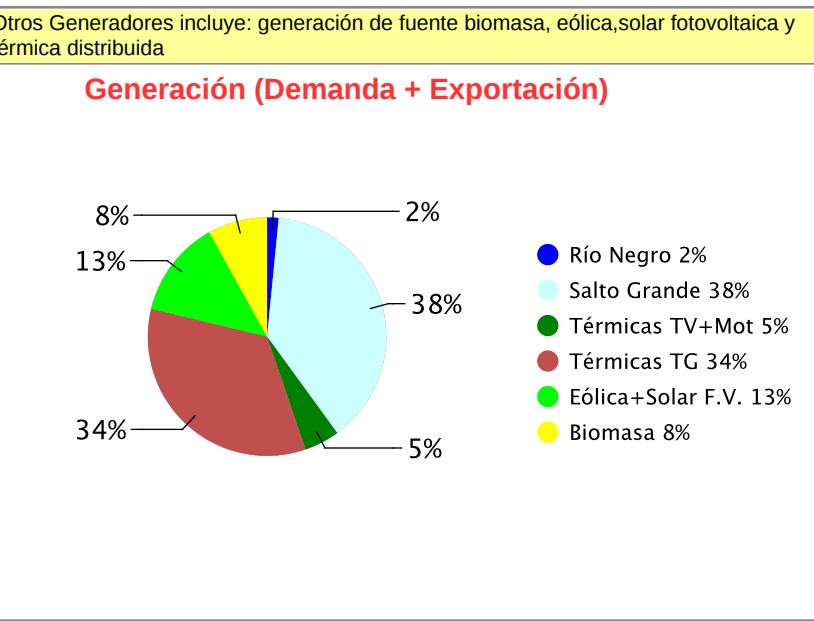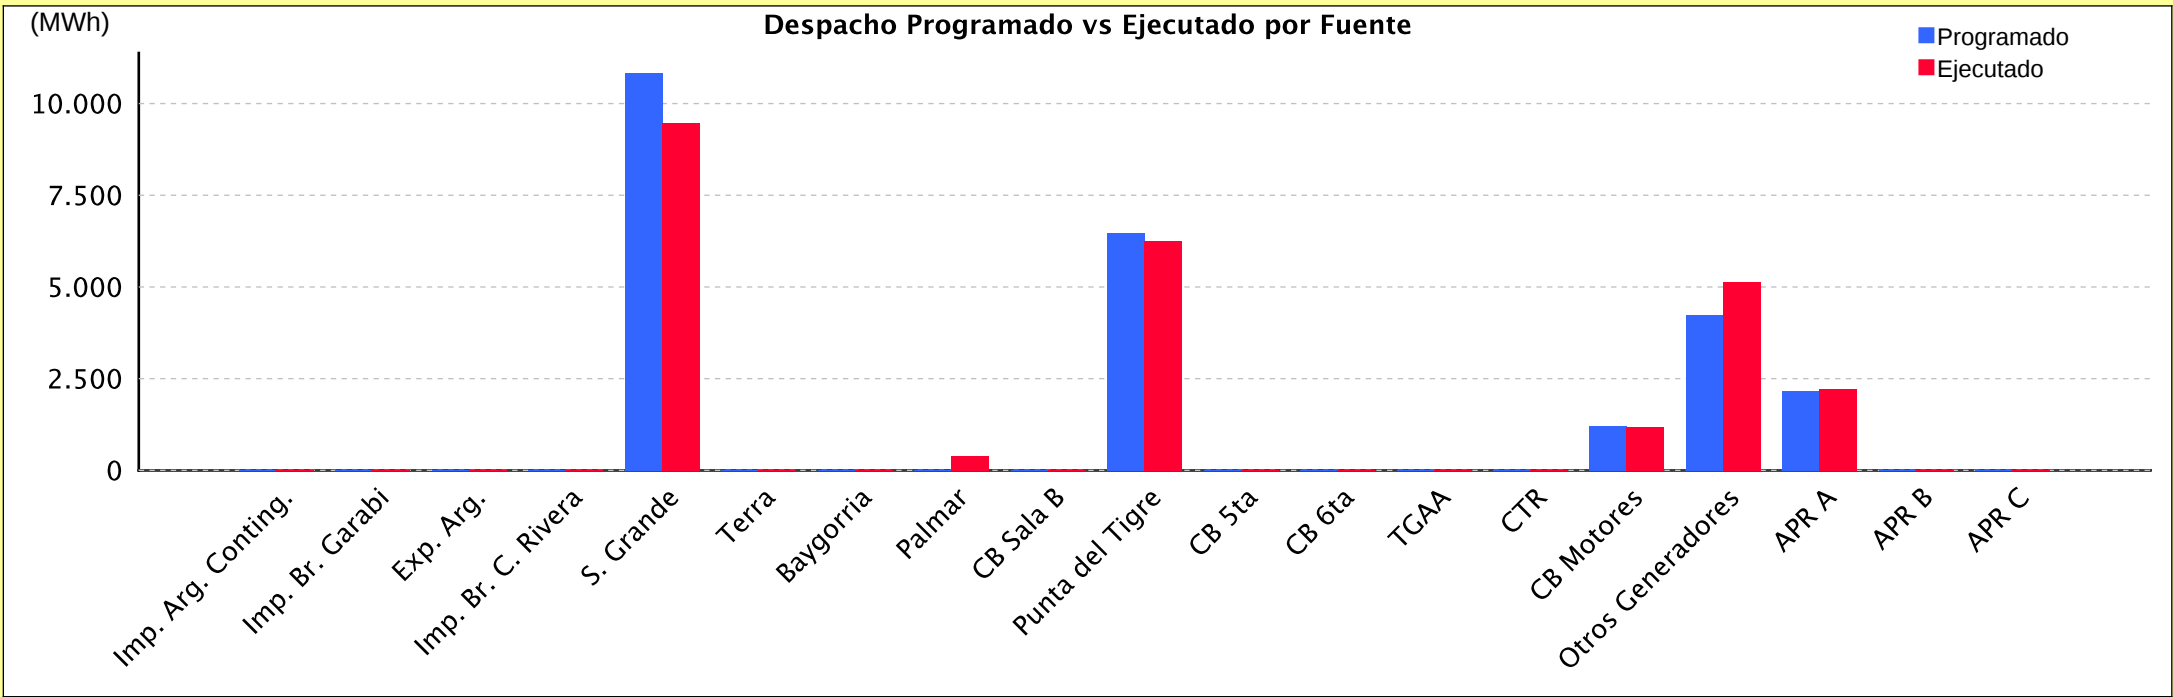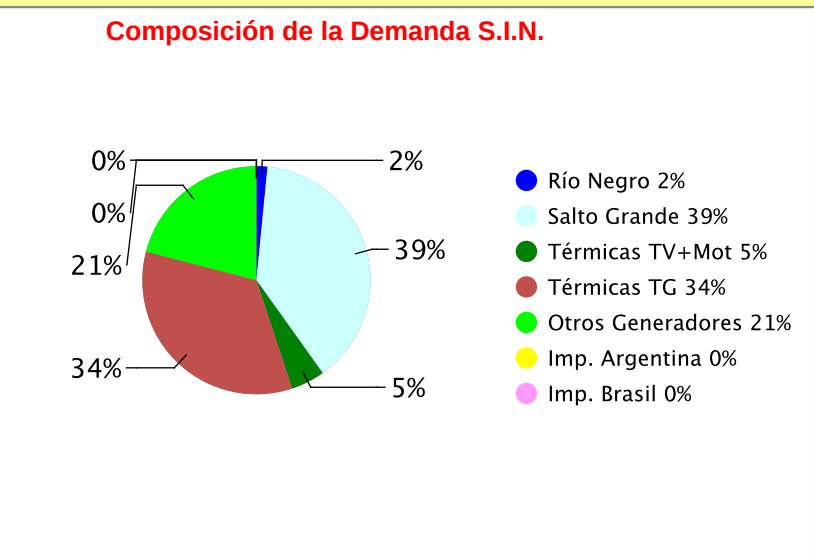



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

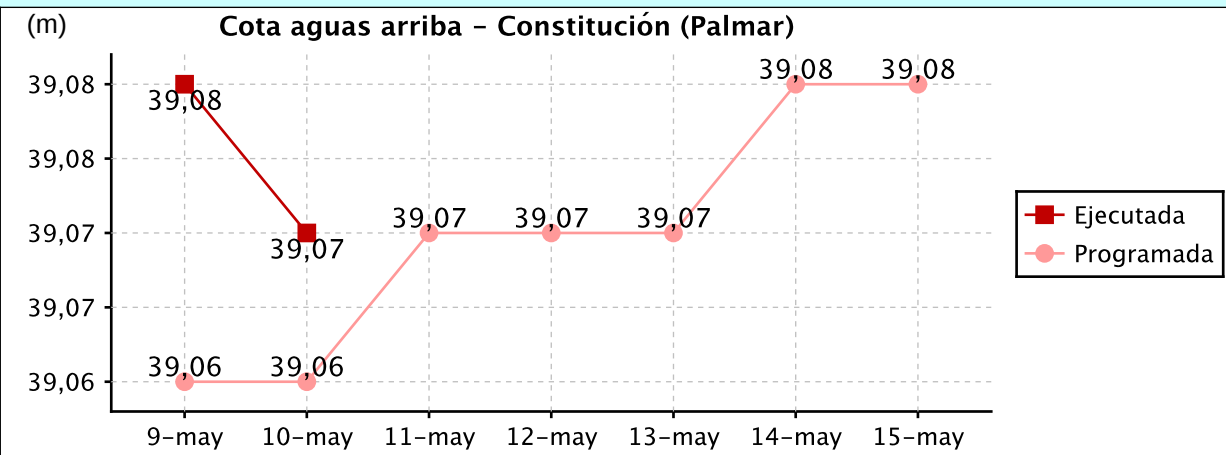
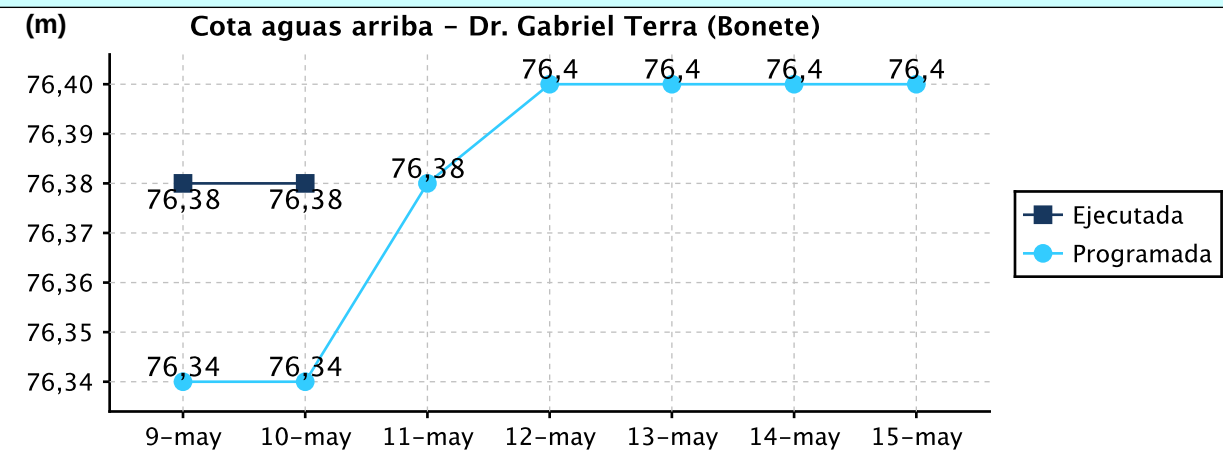


| COTA FINAL | Prevista | Ejecutada |
|------------|----------|-----------|
| Represa    | (m)      | (m)       |
| Terra      | 76,34    | 76,38     |
| Baygorria  | 53,96    | 53,95     |
| Palmar     | 39,06    | 39,07     |
| SGU        | 34,22    | 34,45     |

| Valores de Referencia (operación normal) |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Represa                                  | Cota Min m | Cota Max m |
| Terra                                    | 70         | 80,7       |
| Baygorria                                | 53         | 54,5       |
| Palmar                                   | 36         | 40         |
| Salto Grande                             | 30         | 35         |

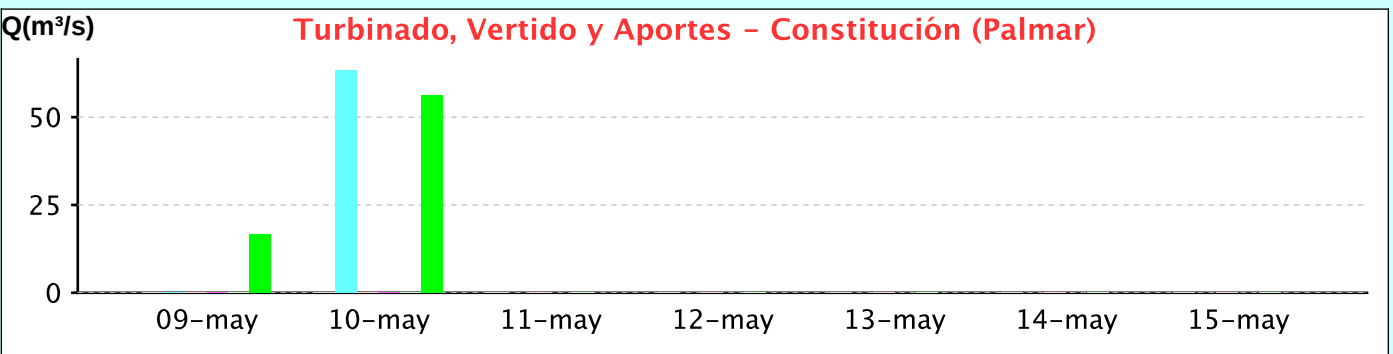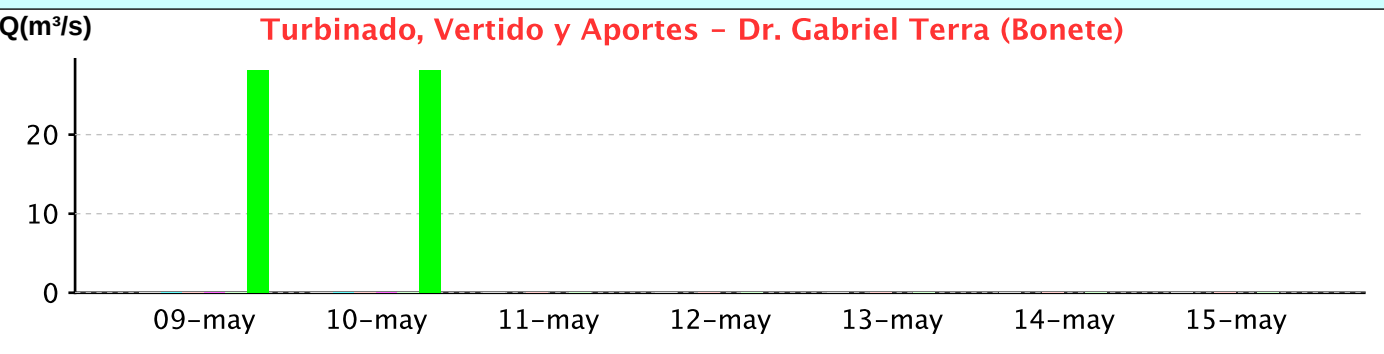

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

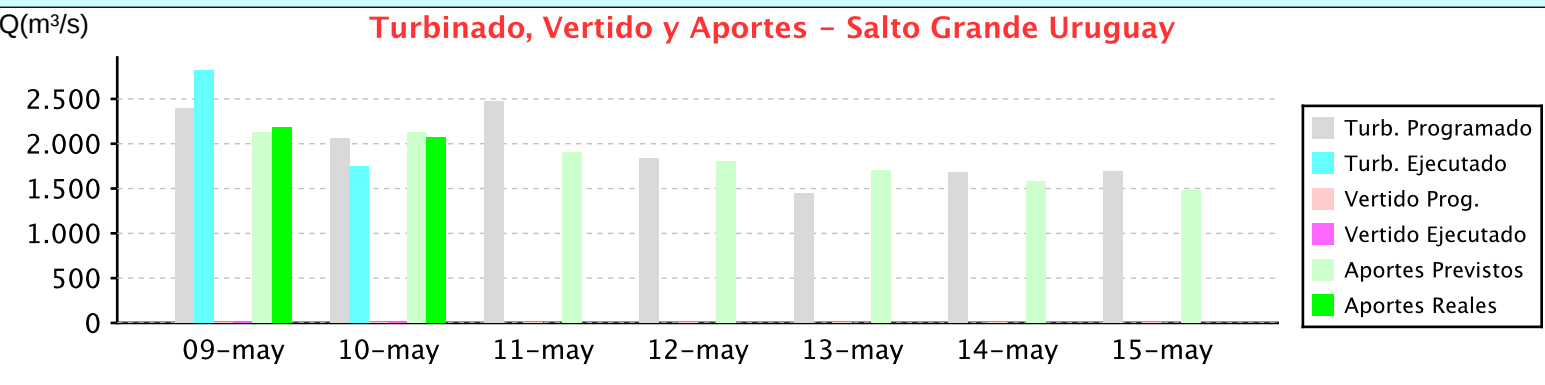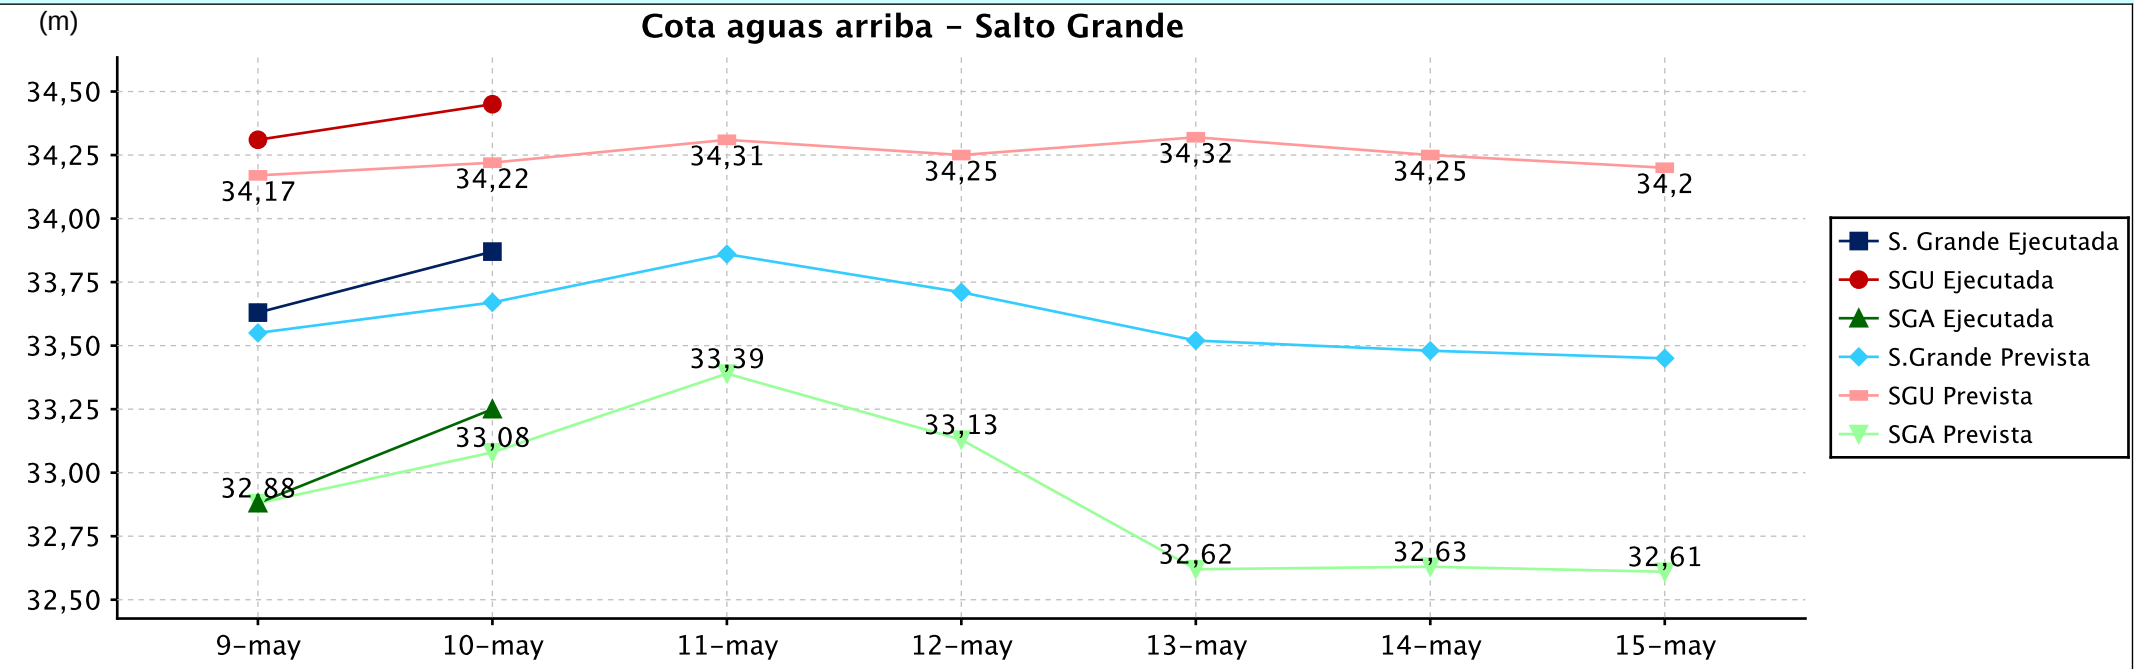

| VALORES CTM    |       |
|----------------|-------|
| Cotas          | (m)   |
| Cota Vista Uru | 34,45 |
| Cota Vista Arg | 33,25 |
| Cota real      | 33,87 |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Dif. Energ. (U-A)<br>Acumulado MWh | 24.350 |
|------------------------------------|--------|

| TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 0        | 0         |
| Baygorria | 0        | 0         |
| Palmar    | 0        | 63        |
| SGU       | 2.060    | 1.746     |

| APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
|-----------------|-----------|--------|
| Represa         | (m³/s)    | (m³/s) |
| Terra           | 0         | 28     |
| Baygorria       | 0         | 8      |
| Palmar          | 0         | 56     |
| SGU             | 2.125     | 2.068  |

| VERTIDO   | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 0        | 0         |
| Baygorria | 0        | 0         |
| Palmar    | 0        | 0         |
| SGU       | 0        | 0         |

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
