




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 11 de mayo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.225
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.230
Central La Tablada	-81
Central P. del Tigre	6.261
APR A	2.216
APR B	192
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	-1
C. Baygorria	-7
C. Palmar	0
C. Salto Grande	13.021
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.721
TOTAL Generación	28.547

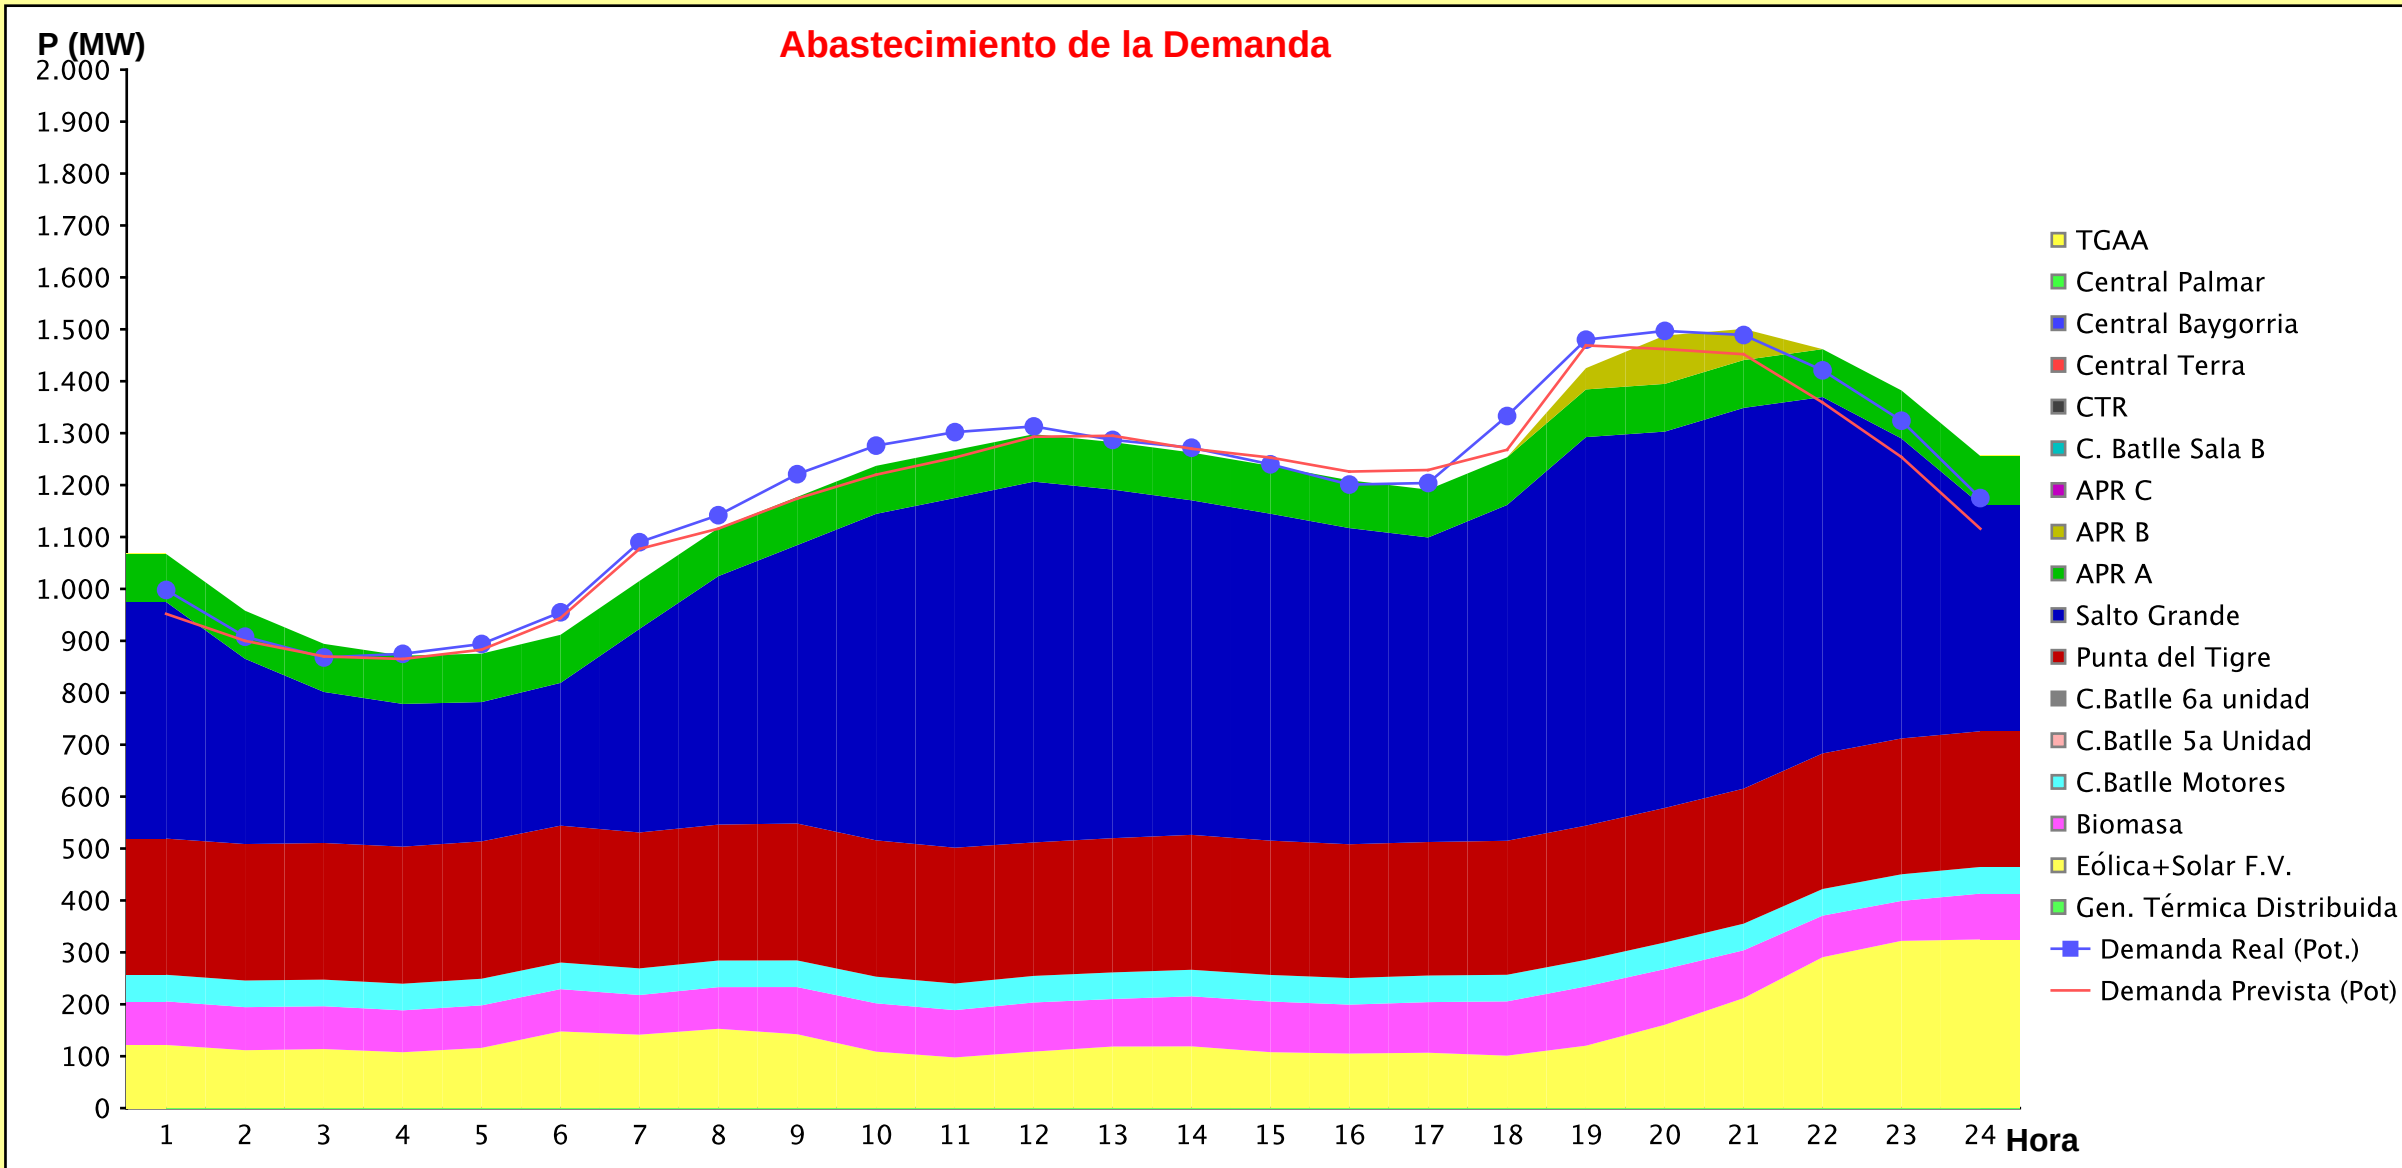

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.547
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.200
Diferencia (MWh)	347
Ejecutada - Programada	1,23 %

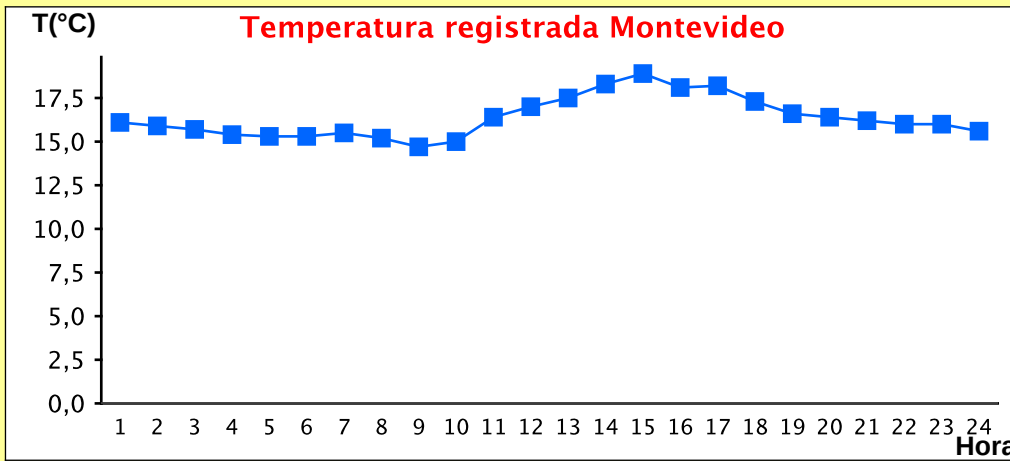


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1321,06 Hora 11:54
Potencia mínima:	851,32 Hora 04:03
Pico noche:	1515,94 Hora 20:54

Generación Media (MW)	
Eólica	148,9
Biomasa	90,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

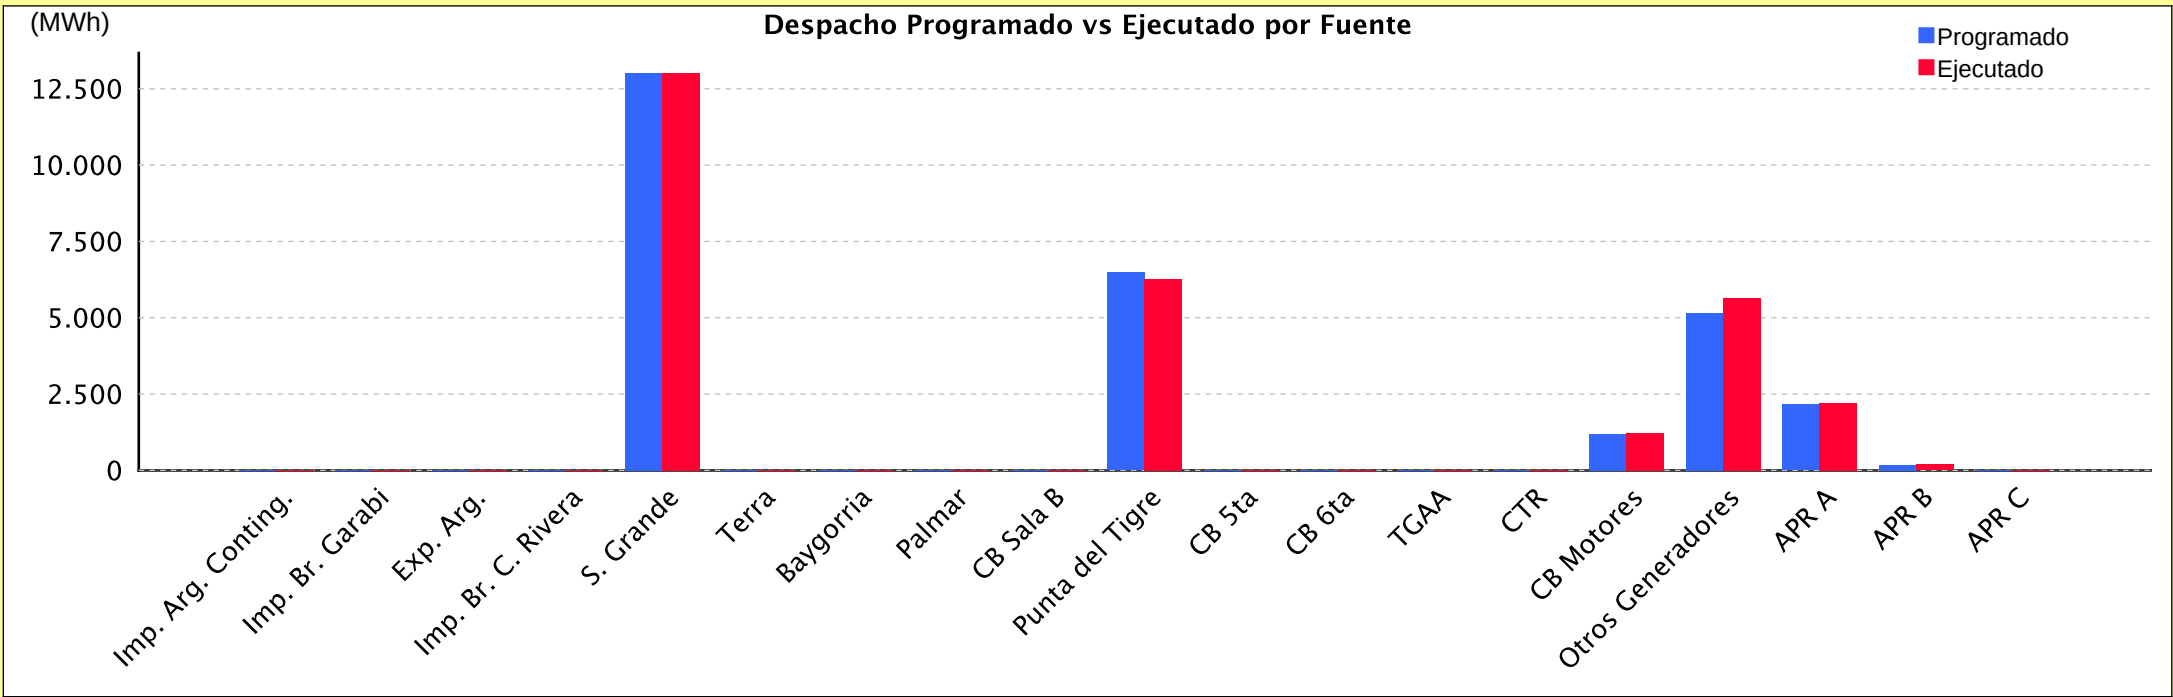
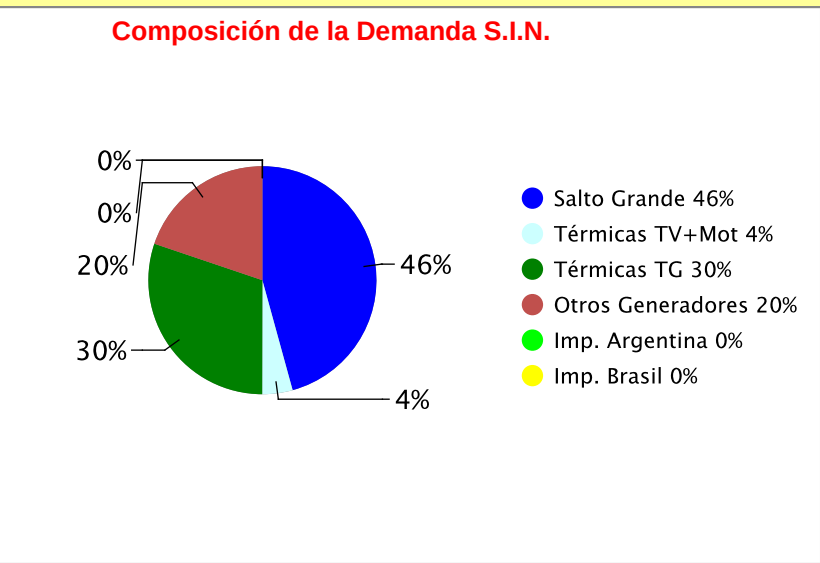


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

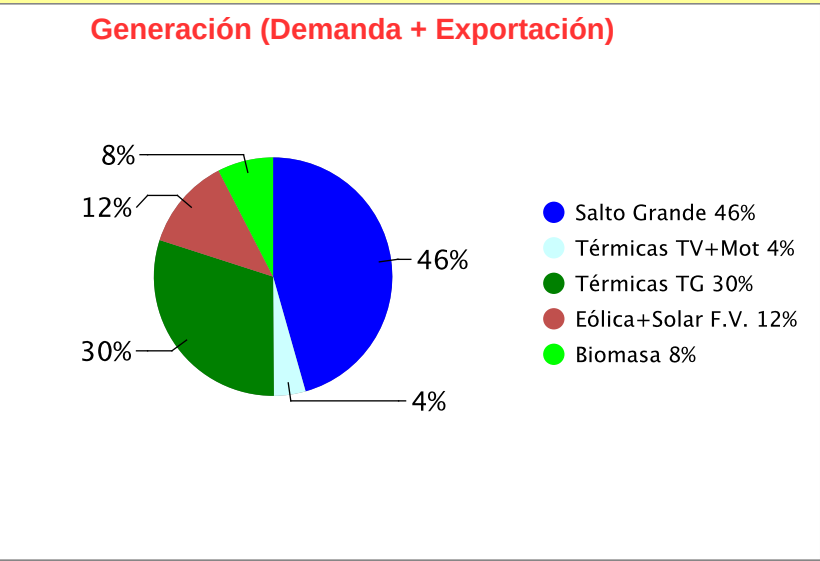



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

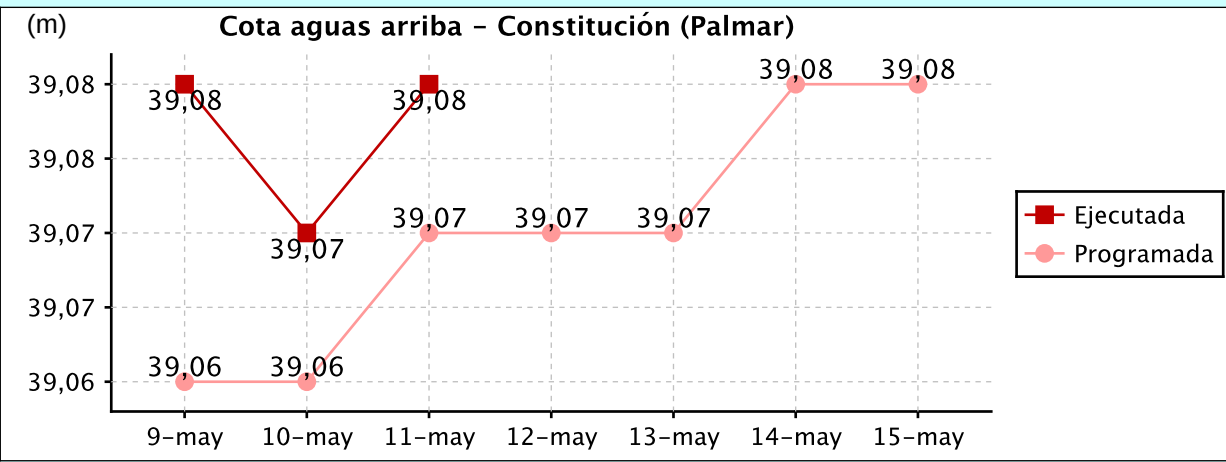
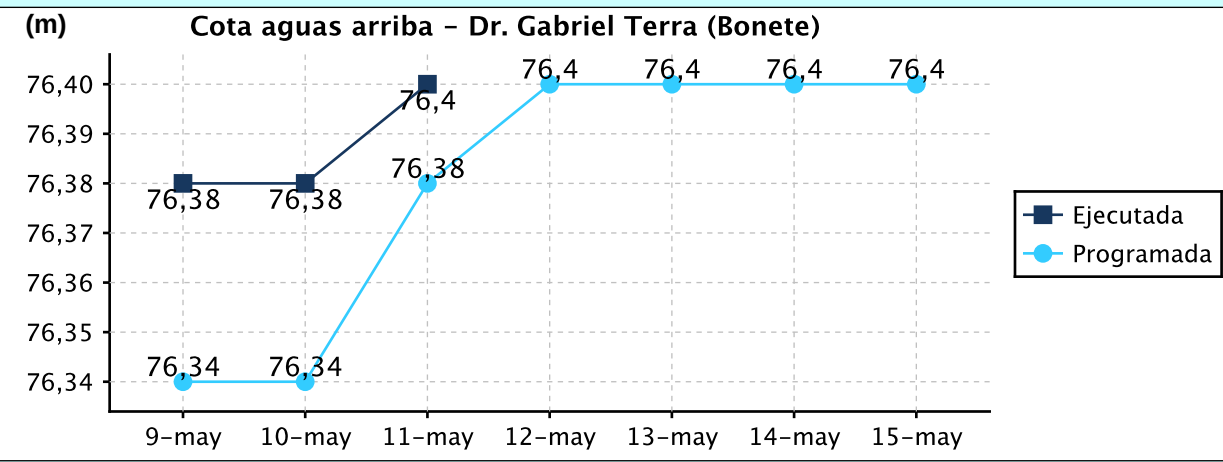


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,38	76,4
Baygorria	53,96	53,96
Palmar	39,07	39,08
SGU	34,31	34,25

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

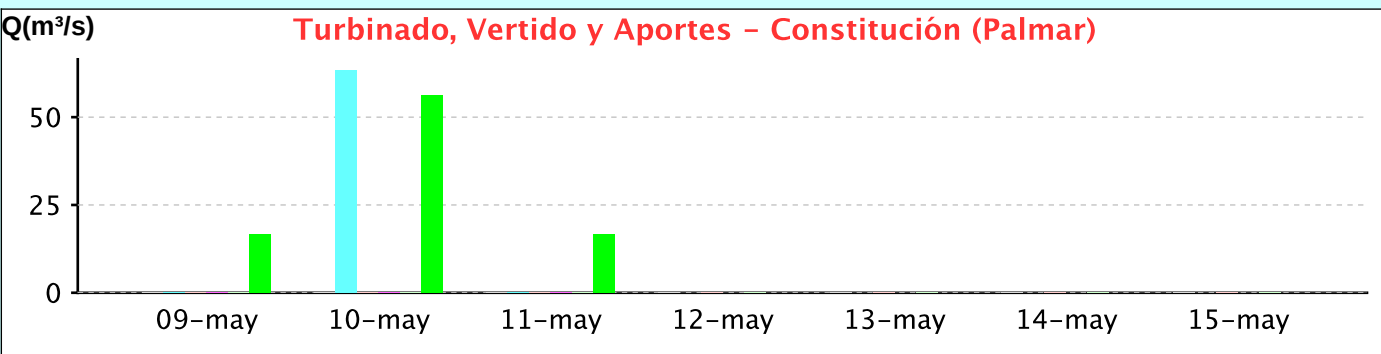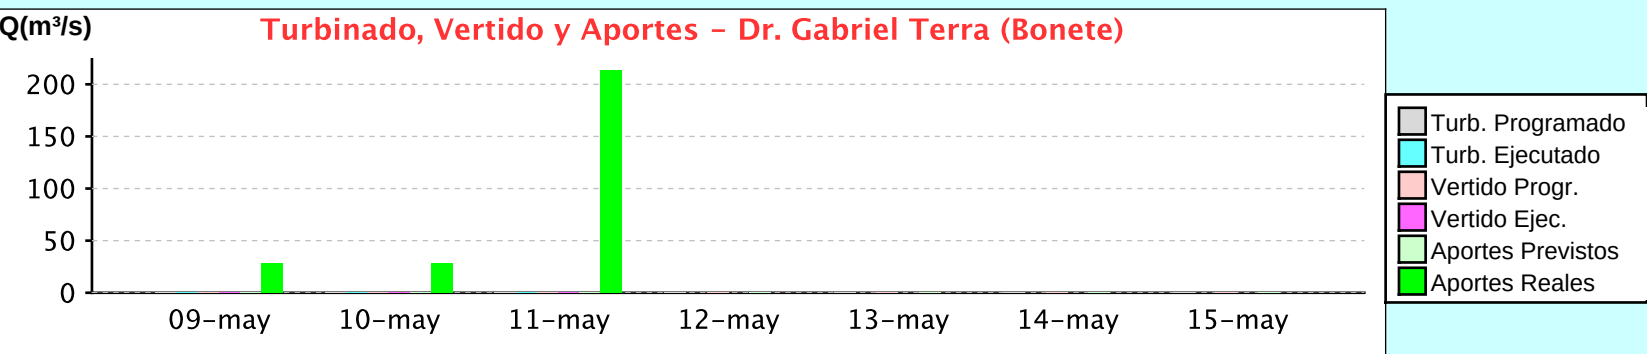

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

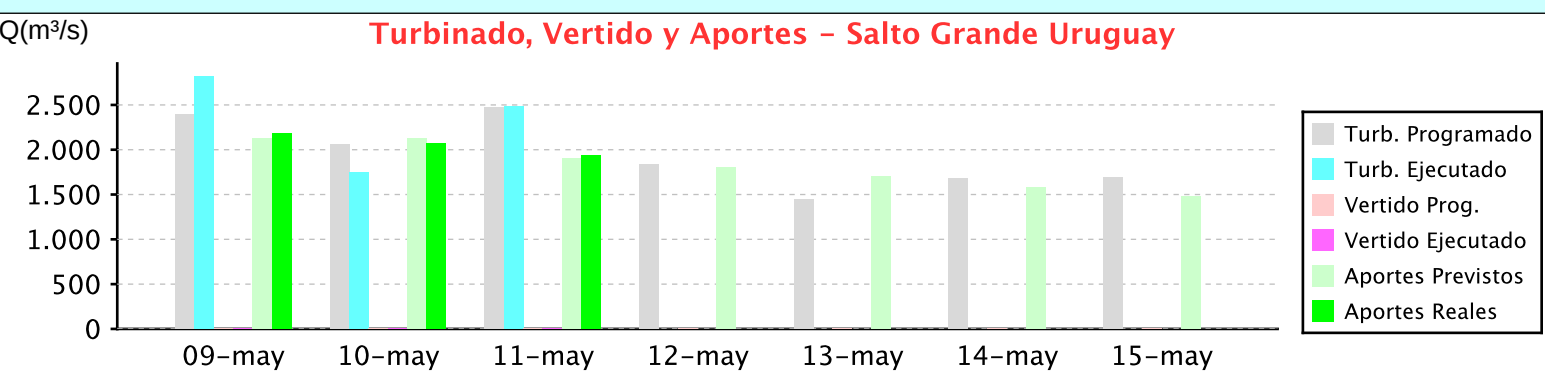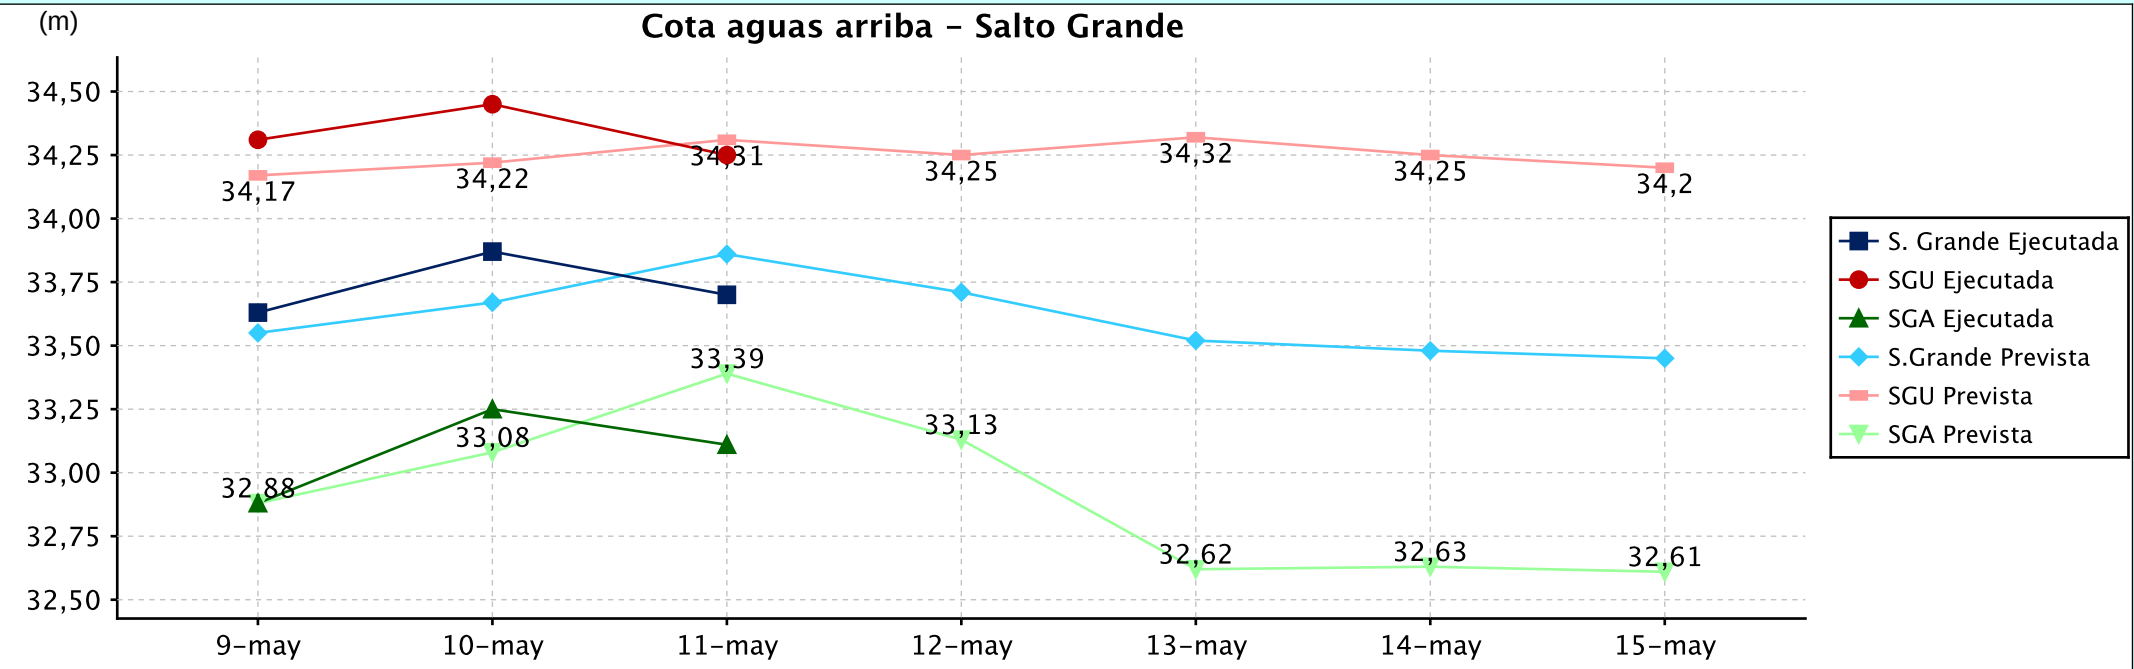

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,25
Cota Vista Arg	33,11
Cota real	33,70

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	22.686
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	2.475	2.487

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	213
Baygorria	0	8
Palmar	0	17
SGU	1.900	1.938

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
