




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 15 de mayo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.202
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.206
Central La Tablada	-79
Central P. del Tigre	6.069
APR A	1.640
APR B	1.799
APR C	1.692
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	-0
C. Baygorria	-7
C. Palmar	0
C. Salto Grande	10.018
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.700
TOTAL Generación	28.033

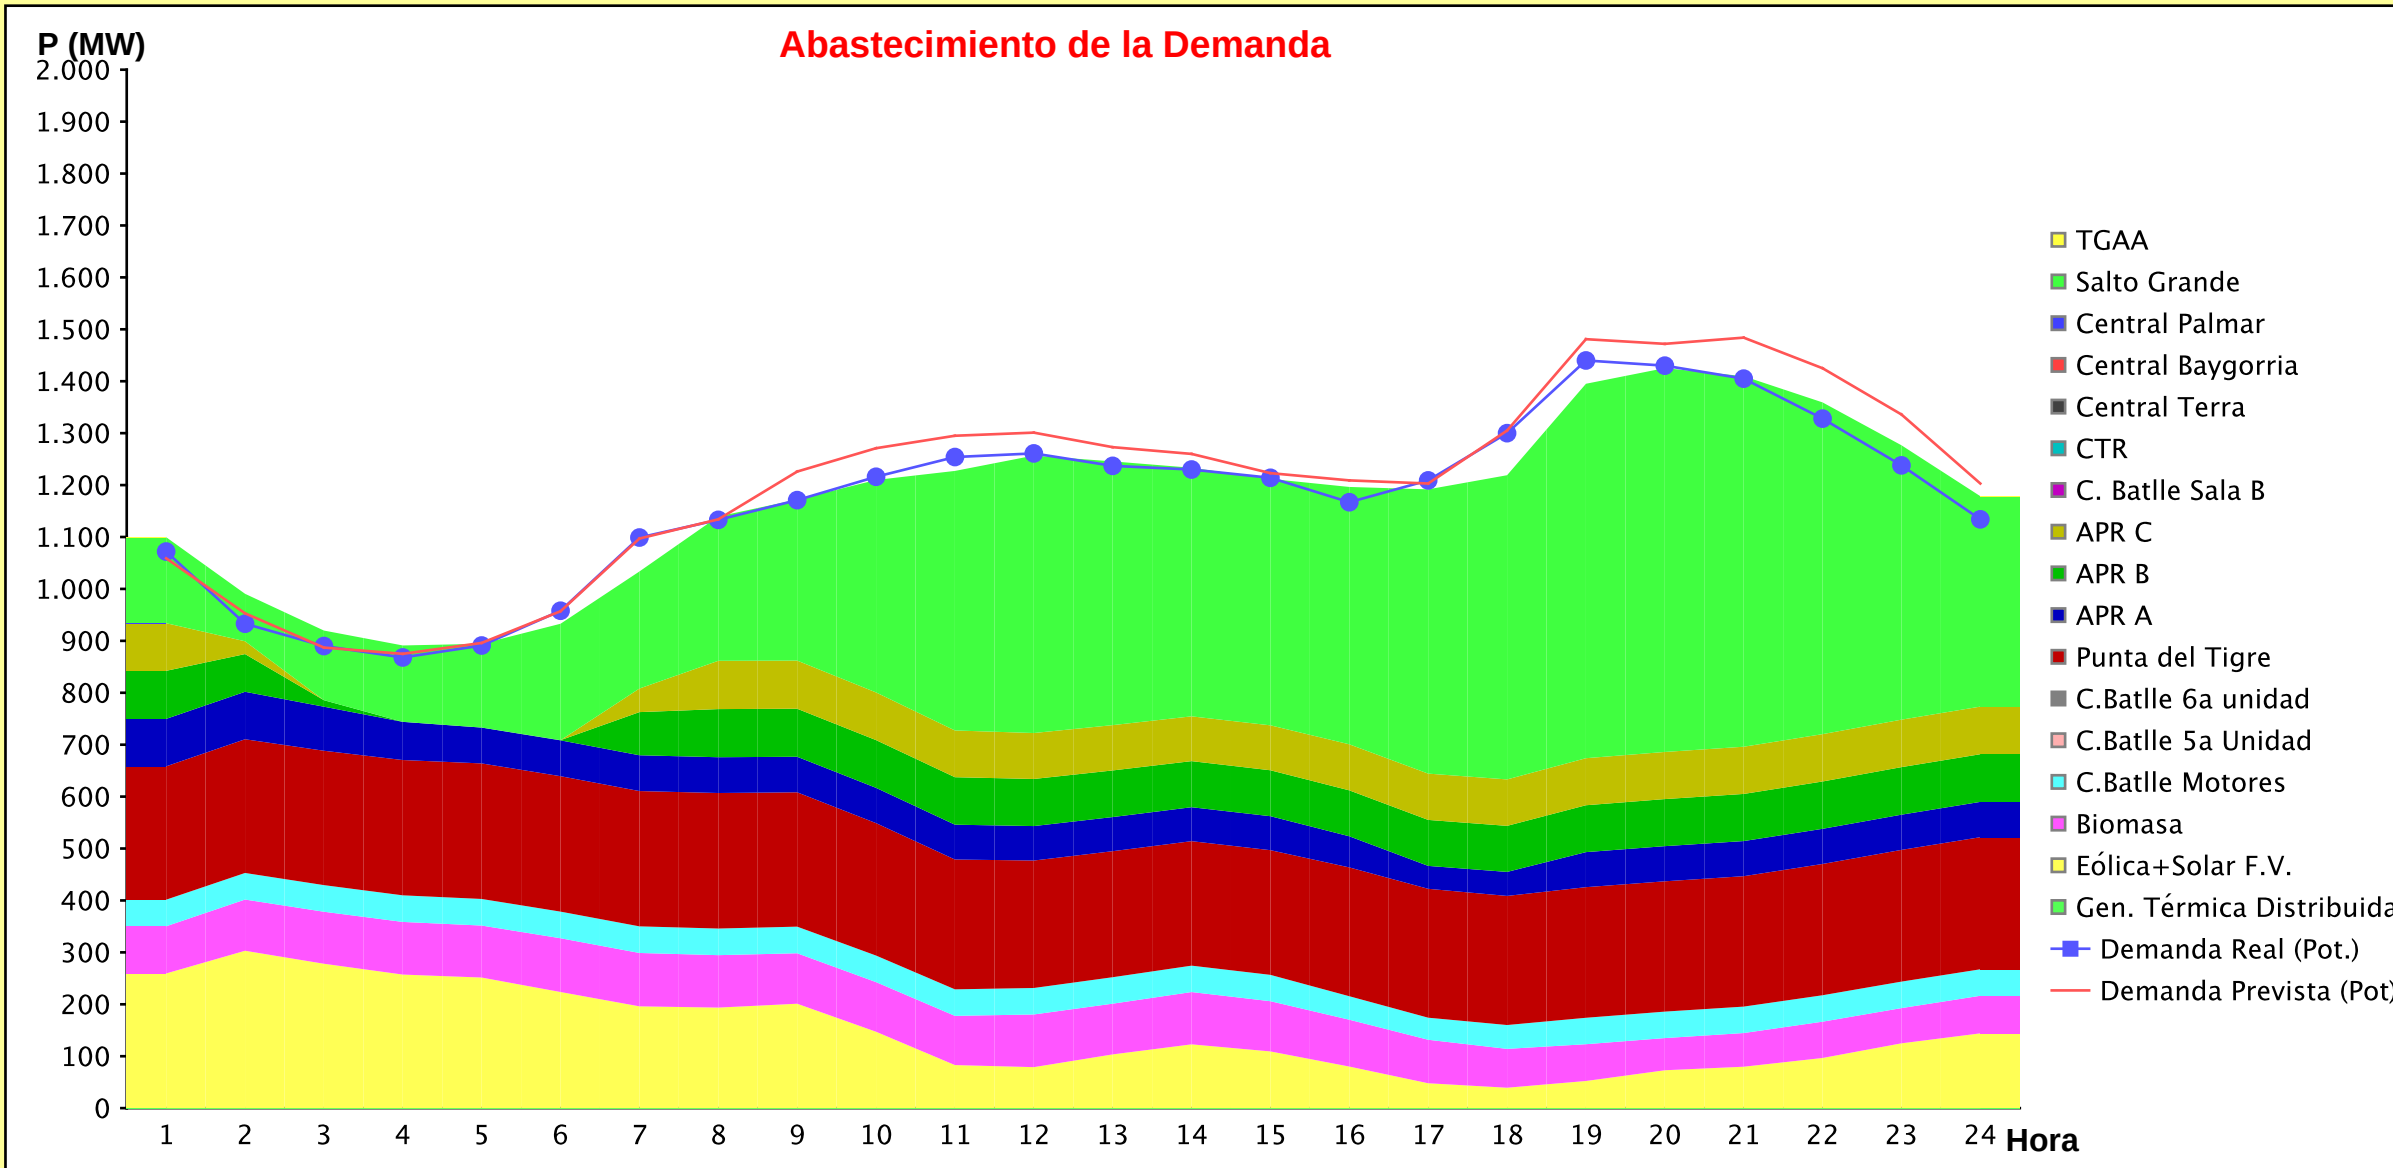

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.033
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.825
Diferencia (MWh)	-792
Ejecutada - Programada	-2,75 %

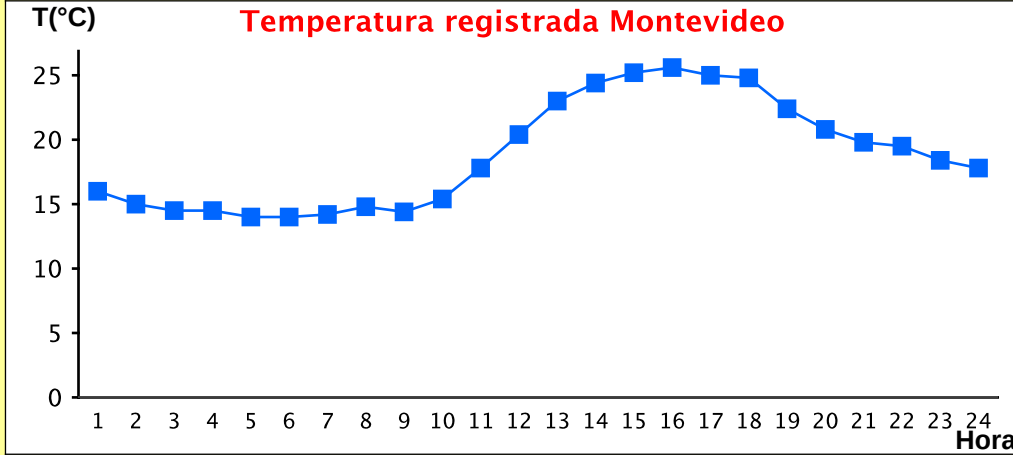



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1297,91 Hora 11:48
Potencia mínima:	863,11 Hora 04:32
Pico noche:	1445,41 Hora 18:53

Generación Media (MW)	
Eólica	148,4
Biomasa	90,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

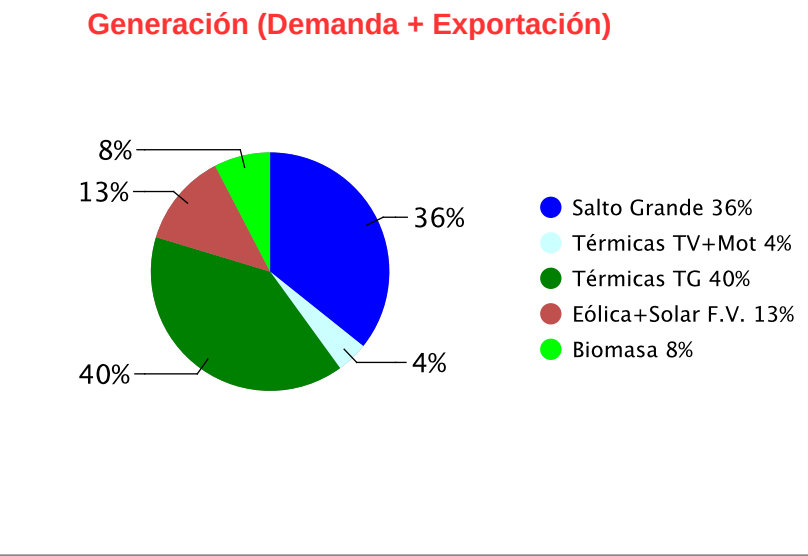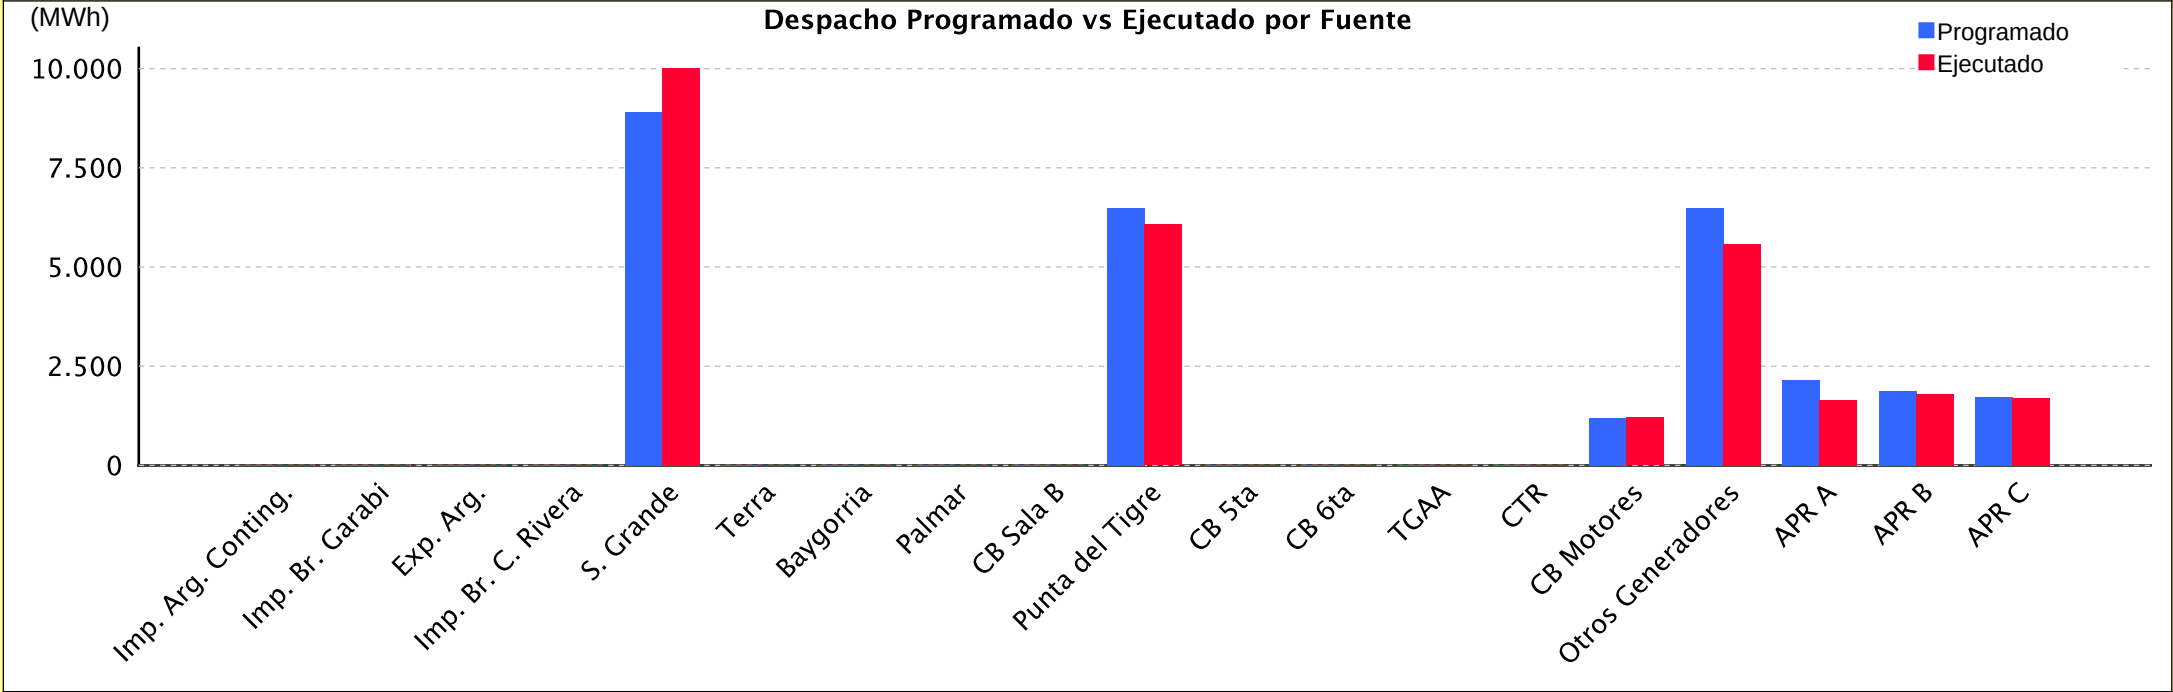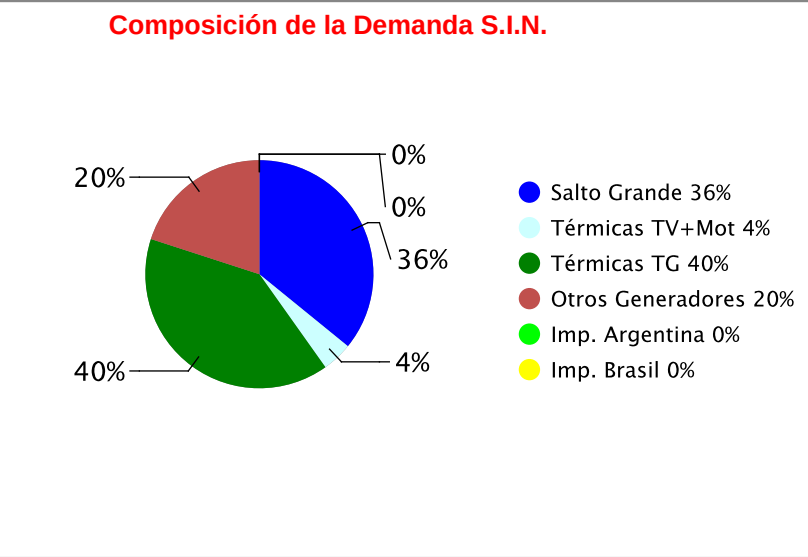



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

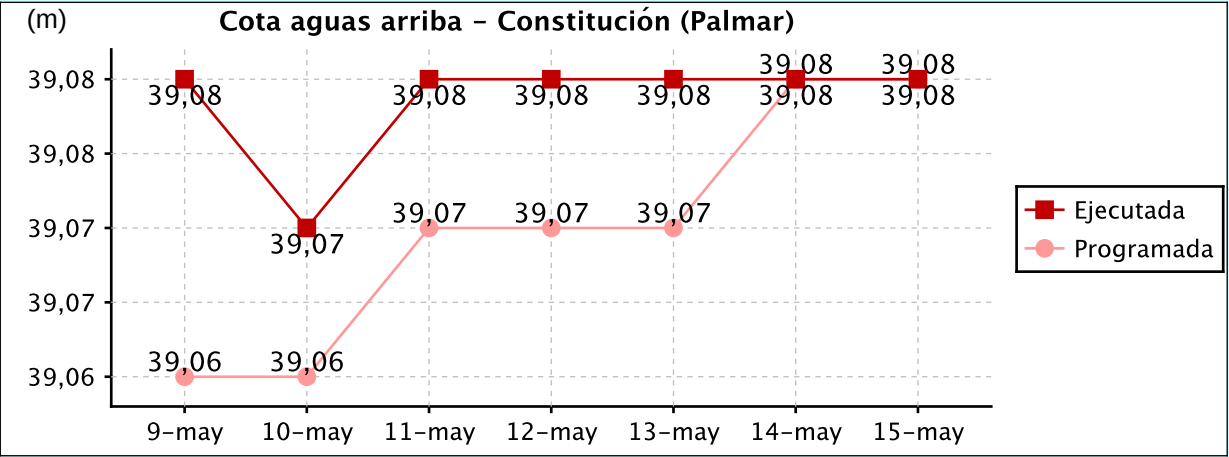
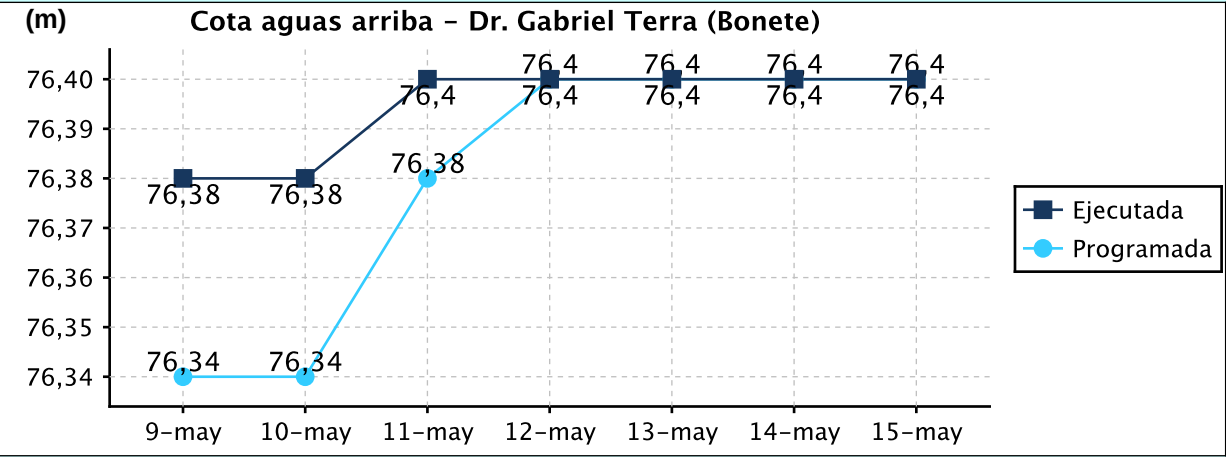


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,40	76,4
Baygorria	53,97	53,95
Palmar	39,08	39,08
SGU	34,20	34,12

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

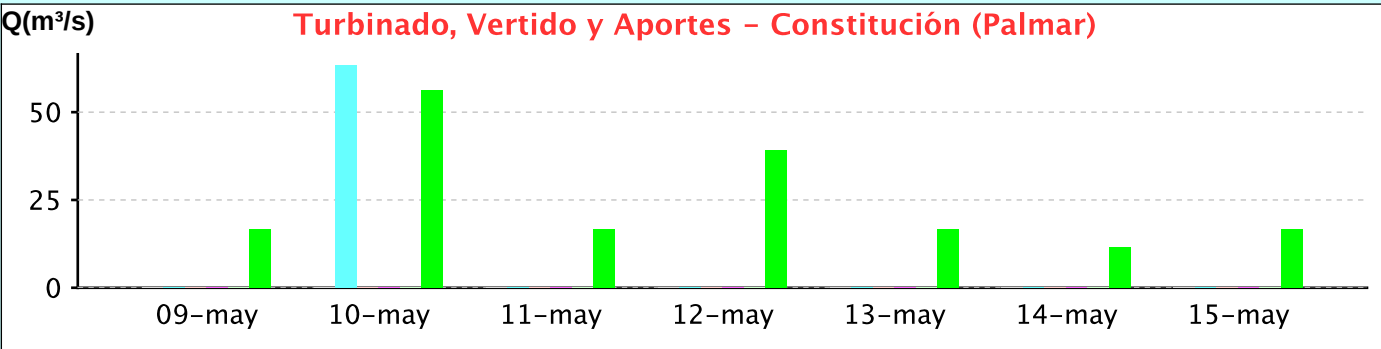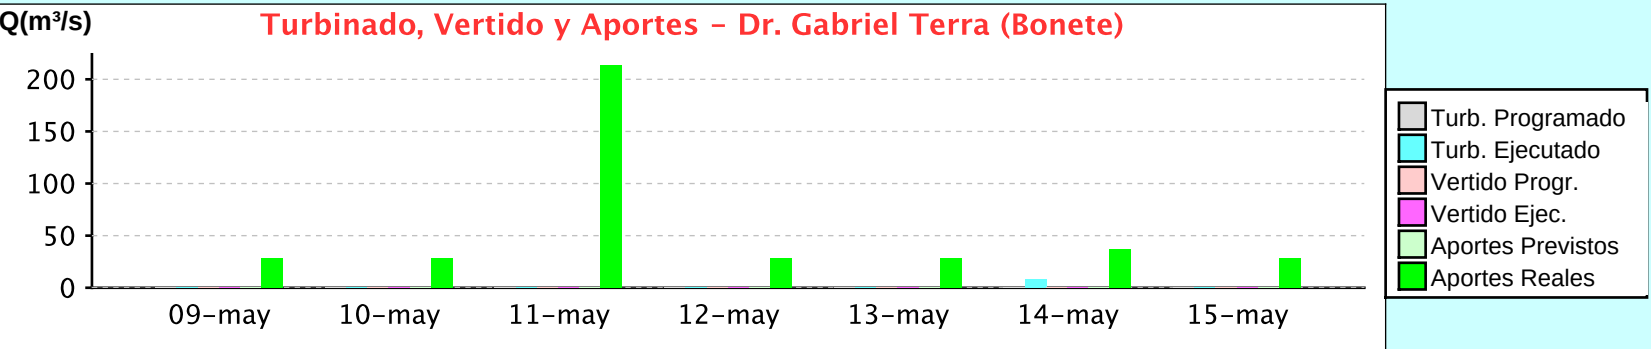

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

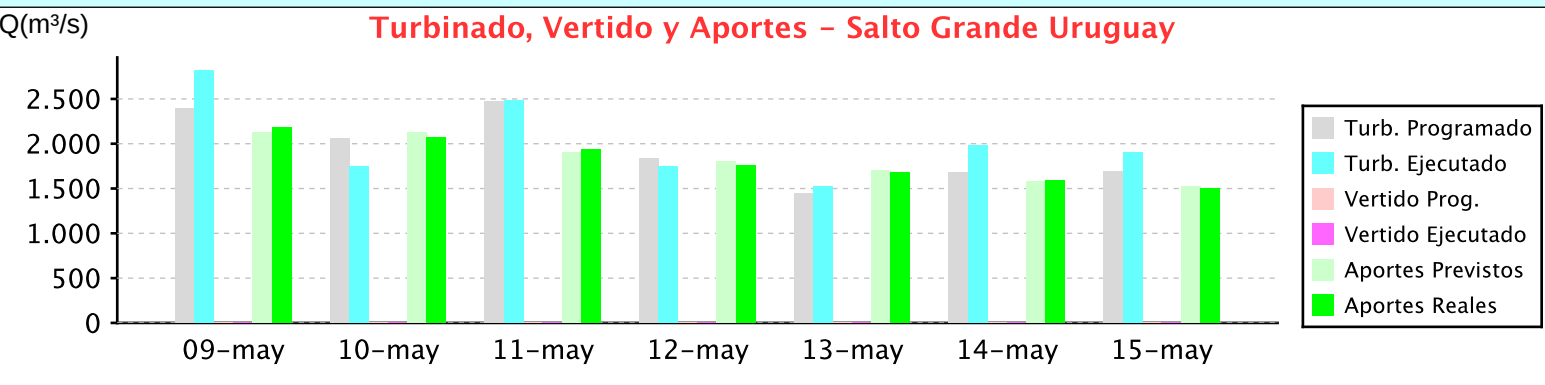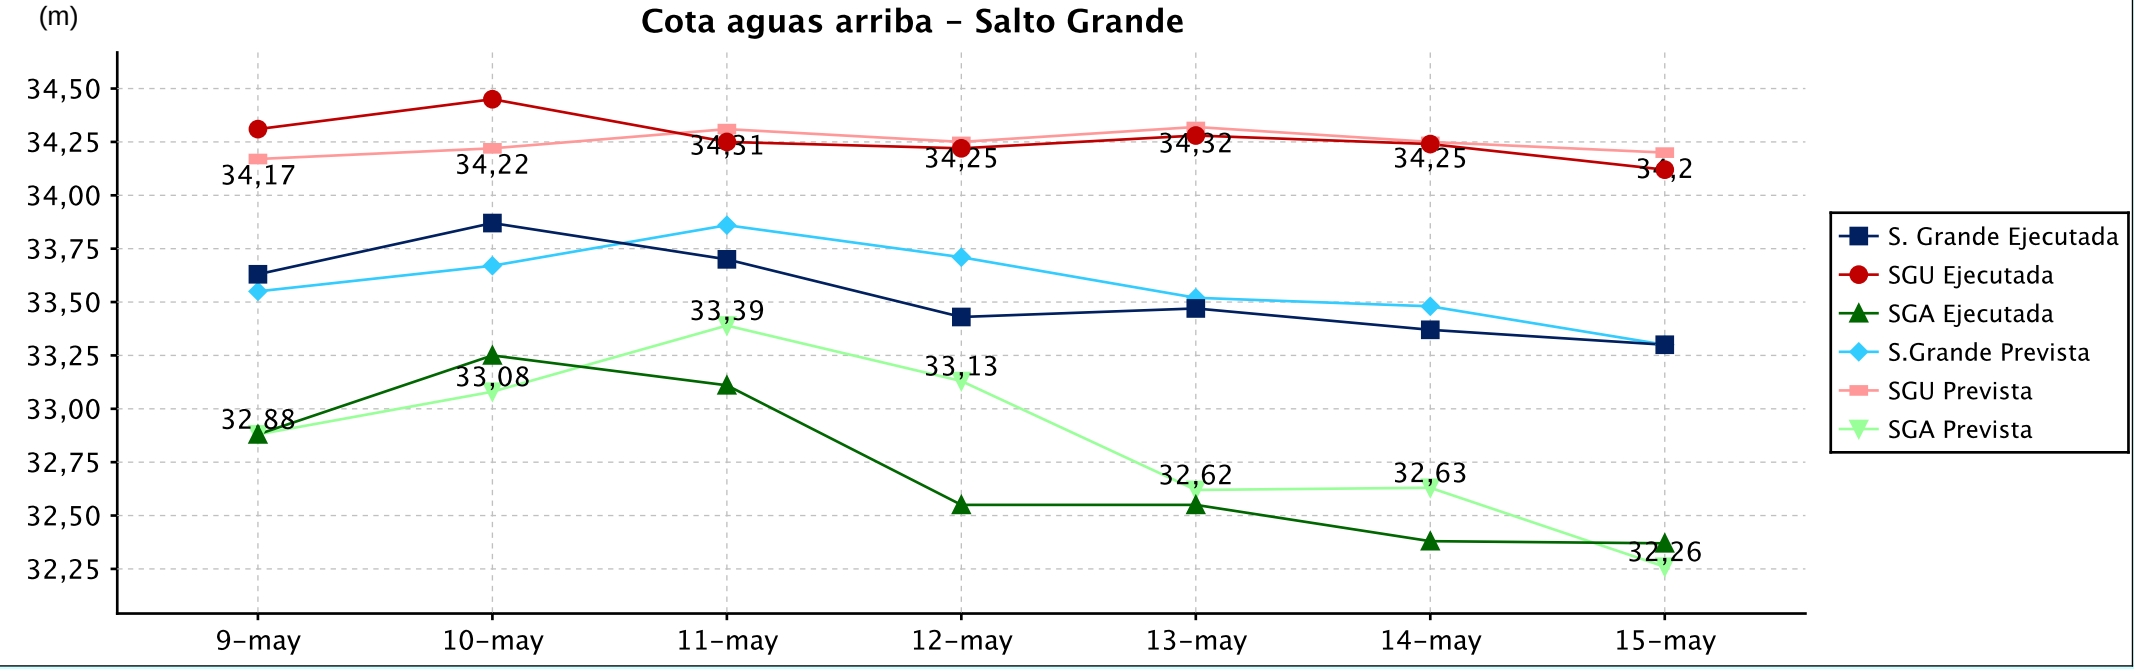

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,12
Cota Vista Arg	32,37
Cota real	33,30
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
32.316	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.687	1.899

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	28
Baygorria	0	19
Palmar	0	17
SGU	1.525	1.506

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
